



Engesolve
SOLUÇÕES AMBIENTAIS INTEGRADAS



**UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – USP
PREFEITURA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – ÁREA
CAPITAL LESTE (PUSP-LESTE)**

**EVOLUÇÃO DO MONITORAMENTO DE INTRUSÃO DE GASES E
DA OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE VENTILAÇÃO**

1º TRIMESTRE/2025 (JANEIRO À MARÇO)

**RUA ARLINDO BÉTTIO, 1.000,
ERMELINO MATARAZZO, SÃO PAULO, SP**

**Contrato nº 0000001/2022 – PUSP – CL
Processo Administrativo: 22.1.18.95.7**



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – USP
PREFEITURA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – ÁREA
CAPITAL LESTE (PUSP-LESTE)

EVOLUÇÃO DO MONITORAMENTO DE INTRUSÃO DE GASES E
DA OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE VENTILAÇÃO

1º TRIMESTRE/2025 (JANEIRO À MARÇO)

RUA ARLINDO BÉTTIO, 1.000,
ERMELINO MATARAZZO, SÃO PAULO, SP

São Paulo, 14 de abril de 2025



RESUMO EXECUTIVO

A ENGESOLVE Soluções Ambientais Ltda. foi contratada pela Prefeitura da Universidade de São Paulo – Área Capital Leste (PUSP-LESTE) para a operação, manutenção dos sistemas de ventilação de gases no solo, bem como o monitoramento de poços de gás e pontos na infraestrutura instalados em edificações da EACH na USP Leste, localizada na Rua Arlindo Bértio, 1.000 – Ermelino Matarazzo, São Paulo/SP, conforme o Processo Administrativo 22.1.18.95.7, Pregão Eletrônico nº 00002/2022 – PUSP – CL e Contrato nº 0000001/2022 – PUSP – CL.

O objetivo da operação dos sistemas de ventilação é impedir o acúmulo de gases sob a laje dos edifícios, aliado ao monitoramento preventivo de intrusão de gases nos ambientes por meio da execução de medições de gases em todos os poços de monitoramentos, pontos de infraestrutura e espaços com pouca circulação de ar.

No 1º trimestre de 2025 foram detectadas concentrações de Metano (acima de 1%Vol CH₄) na porção profunda em 9 dos 289 poços de gases monitorados. Nos demais poços profundos, não foram detectadas concentrações significativas. Para os poços nas porções rasas, não foram detectadas concentrações de metano acima de 1% VolCH₄.

Os resultados das medições realizadas nos pontos de infraestrutura ao longo do trimestre avaliado (ralos e caixa de passagem) em todas as edificações, bem como em ambientes com pouca circulação de ar, não detectaram concentrações de Metano e nem de VOC. Os sistemas de ventilação operaram 24 horas por dia, 30 dias por mês, durante todo o período do trimestre. Estes demonstraram-se eficientes, não permitindo que os gases existentes no solo se acumulassem no tapete de brita ou diretamente sob a laje (poços a 0,30 m), bem como diminuindo eventualmente até mesmo as concentrações no solo abaixo do tapete de brita (poços a 1,00 m), por influência da ventilação.

Diante dos resultados obtidos no monitoramento do 1º trimestre de 2025, e considerando a série histórica de monitoramento ao longo dos 11 anos (abril/2014 a março/2025), verifica-se que não há a intrusão e/ou acúmulo de gases nos ambientes fechados, uma vez que as concentrações de Metano existentes no solo, mesmo com a presença de pressão positiva, não alcançam o tapete de brita (sob a laje) ou, quando alcançam esporadicamente, são arrastadas pelo sistema de ventilação.

Recomenda-se a continuidade da operação dos sistemas de exaustão, bem como a realização dos monitoramentos semanais e quinzenais nos poços de monitoramento e nos pontos de infraestrutura.



EQUIPE TÉCNICA

Integrante	Função	Formação	Tempo de Experiência
Daniel Barel Filho	Operacional	Geólogo	Maior que 25 anos
Felipe Martins Chufi	Operacional	Engenheiro Ambiental	Maior que 15 anos
Gilson Rodrigues Figueirôa	Operacional	Químico	Maior que 15 anos
Amanda Cristina Garcia	Operacional	Engenheiro Ambiental	Maior que 5 anos
André Sammartano	Operacional	Engenheiro Ambiental	Maior que 5 anos



INFORMAÇÕES INICIAIS

Responsável legal

Nome:

RG:

CPF:

Endereço:

Telefone:

Responsável Técnico

Nome: Felipe Martins Chufi

RG: 29.447.243-5

CPF: 326.774.078-92

Endereço: Avenida Paulista, 2.064, 14º Andar, CEP: 01310-928, Bela Vista, São Paulo, SP

Telefone: 11-2844-4386

Contratante

Prefeitura da Universidade de São Paulo – Área Capital Leste (PUSP-LESTE)

CNPJ: 63.025.530/0062-26

Endereço: Rua Arlindo Bétio, 1.000, CEP: 03828-000, Ermelino Matarazzo, São Paulo, SP

Informações do Contrato

Contrato: 00000001/2022 – PUSP - CL

Processo Administrativo: 22.1.00018.95.7

Pregão Eletrônico: 00002/2022 – PUSP - CL

Escopo: Operação, manutenção e monitoramento de poços de gás, pontos na estrutura e de sistemas de ventilação de gases – EACH – USP Leste.



ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO E OBJETIVOS	9
1.1. CONDIÇÕES GERAIS E LIMITAÇÕES	10
1.2. ESTRUTURAÇÃO DO RELATÓRIO	10
2. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO	11
2.1. LOCALIZAÇÃO DA ÁREA.....	11
2.2. SOBRE A PRESENÇA DE GASES	11
2.3. SOBRE O SISTEMA DE VENTILAÇÃO DOS GASES	11
3. DISTRIBUIÇÃO DOS PONTOS DE MONITORAMENTO.....	13
3.1. POÇOS DE MONITORAMENTO	13
3.2. INFRAESTRUTURA	14
4. METODOLOGIA DO MONITORAMENTO DE GASES.....	15
4.1. SOBRE O BIOGÁS E O GÁS METANO	16
4.2. PLANO DE AÇÃO	18
5. RESUMO E TENDÊNCIA EM 11 ANOS DE OPERAÇÃO/MONITORAMENTO (ABRIL DE 2014-À MARÇO DE 2025).....	19
6. RESULTADOS OBTIDOS NO 1º TRIMESTRE DE 2025	44
6.1. RESULTADOS DO MONITORAMENTO EM POÇOS E NA INFRAESTRUTURA.....	44
6.2. RESULTADOS OBTIDOS NA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE VENTILAÇÃO.....	46
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES.....	51
8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	53



FIGURAS

- 2.1. Localização da Área de Interesse (adaptado de *Google Maps*, 2025)
- 2.3.1. Conceito do Sistema de Circulação de Gases USP Leste
- 3.1.1. Localização dos Poços de Monitoramento de Gás e Abrigos de Exaustores
- 3.2.1. Localização dos Pontos Monitoramento de Gases na Infraestrutura dos Edifícios
- 4.1.1. Faixa de Inflamabilidade do Gás Metano (CH_4) e a sua Combustão
- 6.1.1. Resultado da Distribuição das Concentrações de Metano Detectadas $>1\% \text{Vol}$
- 6.1.2. Pluma de Isoconcentração de Metano no Solo no Horizonte B (aproximadamente de 1,0 m – 1,3 m de profundidade) no período de janeiro à março de 2025

TABELAS

- 3.1.1. Distribuição dos Poços de Monitoramento dos Gases nas Edificações
- 3.2.1. Distribuição dos Pontos de Monitoramento de Infraestrutura nas Edificações
- 6.1.1. Resultados dos poços com concentração igual ou maior que $1\% \text{VolCH}_4$
- 6.2.1. Localização dos Exaustores dos Sistemas de Ventilação
- 6.2.2. Comparativo de Pressão de Sucção de Projeto x Medição no 1º Trimestre/2025



ANEXOS

1. Certificados de Calibração dos Equipamentos
2. Plano de Ação
3. Tabelas de Medições Semanais em PMG
4. Tabelas de Medições Quinzenais na Infraestrutura
5. Evolução das concentrações de Metano x Pressão (abril/2014 a Março/2025)
6. Tabelas de Medições Semanais nos Exaustores
7. Declaração de Responsabilidade
8. Anotação de Responsabilidade Técnica – ART



1. INTRODUÇÃO E OBJETIVOS

A ENGESOLVE Soluções Ambientais Ltda. foi contratada pela Prefeitura da Universidade de São Paulo - Área Capital Leste (PUSP-LESTE) para a operação, manutenção dos sistemas de ventilação de gases no solo, bem como o monitoramento de poços de gás e pontos na infraestrutura instalados em edificações da EACH na USP Leste, localizada na Rua Arlindo Bértio, 1.000, Ermelino Matarazzo, São Paulo, SP.

A contratação dos serviços ocorreu por meio do Processo Administrativo 22.1.18.95.7, Pregão Eletrônico nº 00002/2022 – PUSP – CL e Contrato nº 0000001/2022 – PUSP – CL, que teve por objetivo prosseguir com o acompanhamento das atividades de operação, manutenção e monitoramento dos poços de gás, pontos na estrutura e de sistemas de ventilação de gases instalados.

O presente relatório técnico possui como objetivo avaliar a evolução dos resultados de monitoramento de gases no subsolo e a operação do sistema de ventilação ao longo do primeiro trimestre de 2025 (janeiro à março de 2025), além de compará-los com os resultados obtidos desde o início dos trabalhos desenvolvidos na área (março/2014) para uma análise histórica.

Este monitoramento preventivo da intrusão de gases possibilita a elaboração de um diagnóstico contínuo para avaliação da situação da área e, caso necessário, indica ações subsequentes que garantam um uso seguro do local.

Para tanto, foi seguido o resumido escopo de atividades apresentado a seguir:

- Operação e manutenção dos 22 (vinte e dois) Sistemas de Ventilação;
- Monitoramento periódico dos sistemas e monitoramento de gases e explosividade em pontos de estrutura, poços de monitoramento e na entrada dos sistemas de ventilação;
- Compilação dos resultados das medições e tratamento dos dados;
- Elaboração de relatório técnico contendo a descrição dos trabalhos executados e a interpretação dos resultados obtidos, além das conclusões e recomendações pertinentes.

Os trabalhos de campo foram conduzidos em conformidade com as seguintes referências técnicas, além das demais normas e referências pertinentes:

- ABNT NBR 16.209, de setembro de 2013 – Avaliação de risco a saúde humana para fins de gerenciamento de áreas contaminadas;
- CETESB (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo), 2017 – Decisão de Diretoria Nº 038/2017, de 07 de fevereiro de 2017, que dispõe sobre a aprovação do “Procedimento para a Proteção da Qualidade do Solo e das Águas Subterrâneas”.



1.1. Condições Gerais e Limitações

Este relatório é para uso exclusivo do cliente, não podendo ser reproduzido por qualquer meio, ainda que em parte, sem a prévia autorização do cliente. Sua autoria encontra-se protegida nos termos da Lei nº 9.610 de 19/02/98, não sendo permitida sua reprodução parcial ou integral, edição, publicação, divulgação, comercialização, doação, distribuição, cessão ou transferência, no todo ou em parte, sem a prévia e expressa autorização da ENGESOLVE, sob pena de ser compelido o responsável a indenizá-la, mediante composição de perdas e danos, e lucros cessantes, sem prejuízo das sanções cíveis e penais cabíveis.

Este documento foi preparado pela ENGESOLVE em concomitância às normas técnicas recomendáveis e em estrita obediência aos termos do pedido e contrato firmado com o cliente. Em razão disto, a ENGESOLVE isenta-se de qualquer responsabilidade civil e criminal perante o cliente ou terceiros pela utilização deste documento, ainda que parcialmente, fora do escopo para o qual foi preparado.

1.2. Estruturação do Relatório

Com o objetivo de facilitar o entendimento dos dados, informações e resultados gerados através do presente trabalho, este relatório de “Evolução do Monitoramento de Intrusão de Gases e da Operação dos Sistemas de Ventilação” se encontra dividido nos capítulos apresentados a seguir:

- **Capítulo 1:** INTRODUÇÃO E OBJETIVOS dos trabalhos de monitoramento de intrusão dos gases;
- **Capítulo 2:** CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO, localização da área e apresenta o sistema de ventilação dos gases;
- **Capítulo 3:** aborda a DISTRIBUIÇÃO DOS PONTOS DE MONITORAMENTO, localização dos poços de monitoramento e dos pontos de infraestrutura;
- **Capítulo 4:** apresentação METODOLOGIA DO MONITORAMENTO DE GASES e detalhamento do plano de ação;
- **Capítulo 5:** apresentação RESUMO E TENDÊNCIA EM 11 ANOS DE OPERAÇÃO/MONITORAMENTO;
- **Capítulo 6:** apresentação dos resultados da RESULTADOS OBTIDOS NO 1º TRIMESTRE DE 2025;
- **Capítulo 7:** CONSIDERAÇÕES FINAIS com relação aos resultados obtidos, principalmente no que se refere ao monitoramento dos poços de monitoramento de gases e recomendações;
- **Capítulo 9:** REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS utilizadas.



2. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO

2.1. LOCALIZAÇÃO DA ÁREA

A área objeto de estudo pertence à Universidade de São Paulo Campus Área Capital Leste (PUSP-LESTE) e está inserida no município de São Paulo, Subprefeitura Penha, no bairro Ermelino Matarazzo, registrada na Rua Arlindo Bétio, 1.000 (Portaria P2). As coordenadas em UTM Sirgas 2000 do centro da área de estudo são zona 23K, 7402266.51 m S e 346771.93 m E.

O local de estudo (USP Leste) possui aproximadamente 220.000 m² e conta com três portarias principais, a P1 situada na Rodovia Parque (na margem da Rodovia Ayrton Senna), a P2 situada na Rua Arlindo Bétio e a P3 com acesso pela Estação da CPTM USP Leste. A **Figura 2.1.** apresenta a localização da área de interesse.

2.2. SOBRE A PRESENÇA DE GASES

Estudos anteriores realizados no local comprovaram que a ocorrência de gás Metano identificada na Gleba I da USP Leste é proveniente da matéria orgânica advinda das camadas de origem antrópica oriundas da dragagem do Rio Tietê e também das camadas naturais pertencentes aos depósitos aluviais quaternários associados ao Rio Tietê.



O monitoramento dos poços de gás com medições realizado em campo indica que o composto de interesse predominante na atmosfera gasosa dos poros do solo na área de estudo é o gás Metano.

Pela ocorrência destes gases, foi projetado e instalado um sistema de ventilação com objetivo de impedir a intrusão de gases dos edifícios presentes no local.

2.3. SOBRE O SISTEMA DE VENTILAÇÃO DOS GASES

Na área de estudo há um sistema de ventilação (circulação de ar) composto por tapetes de brita inseridos logo abaixo da laje dos prédios, que permite a circulação dos gases, os quais são extraídos por meio de compressores ou exaustores.

O processo de circulação funciona da seguinte maneira: os eventuais gases formados a partir da matéria orgânica são drenados pelo tapete de brita instalado sob a laje das edificações e então arrastados em um fluxo contínuo de ar limpo promovido por um exaustor para ventilação forçada, conduzidos a um sistema de dispersão na atmosfera.

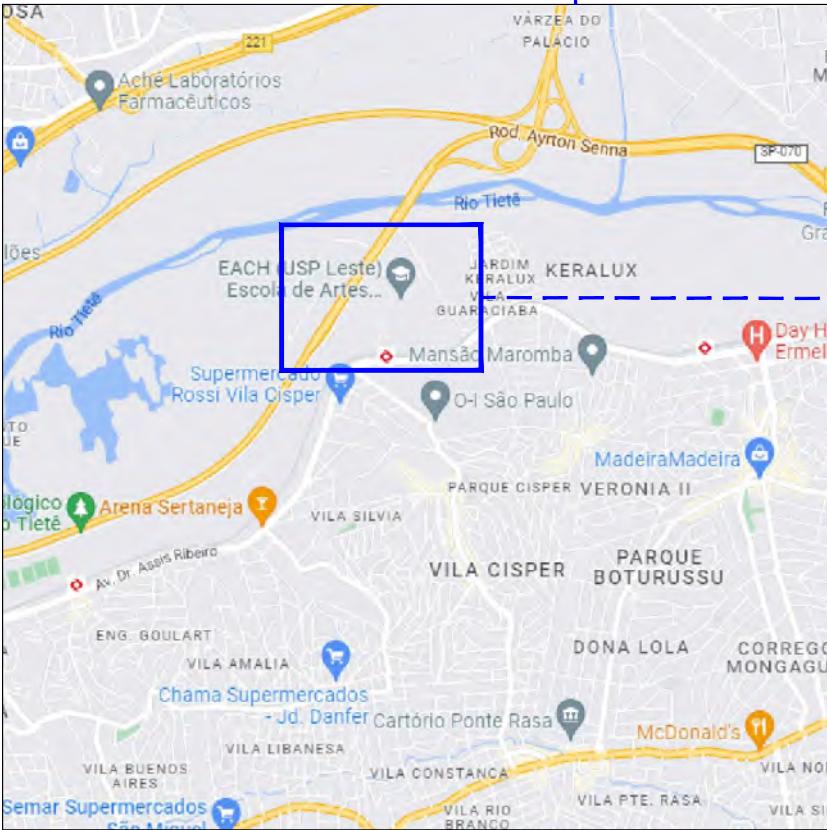

LEGENDA:

 Área de Interesse

CLIENTE: Universidade de São Paulo - USP Leste		
PROJETO: Evolução do Monitoramento de Intrusão de Gases e da Operação do Sistema de Ventilação		
ENDEREÇO: Rua Arlindo Bétio, 1.000, Ermelino Matarazzo – São Paulo/SP		
TÍTULO: Localização da Área de Interesse (Adaptado de Google Earth, 2024)		
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Felipe Chufi	FIGURA Nº: 2.1	DATA: ABR/2025


Dessa forma, mantendo-se a ventilação do tapete de brita, garante-se que os gases que eventualmente emanem do subsolo não atinjam o edifício pela sua laje.

Previamente e como forma de contingência emergencial, os exaustores foram conectados às tubulações drenantes existentes nos edifícios. Durante os meses de março a julho de 2014, os sistemas de ventilação passaram pela etapa de reajuste às características de cada edificação, para que os exaustores fossem conectados à sua situação definitiva.

A eficiência do sistema de ventilação de gases é monitorada por meio de medições das concentrações de Metano (CH_4), Compostos Orgânicos Voláteis (VOC), Gás Carbônico (CO_2), Monóxido de Carbono (CO), Oxigênio (O_2), Sulfeto de Hidrogênio (H_2S) e pressão em poços de monitoramento em duas profundidades distintas.

A **Figura 2.3.1** ilustra o conceito de funcionamento do sistema de circulação de gases instalado na USP Leste.

Figura 2.3.1 – Conceito do Sistema de Circulação de Gases USP Leste

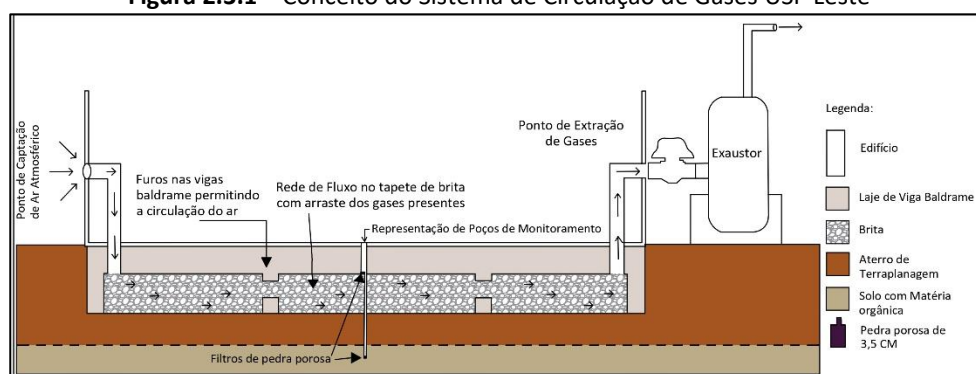

Fonte: Adaptado de Relatório de Instalação de Sistemas (Weber, 2022), Atualizado por Engesolve, 2023.



3. DISTRIBUIÇÃO DOS PONTOS DE MONITORAMENTO

O monitoramento de intrusão de gases/vapores no solo em ambientes fechados é realizado de forma sistemática e programada, com o objetivo de afastar o risco eventual de explosividade nas edificações da USP Leste.

Os pontos de monitoramento se subdividem em Poços de Monitoramento e Infraestrutura.

3.1. POÇOS DE MONITORAMENTO

Atualmente estão instalados na área de estudo 117 (cento e dezessete) conjuntos de poços de monitoramento de gases e 08 (oito) poços de monitoramento de gases, distribuídos nos Edifícios I-1, I-3 (Auditório I-5 e Biblioteca), I-4 (Serviços), Conjunto Laboratorial, Bloco Inicial (Conjunto Didático), Enfermaria, CAT, Incubadora, Ginásio, Guarda Universitária, Portaria P3 e Transportes. Os 03 conjuntos de poços existentes no Edifício Laranjinha foram encerrados com a demolição do prédio.

Entre agosto e novembro de 2013 foram instalados 107 (cento e sete) pares de poços de monitoramento de gases, com duas profundidades distintas, e 08 (oito) poços de monitoramento de gases rasos, sendo intitulados PMG-00 A (~0,30 m – sob as lajes/no tapete de brita) e PMG-00 B (~1,00 m – no solo).

Em março/2014 os poços A e B encontravam-se conectados em uma mesma mangueira. No início do mês de abril/2014, foram inseridas válvulas de individualização dos poços, as quais os mantém fechados, sendo abertos somente no momento da medição após a conexão da mangueira do equipamento, o que permite a leitura da pressão e das concentrações de uma profundidade sem a interferência da outra, ou da atmosfera.

Em julho/2015 foram instalados mais 09 (nove) conjuntos de poços de monitoramento nos edifícios da Guarda Universitária, Portaria P3 e Transportes. O monitoramento nesses poços se iniciou em Agosto/2015.

Nos edifícios Guarda Universitária e Transportes, na porção rasa foi instalado o poço de monitoramento sob a laje tipo Vapor Pin (A) e na porção profunda, com o mesmo perfil construtivo dos já existentes (B). No edifício Portaria P3, foi detectada uma segunda laje sob o piso, sendo assim, os poços de monitoramento neste edifício foram instalados em três profundidades: Sob a primeira laje – A (~0,30 m), sob a segunda laje, no tapete de brita – B (~0,50 m) e no solo – C (~1,30 m).

Entre junho/2019 e junho/2020, o sistema de ventilação no edifício da Guarda Universitária foi desligado e o monitoramento interrompido devido à uma reforma ocorrida entre Julho a novembro/2019. Em dezembro/2019, 07 (sete) novos pares de poços de monitoramento foram



instalados, com o mesmo tipo de construção de 2015, bem como foram instaladas novas tubulações do sistema de ventilação.

Em outubro/2021 foram instalados 34 (trinta e quatro) conjuntos de poços de monitoramento de gases, com profundidades distintas sendo PMG-00 B e C (~0,50 m e ~1,20m) e 11 (onze) poços de monitoramento de gases rasos, sendo PMG-00 A (~0,30 m). Ainda neste período foram reinstalados 07 (sete) poços A sob a laje na Guarda Universitária, totalizando em 52 os poços instalados neste período.

A **Tabela 3.1.1** demonstra o quantitativo de poços distribuídos nos edifícios, totalizando 289 poços de monitoramento em solo/laje. A **Figura 3.1.1** ilustra a localização destes poços de monitoramento.

3.2. INFRAESTRUTURA

Além dos poços de monitoramento, foi realizado o levantamento dos ralos, tomadas e grelhas existentes nos edifícios, para incluí-los nas medições e avaliar a intrusão dos gases nas construções. Foi definido o monitoramento em ralos e caixas de passagem numerados e cadastrados em cada prédio.

Em junho de 2021, foram incluídos sete pontos de infraestrutura na Guarda Universitária, retomando o monitoramento da infraestrutura, a qual estava interrompida desde a reforma do prédio de 2020.

Durante a construção dos edifícios, a presença de gás foi detectada e, por isso, como forma de prevenção, o sistema elétrico foi instalado em tubulações aéreas, chegando às salas via canaletas, fazendo com que as tomadas das edificações não possuam contato direto com o solo.

Foram definidos também espaços que possuem pouca circulação de ar para serem monitorados, a partir de vistoria em toda a área de estudo.

Em março de 2023 foi realizado o levantamento detalhado e atualização de todos os pontos de infraestrutura, na ocasião foi verificado que o ponto 177 se encontrava identificado erroneamente como 171, o ponto 176 identificado como 177 e o ponto 171 (posicionado dentro do box) se encontrava sem identificação. Os pontos identificados foram remarcados corretamente, o **Anexo 7** apresenta Relatório Fotográfico referente ao levantamento e atualização.

A **Tabela 3.2.1.** e a **Figura 3.2.1.** apresentam respectivamente a distribuição e a localização dos pontos de infraestrutura distribuídos nos edifícios (totalizando 180 pontos de medição na infraestrutura), respectivamente.

Tabela 3.1.1.1 – Distribuição dos Poços de Monitoramento dos Gases nas Edificações

Relação de Poços x Edificações																											
Poços				Poços				Poços				Poços				Poços				Poços				Poços			
Edifício I-1 Parte 1	PMG-16	A	37 POÇOS	Edifício I-3 Auditórios (I-5)	PMG-25	A	47 POÇOS	Conjunto Laboratorial	PMG-46	A	41 POÇOS	Bloco Inicial (Conjunto Didático)	PMG-01	A	35 POÇOS	Edifício I-4	PMG-63	A	32 POÇOS	Ginásio Poliesportivo	PMG-102	18 POÇOS					
	PMG-16	B			PMG-25	B			PMG-46	B			PMG-01	B			PMG-63	B			PMG-103						
	PMG-17	A			PMG-26	A			PMG-47	A			PMG-02	A			PMG-64	A			PMG-104						
	PMG-17	B			PMG-26	B			PMG-47	B			PMG-02	B			PMG-64	B			PMG-105						
	PMG-18	A			PMG-27	A			PMG-48	A			PMG-03	A			PMG-65	A			PMG-106						
	PMG-18	B			PMG-27	B			PMG-48	B			PMG-03	B			PMG-65	B			PMG-107						
	PMG-20	A			PMG-28	A			PMG-49	A			PMG-04	A			PMG-66	A			PMG-108						
	PMG-20	B			PMG-28	B			PMG-49	B			PMG-04	B			PMG-66	B			PMG-109		A				
	PMG-22	A			PMG-29	A			PMG-50	A			PMG-05	A			PMG-67	A			PMG-109		B				
	PMG-22	B			PMG-29	B			PMG-50	B			PMG-05	B			PMG-67	B			PMG-110		A				
	PMG-23	A			PMG-44	A			PMG-51	A			PMG-06	A			PMG-68	A			PMG-110		B				
	PMG-23	B			PMG-44	B			PMG-51	B			PMG-06	B			PMG-68	B			PMG-111		A				
	PMG-113	A			PMG-45	A			PMG-52	A			PMG-07	A			PMG-69	A			PMG-111		B				
	PMG-113	B			PMG-45	B			PMG-52	B			PMG-07	B			PMG-69	B			PMG-112						
	PMG-114	A			PMG-132	A			PMG-53	A			PMG-08	A			PMG-77	A			PMG-162		A				
	PMG-114	B			PMG-132	B			PMG-53	B			PMG-08	B			PMG-77	B			PMG-162		B				
	PMG-115	A			PMG-133	A			PMG-54	A			PMG-09	A			PMG-78	A			PMG-166		A				
	PMG-115	B			PMG-133	B			PMG-54	B			PMG-09	B			PMG-78	B			PMG-166		B				
	PMG-135	A			PMG-134	B			PMG-55	A			PMG-10	A			PMG-79	A									
	PMG-135	B			PMG-30	A			PMG-55	B			PMG-10	B			PMG-79	B									
PMG-136	B	PMG-30		B	PMG-56	A		PMG-84	A	PMG-80		A															
Edifício I-1 Parte 2	PMG-14	A		PMG-31	A	PMG-56		B	PMG-84	B		PMG-80	B														
	PMG-14	B		PMG-31	B	PMG-57		A	PMG-85	A		PMG-81	A														
	PMG-21	A		PMG-32	A	PMG-57		B	PMG-85	B		PMG-81	B														
	PMG-21	B		PMG-32	B	PMG-58		A	PMG-86	A		PMG-144	B														
	PMG-15	A		PMG-33	A	PMG-58		B	PMG-86	B		PMG-145	B														
	PMG-15	B		PMG-33	B	PMG-59		A	PMG-87	A		PMG-146	B														
	PMG-13	A		PMG-34	A	PMG-59		B	PMG-87	B		PMG-147	B														
	PMG-13	B		PMG-34	B	PMG-60		A	PMG-152	A		PMG-148	B														
	PMG-19	A		PMG-35	A	PMG-60		B	PMG-152	B		PMG-149	B														
	PMG-19	B		PMG-35	B	PMG-61		A	PMG-153	B		PMG-150	B														
	PMG-11	A		PMG-36	A	PMG-61		B	PMG-154	B		PMG-151	B														
	PMG-11	B		PMG-36	B	PMG-62		A	PMG-155	B		PMG-88	A														
	PMG-12	A		PMG-37	A	PMG-62		B	PMG-156	B		PMG-88	B														
	PMG-12	B		PMG-37	B	PMG-137		B	PMG-157	B		PMG-89	A														
	PMG-24	A		PMG-38	A	PMG-138		B	PMG-82	A		PMG-89	B														
	PMG-24	B		PMG-38	B	PMG-139		A	PMG-82	B		PMG-90	A														
Edifício I-3 Biblioteca	PMG-39	A	PMG-39	A	PMG-139	B		PMG-83	A	PMG-90		B															
	PMG-39	B	PMG-40	A	PMG-140	A		PMG-83	B	PMG-91		A															
	PMG-40	A	PMG-40	B	PMG-140	B		PMG-94	A	PMG-91		B															
	PMG-40	B	PMG-41	A	PMG-141	B		PMG-94	B	PMG-92		A															
	PMG-41	A	PMG-41	B	PMG-70	A		PMG-95	A	PMG-92	B																
	PMG-41	B	PMG-42	A	PMG-70	B		PMG-95	B	PMG-93	A																
	PMG-42	A	PMG-42	B	PMG-71	A		PMG-96	A	PMG-93	B																
	PMG-43	A	PMG-43	A	PMG-71	B		PMG-96	B																		
	PMG-43	B	PMG-72	A	PMG-72	A		PMG-97	A																		
			PMG-72	B	PMG-72	B		PMG-97	B																		
			PMG-73	A	PMG-73	A	PMG-98	A																			
			PMG-73	B	PMG-73	B	PMG-98	B																			
			PMG-74	A	PMG-74	A	PMG-160	A																			
			PMG-74	B	PMG-74	B	PMG-160	B																			
			PMG-75	A	PMG-75	A	PMG-161	A																			
			PMG-75	B	PMG-75	B	PMG-161	B																			
			PMG-76	A	PMG-76	A																					
			PMG-76	B	PMG-76	B																					
			PMG-165	A	PMG-165	A																					
			PMG-165	B	PMG-165	B																					
Edifício I-3 Biblioteca	PMG-102	A	18 POÇOS	Portaria P3	PMG-119	A	09 poços	Transportes	PMG-121	A	10 poços	Guarda Universitária	PMG-158	B	14 POÇOS												
	PMG-119	B			PMG-121	B			PMG-159	B																	
	PMG-119	C			PMG-122	A			PMG-125	A																	
	PMG-120	A			PMG-122	B			PMG-125	B																	
	PMG-120	B			PMG-123	A			PMG-126	A																	
	PMG-120	C			PMG-123	B			PMG-126	B																	
	PMG-163	C			PMG-124	A			PMG-127	A																	
	PMG-164	B			PMG-124	B			PMG-127	B																	
	PMG-164	C							PMG-128	A																	
					PMG-128	B	PMG-129		A																		
					PMG-129	B	PMG-130		A																		
					PMG-130	B	PMG-131		A																		
					PMG-131	A	PMG-131		B																		

Fonte: Dados de Campo, Engesolve, 2024.



LEGENDA:

- Taludes
- Poço de monitoramento de gás
- Abrigo para equipamento
- Quantidades de exaustores nos abrigos
- Cerca de divisa
- Guia e Estacionamento
- Edificações

Escala Gráfica:

0 31,5 63 94,5 126m

CLIENTE: Universidade de São Paulo - USP Leste		 SOLUÇÕES AMBIENTAIS INTEGRADAS
PROJETO: Evolução do Monitoramento de Intrusão de Gases e da Operação do Sistema de Ventilação		
ENDEREÇO: Rua Arlindo Bétio, 1.000, Ermelino Matarazzo – São Paulo/SP		
TÍTULO: Localização dos Poços de Monitoramento de Gás e Abrigos de Exaustores		
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Felipe Chufi	FIGURA Nº: 3.1.1	DATA: ABR/2025



Tabela 3.2.1 – Distribuição dos Pontos de Monitoramento de Infraestrutura nas Edificações

Relação de Pontos da Infraestrutura x Edificações														
Pontos			Pontos			Pontos			Pontos					
Edifício I-1 Parte 1	Ralos	12	Edifício I-3 Auditórios	Ralos	160	Edifício I-4	Ralos	95	Conjunto Laboratorial	Ralos	34	Bloco Inicial	Ralos	74
		17			159			97			36			75
		16			162			99			53			76
		14			165			106			69			77
		15			164			96			70			78
		18			176			104			71			79
		19			177			307			67			80
		20			174			122			66			81
		13			171			111			64			82
		25			148			117			65			83
		22	Edifício I-3 Biblioteca	Ralos	149			100			63			84
		21			150			101			62			85
		32			147			105			56			86
		30			139			91			60	Enfermaria	Ralos	124
		31			140			102			58			125
		28			141			88			55			126
		26			151			108			54			127
		24			145			107			57	CAT	Ralos	136
		27			144			94			42			137
		23			143			92			44			138
Edifício I-1 Parte 2	Ralos	01			142			90			43	P3	Ralos	187
		05			146			89			41			186
		04						87			38	Incubadora	Ralos	132
		03						123			32			133
		09						121			61			134
		08						120			37	Guarda Universitária	Ralos	135
		07						119			45			188
		06						114			46			189
Caixas de Passagem	Pontos	02						113			40			190
								112			47			191
								109			48			192
								110			49			193
											50			194



LEGENDA:

- Taludes
- Cerca de divisa
- Guia e Estacionamento
- Edificações
- Ralos
- Caixas de passagem
- Espaço com pouca ventilação
- Abrigo para equipamento
- Quantidades de exaustores nos abrigos

0 31,5 63 94,5 126m

Escala Gráfica:

CLIENTE:	Universidade de São Paulo - USP Leste	
PROJETO:	Evolução do Monitoramento de Intrusão de Gases e da Operação do Sistema de Ventilação	
ENDEREÇO:	Rua Arlindo Bétio, 1.000, Ermelino Matarazzo – São Paulo/SP	
TÍTULO:	Localização dos Pontos de Monitoramento de Gases na Infraestrutura dos Edifícios	
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	FIGURA Nº:	DATA:
Felipe Chufi	3.2.1	ABR/2025

Engesolve

SOLUÇÕES AMBIENTAIS INTEGRADAS



4. METODOLOGIA DO MONITORAMENTO DE GASES

O monitoramento de intrusão de vapores/gases do solo em ambientes fechados e espaços com pouca circulação de ar do pavimento térreo, ou seja, que tem contato direto com o solo, é realizado de forma sistemática e programada, visando afastar o risco eventual de explosividade nas edificações da USP Leste.

As leituras são realizadas em poços de monitoramento situados sob a laje (no tapete de brita – 0,30 m) e no solo (à profundidade aproximada de 0,50 m e 1,30 m), bem como em ralos e caixas de passagem distribuídos e numerados nas edificações (conforme descrito nos itens **3.1** e **3.2**).

A sistemática adotada segue abaixo especificada:

- **Poços de Monitoramento:** medições semanais com o equipamento GEM 5000 para avaliação da concentração de Metano ($\text{CH}_4\%$ vol), CO_2 (%vol), CO (ppm), H_2S (ppm), O_2 (%vol), e nível de pressão (bar), explosividade (%LEL) e presença de outros VOCs (Compostos Orgânicos Voláteis) com o equipamento BW Gas Alert Micro 5 (BW), totalizando 289 poços de monitoramento em solo/laje;
- **Infraestrutura:** medições quinzenais, com equipamento Gas Alert Micro 5 (BW), para medição do nível de explosividade (%LEL) que a possível presença de Metano e/ou outros voláteis podem conferir ao ambiente, totalizando 180 pontos de medição na infraestrutura; e
- **Exaustores:** monitoramento sistemático nos exaustores de cada sistema de ventilação dos edifícios, realizando-se medições semanais de Metano e pressão com o equipamento GEM 5000 e VOCs com o equipamento Gas Alert Micro 5 (BW), bem como leitura da pressão na célula de vácuo, totalizando 22 pontos de medição em exaustores.

O monitoramento é realizado por técnicos de campo da ENGESOLVE, treinados, capacitados, e supervisionados por Geólogo e Engenheiro Ambiental. As leituras são realizadas por meio de equipamentos calibrados e certificados da marca Industrial Scientific, modelo Gas Alert Micro 5, Modelo BW, e da marca Landtec, modelo GEM 5000. O **Anexo 1** apresenta os certificados de calibração dos equipamentos utilizados.

Os equipamentos Gas Alert Micro 5 (BW) são instrumentos portáteis utilizados em avaliações de passivos para detectar compostos voláteis e incluem até cinco sensores simultâneos. As unidades utilizadas neste projeto estão configuradas com um sensor PID 10,6eV para medição de VOC em ppm e de um sensor catalítico para medição de LEL (*Low Explosivity Level* ou Limite Inferior de Inflamabilidade – LII) em porcentagem.

O BW tem calibração com validade de até 2 anos, mas as unidades utilizadas na USP são calibradas trimestralmente visando a garantia dos dados, considerando a presença frequente de Metano (Equipamento USP Nº de Série: SK317-003329 e/ou SK317-003332).



O equipamento GEM 5000 é um equipamento portátil especificamente utilizado para monitoramento da migração de gases, como por exemplo em aterros. Ele é composto de uma célula infravermelha de comprimento de onda duplo com canal de referência para leitura de Metano (CH_4) em % volume, Dióxido Carbônico (CO_2) em % volume, de uma célula eletroquímica para medição de Sulfeto de Hidrogênio (H_2S), Monóxido de Carbono (CO) em partes por milhão (ppm), Oxigênio (O_2) em %Vol e transdutor para medição de BAL (pressão diferencial) e Nível de Pressão (mbar).

O GEM 5000 tem calibração anual, porém a unidade utilizada na USP é calibrada semestralmente para garantia da qualidade dos dados, considerando a presença frequente de Metano. Além disso, diariamente é realizada verificação com ar ambiente antes do início das medições (Equipamento USP Nº de Série: G500491).

4.1. SOBRE O BIOGÁS E O GÁS METANO

Inicialmente, o termo Biogás estava associado aos diversos nomes atribuídos a ele, como: gás dos pântanos, gás de aterro, gás de digestor e gás de fermentação, entre outros e atualmente, o termo refere-se, de forma geral, aquele gás formado a partir da degradação anaeróbia (ausência de oxigênio gasoso) da matéria orgânica, através da ação de determinadas espécies de bactérias. Durante a digestão anaeróbia, a energia química presente na composição é largamente conservada, principalmente, como Metano (Adaptado, CETESB, 2021).

Junto ao Metano (CH_4), estão presentes outros gases que fazem parte do meio ambiente natural, sendo gerados a partir da degradação bacteriana de matéria orgânica, neste caso, sedimentos advindos da dragagem do Rio Tietê e sedimentos quaternários naturalmente depositados na bacia de inundação do Rio Tietê, área sobre a qual a USP Leste foi implantada, gerando o biogás. A transformação da matéria orgânica é realizada pelo metabolismo bacteriano, tendo participação de fungos e outros microrganismos. As interações entre os diversos grupos de bactérias participantes da decomposição anaeróbia têm múltiplas variáveis, que vão desde a composição dos resíduos e presença de substratos, até variáveis como temperatura, teor de água e pH do meio. Em um ambiente anaeróbio é gerada uma mistura de gases, como:

- Metano (CH_4): 50% - 70% do volume de gás produzido;
- Dióxido de Carbono (gás Carbônico, CO_2): 25% - 50% do volume de gás produzido;
- E traços de outros gases como:
 - Hidrogênio (H_2): 0% - 1% do volume;
 - Gás Sulfídrico ou Sulfeto de Hidrogênio (H_2S): 0% - 3% do volume;
 - Oxigênio (O_2): 0% - 2% do volume;
 - Amoníaco (NH_3): 0% - 1% do volume; e
 - Nitrogênio (N_2): 0% - 7% do volume (CETESB, 2021).


Ao longo dos mais de 11 anos de monitoramento da área de estudo, foi possível observar a presença de outros gases, como Sulfeto de Hidrogênio (H_2S) e Monóxido de Carbono (CO). Consta-se esta possibilidade devido a produção de biogás, na qual as bactérias produzem estes compostos simultaneamente. Contudo, durante a digestão anaeróbica, eles são produzidos em diferentes proporções, onde o Metano é sempre maior do que H_2S e CO .

O gás Metano (CAS nº 74-82-8) é um gás inflamável comumente encontrado em material orgânico devido à presença de bactérias decompositoras. Ele apresenta faixa de inflamabilidade entre 5% e 15% em volume, isto é, concentrações do gás/vapor que em contato com o ar forma uma mistura inflamável (mistura ideal) na presença de uma fonte de ignição. As concentrações abaixo ou acima dessa faixa não propagam chama, uma vez que a quantidade de gás/vapor é muito pequena (mistura pobre) ou muito elevada (mistura rica) para queimar ou explodir, conforme descrito no manual de produtos químicos (CETESB, 2016).

Para que ocorra a inflamabilidade seria necessária a concentração do gás, em sua mistura ideal com oxigênio em um ambiente confinado, e um meio de ignição. Observou-se em uma vistoria que, em geral, o perfil construtivo das edificações apresenta ventilação fixa, o que dificulta o acúmulo do gás nesses ambientes.

A **Figura 4.1.1.** ilustra a faixa de inflamabilidade de gás Metano, bem como a faixa de medição do equipamento utilizado e o esquema de combustão.

Figura 4.1.1. – Faixa de Inflamabilidade do Gás Metano (CH_4) e sua Combustão

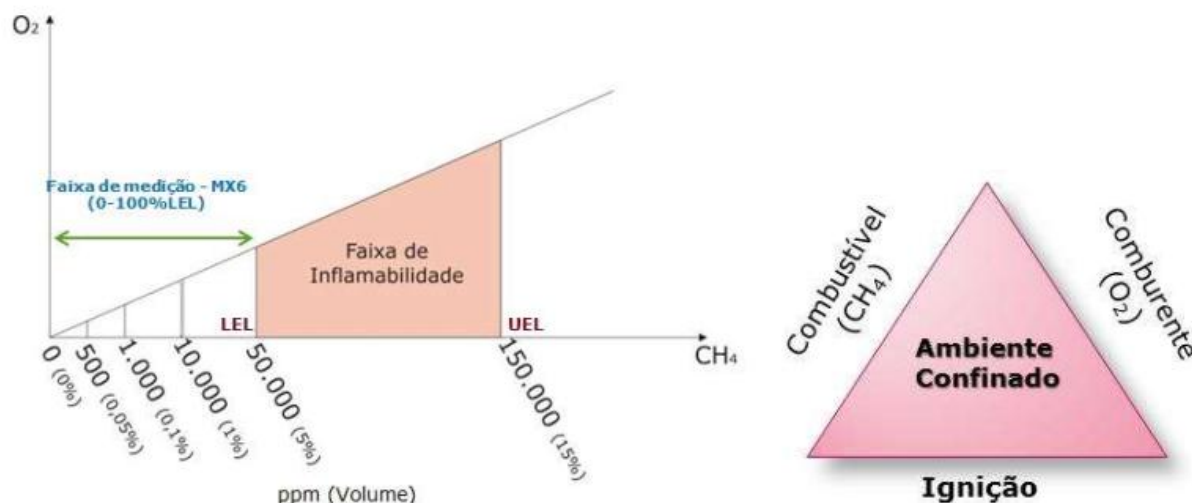

Fonte: Relatório Weber, 2022.

O Sulfeto de Hidrogênio é um gás tóxico, denso e inflamável, com odor de “ovo podre”, já o Monóxido de Carbono é um gás tóxico e inflamável, porém inodoro. Ambos podem ser prejudiciais à saúde quando inalados em ambientes confinados, a depender das concentrações e do tempo de exposição: para o H_2S é necessário concentrações acima de 8,0 ppm por 48 horas e para o CO acima de 39,0 ppm por 48 horas (Manual de Produtos Químicos, CETESB 2016).



Para existir o risco de inflamabilidade, o H_2S e o CO precisam das mesmas características que o Metano, combinando o espaço confinado, fonte de ignição e concentrações dentro da faixa de 4,3 a 45,0%vol ou 43.000 a 450.000 ppm de H_2S ; e 12,0 a 75,0%vol ou 120.000 a 750.000 ppm de CO (CETESB, 2016).

4.2. PLANO DE AÇÃO

Um plano de ação foi estabelecido para garantia da segurança durante a realização dos trabalhos de monitoramento e ventilação dos gases. Sua última atualização foi realizada em setembro/2022. O plano completo pode ser visualizado no **Anexo 2**, e a seguir são apresentadas as principais ações relacionadas às concentrações de Metano obtidas:

Sistema Inoperante: Verificar possíveis falhas, solucioná-las e retomar a operação, além de monitorar os poços de monitoramento sob influência do sistema até o reinício da operação;

Ponto de Alerta (PMG-B com concentração de Metano acima de 5%vol): Acompanhar o monitoramento dos poços de profundidade rasa (PMG-A) para verificar se há movimentação do gás no tapete de brita;

Ponto Crítico (PMG-A com concentração de Metano entre 5% e 15%vol): Ajustar o sistema de ventilação, direcionando o fluxo para o ponto em questão e monitorar a redução da concentração, além de monitorar a infraestrutura para garantir a não intrusão dos vapores do edifício afetado, até que as concentrações no ponto estejam inferiores a 5%;

Ponto Extremamente Crítico (PMG-A com concentração de Metano acima de 15%vol): Ajustar o sistema de ventilação, direcionando o fluxo para o ponto em questão, aumentar a pressão e monitorar a redução da concentração, além de monitorar a infraestrutura para garantir a não intrusão dos vapores do edifício afetado, até que as concentrações no ponto estejam inferiores a 5%;

Pontos de Infraestrutura em ambientes internos com concentração acima de 20%LEL (ou 1%volCH₄): Ventilar o ambiente, remover as pessoas do local, eliminar possíveis fontes de ignição, identificar os pontos de entrada de gás e selar;

Entrada dos Exaustores com concentração acima de 20%LEL (ou 1%volCH₄): Aumentar a frequência do compressor, a fim de elevar o vácuo e o fluxo, aumentando assim a diluição do Metano na corrente de ar.



5. RESUMO E TENDÊNCIA EM 11 ANOS DE OPERAÇÃO/MONITORAMENTO (ABRIL DE 2014-À MARÇO DE 2025)

O monitoramento de gases no solo e sob a laje das edificações na USP Leste teve início em março de 2014 e se mantém ativo até o presente momento, com previsão de continuidade para os próximos anos.

Avaliando os dados obtidos ao longo destes 11 anos de monitoramento (até o mês de março/2025), foi possível estabelecer uma linha de tendência da presença de Metano no solo, além de indicar a efetividade do sistema de ventilação em promover o afastamento das concentrações de Metano sob a laje dos edifícios.

As medições realizadas no período entre julho e setembro, indicaram que as concentrações de Metano acima de 1%Vol. estão localizadas frequentemente em pontos específicos (em até 17 dos 289 poços monitorados), não abrangendo toda a extensão dos edifícios. Também se observa que, em sua maioria, essas concentrações estão localizadas apenas nas porções profundas (cerca de 1,00 m, com valores variáveis entre 1,10 a 33,0%VolCH₄). No ano de 2014, apenas em dois pontos foram verificadas concentrações de Metano acima de 5%VolCH₄, na profundidade imediatamente abaixo das edificações (subslabs 0,3m).

Os sistemas de ventilação foram ligados da forma como existiam em março de 2014. Neste mês, havia 08 poços com concentração de Metano na porção rasa. Em abril/2014, este número caiu para 04. Em maio/2014, havia apenas 01 e, em junho/2014, ao final da instalação/readequação dos sistemas de ventilação, não havia nenhum poço com concentração de Metano na porção rasa.

Em março/2014, os poços A e B encontravam-se conectados em uma mesma mangueira. No início do mês de abril/2014, foram inseridas válvulas de individualização dos poços. Nos meses e anos seguintes, as concentrações na porção rasa se mantiveram nulas. Quando eventualmente aparecem, o sistema de ventilação é redirecionado, rapidamente extinguindo a concentração existente.

Ao longo de março/2014 a dezembro/2021, as medições de VOC, H₂S e CO nos poços de monitoramento não detectaram concentrações significativas (abaixo de 100 ppm) em nenhum dos pontos monitorados. Tratando-se da pressão, observou-se pressões tanto negativas quanto positivas em alguns poços de monitoramento, indicando a movimentação promovida pelo sistema, além da movimentação natural do nível d'água da região.

Além das medições dos poços de monitoramento, também foram realizadas medições em ralos, caixas de passagem e espaços com pouca circulação de ar, onde não foi detectada nenhuma indicação de inflamabilidade, demonstrando que, mesmo com eventuais pressões positivas, não ocorreu intrusão de gases nos ambientes estudados. Em alguns pontos (principalmente na caixa 55 da Enfermaria) foram verificadas concentrações eventuais de VOC, ligadas ao uso de produtos de limpeza.



As linhas de tendência obtidas para o gás Metano nos 11 anos de monitoramento demonstraram que, em alguns poços, as concentrações variam de acordo com o período do ano, enquanto em outros, as concentrações mantêm-se sempre presentes.

De forma geral, nos períodos de julho a novembro, as condições climáticas regionais reportam períodos de seca, corroborando o rebaixamento do nível d'água subterrânea local. Assim, nota-se que o Metano gerado na área encontra mais poros vazios na zona não saturada do solo, conseguindo permear com mais facilidade por este meio. Diferente do que ocorre no período de chuvas, onde o nível d'água se eleva e o Metano encontra-se dissolvido junto à água nos poros da zona saturada.

Ainda durante os 11 anos de monitoramento e operação dos sistemas, diversas ações de manutenção preventiva e corretiva foram realizadas. Entre elas, a adequação da pressão de sucção imposta na célula de vácuo, a qual inicialmente era variável em cada edificação, chegando até -40mmHg, e foram gradativamente ajustadas entre setembro e novembro de 2015, até -2,0 mmHg, se aproximando da pressão prevista em projeto.

Periodicamente é realizada a manutenção preventiva nos sistemas e, quando necessário, também ocorrem ações corretivas, além da manutenção das tubulações, desenvolvida preferencialmente no último trimestre.

No último trimestre de 2016, dois pontos de captação de ar do Edifício Módulo Inicial foram reposicionados para fora da área da lanchonete. No último trimestre de 2017 foi realizado um levantamento para manutenção nas tubulações de entrada e saída dos sistemas em todos os prédios, onde fez-se necessário o ajuste nas tubulações do Bloco I, II e III do Conjunto Básico e em uma tubulação no prédio da biblioteca.

No último trimestre de 2018 foram realizados testes de estanqueidade nas tubulações de saída dos sistemas, por meio de fechamento de válvulas e aumento da pressão, com verificação dos pontos de vazamento. Os testes indicaram que as tubulações permaneciam intactas, com exceção de uma parte da tubulação do módulo inicial (B2), que foi substituída. No último trimestre de 2019 foi realizada a manutenção da tubulação quebrada na saída do sistema do Edifício I-1 parte 2. Em 2020, foram realizadas duas manutenções preventivas nos meses de fevereiro e novembro, não havendo necessidade de ações corretivas.

Observou-se também que ao longo dos 11 anos de monitoramento, em poços com histórico de concentrações de Metano, houve a presença de outros gases, sendo eles: H₂S (Sulfeto de Hidrogênio), e CO (Monóxido de Carbono). O H₂S é um gás tóxico, denso e inflamável, com odor de "ovo podre". O CO também é tóxico e inflamável, porém leve e inodoro. Ambos podem ser prejudiciais à saúde quando inalados em ambientes confinados, a depender das concentrações e do tempo de exposição: para o H₂S é necessário concentrações acima de 8,0 ppm por 48 horas e para o CO, acima de 39,0 ppm por 48 horas (Manual de Produtos Químicos, CETESB, 2016).

O H₂S e o CO estão presentes junto ao Metano (CH₄), pois ambos fazem parte do meio ambiente natural, sendo gerados a partir da degradação bacteriana da matéria orgânica, neste caso,



advinda da dragagem do Rio Tietê. A transformação da matéria orgânica é realizada pelo metabolismo bacteriano, tendo participação de fungos e outros microorganismos. As interações entre os diversos grupos de bactérias participantes da decomposição anaeróbia têm múltiplas variáveis, que vão desde a composição dos resíduos e presença de substratos até variáveis externas como temperatura, teor de água e pH do meio. Em um ambiente anaeróbio, é gerada uma mistura de gases como Metano (CH_4), Gás Carbônico (CO_2), e em menor quantidade, Hidrogênio (H_2), Nitrogênio (N_2), Sulfeto de Hidrogênio (H_2S), Monóxido de Carbono (CO), Amônia (NH_3) e oxigênio (O_2) (Adaptado, CETESB, 2021).

Para existir risco de inflamabilidade, o CH_4 , o H_2S e o CO precisam das mesmas características: espaço confinado, fonte de ignição e concentrações dentro da faixa de 5,0 a 15,0% de VolCH_4 ; 4,3 a 45% ou 43.000 a 450.000 ppm de H_2S ; e 12,0 a 75,0% ou 120.000 a 750.000 ppm de CO (Manual de Produtos Químicos, CETESB, 2016).

Os gráficos gerados a partir do monitoramento histórico da área indicam que a produção de Metano é maior do que a de H_2S e CO , sendo eles independentes uns dos outros e sem quaisquer correlações, pois as bactérias decompõem a matéria orgânica gerando estes compostos simultaneamente, porém em diferentes proporções. Nota-se que todas as concentrações de H_2S e CO encontradas ao longo dos 11 anos de monitoramento, estiveram abaixo do limite de inflamabilidade, apresentando um pico máximo de 12,0 ppm e 7,0 ppm respectivamente, apenas no mês de abril de 2014, sendo que posteriormente a isso, ambos permaneceram em uma média abaixo de 3,5 ppm.

No ano de 2021 e 2022, o monitoramento ocorreu de forma efetiva, de acordo com a sistemática programada nos poços de monitoramento e nos pontos da infraestrutura.


Nos primeiros trimestres de 2023, as concentrações variaram de forma constante. No 3º trimestre de 2023 foi observada concentração atípica no ponto 66A (0,50%Vol CH_4), no dia 09 de agosto de 2023, sendo então colocado em prática o Plano de ação, cujo consiste na medição diária do ponto, entretanto, as medições demonstraram que a concentração foi *outline*, visto que em nenhuma das demais medições apresentaram quaisquer concentrações, mantendo-se nulas.

No 4º trimestre de 2023, foi observada concentração atípica nos pontos PMG-53A (pico de 36,10%Vol CH_4 em 09 de outubro de 2023) e no PMG-139A (pico de 7,90%Vol CH_4 em 09 de outubro de 2023), sendo então colocado em prática o Plano de ação. Foi realizada a medição diária do ponto. As medições demonstraram que a concentração em ambos os pontos até meados de outubro, voltando a se apresentar nulas após esse período.

No 1º, 2º, 3º e 4º trimestre de 2024, as concentrações não apresentaram concentrações atípicas. A seguir, descrevem-se as observações em cada edifício, ao longo dos 11 anos de monitoramento, para as concentrações de Metano, H_2S e CO .

EDIFÍCIO I-1:

- Análise de Metano no período de Abril de 2014 a Março de 2025
- Poços existentes: 17 pares (09 na parte 1 e 08 na Parte 2)
- Poços que apresentaram concentração >1%: (Nenhum)
- Deteção (>1%) sob a laje: Nenhuma

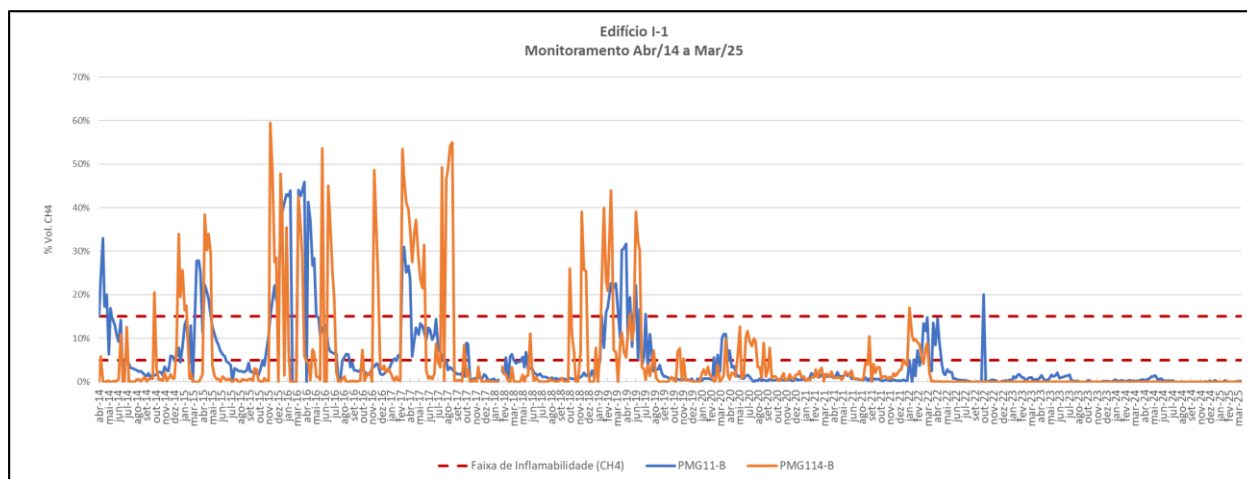

De abril de 2014 a dezembro de 2022 não foram detectadas concentrações de Metano sob a laje do edifício. Percebe-se que, com o início da operação do sistema de ventilação (Jul/2014), houve uma diminuição imediata das concentrações de Metano na porção profunda, porém estas mantiveram-se presentes e variando durante os anos de monitoramento nos poços PMG-11B e PMG 114B. É possível notar que no mês de fevereiro/2018 houve uma redução bem perceptível das concentrações nos dois poços em questão, porém voltaram a se elevar em 2019.

No ano de 2020, nota-se que houve uma diminuição das concentrações, que permaneceram dentro da faixa de inflamabilidade no início do ano, atingindo no máximo 13,0%VolCH₄. Em março, o PMG-11B apresentou concentrações abaixo de 5%, e o mesmo aconteceu com o PMG-114B em outubro do mesmo ano, onde ambos chegaram próximos a concentrações nulas. Este cenário de concentrações abaixo de 5% se manteve durante o ano de 2021, com exceção do mês de agosto e dezembro, onde as concentrações estiveram dentro da faixa de inflamabilidade, atingindo valor máximo de 14,50%VolCH₄ no PMG-114B.

No ano de 2022, ambos os poços seguem variando, ora com concentrações abaixo de 5%, ora com concentrações dentro da faixa de inflamabilidade. No primeiro trimestre de 2023, as concentrações do PMG-114B se encontravam abaixo de 5% apresentando valores entre nulo e 0,1%. No PMG-11B, as concentrações variaram de 0,06% a 1,80%, sendo o valor de pico obtido em 7 de fevereiro, no entanto os valores se mantiveram abaixo de 5%.



No segundo trimestre, apenas o PMG-11B apresentou concentração acima de 1,0%VolCH₄, variando entre 1,20% a 2,10%, sendo o valor de pico obtido em 20 de junho, no entanto os valores se mantiveram abaixo de 5%. No terceiro trimestre, o PMG-11B apresentou concentração acima de 1%VolCH₄, no entanto abaixo de 5%. No 4º trimestre de 2023 e 1º



trimestre de 2024, nenhum dos poços apresentou concentração acima de 1%VolCH₄. No 2º trimestre de 2024 o PM-11B voltou a apresentar concentrações acima de 1%VolCH₄ no mês de maio, no entanto essas concentrações estiveram abaixo de 5%.

No 3º trimestre de 2024, o PMG-11B apresentou concentrações abaixo do 1%VolCH₄ em todos os meses, no entanto, constatou-se concentração acima de 1%VolCH₄ no PMG-22B, que ainda não havia apresentado concentrações, todavia, as concentrações não se repetiram, sendo identificada somente em 26 de setembro de 2024. No 4º trimestre de 2024, todos os poços estiveram abaixo de 1%VolCH₄. No 1º trimestre de 2025, todos os poços estiveram abaixo de 1%VolCH₄.

➤ Análise de H₂S e CO no período de Abril de 2014 a Março de 2025

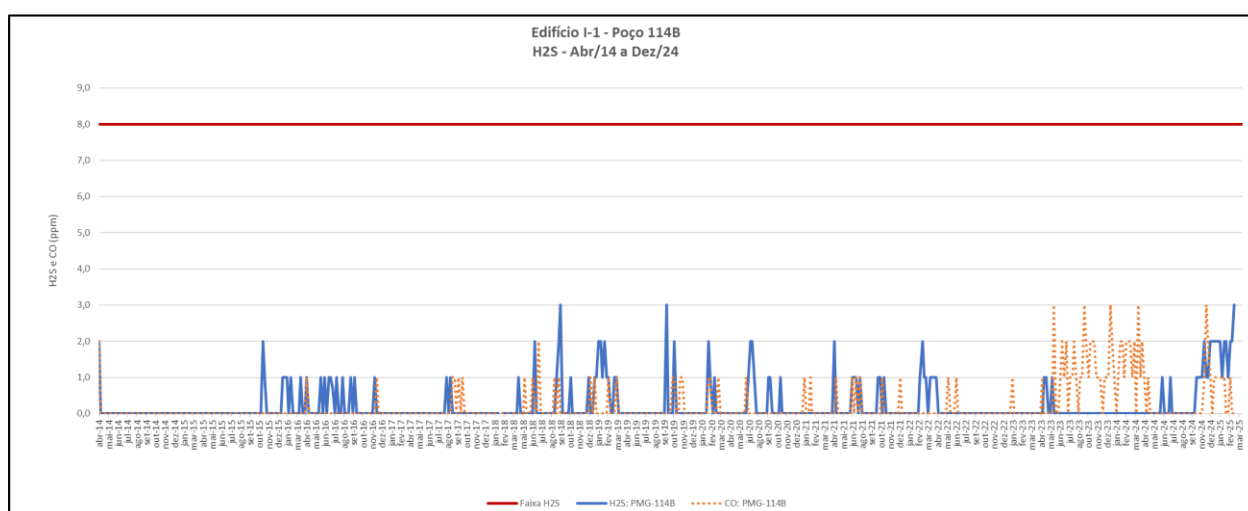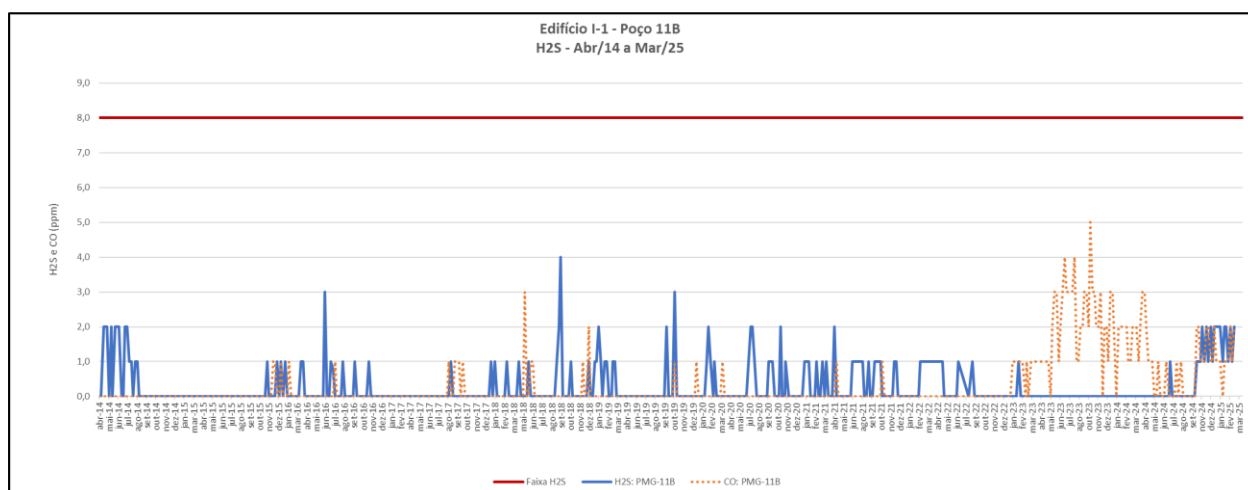


Os gráficos de H₂S e CO demonstram que houve uma variação entre 1,0 e 4,0 ppm para H₂S e entre 10 e 5,0 ppm para CO durante os 11 anos de monitoramento, estando ambos abaixo do índice de inflamabilidade. Essas concentrações indicam que há a produção destes compostos devido à degradação da matéria orgânica, porém a proporção é muito menor quando comparado ao CH₄.



EDIFÍCIO I-3 BIBLIOTECA E I-5 AUDITÓRIO:

- Análise de Metano no período de Abril de 2014 a Março de 2025
Poços existentes: 21 pares (14 na Biblioteca e 07 no Auditório)
Poços que apresentaram concentração >1%: Nenhuma
Detecção (>1%) sob a laje: Nenhuma

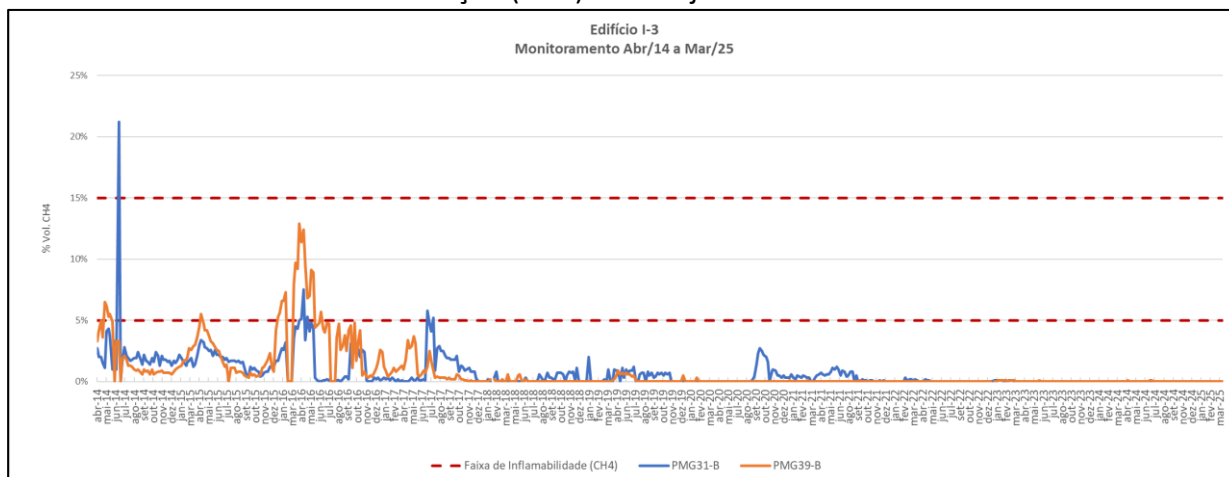

Durante os 11 anos de monitoramento não foram detectadas concentrações de Metano sob a laje do edifício. Nota-se que com o início da operação do sistema de ventilação em julho/2014, houve uma diminuição imediata das concentrações de Metano da porção profunda. Contudo, apesar da diminuição, elas se mantiveram presentes e variando durante todos estes anos nos poços PMG-31B e PMG-39B.

No ano de 2016 houve um aumento significativo das concentrações. Porém, em 2017 observa-se que as concentrações começaram a diminuir, permanecendo abaixo dos 5%VolCH₄, sendo que no ano de 2022 foram quase nulas.

No primeiro trimestre de 2023, as concentrações de ambos os poços PMG-31B e PMG-39B se mantiveram entre nulo e 0,1%. Nos segundos, terceiro e quarto trimestre de 2023, nenhum poço apresentou concentrações acima de 1%VolCH₄.

No ano de 2024, nenhum poço apresentou concentrações acima de 1%VolCH₄. Da mesma forma, no 1º trimestre de 2025, nenhum poço apresentou concentrações acima de 1%VolCH₄.


EDIFÍCIO I-4:

➤ Análise de Metano no período de Abril de 2014 a Março de 2025

Poços existentes: 12 pares

Poços que apresentaram concentração >1%: Nenhuma

Deteção (>1%) sob a laje: Nenhuma

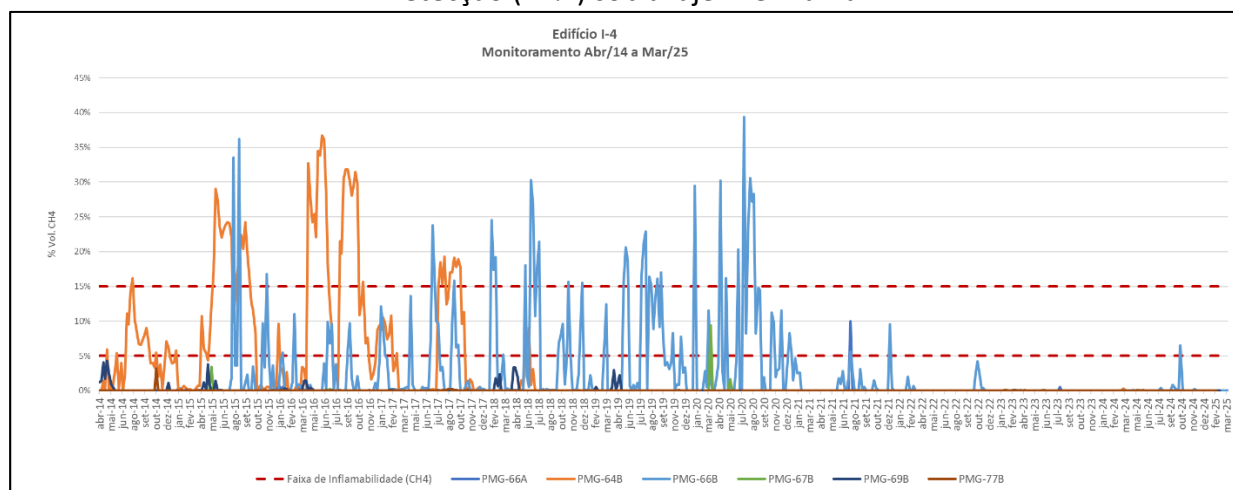

Em Janeiro de 2016, foi detectada concentração de Metano sob a laje do edifício, no poço de monitoramento PMG-66A, sob a concentração de 1,1%. Na porção profunda observa-se a persistência de concentrações de Metano no PMG-66B, mesmo após o início da operação do sistema de ventilação (julho/2014).

Em outros três poços também foram detectadas concentrações de Metano no solo, porém sem continuidade ou com valores fora da faixa de inflamabilidade, sendo eles: PMG-64B (de abril/14 até julho/18), PMG-67B (1x em maio/15), PMG-69B (eventualmente, sempre próximo ao mês de abril de cada ano e abaixo de 5%).

O PMG-77B havia apresentado concentração de Metano abaixo de 5%, somente uma vez, em outubro de 2014. Porém, em março de 2020, voltou a demonstrar concentrações do referido gás, desta vez com concentração de 10,0% VolCH₄, tendo logo depois se estabilizado com concentrações nulas.

No ano de 2021, o PMG-66A atingiu concentração de 10,0% VolCH₄, pontualmente em julho. Nos demais meses as concentrações do poço citado apresentaram-se abaixo de 5%, e nos demais poços obteve-se concentrações nulas. Em 2022, todos os poços apresentaram concentrações nulas.

No primeiro trimestre de 2023 as concentrações dos poços se encontravam nulas. No entanto, foram identificadas concentrações de 1% nos poços PMG-146B, PMG-147B, PMG-148B, PMG-149B, PMG-150B e PM-151B. O poço PMG-150B apresentou medição anômala, acima de 5% em apenas um dia.




No segundo trimestre de 2023, apenas o poço PMG-150B apresentou concentrações acima de 1%VolCH₄, sendo observado de forma anômala, concentração acima de 5%VolCH₄ durante um dia (31 de maio de 2023). No terceiro trimestre de 2023, apenas o poço 66B apresentou concentrações acima de 1%VolCH₄, e em apenas uma medição acima de 5%VolCH₄ dentro da faixa de inflamabilidade. Apesar de ter apresentado concentração de forma atípica, o PM 66A apresentou concentração de 0,50%VolCH₄, cuja concentração foi monitorada, e foi considerada *outline* por não apresentar concentração nas demais medições. Os demais pontos se mantiveram com concentrações nulas ou abaixo de 1%VolCH₄.

No 4^a trimestre de 2023 e 1^o trimestre de 2024, todos os pontos se mantiveram com concentrações nulas ou abaixo de 1%VolCH₄. No 2^o trimestre de 2024, foram identificadas concentrações acima de 1%VolCH₄ nas porções profundas do PMG-66B e PMG-147B no mês de maio, no entanto, abaixo da faixa de inflamabilidade (5%VolCH₄). No 3^o trimestre de 2024, foi identificada concentração acima de 1%VolCH₄ nas porções profundas do PMG-66B, no entanto, abaixo da faixa de inflamabilidade. No 4^o trimestre de 2024, não foram identificadas concentrações acima de 1%VolCH₄.

No 1^o trimestre de 2025, foi identificada concentração acima de 1%VolCH₄ no poço PMG-150B, no entanto, abaixo da faixa de inflamabilidade.

➤ Análise de H₂S e CO no período de Abril de 2014 a Março de 2025

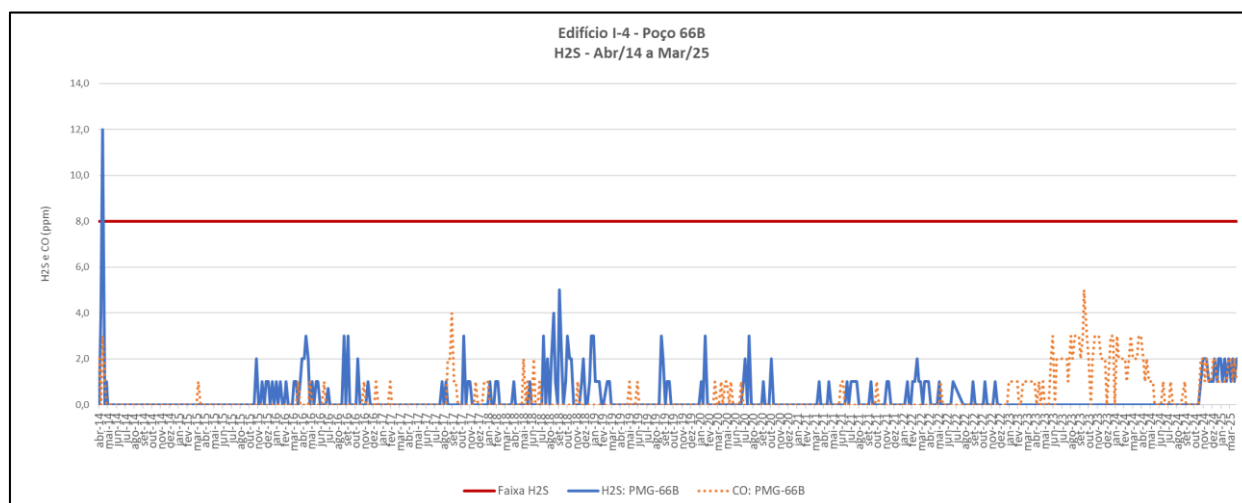

Os gráficos de H₂S e CO demonstraram uma variação entre 1,0 e 5,0 ppm para o H₂S e entre 1,0 e 5,0 para o CO no PMG-66B, ambos abaixo do índice de inflamabilidade. No PMG-150B, anteriormente os valores se apresentavam nulos, a partir de janeiro de 2023 os valores variaram de 0 a 4,0 ppm. Essas concentrações indicam que há a produção destes compostos devido a degradação da matéria orgânica, porém a proporção é muito menor quando comparado ao CH₄.






CONJUNTO LABORATORIAL:

➤ Análise de Metano no período de Abril de 2014 a Março de 2025

Poços existentes: 17 pares

Poços que apresentaram concentração >1%: 12 A1; (PMG-51B, PMG-53B, PMG-54B, PMG-55B, PMG-139B, PMG-140B)

Deteção (>1%) sob a laje: Nenhuma

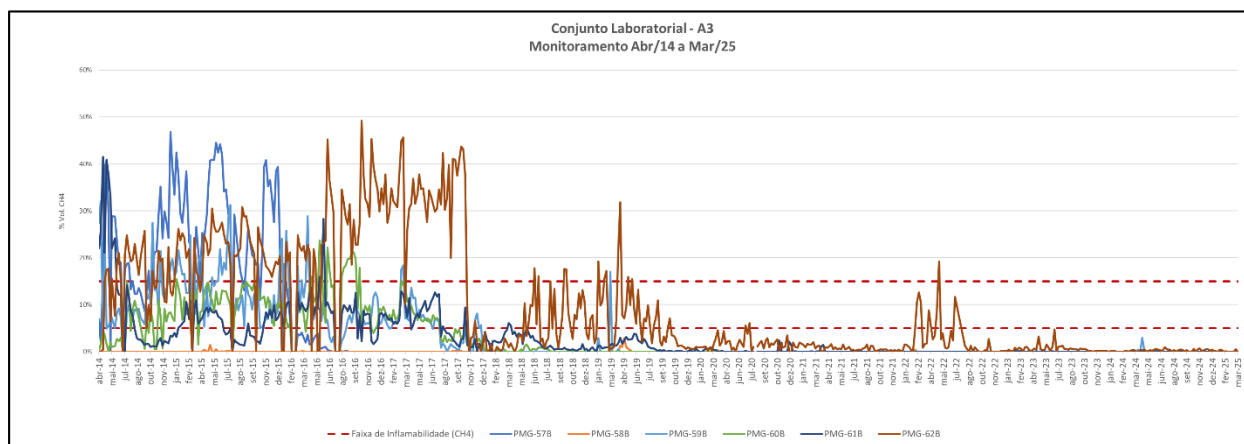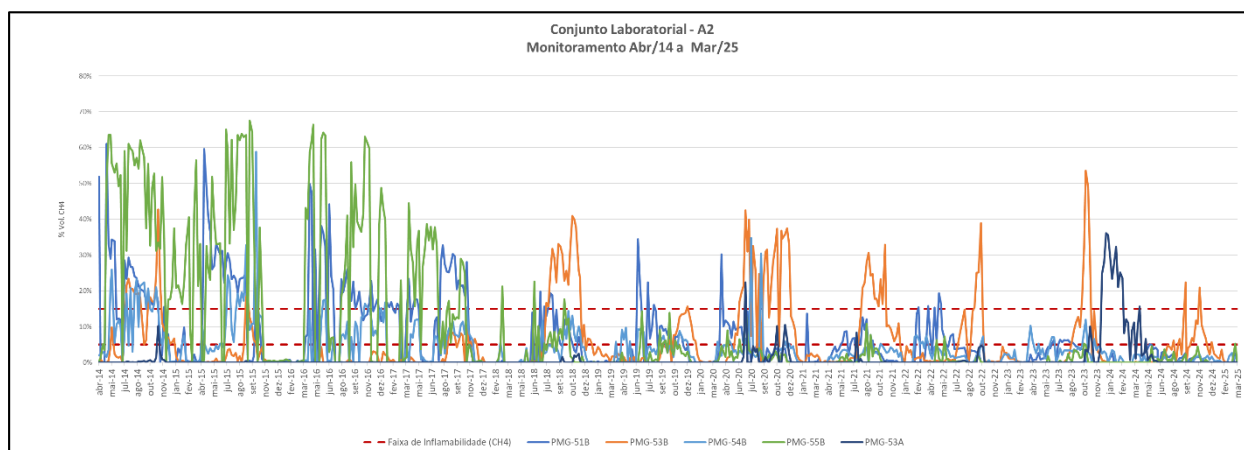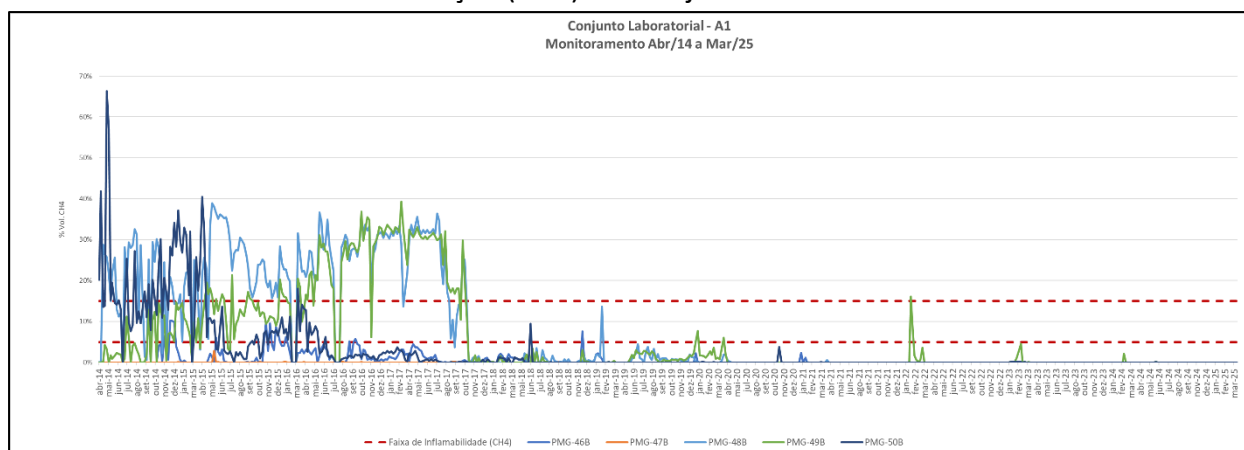



De forma geral, nota-se que os poços dos conjuntos laboratoriais A1 e A3 apresentaram concentrações acima da faixa de inflamabilidade de 2014 a 2017, passando a ficar abaixo de 5% desde então, com exceção do PMG-62B, que em 2019 apresentou concentrações de 5,0 a 30,0% VolCH₄.

No ano de 2021, observa-se que o conjunto laboratorial A2 apresentou um aumento em suas concentrações, passando a demonstrar valores acima da faixa de inflamabilidade nos poços PMG-51B, PMG-53A/B, PMG-54B e PMG-55B de até 32,90 % VolCH₄. Os poços PMG-46B, PMG-52B, PMG-61B e PMG-62B, durante todo referido ano demonstraram concentrações abaixo de 5%, chegando próximo a concentrações nulas.

Em 2022 nota-se um aumento nas concentrações dos três conjuntos laboratoriais (A1, A2 e A3), apresentando concentrações acima da faixa de inflamabilidade nos poços PMG-49B, PMG-51B, PMG-53-B, PMG-54B, PMG-55B e PMG-62B. No último trimestre os valores se mantiveram abaixo dos níveis de inflamabilidade.

Detectou-se concentração de Metano sob a laje do edifício Conjunto Laboratorial A2, no poço PMG-53A, em concentrações variáveis de 1,0 a 39,6% VolCH₄, em períodos pontuais. Este mesmo poço também apresentou concentrações nulas ou abaixo de 1% em outros períodos. Na porção profunda (PMG-53B) nota-se a persistência das concentrações, mesmo após o início da operação do sistema de ventilação (julho/2014), em valores variados, muitas vezes acima da faixa de inflamabilidade. No último trimestre de 2022, os valores se apresentaram abaixo do limite da faixa de inflamabilidade.

Nos meses de novembro de 2014, outubro de 2018 e junho a dezembro de 2021, foram detectadas concentrações de Metano acima de 1% no PMG-53A. Durante tal período os pontos de infraestrutura foram medidos com maior frequência e não foram detectadas concentrações de Metano na infraestrutura, indicando que a via de intrusão de vapores não se completou.

Observando os gráficos específicos das duas profundidades do conjunto monitorado (PMG-53 A e B) durante a linha do tempo de 2014 a 2021, percebe-se que tal situação é comum a este poço nesta época do ano, tendendo à diminuição das concentrações nos meses seguintes.

Também é possível notar que quando as concentrações na porção profunda (PMG-53B) superam valores a cerca de 25% VolCH₄ (junho a novembro/2014, julho a novembro/2018, junho a dezembro/2021), são detectadas concentrações na porção rasa (PMG-53A) iguais ou superiores a 1% VolCH₄. Nos mesmos meses citados, nos anos de 2015, 2016, 2017 e 2019, houve aumento nas concentrações da porção profunda, porém em valores menores que 20% VolCH₄, e então na porção rasa verificou-se pequena influência destas concentrações, demonstrando valores sempre abaixo de 1% VolCH₄.

Nos anos de 2020 a 2021, o sistema de ventilação que opera para a área do A2 foi ajustado e teve sua pressão aumentada, variando de -2,0 a 20,0 mmHg, conforme o aumento das concentrações no poço PMG-53B, diminuindo assim a interferência na porção rasa (PMG-53A). Nos dois primeiros trimestres de 2022, as concentrações de Metano no PMG-53B se estiveram



acima do limite da faixa de inflamabilidade de 10% de VolCH₄ e as concentrações no PMG-53A abaixo da faixa de inflamabilidade de 5%.

No primeiro trimestre de 2023, nota-se estabilidade dos valores de CH₄, se mantendo abaixo do nível de inflamabilidade de 5% para a porção rasa (PMG-53A), na porção mais profunda verificaram-se níveis acima do 1% VolCH₄, no entanto ainda abaixo da faixa de inflamabilidade.

No segundo trimestre de 2023, o PMG-53 apresentou concentrações abaixo de 1%VolCH₄ e portanto, abaixo da faixa de inflamabilidade tanto da faixa rasa quanto a profunda.

No terceiro trimestre de 2023, o PMG-53 apresentou concentrações dentro da faixa de inflamabilidade no mês de agosto e setembro acima da faixa de inflamabilidade, no mês de julho, no entanto, os valores se encontravam abaixo de 5%VolCH₄. No fim do trimestre, as concentrações ultrapassaram a faixa de inflamabilidade (>15%VolCH₄) e acionado o plano de ação, como se tratava de medição no último dia do trimestre, as ações serão tomadas no próximo trimestre.

Detectou-se concentração de Metano sob a laje do edifício Conjunto Laboratorial A2, na porção profunda do poço PMG-54, em concentrações variáveis de 1,0 a 58,8% VolCH₄, em períodos pontuais. Este mesmo poço também apresentou concentrações nulas ou abaixo de 1% em outros períodos. Nota-se a persistência das concentrações, mesmo após o início da operação do sistema de ventilação (julho/2014), em valores variados, muitas vezes acima da faixa de inflamabilidade. Os valores identificados na porção profunda (PMG-54B) estiveram acima da faixa de inflamabilidade até o ano de 2020, quando os níveis de mantiveram dentro e abaixo da mesma.

No último trimestre de 2022, os valores se apresentaram abaixo do limite da faixa de inflamabilidade. O primeiro semestre de 2023, apresentaram concentrações acima de 1% VolCH₄ e acima de 5% VolCH₄, ou seja, acima da faixa de inflamabilidade por alguns períodos. A porção rasa do PMG-54 não apresentou concentrações acima de 1% VolCH₄ durante todo o período de avaliação.

No segundo trimestre de 2023, o PMG-54 apresentou concentrações acima de 5%VolCH₄ (dentro da faixa de inflamabilidade), sendo obtido o valor de pico de concentração de 7,10%VolCH₄ em 14 de junho de 2023. A porção rasa não apresentou concentrações. No terceiro trimestre, o PMG-54A/B apresentou concentrações abaixo da concentração de 5%VolCH₄.

Durante o segundo trimestre de 2023, o PMG-139 não apresentou concentrações acima de 1%VolCH₄. Os PMG-51B, PMG-62B, PMG-140 B e PMG-141B apesar de apresentarem concentrações acima de 1%Vol CH₄, os valores se mantiveram abaixo de 5%VolCH₄ e, portanto, abaixo da faixa de Inflamabilidade.



No terceiro trimestre de 2023, o PMG-139B apresentou concentrações dentro e acima da faixa de inflamabilidade, bem como o PMG-140B. O PMG-141B apresentou apenas uma medição dentro a faixa de inflamabilidade.

No quarto trimestre de 2023, os poços PMG-51, PMG-54, PMG-55, PMG-140 e PMG-141 apresentaram concentrações acima de 5%VolCH₄ (dentro da faixa de inflamabilidade) nas porções profundas, com concentração de pico de 70%VolCH₄ em 18 de outubro de 2023 no PMG-139B. Os poços PMG-53 e PMG-139 apresentaram concentrações nas porções rasas e profundas (horizontes A e B), estas indicaram a necessidade de empregar o plano de ação, que consiste na medição desses poços em variados períodos do dia durante os 20 dias, e em meados de outubro as concentrações apresentaram-se nulas.

No 1º trimestre de 2024, os poços PMG-49, PMG-51 e PMG-54 apresentaram concentrações acima de 1%VolCH₄, porém abaixo da faixa de inflamabilidade nas porções mais profundas, no entanto, apenas o PMG-54 apresentou concentrações acima de 1%VolCH₄ no mês de março/24.

No 2º trimestre de 2024, foram identificadas concentrações acima de 1%VolCH₄ dos poços PMG-51B, PMG-54B, PMG-55B, PMG-59B, PMG-139B, PMG-140B e PMG-141B. Dentre as concentrações identificadas, os poços PMG-51B e PMG-141B apresentaram concentrações dentro da faixa de inflamabilidade (entre 5%VolCH₄ e 15%VolCH₄) no mês de maio.




No 3º trimestre de 2024, foram identificadas concentrações acima de 1%VolCH₄ nos poços PMG-51B, PMG-53B, PMG-54B, PMG-55B, PMG-139B, PMG-140B e PMG-PMG-141B. Dentre os poços que apresentara concentrações, o PMG-53, PMG-139B e PMG-140B apresentaram concentrações dentro da faixa de inflamabilidade (entre 5%VolCH₄ e 15%VolCH₄) em todo o semestre.

No 4º trimestre, foram identificadas concentrações acima de 1%VolCH₄ nos poços PMG-51B, PMG-53B, PMG-54B, PMG-55B, PMG-139B, PMG-140B e PMG-PMG-141B, sendo que os poços PM-53B, PMG-139B e PMG-140B apresentaram concentrações dentro da faixa de inflamabilidade no trimestre atual.

No 1º trimestre de 2025, foram identificadas concentrações acima de 1%VolCH₄ nos poços PMG-51B, PMG-53B, PMG-54B, PMG-55B, PMG-139B, e PMG-140B, sendo que o poço, PMG-139B apresenta concentrações dentro da faixa de inflamabilidade no trimestre atual.

➤ Análise de H₂S e CO no período de Abril de 2014 a Março de 2025

Os gráficos de H₂S e CO demonstram que houve uma variação para H₂S e CO, ambos abaixo do índice de inflamabilidade. Essas concentrações indicam que há a produção destes compostos devido a degradação da matéria orgânica, porém a proporção é muito menor quando comparado ao CH₄.

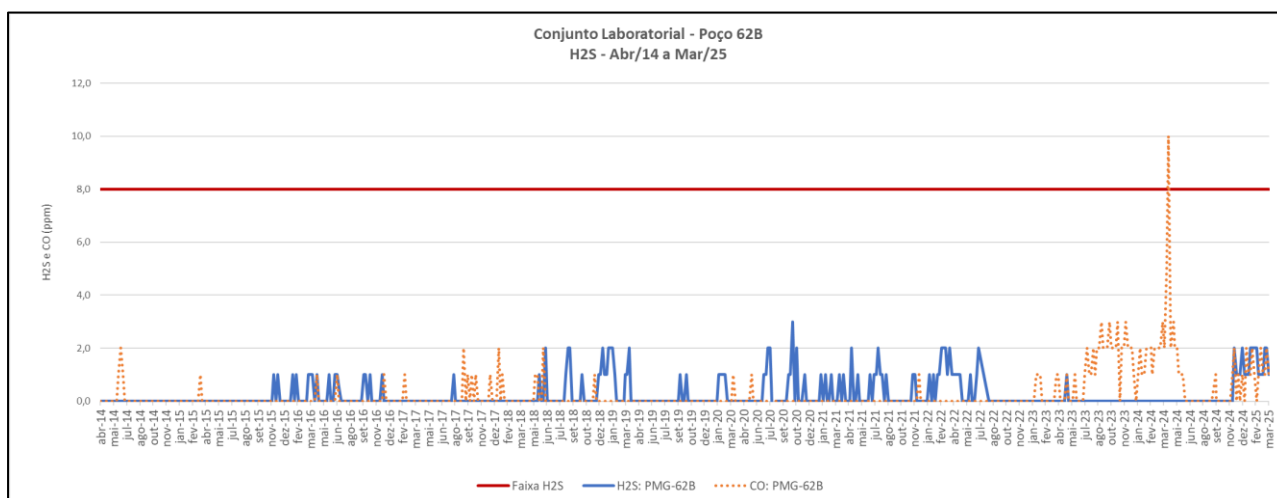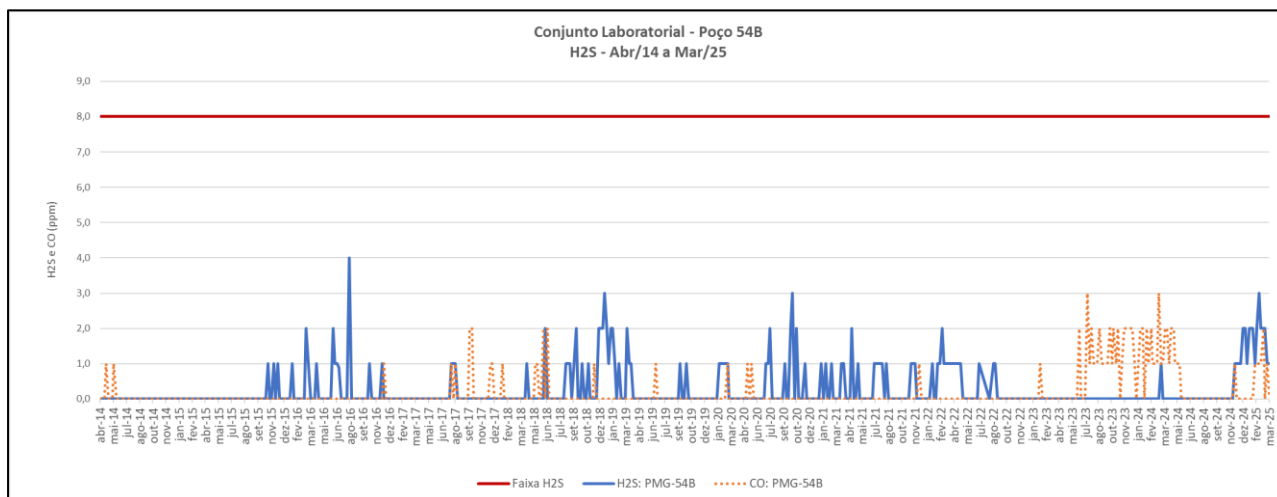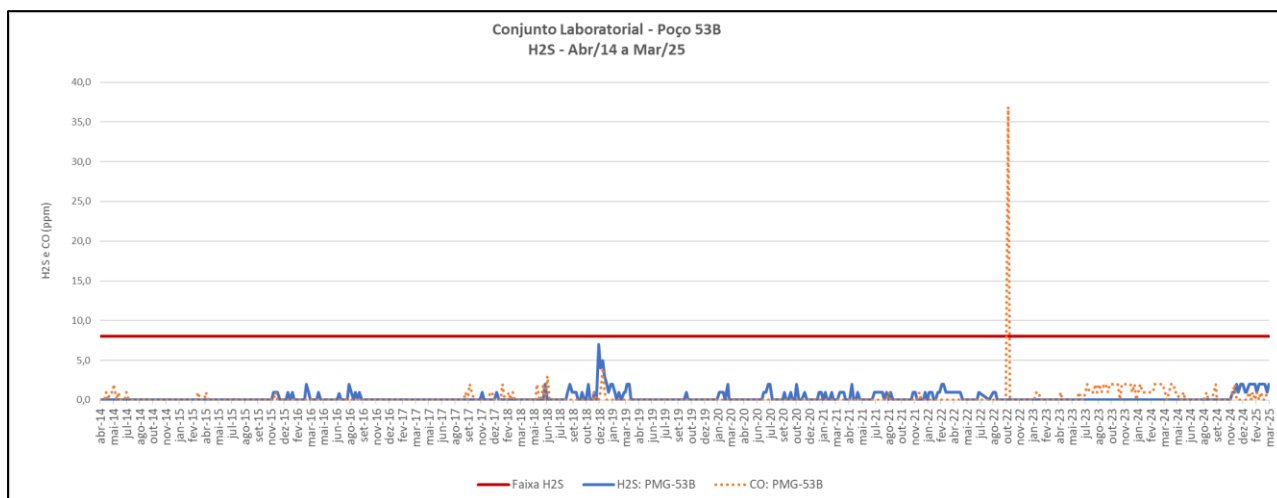


BLOCO INICIAL:

➤ Análise de Metano no período de Abril de 2014 a março de 2025

Poços existentes: 14 pares

Poços que apresentaram concentração >1%: 1 (Nenhum)

Deteção (>1%) sob a laje: Nenhuma

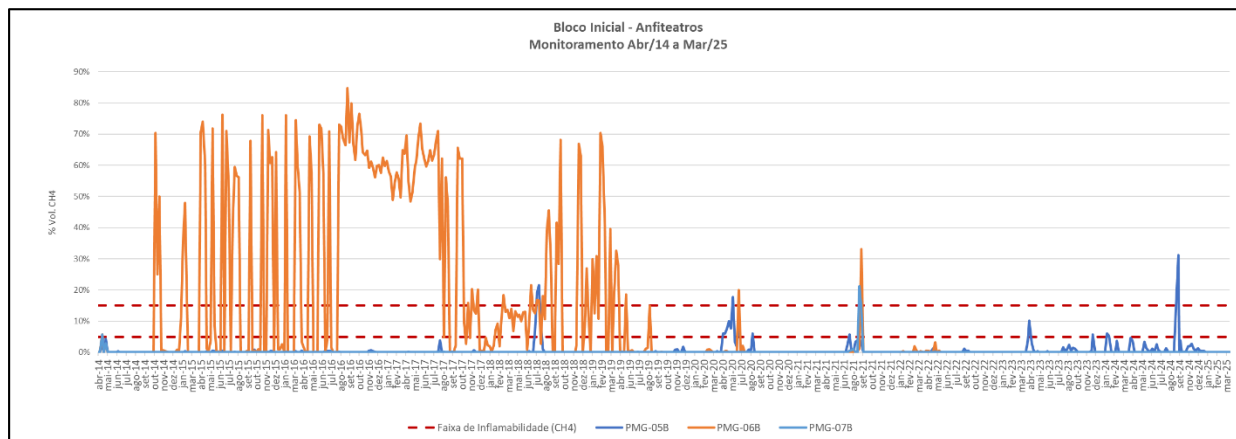


No Bloco dos Anfiteatros, o PMG-06B apresentou persistência das concentrações de Metano durante os anos de monitoramento, alcançando valores de 15 até 80% VolCH₄. Os poços PMG-05B e PMG-07B demonstraram concentrações eventuais de Metano no solo, porém sem persistência. Em 2022 somente o PMG-05B e o PMG-06B apresentaram concentrações de Metano, sendo estas inferiores a 5%, no último semestre se apresentando nulos.

No primeiro trimestre de 2023, as concentrações de todos os poços se mantiveram abaixo do nível de inflamabilidade, e não apresentaram valores acima de 1% VolCH₄. No segundo trimestre de 2023, somente o PMG-05B e apresentou concentração dentro da faixa de inflamabilidade em apenas uma das medições (17 de abril de 2023, considerado anômalo) as demais medições se mantiveram abaixo de 5%VolCH₄. No terceiro trimestre, o PMG-05 apresentou concentrações abaixo de 5%VolCH₄. No quarto trimestre de 2023, o PMG-05 apresentou concentrações dentro da faixa de inflamabilidade, no entanto considerado *outline*, já que a concentração não se repetiu.


No 1º trimestre de 2024, o PMG-05 apresentou concentrações dentro da faixa de inflamabilidade (maior que 5%VolCH₄ e menor que 15%VolCH₄) para as poções mais profundas. No entanto, foram identificados em apenas dois dias, e acima de 1%VolCH₄ em outro dia, após esses, não foram identificados acima dessa concentração. No 2º e 3º trimestre de 2024, o PMG-05 apresentou concentrações acima de 1%VolCH₄, no entanto, abaixo da faixa de inflamabilidade, além de identificado o PMG-156B, não identificado anteriormente.

No 4º trimestre de 2024, foram identificadas concentrações acima de 1%VolCH₄ nos poços PMG-05B e PMG-08B, no entanto, abaixo da faixa de inflamabilidade. No 1º trimestre de 2025, não foram identificadas concentrações acima de 1%VolCH₄.

No Bloco B1, os PMG-01B e PMG-02B apresentaram persistência das concentrações de Metano durante os anos monitorados, alcançando valores maiores de 15% até o ano de 2015 e, a partir de 2016, demonstrando valores menores, abaixo de 5%. O PMG-01B em 2021 apresentou concentrações dentro da faixa de inflamabilidade, atingindo valores de até 8,9% VolCH₄.

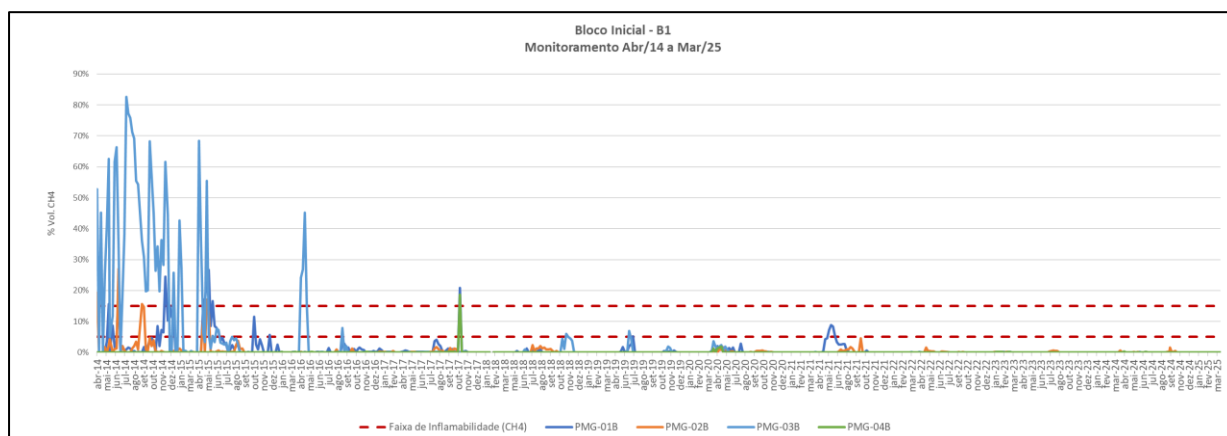


O PMG-03B demonstra comportamento semelhante, alcançando valores de até 80% em 2014 e decaindo para 5% em novembro/2018. Em 2021, o PMG-03B apresentou somente concentrações esporádicas abaixo de 1%. No PMG-04B detectou-se concentração de Metano no solo, porém sem continuidade (uma vez em outubro/2017). Em 2022 somente o PMG-02B apresentou concentrações, sendo estas abaixo de 5%, no último trimestre apresentaram concentrações nulas. Em 2023 e 1º trimestre de 2024, as concentrações no Bloco B1 se encontravam nulas. No 3º trimestre de 2024, o PMG-02 voltou a apresentar concentrações, no entanto, abaixo de 1%VolCH₄. No 4º trimestre de 2024, não foram identificadas concentrações acima de 1%VolCH₄ dos poços. No 1º trimestre de 2025, não foram identificadas concentrações acima de 1%VolCH₄ dos poços.

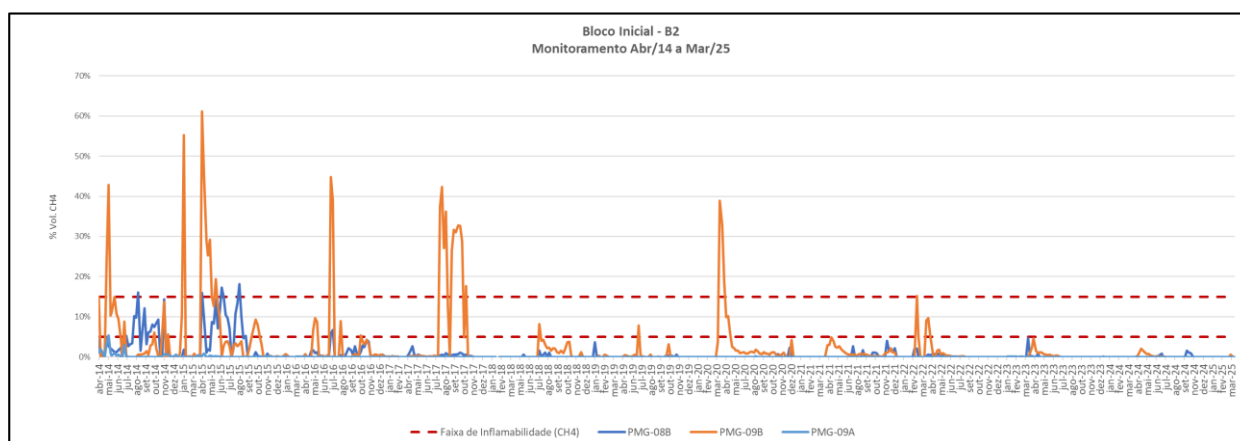


No Bloco B2, foram identificadas concentrações de metano acima do nível de inflamabilidade (15% VolCH₄) no período de abril de 2014 a março de 2022. Em maio de 2022, as concentrações se mantiveram abaixo da faixa de inflamabilidade em todos os poços de monitoramento. No primeiro trimestre de 2023, as concentrações do Bloco B2 se apresentaram nulas, exceto pelo

ponto PMG-08B que apresentou concentração acima de 1% VolCH₄ em apenas uma medição realizada no mês de março. No segundo trimestre, somente o PMG-09B apresentou concentração acima de 1%VolCH₄, no entanto abaixo da faixa de inflamabilidade. No 4º trimestre de 2023 e 1º trimestre de 2024 não foram apresentadas concentrações acima de 1% VolCH₄. No 2º trimestre de 2024, o PMG-09B voltou a apresentar a concentrações acima de 1%VolCH₄. No 4º trimestre de 2024, não foi identificada concentração acima de 1%VolCH₄. No 1º trimestre de 2025, não foi identificada concentração acima de 1%VolCH₄.

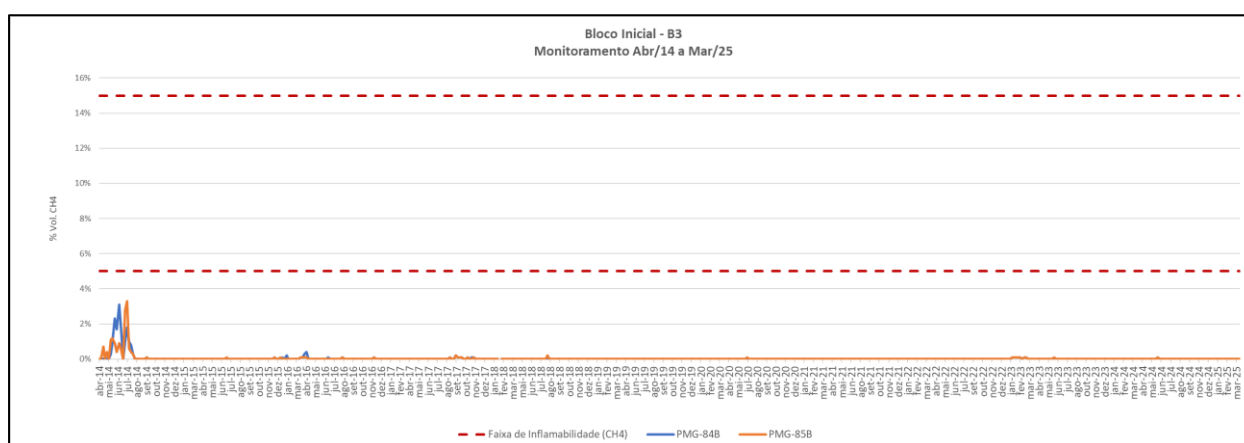

No Bloco B3, os PMG-84B e PMG-85B apresentaram concentrações de Metano no período de abril a outubro de 2014. Posteriormente à isso, as concentrações se mantiveram nulas ou abaixo de 1%. No 2º trimestre de 2024, o PMG-87B apresentou concentrações acima de 1%VolCH₄ somente no mês de maio, essas concentrações não atingiram a faixa de inflamabilidade. No 3º e 4º trimestre de 2024, o Bloco B3 apresentou concentrações nulas ou abaixo de 1%VolCH₄. No 1º trimestre de 2025, não foi identificada concentração acima de 1%VolCH₄.

➤ Análise de H₂S e CO no período de Abril de 2014 a Março de 2025

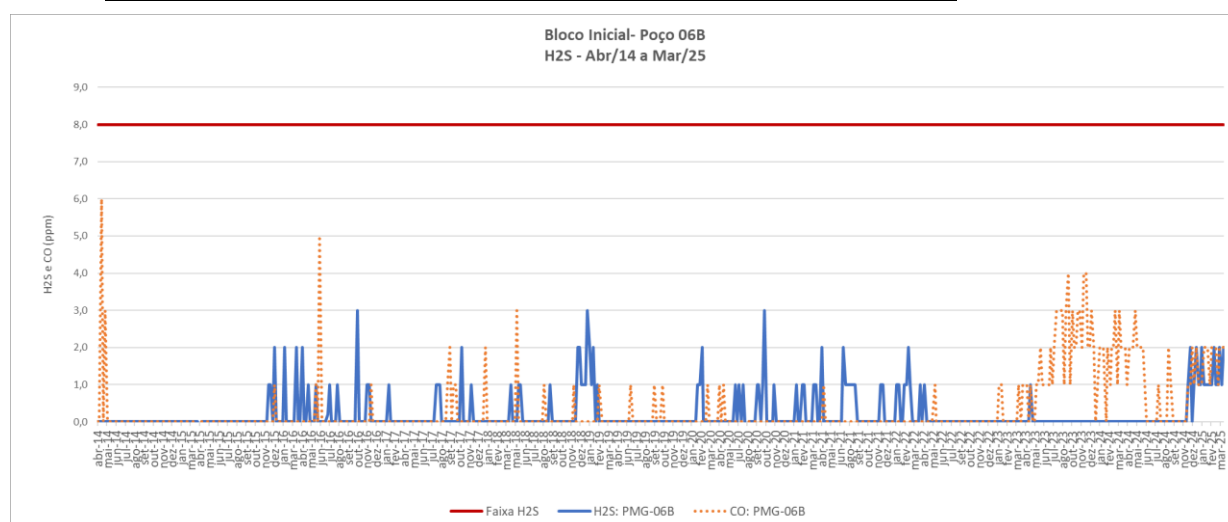



O gráfico de H₂S e CO demonstra que houve uma variação entre 1,0 e 3,0 ppm para H₂S e 1,0 e 6,0 para CO, ambos abaixo do índice de inflamabilidade. Essas concentrações indicam que há a produção destes compostos devido a degradação da matéria orgânica, porém a proporção é muito menor quando comparado ao CH₄. No último semestre de 2022, as concentrações se apresentaram nulas. No primeiro trimestre de 2023, as concentrações de CO apresentaram variações de concentração de 0 a 1,0 ppm. No terceiro trimestre de 2023, as concentrações de CO apresentaram pico de 4,0 ppm, enquanto as medições de H₂S estiveram nulas. No quarto trimestre de 2023, as concentrações de H₂S estiveram nulas, e as concentrações de CO apresentaram pico de 5,0 ppm.

O 1º, 2º e 3º trimestre de 2024, as concentrações de H₂S estiveram nulas, e as concentrações de CO apresentaram concentrações de pico 3,0 ppm.




ENFERMARIA:

➤ Análise de Metano no período de Abril de 2014 a Março de 2025

Poços existentes: 07 pares

Poços que apresentaram concentração >1%: 02 (PMG-74B)

Deteção (>1%) sob a laje: Nenhuma

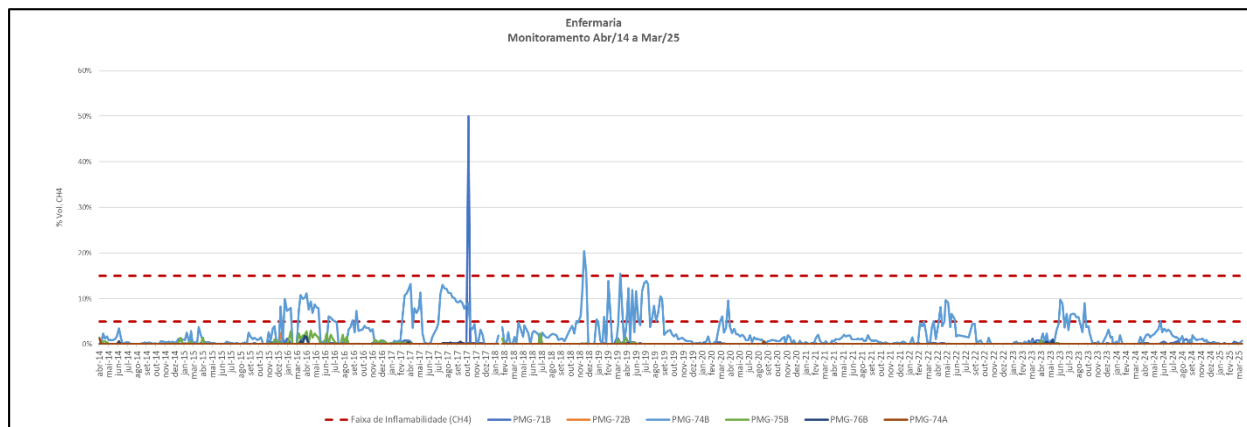

Durante os 11 anos de monitoramento foi detectada somente uma vez a concentração de Metano sob a laje do edifício, no poço PMG-74A, com concentração de 1,4% em abril de 2014. Nos poços da porção profunda observa-se a persistência das concentrações, principalmente no PMG-74B, mesmo após o início da operação do sistema de ventilação (julho/2014), prevalecendo até o monitoramento atual (2023).

Em outros quatro poços também foram detectadas concentrações de Metano no solo, porém sem continuidade ou com valores abaixo da faixa de inflamabilidade, sendo eles: PMG-71B (de 1,1 a 1,6% entre janeiro e agosto/16 e 50% 1 vez em outubro/17); PMG-72B (2,5% em janeiro/16); PMG-75B (valores eventuais entre 1,0 e 3,0 %) e PMG-76B (cerca de 1% entre mar e abril/16). Em 2022, os valores permaneceram nulos ou abaixo de 1%, exceto o PMG-74B que apresentou valores nulos apenas em dezembro de 2022.

No primeiro trimestre de 2023, os valores permaneceram nulos ou abaixo de 1%, exceto pelo PMG-71B, que apresentou valores acima de 1% VolCH₄ em uma medição, no entanto abaixo da faixa de inflamabilidade de 5% VolCH₄ no mês de março de 2023.

No segundo trimestre de 2023, o PMG-74B apresentou concentrações acima de 5%VolCH₄, sendo a concentração mais alta de 9,80%VolCH₄. O PMG-76B apresentou concentração acima de 1%VolCH₄ durante apenas uma das medições, considerado anômalo.

No terceiro trimestre de 2023, o PMG-74B e PMG-165B apresentaram concentrações acima de 5%VolCH₄, dentro da faixa de inflamabilidade. No quarto trimestre, somente o PMG-74B apresentou concentrações acima de 1%, porém abaixo da faixa de inflamabilidade (5%VolCH₄).

O 1º trimestre de 2024, o PMG-74B apresentou concentrações acima de 1%VolCH₄, no entanto, abaixo da faixa de inflamabilidade. No 2º trimestre de 2024, o PMG-74B e o PMG-165B



apresentaram concentrações acima de 1%VolCH₄, sendo apresentadas concentrações dentro da faixa de inflamabilidade no mês de maio.


No 3º trimestre de 2024, foram identificadas concentrações acima de 1%VolCH₄ no PMG-71B, PMG-74 e PMG-165B, sendo que apenas o PMG-165B foi identificado dentro da faixa de inflamabilidade.

No 4º trimestre de 2024, foram identificadas concentrações acima de 1%VolCH₄ no PMG-74B e PMG-165B, sendo ambos identificados fora da faixa de inflamabilidade. No 1º trimestre de 2025, foram identificadas concentrações acima de 1%VolCH₄ no PMG-74B, sendo identificado fora da faixa de inflamabilidade.



CAT-1 E INCUBADORA (CAT-2):

- **Análise de Metano no período de Abril de 2014 a Março de 2025**
Poços existentes: 13 pares (07 no CAT-1 e 06 no CAT-2)
Poços que apresentaram concentração >1%: Nenhuma
Detecção (>1%) sob a laje: Nenhuma

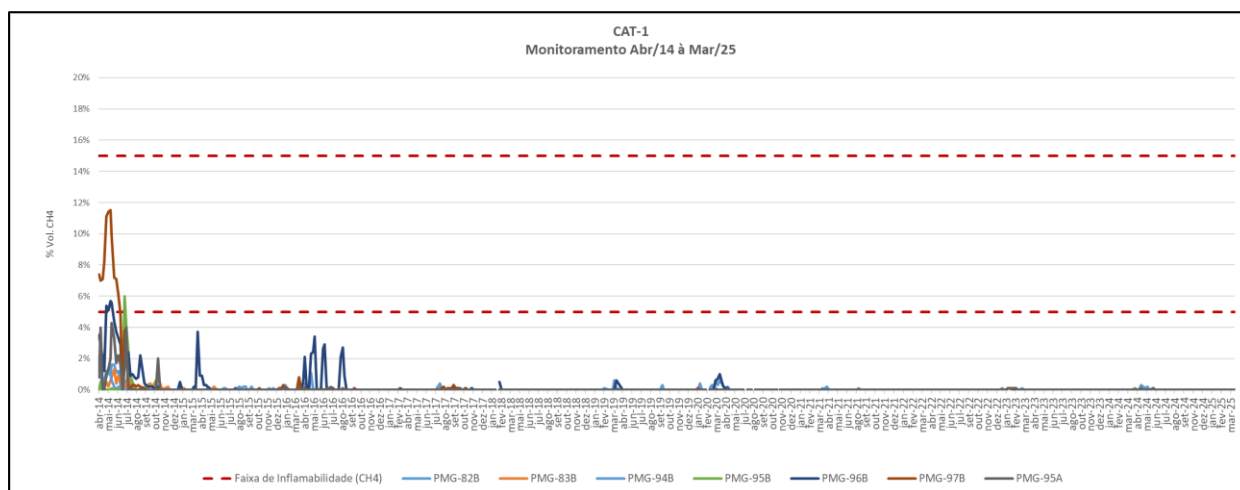

Ao longo de 11 anos de monitoramento foi detectada concentração de Metano sob a laje do edifício Enfermaria apenas no PMG-95A, com concentrações variáveis entre 1,0 a 4,0% VoCH₄, que perduraram de abril a novembro de 2014. Posteriormente, as leituras neste ponto permaneceram nulas ou abaixo de 1%.

Nos poços da porção profunda nota-se a redução das concentrações em todos os poços, após o início da operação do sistema de ventilação em julho/2014, sendo que após isso estas se mantiveram abaixo de 5% de CH₄ ou nulas.

No primeiro trimestre de 2023, as concentrações em todos os poços se apresentaram nulas ou abaixo de 1% VolCH₄.

No segundo, terceiro e quarto trimestre de 2023, as concentrações em todos os poços se mantiveram nulas ou abaixo de 1% VolCH₄. O ano de 2024, as concentrações estiveram abaixo de 1%VolCH₄ ou nulas.

No 1º trimestre de 2025, as concentrações estiveram abaixo de 1%VolCH₄ ou nulas.




GINÁSIO:

➤ Análise de Metano no período de Abril de 2014 a Março de 2025

Poços existentes: 3 pares + 08 poços

Poços que apresentaram concentração >1%: (PMG-162B)

Deteção (>1%) sob a laje: Nenhuma

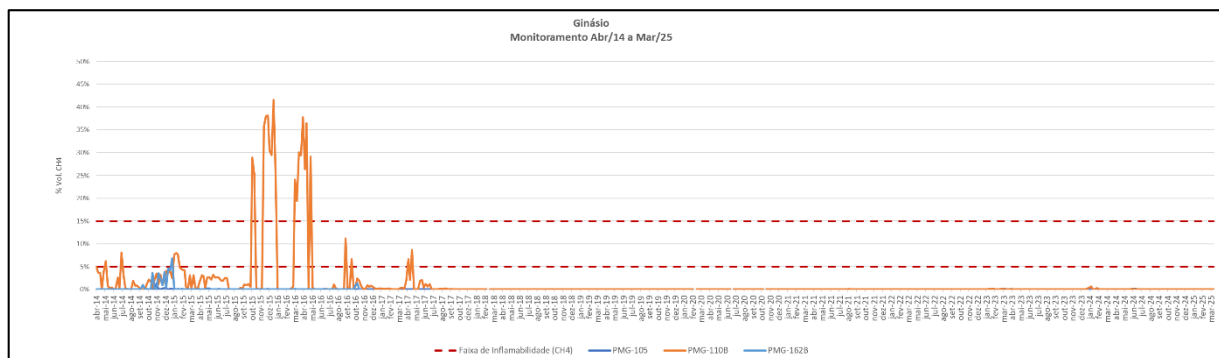

Ao longo dos anos de monitoramento não foram detectadas concentrações de Metano sob a laje do edifício. Percebe-se que com o início da operação do sistema de ventilação (setembro/15) houve um aumento inicial das concentrações no PMG-110B, mas que a partir de julho/2017 os valores das concentrações foram reduzidos para abaixo de 1% ou nulos, permanecendo dessa forma até então.

O PMG-162B, porção rasa do poço de monitoramento apresentou concentrações de nulas a inferior a 1% VolCH₄ até janeiro de 2023. Após esse período as concentrações variam acima de 1% até o valor nulo, no entanto abaixo do nível de inflamabilidade de 5% VolCH₄.

No segundo trimestre de 2023, o PMG-162 apresentou concentração acima de 1%VolCH₄ durante o mês de abril de 2023, e acima de 5%VolCH₄ em maio de 2023, durante o mês de junho de 2023, os valores voltaram a se apresentar nulos ou abaixo de 1%.

No terceiro e quarto trimestre de 2023, os valores de todos os poços apresentaram valores nulos. No ano de 2024, os valores se apresentaram nulos ou abaixo de 1%.

No 1º trimestre de 2025, os valores se apresentaram nulos ou abaixo de 1%.



GUARDA UNIVERSITÁRIA:

➤ **Análise de Metano no período de Abril de 2014 a Março de 2025**

Poços existentes: 3 pares

Poços que apresentaram concentração >1%: Nenhum

Detecção (>1%) sob a laje: Nenhuma

O sistema de ventilação foi iniciado em julho de 2014 e os poços de monitoramento da guarda universitária foram instalados em julho de 2015. Nenhum par apresentou concentrações significativas de Metano (>1%VolCH₄) durante todo o período de monitoramento.

O sistema de ventilação no edifício da guarda universitária foi desligado e o monitoramento foi interrompido em maio/2019 devido à reforma do prédio. Em junho de 2020 a obra foi finalizada e constatou-se que os poços instalados na área foram tamponados, portanto, foi realizada a reinstalação destes pontos. O monitoramento foi retomado e as concentrações se mantiveram nulas.

Em 2021 foi possível observar pontualmente no mês de outubro, concentrações de até 1,30% de Metano no PMG-126B. Contudo, nos demais poços foram verificados valores abaixo de 1% ou nulos.

Em 2022 e 2023, todos os poços se mantiveram nulos. No ano de 2024, os poços estiveram nulos ou abaixo de 1%.

No 1º trimestre de 2025, os valores se apresentaram nulos ou abaixo de 1%.


PORTARIA P3:

➤ Análise de Metano no período de Abril de 2014 a Março de 2025

Poços existentes: 2 Trios

Poços que apresentaram concentração >1%: (Nenhuma)

Deteção (>1%) sob a laje: Nenhuma

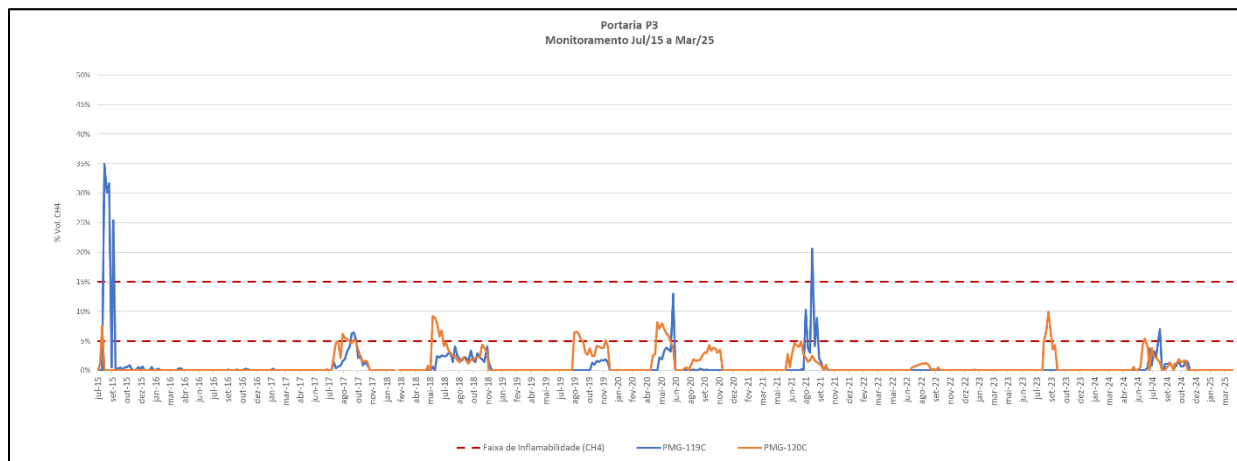

Na Portaria P3, foi detectada uma segunda laje sob o piso. Sendo assim, os poços de monitoramento neste edifício foram instalados em três profundidades: A (sob a primeira laje ~0,30m); B (sob a segunda laje, no tapete de brita ~1,00m); e C (no solo ~1,30m). Neste edifício o sistema de ventilação foi iniciado em junho/2014 e os poços de monitoramento instalados em julho/2015.

Ao longo do monitoramento, entre ago/2015 e dez/2020, não foram detectadas concentrações de Metano sob as lajes do edifício (0,30 a 0,50m). Nota-se que os meses seguintes à instalação dos poços de monitoramento (agosto e setembro/2015) foram detectadas as concentrações mais elevadas nos poços profundos e, posteriormente estas concentrações mantiveram-se nulas ou abaixo de 1%VolCH₄.

Nos anos de 2020 e 2021, os poços PMG-119C e PMG-120C apresentaram concentrações de até 20,60%Vol CH₄. É possível observar que o aumento das concentrações sempre acontece no segundo semestre do ano.

Em 2022, as concentrações de Metano no PMG-119C se mantiveram nulas e a do PMG-120C esteve inferior a 5% VolCH₄, apresentando valor nulo ao fim do trimestre. Em 2023, as concentrações de metano se mantiveram nulas ou em valor inferior a 1% VolCH₄ em ambos os poços de monitoramento de gás.

No segundo trimestre de 2023, as concentrações se mantiveram nulos ou em valor inferior a 1%VolCH₄. No terceiro trimestre, o poço PMG-120C apresentaram concentrações dentro da faixa de inflamabilidade, atingindo o valor de até 9,90%VolCH₄.



No 4º trimestre de 2022, e 1º trimestre de 2024, todas as concentrações se mantiveram nulas ou abaixo de 1%VolCH₄. No 2º trimestre de 2024, o PMG-120C apresentou concentrações acima de 1%VolCH₄, no entanto abaixo da faixa de inflamabilidade.

No 3º trimestre de 2024, o PMG-119C e PMG-120C foram identificados acima de 1%VolCH₄ nos 3 meses, no entanto, o PMG-120C esteve dentro da faixa de inflamabilidade em julho e o PMG-119C em agosto.

No 4º trimestre de 2024, o PMG-119C e PMG-120C foram identificados acima de 1%VolCH₄ somente em outubro e novembro de 2024, fora da faixa de inflamabilidade.

No 1º trimestre de 2025, os valores se apresentaram nulos ou abaixo de 1%.




TRANSPORTES:

➤ Análise de Metano no período de Abril de 2014 a Março de 2025

Poços existentes: 4 Pares

Poços que apresentaram concentração >1%: Nenhuma

Deteccção (>1%) sob a laje: Nenhuma

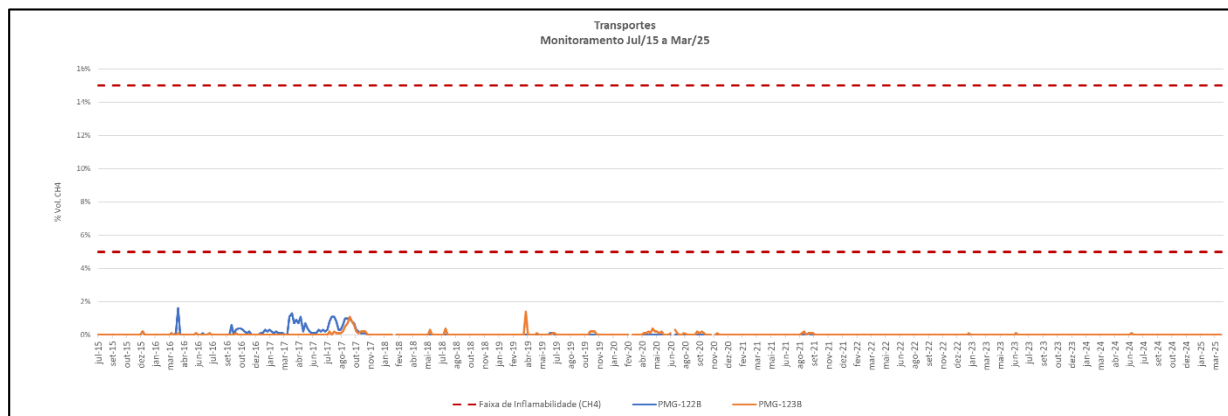

Neste edifício o sistema de ventilação foi iniciado em jun/2014 e os poços de monitoramento instalados em jul/2015.

Ao longo do monitoramento até o presente momento, não foram detectadas concentrações de Metano sob a laje do edifício. Eventualmente, na porção profunda, ocorrem detecções de metano variando entre 1,1 a 1,6%VolCH₄. Desde o final de 2021 as concentrações encontram-se nulas.

Em 2023, as concentrações foram identificadas nulas ou abaixo de 1% VolCH₄. O mesmo se repete no ano de 2024.

No 1º trimestre de 2025, os valores se apresentaram nulos ou abaixo de 1%.



6. RESULTADOS OBTIDOS NO 1º TRIMESTRE DE 2025

As medições no 1º trimestre de 2025 (janeiro à março/2025) ocorreram de forma efetiva nos poços de monitoramento e infraestrutura. Os sistemas de ventilação operaram normalmente.

Durante o 1º trimestre de 2025, não houve interrupções das medições, salvo intercorrências com problemas do equipamento durante 2 dias e salas com restrição de acesso. Ainda se salienta que a operação dos sistemas de ventilação se manteve inalterada, operando por todo o período 24 horas por dia, 30 dias por mês.

Durante este trimestre, foram utilizados para medição dos gases os equipamentos BW nº de série SK317-003329, BW nº de série SK317-003332 e o GEM 5000 nº de série G500491.

A seguir são apresentados os dados compilados de monitoramento (**Item 6.1**) e de operação dos sistemas (**Item 6.2**).

6.1. RESULTADOS DO MONITORAMENTO EM POÇOS E NA INFRAESTRUTURA

As medições realizadas nos poços de monitoramento indicaram que as concentrações de Metano acima de 1%Vol estão localizadas em pontos específicos da área de estudo e não abrangem toda a extensão dos edifícios, além de estarem localizadas nas porções mais profundas (cerca de 1,0m).

Os poços nas porções profundas que demonstraram concentrações acima de 1%VolCH₄ neste trimestre foram: PMG-51B, PMG-53B, PMG-54B, PMG-55B, PMG-139B, PMG-140B, PMG-74B, PMG-150B e PMG-162B.

Não foram detectadas concentração nos poços nas porções rasas.

Os demais poços rasos e profundos não demonstraram concentrações significativas (>1%Vol) de Metano.

Quanto às medições de H₂S e CO nos poços de monitoramento, foram obtidas concentrações de 6,0 e 24,0, respectivamente. Essas concentrações indicam que há a produção destes compostos devido a degradação da matéria orgânica. Para VOC, não foram constatadas concentrações no trimestre em questão.

Sobre as medidas de pressão, os valores entre -0,2 a 0,2 mBar são considerados como faixa de variação do equipamento. Sendo assim, foi observada pressão em alguns poços de monitoramento, positiva de até 12,00 e negativa de até -2,61 mBar. Essa variação de pressão pode relacionar-se com a operação dos sistemas e/ou com a variação do nível d'água local.

As medições na infraestrutura, que contemplaram ralos e caixas de passagem em todas as edificações, bem como os ambientes com pouca circulação de ar, detectaram concentrações



nulas de Metano e de VOC, o que indica que, apesar das duas ocorrências de concentração de Metano em poços sob a laje, não houve a intrusão dos gases nos edifícios ou em ambientes fechados.

Os **Anexos 3 e 4** apresentam as planilhas de monitoramento semanal dos poços e quinzenal dos pontos de infraestrutura.

Visando facilitar a observação dos resultados obtidos, foram destacados na **Tabela 6.1.1** e na **Figura 6.1.1**, os poços que apresentaram concentração de Metano ao menos uma vez acima de 1%Vol durante o trimestre analisado, a fim de avaliar a distribuição dos poços com concentrações próximas ou na faixa de inflamabilidade de Metano.

A **Figura 6.1.2**, apresenta as plumas de isoconcentrações de Metano do 1º trimestre de 2025.

Os gráficos de concentrações a seguir exibem a variação da concentração semanal de Metano nos poços de monitoramento que demonstraram ao menos uma vez a presença de Metano acima de 1%Vol, a fim de acompanhar a concentração recorrente de Metano nos Poços, mesmo que abaixo da faixa de inflamabilidade.



O **Anexo 5** apresenta a evolução das concentrações e pressões obtidas desde o início do monitoramento em abril/14 até março/25.



Tabela 6.1.1 – Resultados dos poços com concentração igual ou maior que 1%VolCH₄ (Janeiro à Março/2025)

Distribuição dos Gases nos Edifícios (1º Trimestre/2025)												
EDIFÍCIOS	Total de Poços	jan/25			fev/25			mar/25			Poços ≥ 1%VolCH ₄	Posição
		Poços ≥ 1%VolCH ₄	Posição	≥ Faixa 5-15%	Poços ≥ 1%VolCH ₄	Posição	≥ Faixa 5-15%	Poços ≥ 1%VolCH ₄	Posição	≥ Faixa 5-15%		
Edifício I-1	17 Pares	Nenhum			Nenhum			Nenhum				
Edifício I-3 e I-5	21 Pares	Nenhum			Nenhum			Nenhum				
Edifício I-4	12 Pares	Nenhum			Nenhum			1	PMG-150B	Profundo (1,00 m)	Não	
Conjunto Laboratorial	17 Pares	3	-	-	1	-	-	4	PMG-51B	Profundo (1,00 m)	Não	
			PMG-53B	Profundo (1,00 m)		-	-		-	-	-	
			-	-		PMG-54B	Profundo (1,00 m)		PMG-54B	Profundo (1,00 m)	Não	
			-	-		-	-		PMG-55B	Profundo (1,00 m)	Não	
			-	-		-	-		-	-	-	
			PMG-139B	Profundo (1,00 m)		-	-		-	-	-	
			PMG-140B	Profundo (1,00 m)		-	-		-	-	-	
			-	-		-	-		-	-	-	
			-	-		-	-		-	-	-	
Bloco Inicial	14 Pares	Nenhum			Nenhum			Nenhum				
Enfermaria	7 Pares	Nenhum			Nenhum			1	PMG-74B	Profundo (1,00 m)	Não	
									-	-	-	
									-	-	-	
CAT	7 Pares	Nenhum			Nenhum			Nenhum				
Incubadora	6 Pares	Nenhum			Nenhum			Nenhum				
Ginásio	11 Pares	Nenhum			Nenhum			1	PMG-162B	Profundo (1,00 m)	Não	
Guarda Universitária	7 Pares	Nenhum			Nenhum			Nenhum				
Portaria P3	2 Trios	Nenhum			Nenhum			Nenhum				
Transportes	4 Pares	Nenhum			Nenhum			Nenhum				

Fonte: Dados de Campo, Engesolve, 2024.

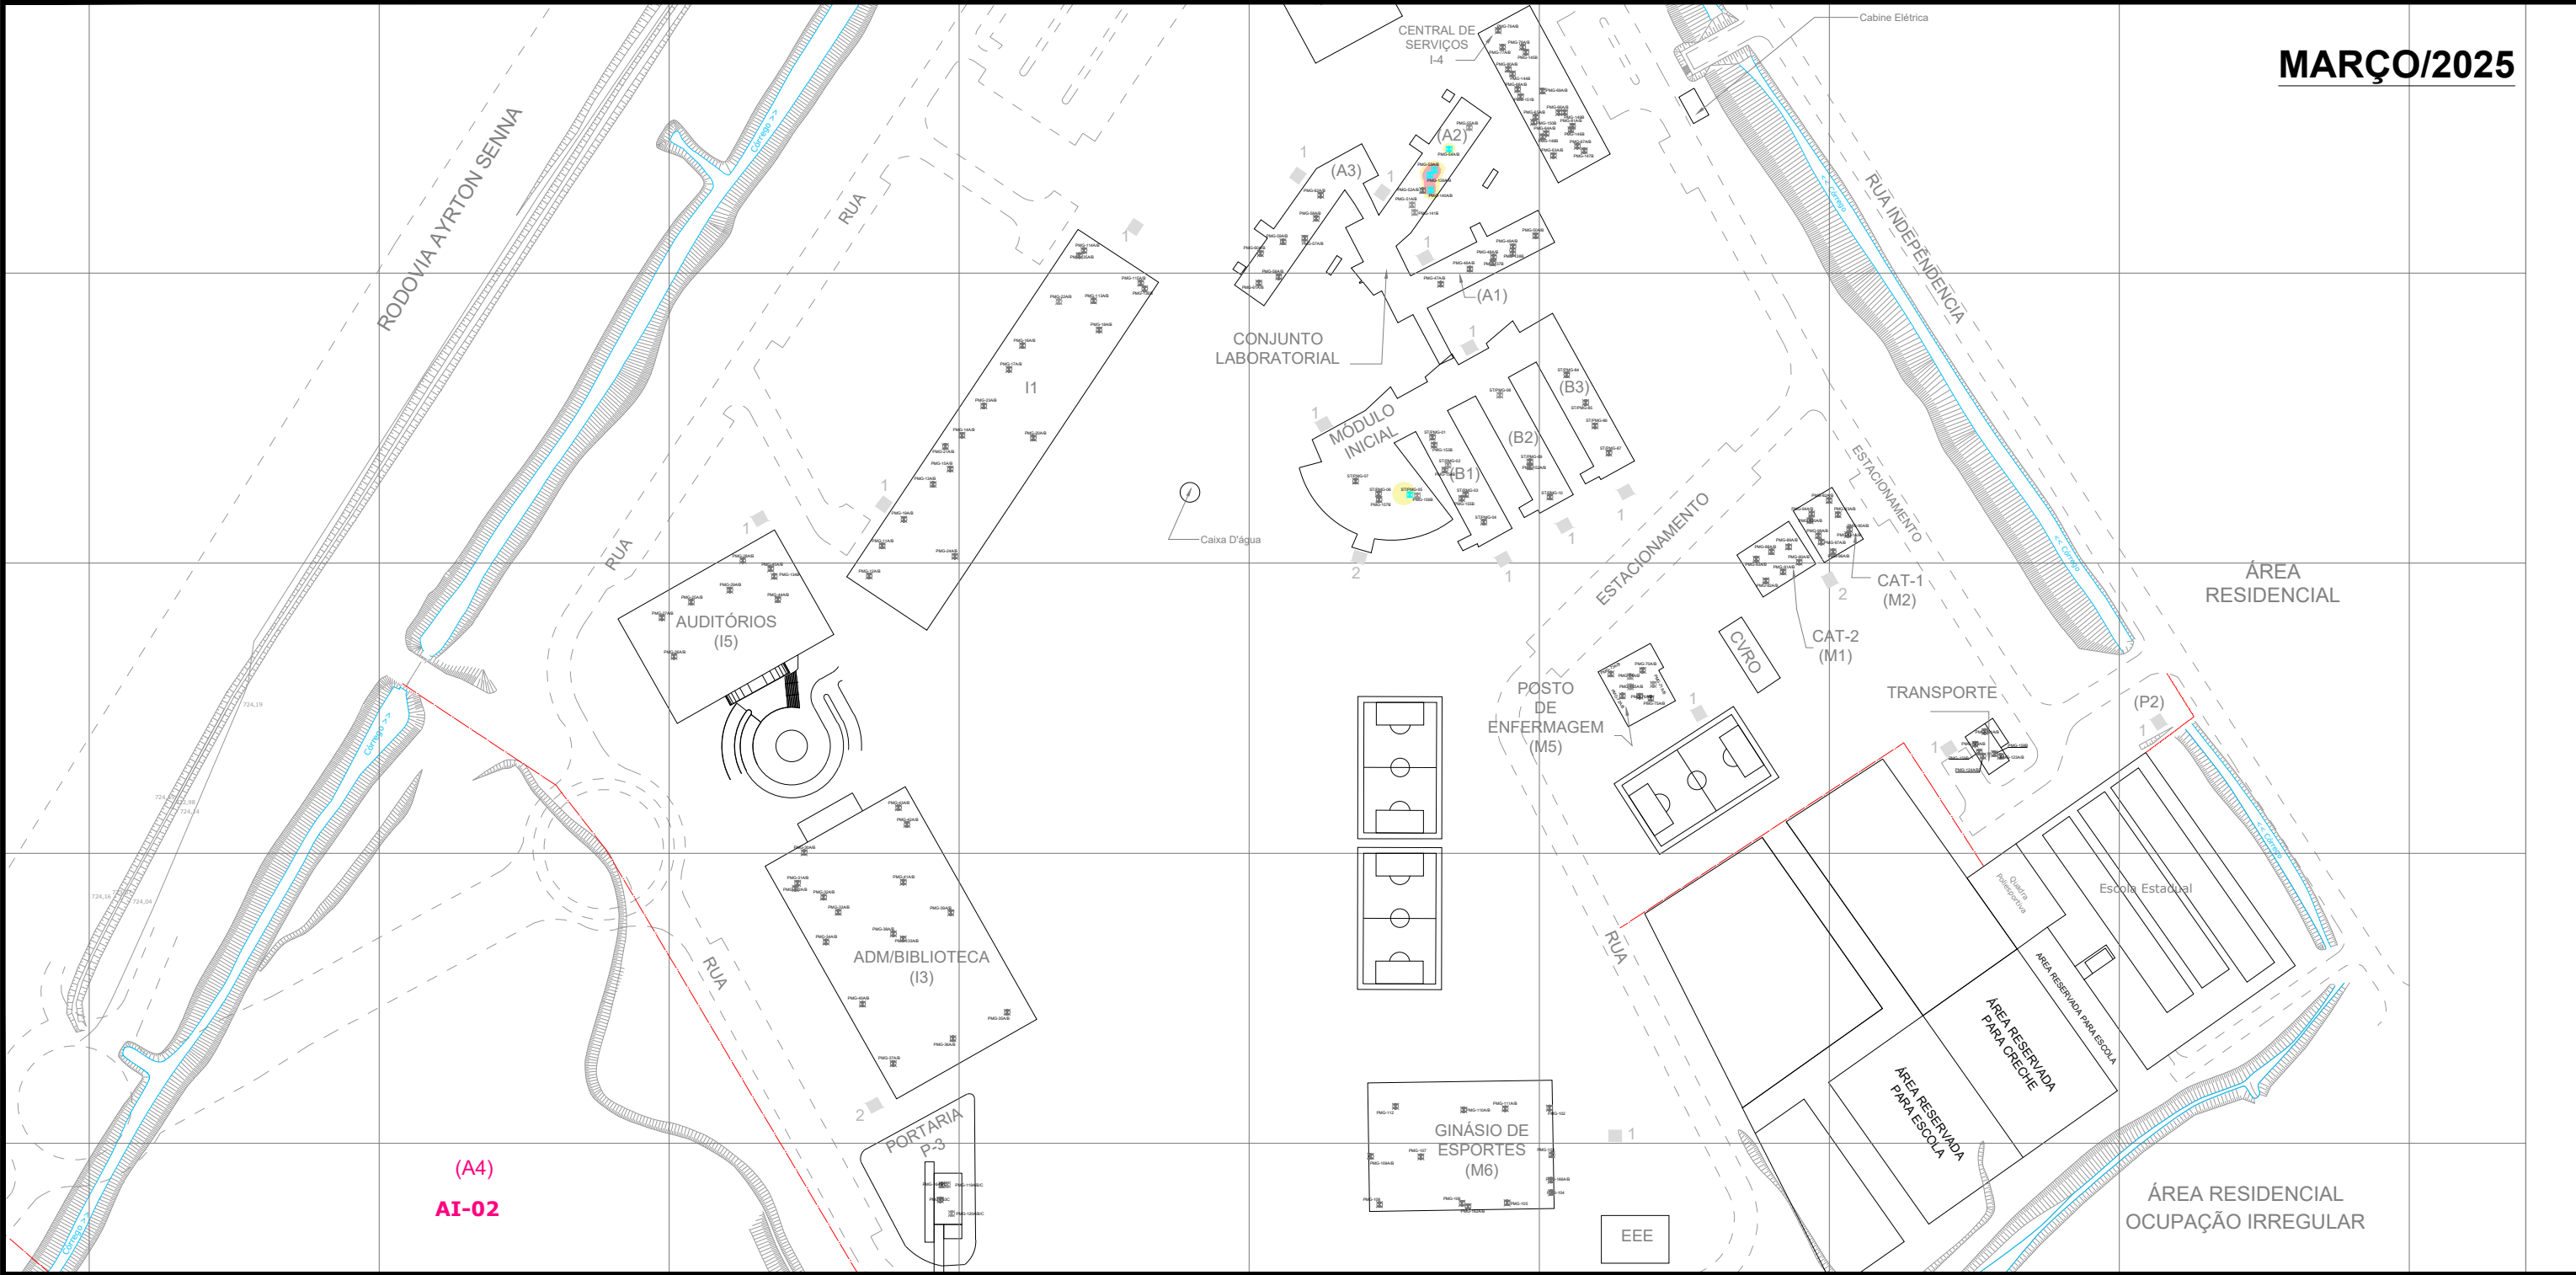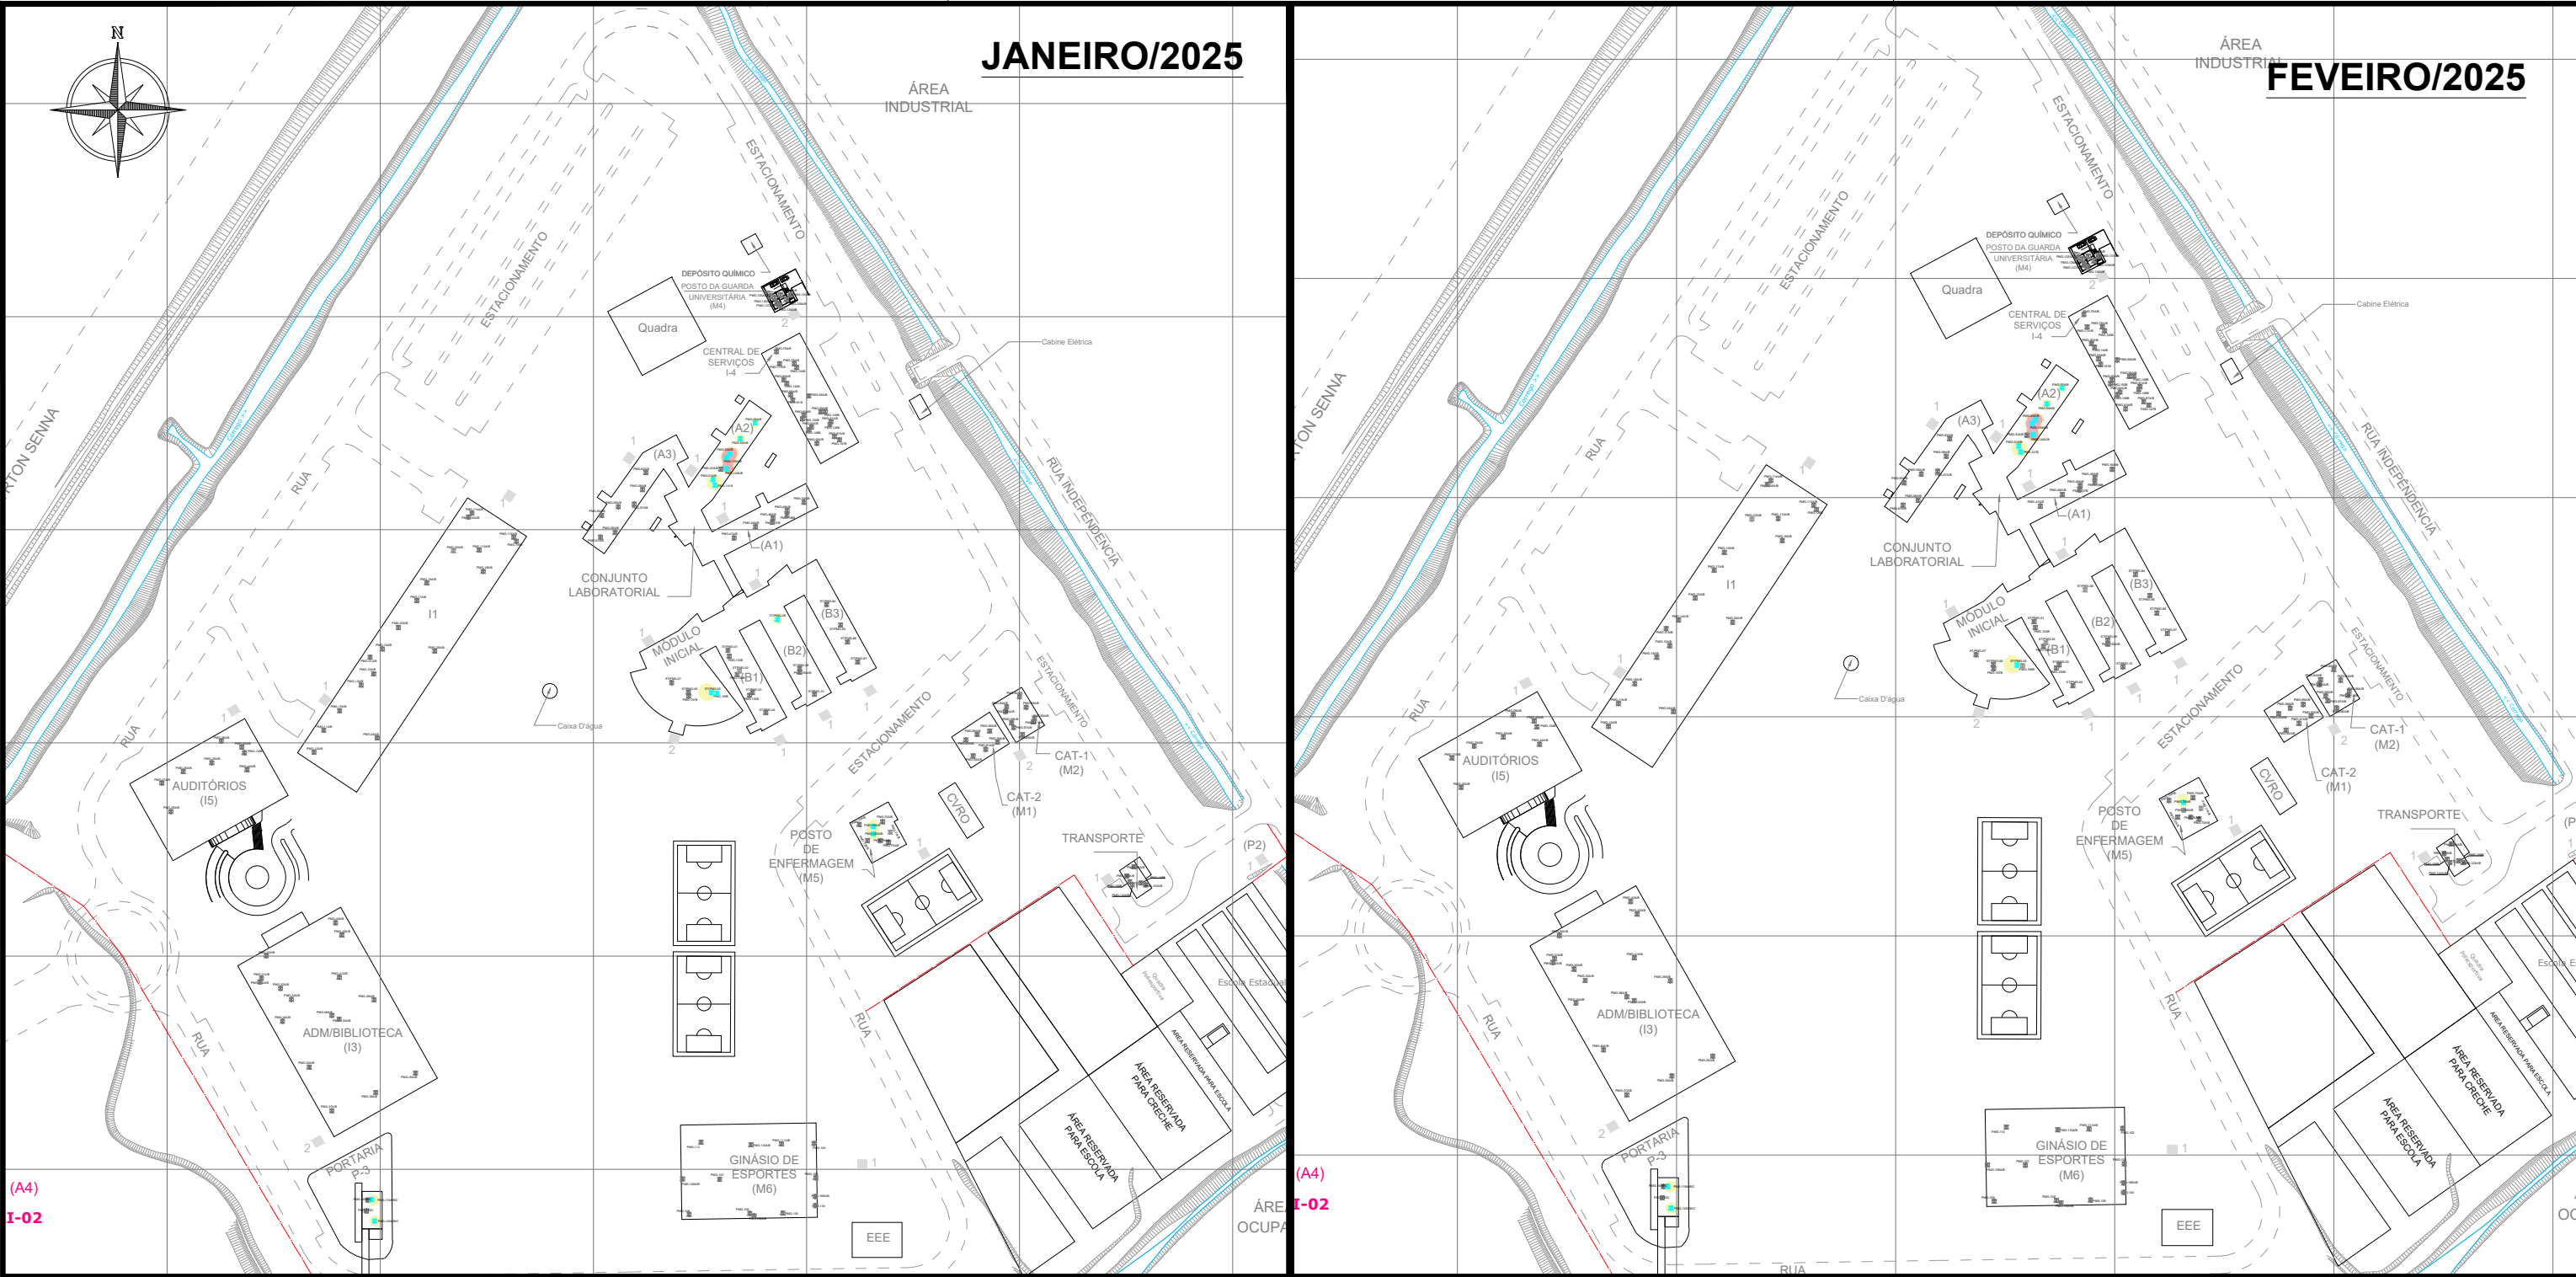

LEGENDA:

- Taludes
- Abrigo para equipamento
- Quantidades de exaustores nos abrigos
- Cerca de divisa
- Guia e Estacionamento
- Edificações
- Poço de monitoramento de gás
- Poço com concentração de CH₄ > 1% na porção profunda (1,00 m)

Escala de cores de Isoconcentração de Metano (%Vol.CH₄)

> 50,0
15,0 - 50,0
5,0 - 15,0
1,0 - 4,9
0,0 - 0,9

Escala Gráfica:

0 31,5 63 94,5 126m

CLIENTE: Universidade de São Paulo - USP Leste	
PROJETO: Evolução do Monitoramento de Intrusão de Gases e da Operação do Sistema de Ventilação	
ENDEREÇO: Rua Arlindo Bétio, 1.000, Ermelino Matarazzo – São Paulo/SP	
TÍTULO: Pluma de Isoconcentração de Metano no Solo no Horizonte B (1 metro de Profundidade) no período de Janeiro à Março de 2025	
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Felipe Chufi	FIGURA Nº: 6.1.2
DATA: ABR/2025	



6.2. RESULTADOS OBTIDOS NA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE VENTILAÇÃO

A avaliação da eficiência dos sistemas de ventilação (circulação de ar nos tapetes de brita, logo abaixo da laje das edificações) é realizada pela análise dos resultados de monitoramento das concentrações de Metano e da variação de pressão nos poços de monitoramento nas duas profundidades distintas, bem como pela operação ininterrupta dos sistemas (24h por dia, 30 dias por mês).

O sistema de ventilação é individual e específico para cada edificação. De forma geral, ele é composto por elementos de subsuperfície (colchão de brita, pontos de captação de ar atmosférico e de extração de gases e/ou tubulação geomecânica), por elementos de superfície (tubulação de interconexão dos pontos de extração de gases) e por exaustores (montados com compressor, célula de vácuo e painel elétrico).

No total, há 24 exaustores para realização de ventilação forçada, sendo que estão em utilização 22 unidades e 02 são adicionais, servindo como reservas para serem utilizadas em caso de necessidade de substituição de equipamentos quando algum exaustor precisar ser encaminhado para manutenção corretiva.

Os exaustores estão distribuídos em 18 abrigos, pois em alguns abrigos foi possível posicionar dois exaustores, enquanto em outros, somente um. A distribuição dos exaustores e abrigos está apresentada na **Tabela 6.2.1**.

Os sistemas se mostram eficientes no seu propósito de promover a circulação do ar no tapete de brita, evitando o acúmulo e confinamento de gases sob a laje dos edifícios. Essa eficiência se confirma pela ausência de Metano nos poços instalados no tapete de brita. Além disso, também é possível observar na análise histórica do monitoramento que houve uma diminuição das concentrações de Metano até mesmo nos poços de monitoramento instalados na profundidade do solo.

Observa-se que os sistemas de extração instalados com a metodologia de furos na laje (ex. Módulo Inicial) têm atuação diferente daquela que manteve a ventilação via dutos enterrados, como no Conjunto Laboratorial. Ambos os tipos de sistema são eficientes e capazes de eliminar as concentrações no tapete de brita logo abaixo da laje, porém os dados indicam que o primeiro é capaz de diminuir as concentrações também em solo, logo após a camada de brita.

Em fevereiro/2016 iniciou-se o monitoramento sistemático nos exaustores de cada sistema de ventilação dos edifícios, realizando-se medições semanais de Metano e pressão com o equipamento GEM 5000 e VOCs com o equipamento BW, bem como a leitura de pressão na célula de vácuo.

No trimestre englobado por esse relatório (janeiro à março/2025), os exaustores operaram com pressão na célula de vácuo de -2,0 mmHg (-2,66mBar) com variação do equipamento entre -0,2 e 0,2 mBar.



Tabela 6.2.1 – Localização dos Exaustores dos Sistemas de Ventilação

Identificação do Exaustor	Edifício ao qual está conectado	Identificação do Abrigo
Exaustor I-1 (1)	Edifício I-1 Parte 1	Abrigo I-1 (1)
Exaustor I-1 (2)	Edifício I-1 Parte 2	Abrigo I-1 (2)
Exaustor I-5 Auditórios	Edifício I-5 Auditórios	Abrigo I-5 Auditórios
Exaustor Biblioteca	Edifício I-3 Biblioteca	Abrigo I-3 Biblioteca
Exaustor Portaria 3	Portaria P3	Abrigo I-3 Biblioteca
Exaustor Ginásio	Ginásio	Abrigo Ginásio
Exaustor Enfermaria	Enfermaria	Abrigo Enfermaria
Exaustor CAT 1	CAT 1	Abrigo Incubadora
Exaustor CAT 2	Incubadora (CAT 2)	Abrigo Incubadora
Exaustor Transportes	Transportes	Abrigo Transportes
Exaustor MI (B1)	Módulo Inicial - Bloco 1	Abrigo Módulo Inicial (B1)
Exaustor MI (B2)	Módulo Inicial - Bloco 2	Abrigo Módulo Inicial (B2)
Exaustor MI (B3)	Módulo Inicial - Bloco 3	Abrigo Módulo Inicial (B3)
Exaustor Auditório 1	Módulo Inicial - Auditórios 1	Abrigo Auditórios
Exaustor Auditório 2	Módulo Inicial - Auditórios 2	Abrigo Auditórios
Exaustor Cantina	Módulo Inicial - Cantina	Abrigo Cantina
Exaustor Corredor	Módulo Inicial - Corredor	Abrigo Módulo Inicial (Corredor)
Exaustor Conj. Lab. (A1)	Conjunto Laboratorial Edifício A1	Abrigo Conjunto Laboratorial (A1)
Exaustor Conj. Lab. (A2)	Conjunto Laboratorial Edifício A2	Abrigo Conjunto Laboratorial (A2)
Exaustor Conj. Lab. (A3)	Conjunto Laboratorial Edifício A3	Abrigo Conjunto Laboratorial (A3)
Exaustor I-4	Edifício I-4	Abrigo I-4
Exaustor Guarda	Guarda Universitária	Abrigo I-5
Exaustor Reserva 1	Reserva 1 (sala E-02 Edifício I-1)	
Exaustor Reserva 2	Reserva 2 (sala E-02 Edifício I-1)	

Fonte: Dados de Campo, Engesolve, 2024.



Na entrada de cada exaustor não foram detectadas concentrações para VOC e nem para Metano. O vácuo é variável para cada edifício e, eventualmente há picos de pressão negativa. No momento em que os picos são observados, realiza-se a drenagem da tubulação nos pontos de inspeção e em sua extensão, retirando-se a água acumulada e voltando a pressão média.

Sobre a pressão de sucção de operação do sistema, a pressão medida na entrada do exaustor, quando comparada aos modelos matemáticos de projeto, devem atender à necessidade estabelecida, considerando as perdas de carga no sistema. Ao longo do monitoramento do 1º trimestre de 2025, tais pressões se mantiveram em valores superiores aos de projeto, demonstrando que o arraste previsto ocorreu. A **Tabela 6.2.2.** apresenta este comparativo.

Nos gráficos a seguir demonstra-se a variação da pressão na célula de vácuo em comparação com a entrada nos exaustores. O **Anexo 6** apresenta as planilhas de monitoramento semanal de cada exaustor.

Cabe mencionar que entre o término do processo licitatório da antiga empresa que operava na USP Leste e o início da operação pela ENGESOLVE, houve um período em que as medições dos poços de monitoramento e pontos de infraestrutura tiveram suas frequências alteradas, com um maior espaçamento em determinadas medições e priorização em outras, mas a operação dos sistemas de ventilação se manteve inalterada por todo o período (24 horas por dia, 30 dias por mês).

A limpeza dos abrigos é realizada a cada 3 ou 4 meses, devido ao acúmulo de pó, grama advinda da capinagem e aranhas.



Tabela 6.2.2. – Comparativo de pressão de sucção de projeto x medição no 4º trimestre/2024

Detalhes de Projeto dos Sistemas (obtidos por meio de simulações - IPT)						Dados Obtidos entre Janeiro e Março de 2025										
SISTEMA		Pressão de Sucção	Vazão total de exaustão	Velocidade principal de escoamento do ar no tapete de brita	Taxa de renovação do ar no tapete de brita	Exaustor (Capacidade de Aplicação de Pressão)	Identificação do Exaustor		Pressão Mínima obtida na entrada do exaustor neste período			Pressão Máxima obtida na entrada do exaustor neste período				
Edifício I-1		153Pa nos pontos de extração	34,8 m³/h	≥10 ⁻⁴ m/s	0,15 renov/h ou 3,7 renov/dia	194,8Pa (153 Pa Rede fluxo + 41,8 Pa Perdas Carga)	Exaustor I-1 (1)		-2,24	mBar	-224,0	Pa	-3,94	mBar	-394,0	Pa
							Exaustor I-1 (2)		-3,48	mBar	-348,0	Pa	-4,75	mBar	-475,0	Pa
Biblioteca I-3		153Pa nos pontos de extração	15,5 m³/h	≥10 ⁻³ m/s	0,05 renov/h ou 1,3 renov/dia	154,9Pa (153 Pa Rede fluxo + 1,9 Pa Perdas Carga)	Exaustor Biblioteca		-1,69	mBar	-169,0	Pa	-2,56	mBar	-256,0	Pa
Auditórios I-5		-	-	-	-	-	Exaustor I-5 Auditórios		-1,61	mBar	-161,0	Pa	-2,08	mBar	-208,0	Pa
Portaria P3		63Pa nos pontos de extração	3,2 m³/h	≥10 ⁻⁵ m/s	1,5 renov/h ou 36 renov/dia	67,4Pa (63 Pa Rede fluxo + 4,5 Pa Perdas Carga)	Exaustor Portaria P3		-3,03	mBar	-303,0	Pa	-4,11	mBar	-411,0	Pa
Ginásio de Esportes		43,1Pa no ponto de aplicação e 13Pa na extremidade oposta	12,6 m³/h	≥10 ⁻⁴ m/s	0,1 renov/h ou 2,4 renov/dia	59,4Pa (43,1 Pa Rede fluxo + 16,3 Pa Perdas Carga)	Exaustor Ginásio		-1,79	mBar	-179,0	Pa	-2,81	mBar	-281,0	Pa
Enfermaria		38Pa nos pontos de extração	46,3 m³/h	≥10 ⁻⁴ m/s	3,6 renov/h ou 86,4 renov/dia	44Pa (38 Pa Rede fluxo + 6 Pa Perdas Carga)	Exaustor Enfermaria		-3,69	mBar	-369,0	Pa	-6,01	mBar	-601,0	Pa
CAT 1		27Pa nos pontos de extração de ar atmosférico	12,6 m³/h	≥10 ⁻⁵ m/s	0,7 renov/h ou 16,8 renov/dia	117Pa (27 Pa Rede fluxo + 87 Pa Perdas Carga)	Exaustor CAT 1		-1,86	mBar	-186,0	Pa	-2,77	mBar	-277,0	Pa
CAT 2 (Incubadora)		11Pa nos pontos de extração de ar atmosférico	4,0 m³/h Tubo 1 8,0 m³/h Tubo 2 4,5 m³/h Tubo 3	≥10 ⁻⁵ m/s	1,3 renov/h ou 31,2 renov/dia	46,3Pa (13,5 Pa Rede fluxo + 30,5 Pa Perdas Carga)	Exaustor CAT 2		-1,74	mBar	-174,0	Pa	-3,97	mBar	-397,0	Pa
Transportes		-	-	-	-	-	Exaustor Transportes		-3,55	mBar	-355,0	Pa	-5,06	mBar	-506,0	Pa
Módulo Inicial	Blocos Padrões	16,5Pa no ponto de aplicação e 2 Pa no ponto mais distante do exaustor	49,5 m³/h	?	?	16,5 Pa	Exaustor MI (B1)		-3,45	mBar	-345,0	Pa	-3,89	mBar	-389,0	Pa
							Exaustor MI (B2)		-2,16	mBar	-216,0	Pa	-2,99	mBar	-299,0	Pa
							Exaustor MI (B3)		-3,38	mBar	-338,0	Pa	-4,57	mBar	-457,0	Pa
	Auditórios	49Pa e 97Pa nos pontos de aplicação (esquerdo e direito, respectivamente) e 2Pa no ponto mais distante do exaustor	73 m³/h	?	?	97Pa	Exaustor Auditório 1		-2,56	mBar	-256,0	Pa	-4,51	mBar	-451,0	Pa
							Exaustor Auditório 2		-2,11	mBar	-211,0	Pa	-2,53	mBar	-253,0	Pa
	Corredor de Serviços	162 Pa no ponto de aplicação e 2 Pa no ponto mais distante do exaustor	122 m³/h	?	?	162 Pa	Exaustor Cantina		-2,67	mBar	-267,0	Pa	-3,13	mBar	-313,0	Pa
Exaustor Corredor							-2,51	mBar	-251,0	Pa	-3,38	mBar	-338,0	Pa		
Conjunto Laboratorial		-	3,2 m²/h	?	0,5 renov/h ou 12 renov/dia	?	Exaustor Conj. Lab. (A1)		-4,41	mBar	-441,0	Pa	-5,64	mBar	-564,0	Pa
							Exaustor Conj. Lab. (A2)		-5,19	mBar	-519,0	Pa	-6,99	mBar	-699,0	Pa
							Exaustor Conj. Lab. (A3)		-3,60	mBar	-360,0	Pa	-4,57	mBar	-457,0	Pa
Edifício I-4		23,7Pa no ponto de aplicação e 13 Pa na extremidade oposta	10,7 m³/h	≥10 ⁻⁴ m/s	0,2 renov/h ou 4,8 renov/dia	34,6Pa (23,7 Pa Rede fluxo + 10,9 Pa Perdas carga)	Exaustor I-4		-1,81	mBar	-181,0	Pa	-3,16	mBar	-316,0	Pa
Posto Guarda Universitária		-	-	-	-	-	Exaustor Guarda		-1,99	mBar	-199,0	Pa	-3,22	mBar	-322,0	Pa









Legenda: (-) não há projeto; (?) não há dados disponíveis.

Fonte: Baseado nos relatórios IPT: Mar, Jun e Jul/2013







(1Pa = 0,01mBar)









Gráficos de Variação da Pressão Célula de Vácuo x Entrada dos Exaustores I1 (1), I5 (Auditórios, Biblioteca, Portaria P3, Ginásio, Enfermaria e CAT1

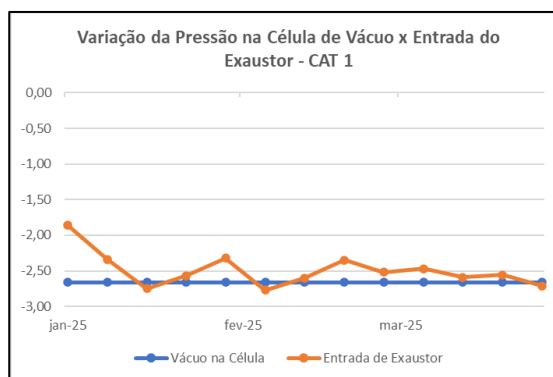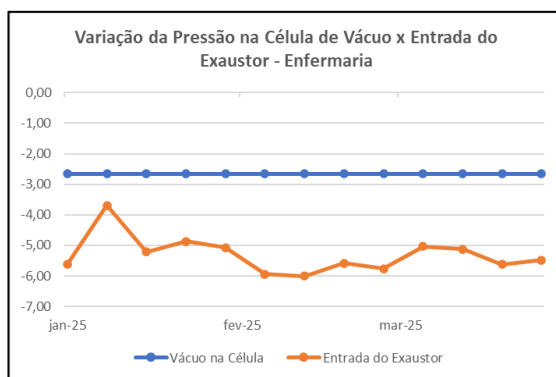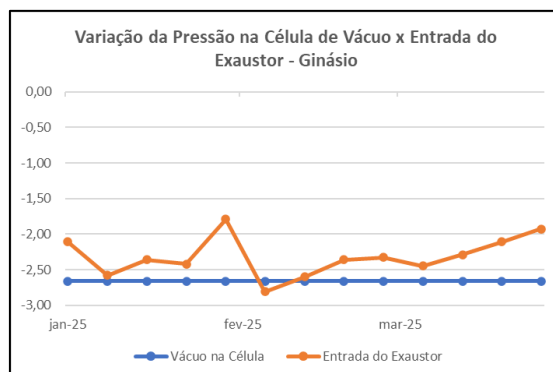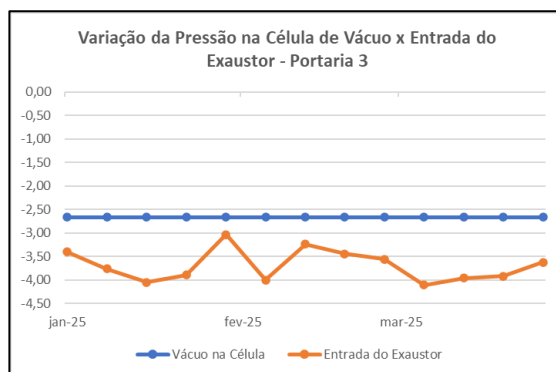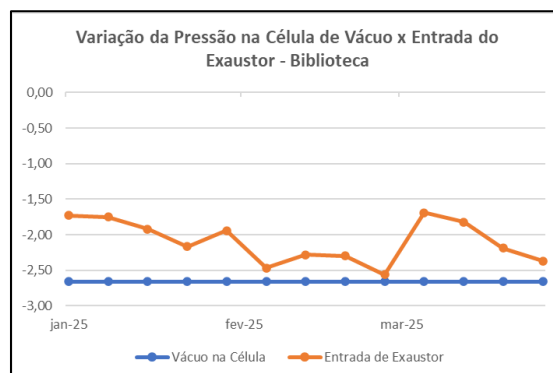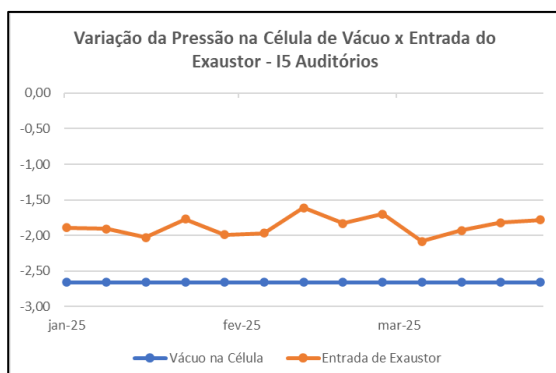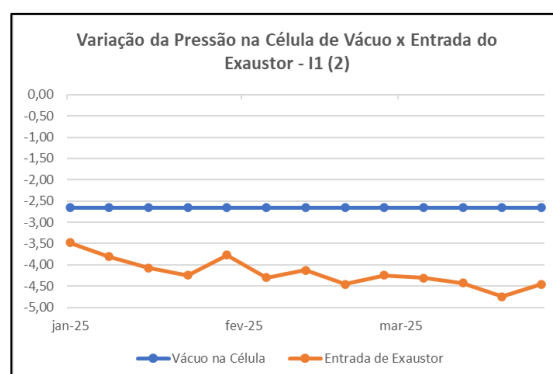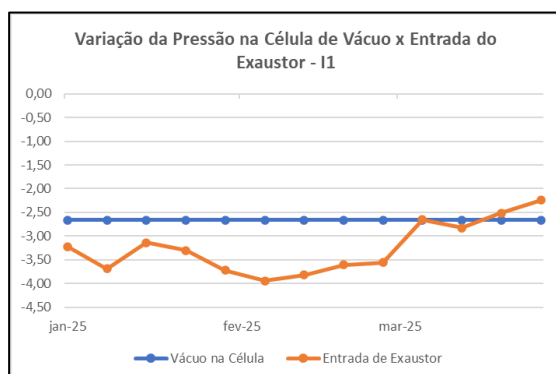

Gráficos de Variação da Pressão Célula de Vácuo x Entrada dos Exaustores CAT2, Transportes, MI (B1), MI (B2), MI (B3), Auditório 1, Auditório 2 e Cantina

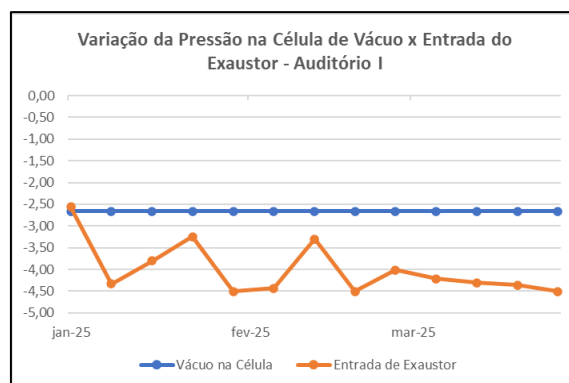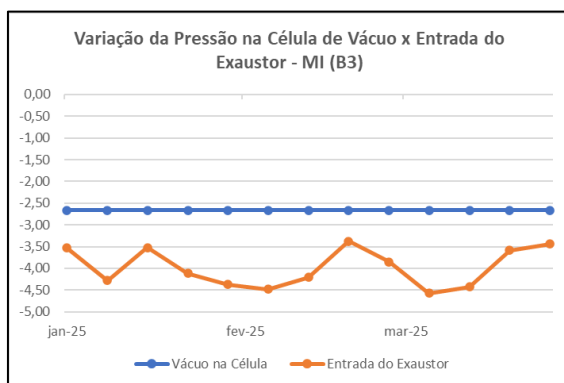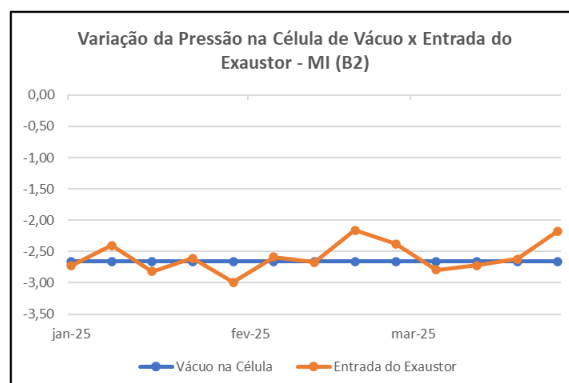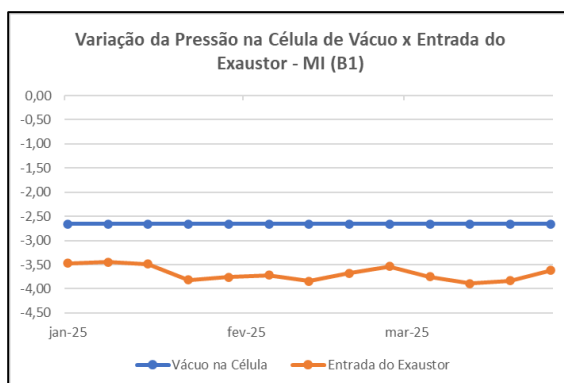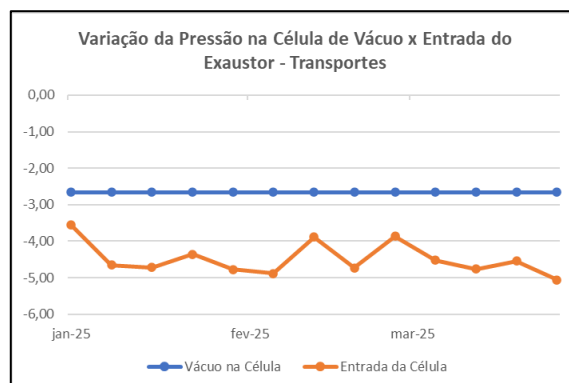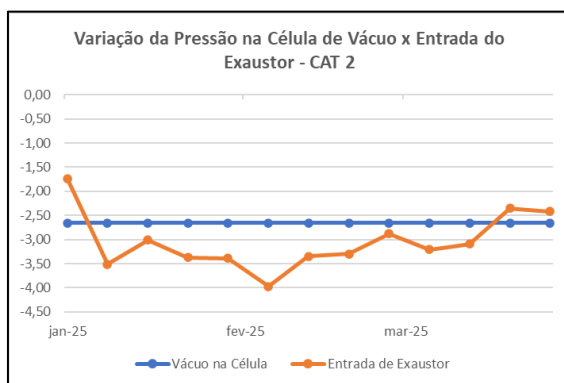

Gráficos de Variação da Pressão Célula de Vácuo x Entrada dos Exaustores Corredor, Conj. Lab. (A1), Conj. Lab. (A2), Conj. Lab. (A3), I4 e Guarda Universitária

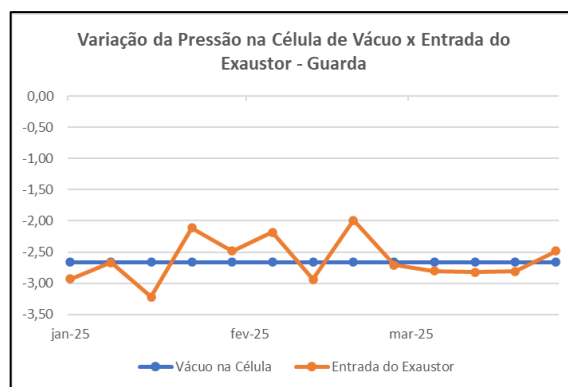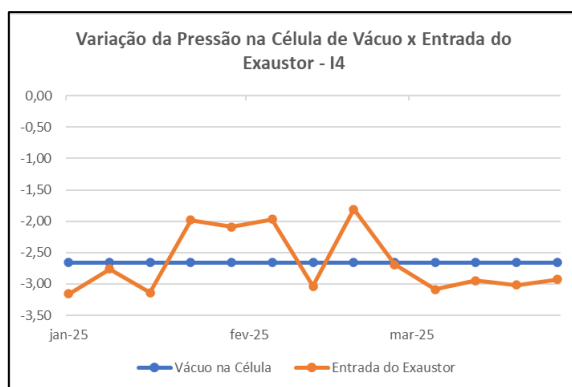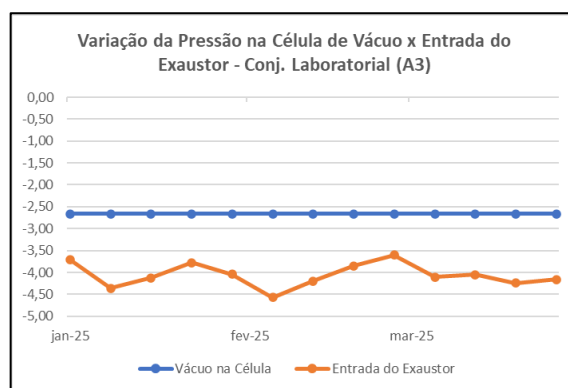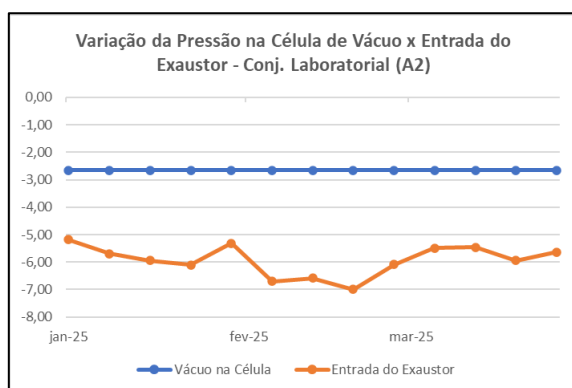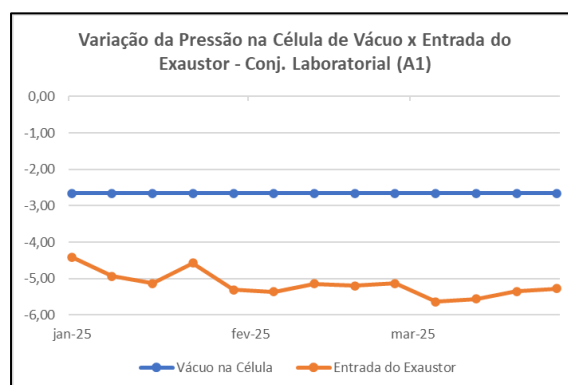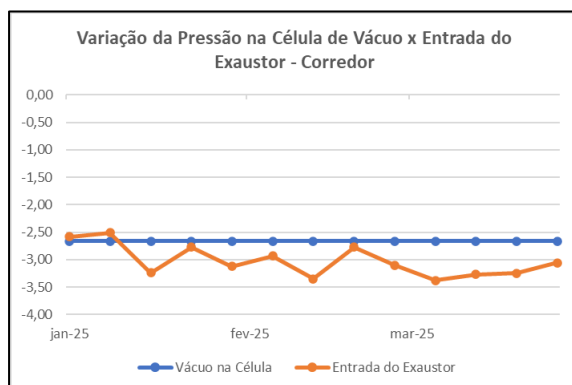



7. CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES

A ENGESOLVE Soluções Ambientais Ltda. foi contratada pela Prefeitura da Universidade de São Paulo Área Capital Leste (PUSP-LESTE) para a operação, manutenção dos sistemas de ventilação de gases no solo bem como o monitoramento de poços de gás e pontos na infraestrutura instalados em edificações da EACH na USP Leste, localizada na Rua Arlindo Bétio, 1.000 – Ermelino Matarazzo, São Paulo/SP, conforme do Processo Administrativo 22.1.18.95.7, Pregão Eletrônico nº 00002/2022 – PUSP – CL e Contrato nº 0000001/2022 – PUSP – CL.

O objetivo da operação dos sistemas de ventilação é impedir o acúmulo de gases sub a laje dos edifícios, aliado ao monitoramento preventivo de intrusão de gases nos ambientes por meio da execução de medições de gases em todos os poços de monitoramento, pontos de infraestrutura e espaços com pouca circulação de ar.

Com base nos resultados obtidos no 1º trimestre de 2025, foram detectadas concentrações de Metano (acima de 1%Vol CH₄) na porção profunda em 9 dos 289 poços de gases monitorados. Nos demais poços profundos, não foram detectadas concentrações significativas.

Para os poços nas porções rasas, não foram detectadas concentrações de metano acima de 1% VolCH₄.

Essas concentrações podem ser consideradas esperadas, uma vez que estes poços estão instalados sobre a fonte de geração do gás Metano (camada de matéria orgânica). Porém, tais concentrações estão localizadas em pontos específicos e não abrangem toda a extensão dos edifícios. É importante ressaltar que as concentrações nulas nos pontos de infraestrutura ratificam a ausência do risco de inflamabilidade ou ocorrência de intrusão de gases.

As concentrações obtidas ao longo deste 1º trimestre/2025 se mostraram coerentes com a linha de tendência obtida durante os 11 anos de monitoramento da área de estudo. Observa-se que nos períodos de seca há um singelo aumento das concentrações medidas por meio dos poços profundos.

Quanto às medições de H₂S e CO nos poços de monitoramento, foram obtidas concentrações de 4,0 e 4,0, respectivamente. Essas concentrações indicam que há a produção destes compostos devido a degradação da matéria orgânica. Para VOC, não foram constatadas concentrações.

Os resultados obtidos nas medições realizadas nos demais pontos de infraestrutura ao longo deste trimestre (ralos e caixa de passagem) nas demais as edificações, bem como em ambientes com pouca circulação de ar, não detectaram concentrações de Metano e nem de VOC.

Os sistemas de ventilação operaram 24 horas por dia, 30 dias por mês, durante todo o período do trimestre. Estes demonstraram-se eficientes, não permitindo que os gases existentes no solo se acumulassem no tapete de brita (poços a 0,30 m) ou diretamente sob a laje (vapor pin), bem



como diminuindo eventualmente até mesmo as concentrações no solo abaixo do tapete de brita (poços a 1,00 m), por influência da ventilação.

O nível d'água raso existente na área tende a dificultar a migração vertical do gás, bem como as medidas já adotadas ao longo do tempo, como as construções com ventilação fixa, colchão de brita em subsuperfície, drenos geomecânicos, que colaboram com a mitigação da possibilidade de intrusão e gases.

Diante dos resultados obtidos a partir do monitoramento do primeiro trimestre de 2025, e considerando a série histórica de monitoramento ao longo dos 11 anos (abril/2014 a março/2025), verifica-se que não há a intrusão de gases nos ambientes fechados, uma vez que as concentrações de Metano existentes no solo, mesmo com a presença de pressão positiva, não alcançam o tapete de brita (sob a laje) ou, quando alcançam esporadicamente, são arrastadas pelo sistema de ventilação. Além disso, não há presença de Metano em nenhum dos pontos de infraestrutura.

Recomenda-se a continuidade da operação dos sistemas de exaustão, bem como a realização dos monitoramentos semanais e quinzenais nos poços de monitoramento e nos pontos de infraestrutura, respectivamente.



8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABNT NBR 16.209, de setembro de 2013 – Avaliação de risco a saúde humana para fins de gerenciamento de áreas contaminadas;

AVATZ AMBIENTAL. Relatório Técnico – Instalação de Poços de Monitoramento de Gases e de Monitoramento dos Poços Instalados – R047/21-PR014/21. São Paulo: AVATZ AMBIENTAL, Outubro/2021.

CETESB (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo), 2021 – Biogás. Disponível em: <<https://cetesb.sp.gov.br/biogas/>>. Acesso em: out 2022.

CETESB (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo), 2017 – Decisão de Diretoria Nº 038/2017, de 07 de fevereiro de 2017, que dispõe sobre a aprovação do “Procedimento para a Proteção da Qualidade do Solo e das Águas Subterrâneas”, da revisão do “Procedimento para o Gerenciamento de Áreas Contaminadas” e estabelece “Diretrizes para Gerenciamento de Áreas Contaminadas no Âmbito do Licenciamento Ambiental”, e dá outras providências;

CETESB (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo), 2016 – Manual de Produtos Químicos. Constituído de um Guia Técnico e 96 Fichas de Informação de Produtos Químicos.

ENGESOLVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS. Relatório Técnico. Evolução do Monitoramento de Intrusão de Gases e da Operação do Sistema de Ventilação – 4º Trimestre /2024. USP Leste. São Paulo: ENGESOLVE, Janeiro/2025.

ENGESOLVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS. Relatório Técnico. Evolução do Monitoramento de Intrusão de Gases e da Operação do Sistema de Ventilação – 3º Trimestre /2024. USP Leste. São Paulo: ENGESOLVE, Outubro/2024.

ENGESOLVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS. Relatório Técnico. Evolução do Monitoramento de Intrusão de Gases e da Operação do Sistema de Ventilação – 2º Trimestre /2024. USP Leste. São Paulo: ENGESOLVE, Junho/2024.

ENGESOLVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS. Relatório Técnico. Evolução do Monitoramento de Intrusão de Gases e da Operação do Sistema de Ventilação – 1º Trimestre /2024. USP Leste. São Paulo: ENGESOLVE, Março/2024.

ENGESOLVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS. Relatório Técnico. Evolução do Monitoramento de Intrusão de Gases e da Operação do Sistema de Ventilação – 4º Trimestre /2023. USP Leste. São Paulo: ENGESOLVE, Janeiro/2024.

ENGESOLVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS. Relatório Técnico. Evolução do Monitoramento de Intrusão de Gases e da Operação do Sistema de Ventilação – 3º Trimestre /2023. USP Leste. São Paulo: ENGESOLVE, Outubro/2023.



ENGESOLVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS. Relatório Técnico. Evolução do Monitoramento de Intrusão de Gases e da Operação do Sistema de Ventilação – 2º Trimestre /2023. USP Leste. São Paulo: ENGESOLVE, Junho/2023.

ENGESOLVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS. Relatório Técnico. Evolução do Monitoramento de Intrusão de Gases e da Operação do Sistema de Ventilação – 1º Trimestre /2023. USP Leste. São Paulo: ENGESOLVE, Abril/2023.

ENGESOLVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS. Relatório Técnico. Evolução do Monitoramento de Intrusão de Gases e da Operação do Sistema de Ventilação – 4º Trimestre /2022. USP Leste. São Paulo: ENGESOLVE, Janeiro/2023.

ENGESOLVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS. Relatório Técnico. Evolução do Monitoramento de Intrusão de Gases e da Operação do Sistema de Ventilação – 3º Trimestre /2022. USP Leste. São Paulo: ENGESOLVE, Outubro/2022.

IPT. Relatório Técnico 92353-205 – Avaliação e sugestões de aperfeiçoamento para alguns dos sistemas de ventilação de gás e vapor do subsolo de edifícios do campus da USP Leste – resultados preliminares. São Paulo: IPT, 02 de abril de 2007.

SERVMAR. Relatório de Investigação Detalhada, Avaliação de Risco à Saúde Humana e Plano de Intervenção na AI-01 e Investigação Detalhada de Gases – MA/12936/14BLS. São Paulo: SERVMAR, Fevereiro/2014.

WEBER AMBIENTAL. Relatório Técnico: Evolução do Monitoramento de Intrusão de Gases e da Operação do Sistema de Ventilação – 2º Trimestre/2022. USP Leste. São Paulo: WEBER, Julho/2022.

WEBER AMBIENTAL. Relatório Técnico: As-Built completo dos sistemas de ventilação de gases instalados na USP Leste – vs.07. Projeto 311.1264.14EGS.VS07 – USP Leste. São Paulo: WEBER, Julho/2021.

WEBER AMBIENTAL. Relatório Técnico: Instalação de novos poços de monitoramento e amostragem de gases – vs.02. Projeto 311.1265.14-IAG.VS02 – USP Leste. São Paulo: WEBER, Janeiro/2016.

WEBER AMBIENTAL. Relatório Técnico: Instalação do Sistema de Exaustão de Gases no Solo sob os Edifícios – Ago/14. Projeto 311.1205.14 – USP Leste. São Paulo: WEBER, Agosto/2014.



ANEXO 1
CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

Certificado de Calibração nº.: RBC.1469.24.rev.00

Controle Interno: 24616

Dados do Cliente:

Nome: EngeSolve Soluções Ambientais Integradas Ltda.
Endereço: Avenida Paulista 2064, nº 2086 - São Paulo/SP

Local da realização do serviço de calibração:

Laboratório de calibração da Clean Environment Brasil

Dados do Instrumento Calibrado:

Identificação: Detector Portátil de Gás, Landtec, GEM 5000
Nº. Série: G500491
Nº. Patrimônio: 086-018480
Ident. Adicional: Não Consta

Data da Calibração: 12/11/2024**Método Utilizado:** Método de calibração com material de referência certificado

O equipamento foi submetido à medição de um material de referência certificado, sendo as leituras obtidas no display/indicador do equipamento/sistema de medição, e na mesma grandeza do material de referência.
Foram realizadas 3 leituras.

Condições Ambientais: Temperatura: 21,7 °C ± 0,2 °C Umidade relativa: 61 %UR ± 2 %UR

Dado(s) do(s) Instrumento(s) Utilizado(s):

Descrição	Certificado	Rastreabilidade	Validade
Monitor de gás MGAS-07	RBC.0884.24.rev.00	CAL 0540	22/05/2025
Termo-higrômetro TMHG-15	1000649	CAL 0439	02/07/2025
Monitor de gás MGAS-06	RBC.1306.24.rev.00	CAL 0540	17/10/2025

Materiais de Referência:

Material de referência	Certificado	Rastreabilidade	Validade
Multigás (G)	QCSPC035193	12803	14/03/2026
Dióxido de Carbono	QCSPC024458	12803	05/06/2025

Legendas:

%LEL: Lower Explosive Limit (Limite Inferior de Explosividade);
ppm: Partes Por Milhão;
U₉₅: Incerteza de medição para um nível de confiança de 95,45%. Parâmetro associado ao resultado de uma medição que caracteriza a dispersão dos valores que podem ser razoavelmente atribuídos a um mensurando;
k: Fator de abrangência;
Veff: Grau de liberdade efetivo.

Certificado de Calibração nº.: RBC.1469.24.rev.00

Controle Interno: 24616

Resultados da Calibração:

Sensor	Gás de Ref. Aplicado	Medição Antes do Ajuste	Média das Medições	Erro de Medição	U ₉₅	k	Veff
CH₄ (Metano)	50 %LEL	48 %LEL	50 %LEL	0 %LEL	1,8 %LEL	2,18	15
O₂ (Oxigênio)	18,0 %mol/mol	xxxx	18,3 %mol/mol	0,3 %mol/mol	0,4 %mol/mol	2,21	13
H₂S (Sulfeto de Hidrogênio)	26 ppm	xxxx	30 ppm	4 ppm	2 ppm	2,00	Infinito
CO (Monóxido de Carbono)	102 ppm	xxxx	101 ppm	-1 ppm	3,2 ppm	2,04	66
CO₂ (Dióxido de Carbono)	4014 ppm	4000 ppm	4000 ppm	-14 ppm	216,8 ppm	2,87	4

Notas:

- 1 - O serviço de calibração realizado nesse equipamento não se estende a outros, mesmo que de mesma marca, lote ou modelo;
- 2 - Este certificado de calibração poderá ser reproduzido somente por inteiro, sem nenhuma alteração;
- 3 - Esta calibração não desobriga o usuário a testar o equipamento antes de cada utilização, de acordo com a exigência da NR-33;
- 4 - Este certificado só é válido com as assinaturas dos responsáveis;
- 5 - A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência k, o qual para k = 2, se tem uma distribuição normal e para k > 2, se tem uma distribuição t com v_{eff} graus de liberdade efetivos, que corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02;
- 6 - Manutenções e Ajuste não fazem parte do escopo de acreditação;
- 7 - Conversões de unidades: 1 %vol = 10.000 ppm / 1 %vol de CH₄ = 20 %LEL / Unidade %mol/mol equivalente a unidade %vol;
- 8 - Erro de Medição = Média das Medições - Gás de Ref. Aplicado;
- 9 - A violação ou remoção do lacre de segurança invalida a calibração.
- 10 - Este certificado atende aos requisitos de acreditação pela Cgcre que avaliou a competência do laboratório e comprovou sua rastreabilidade de medição.

Observações:

Nenhuma.

Data da Emissão: 13/11/2024

Técnico Executante
Vinicius Lima

Signatária Autorizada
Brenda Santos

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO

Nº 136-2025

Dados do Cliente:

Nome: Engesolve Soluções Ambientais Integradas Ltda
Endereço: Av. Paulista 2064, 2086 14 Andar
Bairro: Bela Vista
Cidade: São Paulo
CEP: 01.310-928

UF: SP
Contato: 11 9308-4713



Interessado: O mesmo

Identificação do Item:

Item: Detector de Gás com Indicação Direta
Marca: BW Technologies
Modelo: GasAlert Micro5 PID
N.º de Série: SK317-003332

B.P: 86020395

Dados da Calibração:

Data da Calibração: 13-jan-25
N.º do Processo: 48 Item: 1
Procedimento de Calibração: PC-10 REV. 14

Condições Ambientais:

Temperatura: 23,9 °C
Umidade Relativa: 55,3 %

Método de Medição:

Os resultados são obtidos através da aplicação de material de referência certificado (MRC) de gás sobre o sensor do instrumento sob teste.

Material de Referência Certificado Utilizado:

MRC	Código	Certificado	Emitente	Validade
Mistura Padrão de Metano	CIL-LEL	834094	Coregas	maio-26
Mistura Padrão de Isobutileno	CIL-PID	683633	Coregas	março-27

Laboratório de calibração acreditado pela Cgcre, de acordo com a NBR ISO/IEC 17025 sob o número 407

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO

Nº 136-2025

Resultado Obtido:

Gás	V.M	V.R	R.M	Erro	Unidade	Fator k	Incerteza
CH4	39	50,4	50	-0,4	% LEL	2,00	1,2
C4H8	89	100,4	100	-0,4	PPM	2,00	2,1

Legenda:

V.M= Valor de uma medição realizada no sensor sob teste isento de ajustes.

V.R=Valor de referência da MRC.

R.M= Resultado da medição. (média de 3 leituras realizadas após ajuste de SPAN).

Observações:

- Este certificado de calibração é válido apenas para o instrumento e sensores especificados , não sendo extensivo a quaisquer outros instrumentos ainda que similares.
- Não é autorizada a reprodução parcial deste documento sem autorização da ALMONT DO BRASIL. As informações fornecidas neste certificado são de responsabilidade da Almont.
- A incerteza expandida estimada relatada é baseada em uma incerteza padrão combinada, multiplicada por um fator de abrangência k, para um nível de confiança de aproximadamente 95 %.
- Manutenções, Ajustes e Configurações não fazem parte do escopo de acreditação do laboratório.
- Esta calibração não isenta o usuário de realizar o teste de resposta conforme NR-33.
- Calibração realizada nas instalações permanentes do laboratório Almont do Brasil.
- Este certificado atende aos requisitos de acreditação da Cgcre, que avaliou a competência do laboratório.
- Calibração inválida se o lacre for rompido.
- A versão original deste certificado é um arquivo PDF.

Técnico Executor:

Vinicius Archilha
Técnico Instrumentista

Signatário Autorizado

Anderson Fusari de Andrade
Gerente Técnico Subst.

Data de Emissão: 14/01/2025

Laboratório de calibração acreditado pela Cgcre, de acordo com a NBR ISO/IEC 17025 sob o número 407

Fim do certificado de Calibração

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO

Nº 997-2025

Dados do Cliente:

Nome: Engesolve Soluções Ambientais Integradas Ltda
Endereço: Av. Paulista 2064, 2086 14 Andar
Bairro: Bela Vista
Cidade: São Paulo
CEP: 01.310-928

UF: SP
Contato: 11 9308-4713



Interessado: O mesmo

Identificação do Item:

Item: Detector de Gás com Indicação Direta
Marca: BW Technologies
Modelo: GasAlert Micro5 PID
N.º de Série: SK317-003329

Dados da Calibração:

Data da Calibração: 28-fev-25
N.º do Processo: 1668 Item: 1
Procedimento de Calibração: PC-10 REV. 14

Condições Ambientais:

Temperatura: 23,1 °C
Umidade Relativa: 44,5 %

Método de Medição:

Os resultados são obtidos através da aplicação de material de referência certificado (MRC) de gás sobre o sensor do instrumento sob teste.

Material de Referência Certificado Utilizado:

MRC	Código	Certificado	Emitente	Validade
Mistura Padrão de Metano	CIL-LEL	834094	Coregas	maio-26
Mistura Padrão de Isobutileno	CIL-PID	683633	Coregas	março-27

Laboratório de calibração acreditado pela Cgcre, de acordo com a NBR ISO/IEC 17025 sob o número 407

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO

Nº 997-2025

Resultado Obtido:

Gás	V.M	V.R	R.M	Erro	Unidade	Fator k	Incerteza
CH4	50	50,4	51	0,6	% LEL	2,00	1,2
C4H8	106	100,4	102	1,6	PPM	2,00	2,1

Legenda:

V.M= Valor de uma medição realizada no sensor sob teste isento de ajustes.

V.R=Valor de referência da MRC.

R.M= Resultado da medição. (média de 3 leituras realizadas após ajuste de SPAN).

Observações:

- Este certificado de calibração é válido apenas para o instrumento e sensores especificados , não sendo extensivo a quaisquer outros instrumentos ainda que similares.
- Não é autorizada a reprodução parcial deste documento sem autorização da ALMONT DO BRASIL. As informações fornecidas neste certificado são de responsabilidade da Almont.
- A incerteza expandida estimada relatada é baseada em uma incerteza padrão combinada, multiplicada por um fator de abrangência k, para um nível de confiança de aproximadamente 95 %.
- Manutenções, Ajustes e Configurações não fazem parte do escopo de acreditação do laboratório.
- Esta calibração não isenta o usuário de realizar o teste de resposta conforme NR-33.
- Calibração realizada nas instalações permanentes do laboratório Almont do Brasil.
- Este certificado atende aos requisitos de acreditação da Cgcre, que avaliou a competência do laboratório.
- Calibração inválida se o lacre for rompido.
- A versão original deste certificado é um arquivo PDF.

Técnico Executor:

Anderson Fusari de Andrade
Gerente Técnico Subst.

Signatário Autorizado

Anderson Fusari de Andrade
Gerente Técnico Subst.

Data de Emissão: 28/02/2025

Laboratório de calibração acreditado pela Cgcre, de acordo com a NBR ISO/IEC 17025 sob o número 407

Fim do certificado de Calibração



ANEXO 2

PLANO DE AÇÃO



ANEXO 3

TABELAS DE MEDIÇÕES SEMANAIS EM PMG

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	CO2 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15% ,															
Edifício I 1	PMG-16 A	02/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,60	1,00	2,00	78,30	0,24			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-16 B	02/01/2025	0,00%	0,00%	1,40	20,40	2,00	2,00	78,20	0,05			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-17 A	02/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,60	2,00	2,00	78,30	0,13			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-17 B	02/01/2025	0,00%	0,00%	1,80	20,60	2,00	2,00	77,60	0,09			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-18 A	02/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,60	2,00	2,00	78,40	0,15			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-18 B	02/01/2025	0,00%	0,00%	1,50	20,10	1,00	2,00	78,50	0,29			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-20 A	02/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,30	1,00	2,00	78,60	0,14			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-20 B	02/01/2025	0,00%	0,00%	0,30	20,90	1,00	2,00	78,80	0,10			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-22 A	02/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,50	1,00	2,00	78,40	0,18			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-22 B	02/01/2025	0,00%	0,00%	2,10	19,30	2,00	2,00	78,60	0,05			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-23 A	02/01/2025	0,00%	0,00%	0,40	21,00	1,00	2,00	78,60	0,16			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-23 B	02/01/2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Não medido, água no momento de medição.
Edifício I 1	PMG-113 A	02/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,50	1,00	2,00	78,50	0,13			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-113 B	02/01/2025	0,00%	0,00%	1,40	19,90	1,00	1,00	78,70	0,10			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-114 A	02/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,50	1,00	2,00	78,50	0,14			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-114 B	02/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,60	1,00	2,00	78,40	0,11			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-115 A	02/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,30	1,00	2,00	78,60	0,16			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-115 B	02/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,50	1,00	2,00	78,50	0,04			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-11 A	02/01/2025	0,00%	0,00%	0,40	21,40	1,00	1,00	78,20	0,11			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-11 B	02/01/2025	0,00%	0,00%	0,40	21,20	1,00	2,00	78,40	0,15			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-12 A	02/01/2025	0,00%	0,00%	2,30	18,60	1,00	2,00	79,10	0,14			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-12 B	02/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,70	1,00	2,00	78,20	0,11			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-13 A	02/01/2025	0,00%	0,00%	1,10	20,10	1,00	2,00	78,80	0,18			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-13 B	02/01/2025	0,00%	0,00%	2,70	17,50	1,00	2,00	79,70	0,06			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-14 A	02/01/2025	0,00%	0,00%	2,60	17,70	1,00	1,00	79,60	0,13			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-14 B	02/01/2025	0,00%	0,00%	3,60	16,20	2,00	1,00	80,10	0,23			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-15 A	02/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,50	1,00	2,00	78,40	0,14			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-15 B	02/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,70	1,00	2,00	78,20	0,17			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-19 A	02/01/2025	0,00%	0,00%	0,40	21,50	1,00	2,00	78,20	0,15			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-19 B	02/01/2025	0,00%	0,00%	0,70	20,90	1,00	1,00	78,30	0,24			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-21 A	02/01/2025	0,00%	0,00%	1,10	19,80	1,00	2,00	79,20	0,16			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-21 B	02/01/2025	0,00%	0,00%	1,60	18,80	1,00	1,00	79,60	0,03			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-24 A	02/01/2025	0,00%	0,00%	0,30	21,20	1,00	2,00	78,60	0,08			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-24 B	02/01/2025	0,00%	0,00%	0,40	21,20	1,00	2,00	78,40	0,11			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-135 A	02/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,50	1,00	2,00	78,50	0,06			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG -135 B	02/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,50	1,00	2,00	78,50	0,03			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-136 B	02/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,50	1,00	2,00	78,40	0,20			0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-63 A	03/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,50	1,00	2,00	78,40	0,18			0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-63 B	03/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,60	1,00	2,00	78,40	0,24			0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-64 A	03/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,50	1,00	2,00	78,50	0,15			0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-64 B	03/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,50	2,00	2,00	78,50	0,05			0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-65 A	03/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,40	2,00	2,00	78,60	0,18			0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-65 B	03/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,50	1,00	1,00	78,50	0,17			0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-66 A	03/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,40	2,00	2,00	78,50	0,17			0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-66 B	03/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,50	1,00	2,00	78,50	0,28			0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-67 A	03/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,20	1,00	1,00	78,80	0,05			0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-67 B	03/01/2025	0,00%	0,00%	0,40	20,90	1,00	1,00	78,70	-0,10			0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-68 A	03/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	1,00	1,00	78,70	0,10			0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-68 B	03/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	1,00	1,00	78,60	0,13			0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-69 A	03/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,50	2,00	2,00	78,50	0,14			0,00	0,00	



Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	C02 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
Edifício I-4	PMG-69	B	03/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,50	1,00	1,00	78,50	0,15		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-77	A	03/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,30	1,00	2,00	78,60	0,19		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-77	B	03/01/2025	0,00%	0,00%	0,60	20,50	1,00	1,00	78,90	0,08		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-78	A	03/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,30	1,00	1,00	78,70	0,24		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-78	B	03/01/2025	0,00%	0,00%	0,60	20,50	1,00	1,00	78,90	0,16		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-79	A	03/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,20	1,00	2,00	78,80	0,13		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-79	B	03/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,20	1,00	1,00	78,70	0,11		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-80	A	03/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	1,00	2,00	78,70	0,11		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-80	B	03/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	1,00	1,00	78,70	0,12		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-81	A	03/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	1,00	1,00	78,70	-0,03		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-81	B	03/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	1,00	1,00	78,60	0,14		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-144	B	03/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	2,00	1,00	78,60	0,07		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-145	B	03/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,10	1,00	1,00	78,80	0,10		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-146	B	03/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	1,00	1,00	78,70	0,03		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-147	B	03/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,20	2,00	1,00	78,80	0,07		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-148	B	03/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,50	1,00	2,00	78,50	0,14		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-149	B	03/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,50	1,00	1,00	78,50	0,16		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-150	B	03/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,50	1,00	2,00	78,50	0,23		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-151	B	03/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	1,00	1,00	78,60	0,11		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-46	A	03/01/2025	0,00%	0,00%	0,30	21,10	1,00	1,00	78,60	0,14		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-46	B	03/01/2025	0,00%	0,00%	4,30	17,00	1,00	1,00	78,70	0,11		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-47	A	03/01/2025	0,00%	0,00%	0,30	21,00	1,00	2,00	78,70	0,14		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-47	B	03/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,30	1,00	2,00	78,60	0,24		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-48	A	03/01/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,20	1,00	2,00	78,60	0,14		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-48	B	03/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,40	1,00	2,00	78,50	0,11		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-49	A	03/01/2025	0,00%	0,00%	0,30	21,10	1,00	2,00	78,60	0,10		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-49	B	03/01/2025	0,00%	0,00%	4,10	17,40	1,00	2,00	78,50	0,18		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-50	A	03/01/2025	0,00%	0,00%	0,30	20,90	1,00	2,00	78,80	0,17		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-50	B	03/01/2025	0,00%	0,00%	2,70	18,80	1,00	1,00	78,50	0,10		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-51	A	03/01/2025	0,00%	0,00%	0,30	21,00	1,00	1,00	78,80	0,07		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-51	B	03/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,10	1,00	0,00	78,80	0,18		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-52	A	03/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,10	2,00	0,00	78,80	-0,01		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-52	B	03/01/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,90	1,00	0,00	78,80	-0,01		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-53	A	03/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,00	1,00	0,00	79,90	0,06		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-53	B	03/01/2025	2,40%	2,40%	0,50	20,40	1,00	0,00	76,70	0,13		0,00	100,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-54	A	03/01/2025	0,00%	0,00%	0,40	20,50	1,00	0,00	79,10	0,01		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-54	B	03/01/2025	0,50%	0,50%	4,10	15,50	2,00	0,00	79,90	0,12		0,00	18,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-55	A	03/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,10	1,00	0,00	78,80	0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-55	B	03/01/2025	0,00%	0,00%	5,00	15,50	2,00	0,00	79,60	0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-56	A	03/01/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,70	1,00	2,00	79,10	0,12		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-56	B	03/01/2025	0,00%	0,00%	1,00	20,60	1,00	1,00	78,40	0,19		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-57	A	03/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,10	1,00	1,00	78,70	-0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-57	B	03/01/2025	0,00%	0,00%	1,00	20,10	1,00	1,00	78,90	0,04		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-58	A	03/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,10	1,00	0,00	78,70	0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-58	B	03/01/2025	0,00%	0,00%	1,10	20,40	1,00	1,00	78,50	0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-59	A	03/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,10	1,00	1,00	78,70	0,05		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-59	B	03/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	1,00	1,00	78,70	0,12		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-60	A	03/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,20	1,00	1,00	78,70	0,11		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-60	B	03/01/2025	0,00%	0,00%	2,80	16,20	1,00	1,00	80,90	0,11		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-61	A	03/01/2025	0,00%	0,00%	0,30	20,80	1,00	1,00	78,90	0,08		0,00	0,00	



Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	CO2 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15% ;															
Conjunto Laboratorial	PMG-61 B		03/01/2025	0,00%	0,00%	6,80	13,10	1,00	0,00	80,00	0,19		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-137 B		03/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,40	1,00	2,00	78,60	0,12		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-138 B		03/01/2025	0,00%	0,00%	3,70	17,70	1,00	1,00	78,70	0,18		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-139 A		03/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,00	1,00	0,00	78,90	0,00		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-139 B		03/01/2025	4,10%	4,10%	0,90	19,90	1,00	1,00	75,10	0,06		0,00	100,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-140 A		03/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,00	1,00	0,00	78,80	0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-140 B		03/01/2025	0,40%	0,40%	0,10	21,00	1,00	0,00	78,50	0,00		0,00	22,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-141 B		03/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,20	1,00	0,00	78,80	0,06		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-62 A		03/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,10	1,00	0,00	78,80	0,07		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-62 B		03/01/2025	0,20%	0,70%	0,10	21,00	1,00	0,00	78,70	0,19		0,00	13,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-01 A		02/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,40	1,00	1,00	78,60	0,09		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-01 B		02/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,40	1,00	1,00	78,50	0,08		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-02 A		02/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,40	2,00	1,00	78,60	0,06		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-02 B		02/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	1,00	2,00	78,60	0,08		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-03 A		02/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,20	1,00	2,00	78,70	0,12		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-03 B		02/01/2025	0,00%	0,00%	0,90	20,70	1,00	1,00	78,30	0,09		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-04 A		02/01/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,00	1,00	1,00	78,80	0,11		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-04 B		02/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,20	1,00	1,00	78,70	0,08		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-05 A		02/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,40	2,00	2,00	78,60	0,13		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-05 B		02/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,40	1,00	2,00	78,60	0,04		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-06 A		02/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,40	1,00	2,00	78,50	0,08		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-06 B		02/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,50	1,00	1,00	78,50	0,03		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-07 A		02/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,40	1,00	2,00	78,50	0,15		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-07 B		02/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,50	1,00	1,00	78,50	0,23		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-08 A		02/01/2025	0,00%	0,00%	0,30	20,90	1,00	1,00	78,90	0,12		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-08 B		02/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,20	1,00	1,00	78,70	0,12		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-09 A		02/01/2025	0,00%	0,00%	1,20	20,10	1,00	1,00	78,70	0,08		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-09 B		02/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,10	1,00	1,00	78,90	0,05		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-10 A		02/01/2025	0,00%	0,00%	0,40	20,50	1,00	1,00	79,10	0,08		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-10 B		02/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,00	1,00	0,00	78,90	-0,11		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-84 A		02/01/2025	0,00%	0,00%	0,30	20,60	1,00	0,00	79,10	0,10		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-84 B		02/01/2025	0,00%	0,00%	4,90	16,20	1,00	1,00	78,90	-0,09		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-85 A		02/01/2025	0,00%	0,00%	1,00	20,00	1,00	0,00	79,00	0,08		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-85 B		02/01/2025	0,00%	0,00%	2,60	19,50	2,00	0,00	77,90	0,06		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-86 A		02/01/2025	0,00%	0,00%	0,30	20,60	2,00	1,00	79,10	0,09		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-86 B		02/01/2025	0,00%	0,00%	1,10	19,80	2,00	0,00	79,10	0,04		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-87 A		02/01/2025	0,00%	0,00%	3,00	17,00	1,00	1,00	80,10	0,03		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-87 B		02/01/2025	0,00%	0,00%	2,70	18,40	1,00	1,00	79,00	0,08		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-152 A		02/01/2025	0,00%	0,00%	0,40	20,80	1,00	1,00	78,80	0,12		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-152 B		02/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,10	1,00	1,00	78,90	0,11		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-153 B		02/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,50	1,00	1,00	78,50	0,01		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-154 B		02/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,40	1,00	2,00	78,60	0,05		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-155 B		02/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	1,00	1,00	78,60	0,04		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-156 B		02/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,50	1,00	2,00	78,50	0,09		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-157 B		02/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,50	1,00	2,00	78,50	0,13		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-70 A		02/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,30	1,00	2,00	78,70	0,18		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-70 B		02/01/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,00	1,00	2,00	78,90	0,25		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-71 A		02/01/2025	0,00%	0,00%	0,30	20,50	2,00	2,00	79,20	0,11		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-71 B		02/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,10	1,00	2,00	78,80	0,74		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-72 A		02/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,10	1,00	3,00	78,70	0,08		0,00	0,00	



Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	CO2 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15%,															
Enfermaria	PMG-72	B	02/01/2025	0,00%	0,00%	0,70	19,90	1,00	3,00	79,30	0,14		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-73	A	02/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,00	1,00	3,00	78,80	0,21		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-73	B	02/01/2025	0,00%	0,00%	0,70	20,60	1,00	2,00	78,80	0,15		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-74	A	02/01/2025	0,00%	0,00%	0,30	20,50	1,00	3,00	79,20	0,22		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-74	B	02/01/2025	0,00%	0,00%	1,20	15,90	2,00	2,00	82,90	0,13		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-75	A	02/01/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,70	1,00	3,00	79,00	0,19		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-75	B	02/01/2025	0,00%	0,00%	1,40	17,50	1,00	3,00	81,10	0,12		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-76	A	02/01/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,10	1,00	2,00	78,70	0,15		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-76	B	02/01/2025	0,00%	0,00%	2,80	15,30	2,00	3,00	81,80	0,29		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-165	A	02/01/2025	0,00%	0,00%	0,30	20,80	1,00	3,00	78,90	0,23		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-165	B	02/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,20	2,00	2,00	78,80	0,24		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-88	A	03/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,40	1,00	2,00	78,50	0,13		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-88	B	03/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,40	1,00	2,00	78,40	0,24		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-89	A	03/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,40	1,00	3,00	78,50	0,08		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-89	B	03/01/2025	0,00%	0,00%	0,70	20,80	1,00	2,00	78,40	0,22		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-90	A	03/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,50	1,00	3,00	78,50	0,15		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-90	B	03/01/2025	0,00%	0,00%	0,40	21,20	1,00	2,00	78,40	0,17		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-91	A	03/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,50	1,00	3,00	78,50	0,22		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-91	B	03/01/2025	0,00%	0,00%	1,40	20,20	1,00	3,00	78,40	-0,02		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-92	A	03/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,50	1,00	3,00	78,50	0,18		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-92	B	03/01/2025	0,00%	0,00%	0,60	20,90	1,00	3,00	78,50	0,19		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-93	A	03/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,50	1,00	2,00	78,40	0,18		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-93	B	03/01/2025	0,00%	0,00%	0,80	20,80	1,00	2,00	78,30	0,13		0,00	0,00	
Transportes	PMG-121	A	02/01/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,30	1,00	2,00	78,50	0,10		0,00	0,00	
Transportes	PMG-121	B	02/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,50	2,00	2,00	78,40	0,13		0,00	0,00	
Transportes	PMG-122	A	02/01/2025	0,00%	0,00%	0,30	21,10	2,00	2,00	78,70	0,11		0,00	0,00	
Transportes	PMG-122	B	02/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,50	1,00	2,00	78,50	0,14		0,00	0,00	
Transportes	PMG-123	A	02/01/2025	0,00%	0,00%	0,50	20,80	1,00	2,00	78,70	0,12		0,00	0,00	
Transportes	PMG-123	B	02/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,50	1,00	2,00	78,50	0,20		0,00	0,00	
Transportes	PMG-124	A	02/01/2025	0,00%	0,00%	0,50	20,20	1,00	2,00	79,20	0,24		0,00	0,00	
Transportes	PMG-124	B	02/01/2025	0,00%	0,00%	2,10	18,80	1,00	2,00	79,10	0,03		0,00	0,00	
Transportes	PMG-158	B	02/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,60	1,00	1,00	78,40	0,08		0,00	0,00	
Transportes	PMG-159	B	02/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,50	1,00	2,00	78,50	0,11		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-125	A	03/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,40	1,00	1,00	78,60	0,15		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-125	B	03/01/2025	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	Não medido. Agua no momento de medição.
Posto Guarda Universitário	PMG-126	A	03/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	1,00	1,00	78,60	0,11		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-126	B	03/01/2025	0,00%	0,00%	2,50	16,50	1,00	1,00	81,10	-0,85		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-127	A	03/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,20	1,00	1,00	78,80	0,04		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-127	B	03/01/2025	0,00%	0,00%	1,20	20,10	1,00	1,00	78,60	2,07		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-128	A	03/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	1,00	1,00	78,60	0,12		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-128	B	03/01/2025	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	Não medido. Agua no momento de medição.
Posto Guarda Universitário	PMG-129	A	03/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,20	1,00	2,00	78,80	0,13		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-129	B	03/01/2025	0,00%	0,00%	0,80	20,40	2,00	2,00	78,90	0,09		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-130	A	03/01/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,00	0,00	2,00	78,80	0,17		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-130	B	03/01/2025	0,00%	0,00%	2,30	18,90	1,00	2,00	78,80	0,19		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-131	A	03/01/2025	0,00%	0,00%	0,40	20,60	1,00	1,00	79,00	0,05		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-131	B	03/01/2025	0,00%	0,00%	0,70	20,30	1,00	2,00	79,00	0,06		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-16	A	07/01/2025	0,00%	0,00%	2,10	19,40	1,00	2,00	78,50	0,08		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-16	B	07/01/2025	0,00%	0,00%	2,00	19,50	1,00	2,00	78,50	0,10		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-17	A	07/01/2025	0,00%	0,00%	0,60	20,80	1,00	2,00	78,60	0,14		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	C02 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15% ,															
Edifício I 1	PMG-17 B		07/01/2025	0,00%	0,00%	1,70	19,60	2,00	1,00	78,80	0,12		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-18 A		07/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,70	3,00	0,00	79,20	0,03		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-18 B		07/01/2025	0,00%	0,00%	1,60	19,40	1,00	0,00	79,00	0,01		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-20 A		07/01/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,80	2,00	1,00	79,00	0,09		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-20 B		07/01/2025	0,00%	0,00%	0,40	20,50	1,00	1,00	79,20	-0,08		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-22 A		07/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,70	1,00	0,00	78,20	0,06		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-22 B		07/01/2025	0,00%	0,00%	2,10	19,60	2,00	0,00	78,30	0,03		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-23 A		07/01/2025	0,00%	0,00%	0,40	20,50	2,00	1,00	79,10	0,11		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-23 B		07/01/2025	0,00%	0,00%	1,40	19,60	2,00	0,00	79,00	0,18		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-113 A		07/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,80	2,00	1,00	79,20	0,03		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-113 B		07/01/2025	0,00%	0,00%	1,20	19,60	2,00	1,00	79,20	0,03		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-114 A		07/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,80	2,00	1,00	79,10	-0,03		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-114 B		07/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,00	2,00	1,00	79,00	0,15		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-115 A		07/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,70	1,00	1,00	79,20	0,04		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-115 B		07/01/2025	0,00%	0,00%	0,40	20,70	1,00	1,00	78,90	0,03		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-11 A		07/01/2025	0,00%	0,00%	0,90	20,50	1,00	1,00	78,60	0,08		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-11 B		07/01/2025	0,00%	0,00%	0,50	20,80	2,00	1,00	78,70	0,08		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-12 A		07/01/2025	0,00%	0,00%	2,60	18,40	1,00	1,00	79,10	0,12		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-12 B		07/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,40	1,00	2,00	78,50	0,10		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-13 A		07/01/2025	0,00%	0,00%	1,30	19,90	1,00	2,00	78,80	0,15		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-13 B		07/01/2025	0,00%	0,00%	1,80	19,20	1,00	2,00	79,00	0,25		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-14 A		07/01/2025	0,00%	0,00%	2,50	18,10	1,00	0,00	79,30	0,08		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-14 B		07/01/2025	0,00%	0,00%	4,00	15,90	1,00	1,00	80,10	0,06		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-15 A		07/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,50	1,00	2,00	78,40	0,13		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-15 B		07/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,60	1,00	2,00	78,30	0,10		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-19 A		07/01/2025	0,00%	0,00%	0,40	21,30	1,00	1,00	78,40	0,06		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-19 B		07/01/2025	0,00%	0,00%	0,60	20,90	1,00	1,00	78,50	0,12		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-21 A		07/01/2025	0,00%	0,00%	1,00	20,20	1,00	1,00	78,80	0,07		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-21 B		07/01/2025	0,00%	0,00%	1,00	20,30	2,00	0,00	78,70	0,07		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-24 A		07/01/2025	0,00%	0,00%	0,30	21,30	1,00	1,00	78,50	0,08		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-24 B		07/01/2025	0,00%	0,00%	0,50	21,00	1,00	1,00	78,50	0,03		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-135 A		07/01/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,70	1,00	1,00	79,10	0,05		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-135 B		07/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,00	2,00	0,00	79,00	0,11		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-136 B		07/01/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,80	2,00	0,00	79,00	0,06		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-25 A		06/01/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,30	1,00	1,00	78,50	0,10		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-25 B		06/01/2025	0,00%	0,00%	1,00	20,60	1,00	1,00	78,40	0,06		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-26 A		06/01/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,30	1,00	1,00	78,50	0,13		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-26 B		06/01/2025	0,00%	0,00%	1,10	20,20	1,00	1,00	78,80	0,14		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-27 A		06/01/2025	0,00%	0,00%	1,20	20,00	1,00	1,00	78,90	0,13		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-27 B		06/01/2025	0,00%	0,00%	3,10	17,90	2,00	2,00	79,00	0,16		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-28 A		06/01/2025	0,00%	0,00%	1,00	19,50	1,00	1,00	79,50	0,10		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-28 B		06/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,40	1,00	1,00	78,50	0,17		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-29 A		06/01/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,40	2,00	1,00	78,40	0,12		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-29 B		06/01/2025	0,00%	0,00%	0,90	20,70	1,00	2,00	78,40	0,08		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-44 A		06/01/2025	0,00%	0,00%	0,50	21,10	2,00	1,00	78,40	0,13		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-44 B		06/01/2025	0,00%	0,00%	0,60	20,90	1,00	1,00	78,50	0,10		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-45 A		06/01/2025	0,00%	0,00%	0,30	20,70	1,00	1,00	79,00	0,13		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-45 B		06/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,60	1,00	1,00	78,40	0,11		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-134 B		06/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,60	1,00	2,00	78,30	0,09		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-30 A		06/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,10	2,00	1,00	78,80	0,00		0,00	0,00	



Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	C02 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15%,															
I-3 Biblioteca	PMG-30	B	06/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,30	1,00	1,00	78,60	0,11		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-31	A	06/01/2025	0,00%	0,00%	0,30	20,80	2,00	0,00	78,90	0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-31	B	06/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,00	2,00	0,00	78,90	0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-32	A	06/01/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,00	1,00	1,00	78,80	0,21		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-32	B	06/01/2025	0,00%	0,00%	0,80	20,50	1,00	1,00	78,70	0,14		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-33	A	06/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,20	1,00	1,00	78,70	0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-33	B	06/01/2025	0,00%	0,00%	3,30	18,10	1,00	1,00	78,70	0,06		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-34	A	06/01/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,90	1,00	1,00	78,80	0,08		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-34	B	06/01/2025	0,00%	0,00%	1,40	20,10	1,00	1,00	78,60	0,09		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-35	A	06/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,30	1,00	1,00	78,60	0,10		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-35	B	06/01/2025	0,00%	0,00%	1,50	20,10	1,00	1,00	78,40	0,11		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-36	A	06/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,20	1,00	1,00	78,70	0,00		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-36	B	06/01/2025	0,00%	0,00%	1,90	19,30	2,00	1,00	78,80	0,23		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-37	A	06/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,30	1,00	1,00	78,60	0,11		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-37	B	06/01/2025	0,00%	0,00%	1,20	20,40	1,00	1,00	78,50	0,12		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-38	A	06/01/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,10	1,00	0,00	78,70	0,00		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-38	B	06/01/2025	0,00%	0,00%	0,40	20,90	1,00	1,00	78,70	0,13		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-39	A	06/01/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,10	1,00	1,00	78,70	0,17		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-39	B	06/01/2025	0,00%	0,00%	7,80	12,80	2,00	1,00	79,40	0,13		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-40	A	06/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,20	1,00	1,00	78,60	0,08		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-40	B	06/01/2025	0,00%	0,00%	0,30	21,00	1,00	1,00	78,70	0,21		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-41	A	06/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,10	1,00	1,00	78,80	0,13		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-41	B	06/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,10	1,00	0,00	78,80	0,13		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-42	A	06/01/2025	0,00%	0,00%	0,60	20,60	1,00	0,00	78,80	0,08		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-42	B	06/01/2025	0,00%	0,00%	4,50	17,30	1,00	1,00	78,20	0,02		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-43	A	06/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,90	2,00	0,00	79,00	0,10		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-43	B	06/01/2025	0,00%	0,00%	0,60	20,60	1,00	0,00	78,80	0,06		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-132	A	06/01/2025	0,00%	0,00%	0,30	20,60	2,00	0,00	79,10	0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-132	B	06/01/2025	0,00%	0,00%	0,30	20,60	2,00	0,00	79,10	-0,05		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-133	A	06/01/2025	0,00%	0,00%	0,50	20,70	1,00	1,00	78,90	0,11		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-133	B	06/01/2025	0,00%	0,00%	0,60	20,60	2,00	2,00	78,80	0,09		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-63	A	08/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,50	1,00	2,00	78,50	0,13		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-63	B	08/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,50	1,00	2,00	78,40	0,17		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-64	A	08/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,40	1,00	2,00	78,50	0,09		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-64	B	08/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,50	2,00	2,00	78,50	0,13		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-65	A	08/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,60	2,00	2,00	78,40	0,10		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-65	B	08/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,60	1,00	1,00	78,40	-0,40		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-66	A	08/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,50	2,00	2,00	78,40	0,17		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-66	B	08/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,60	2,00	2,00	78,40	0,15		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-67	A	08/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	1,00	1,00	78,70	0,13		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-67	B	08/01/2025	0,00%	0,00%	0,40	20,90	1,00	1,00	78,70	0,16		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-68	A	08/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,40	1,00	2,00	78,60	0,13		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-68	B	08/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,40	2,00	2,00	78,50	0,12		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-69	A	08/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,70	1,00	1,00	78,30	0,13		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-69	B	08/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,70	1,00	1,00	78,30	0,06		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-77	A	08/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,20	1,00	1,00	78,70	-0,26		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-77	B	08/01/2025	0,00%	0,00%	1,10	17,40	1,00	2,00	81,50	0,01		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-78	A	08/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,10	1,00	2,00	78,90	0,13		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-78	B	08/01/2025	0,00%	0,00%	0,30	20,80	1,00	2,00	78,90	0,13		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-79	A	08/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	1,00	2,00	78,70	0,14		0,00	0,00	



Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	CO2 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15%,															
Edifício I-4	PMG-79	B	08/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,40	1,00	1,00	78,60	0,21		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-80	A	08/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	1,00	2,00	78,60	0,16		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-80	B	08/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,40	1,00	2,00	78,60	0,26		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-81	A	09/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	1,00	2,00	78,60	0,17		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-81	B	09/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,40	1,00	2,00	78,60	0,13		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-144	B	08/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	1,00	2,00	78,70	0,03		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-145	B	08/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,20	1,00	2,00	78,70	0,01		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-146	B	09/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	1,00	1,00	78,70	0,14		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-147	B	08/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,20	1,00	1,00	78,70	0,11		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-148	B	08/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,60	1,00	2,00	78,40	0,14		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-149	B	08/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,60	2,00	2,00	78,30	0,13		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-150	B	08/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,70	1,00	2,00	78,30	0,08		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-151	B	08/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,40	1,00	1,00	78,50	0,24		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-46	A	08/01/2025	0,00%	0,00%	0,50	20,90	1,00	2,00	78,60	0,18		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-46	B	08/01/2025	0,00%	0,00%	3,90	17,50	1,00	2,00	78,60	0,21		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-47	A	08/01/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,00	2,00	2,00	78,80	0,18		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-47	B	08/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,50	2,00	2,00	78,50	0,24		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-48	A	08/01/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,20	2,00	1,00	78,50	0,11		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-48	B	08/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,50	1,00	2,00	78,40	0,18		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-49	A	08/01/2025	0,00%	0,00%	0,40	21,00	1,00	2,00	78,60	0,23		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-49	B	08/01/2025	0,00%	0,00%	5,40	16,20	1,00	2,00	78,40	0,23		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-50	A	08/01/2025	0,00%	0,00%	0,30	21,00	1,00	2,00	78,70	0,22		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-50	B	08/01/2025	0,00%	0,00%	1,10	20,50	2,00	2,00	78,40	0,23		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-51	A	08/01/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,20	1,00	1,00	78,60	0,11		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-51	B	08/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	1,00	1,00	78,70	0,13		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-52	A	08/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,20	1,00	1,00	78,70	0,07		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-52	B	08/01/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,00	1,00	0,00	78,80	-0,02		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-53	A	08/01/2025	0,00%	0,00%	1,70	19,00	1,00	0,00	79,30	0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-53	B	08/01/2025	2,00%	2,00%	0,50	20,40	1,00	0,00	77,20	0,07		0,00	100,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-54	A	08/01/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,70	1,00	1,00	79,00	0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-54	B	08/01/2025	0,30%	0,30%	3,70	15,70	1,00	0,00	80,30	0,15		0,00	11,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-55	A	08/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,10	1,00	0,00	78,80	0,05		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-55	B	08/01/2025	0,00%	0,00%	3,80	16,70	1,00	0,00	79,50	-0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-56	A	08/01/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,90	2,00	2,00	78,90	0,18		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-56	B	08/01/2025	0,00%	0,00%	1,20	20,40	2,00	2,00	78,40	0,20		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-57	A	08/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,30	1,00	2,00	78,60	0,23		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-57	B	08/01/2025	0,00%	0,00%	0,70	20,50	1,00	2,00	78,70	0,18		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-58	A	08/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,30	1,00	2,00	78,70	0,18		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-58	B	08/01/2025	0,00%	0,00%	1,20	20,30	1,00	2,00	78,50	0,18		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-59	A	08/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,20	1,00	2,00	78,70	0,18		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-59	B	08/01/2025	0,00%	0,00%	4,00	16,70	1,00	2,00	79,30	0,24		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-60	A	08/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,90	1,00	2,00	78,90	0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-60	B	08/01/2025	0,00%	0,00%	3,00	16,10	1,00	2,00	80,90	0,20		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-61	A	08/01/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,90	1,00	2,00	78,90	0,14		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-61	B	08/01/2025	0,00%	0,00%	6,20	14,00	2,00	2,00	79,80	0,14		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-137	B	08/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,60	1,00	2,00	78,40	0,15		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-138	B	08/01/2025	0,00%	0,00%	3,50	17,80	1,00	2,00	78,60	0,14		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-139	A	08/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,10	1,00	0,00	78,80	-0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-139	B	08/01/2025	8,50%	8,50%	1,90	19,10	1,00	1,00	70,60	0,08		0,00	100,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-140	A	08/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,10	1,00	1,00	78,80	0,12		0,00	0,00	



Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	CO2 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
Conjunto Laboratorial	PMG-140	B	08/01/2025	1,30%	1,30%	0,30	20,80	1,00	1,00	77,70	0,08		0,00	61,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-141	B	08/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	2,00	1,00	78,60	0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-62	A	08/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	1,00	2,00	78,60	0,16		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-62	B	08/01/2025	0,10%	0,50%	0,10	21,30	1,00	2,00	78,60	0,27		0,00	7,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-01	A	10/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,60	2,00	0,00	78,30	0,05		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-01	B	10/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,60	1,00	0,00	78,30	0,09		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-02	A	10/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,40	1,00	1,00	78,40	0,06		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-02	B	10/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,50	1,00	0,00	78,40	0,08		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-03	A	10/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,40	1,00	1,00	78,50	-0,02		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-03	B	10/01/2025	0,00%	0,00%	1,50	20,40	1,00	0,00	78,10	0,11		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-04	A	10/01/2025	0,00%	0,00%	0,30	21,20	1,00	1,00	78,50	0,08		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-04	B	10/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,40	1,00	1,00	78,50	0,05		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-05	A	07/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,50	2,00	2,00	78,40	0,11		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-05	B	07/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,60	1,00	1,00	78,40	0,03		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-06	A	07/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,60	1,00	2,00	78,40	-0,82		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-06	B	07/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,60	2,00	1,00	78,30	0,08		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-07	A	07/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,50	1,00	2,00	78,40	0,13		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-07	B	07/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,60	1,00	1,00	78,30	0,21		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-08	A	07/01/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,20	1,00	2,00	78,50	0,14		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-08	B	07/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,60	1,00	0,00	78,30	0,08		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-09	A	07/01/2025	0,00%	0,00%	0,90	20,50	1,00	2,00	78,60	0,09		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-09	B	07/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	1,00	1,00	78,70	0,17		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-10	A	07/01/2025	0,00%	0,00%	0,50	20,90	1,00	2,00	78,60	0,03		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-10	B	07/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	2,00	2,00	78,60	0,24		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-84	A	07/01/2025	0,00%	0,00%	0,40	20,80	2,00	1,00	78,80	0,12		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-84	B	07/01/2025	0,00%	0,00%	8,50	13,10	1,00	1,00	78,40	0,07		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-85	A	07/01/2025	0,00%	0,00%	1,40	19,90	1,00	1,00	78,80	0,23		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-85	B	07/01/2025	0,00%	0,00%	3,90	19,00	2,00	1,00	77,10	0,01		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-86	A	07/01/2025	0,00%	0,00%	0,30	20,80	1,00	1,00	78,90	0,08		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-86	B	07/01/2025	0,00%	0,00%	0,90	20,20	1,00	1,00	78,90	0,13		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-87	A	07/01/2025	0,00%	0,00%	2,60	17,60	1,00	1,00	79,90	0,01		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-87	B	07/01/2025	0,00%	0,00%	3,10	17,60	1,00	1,00	79,30	0,04		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-152	A	07/01/2025	0,00%	0,00%	0,30	20,90	1,00	2,00	78,80	0,13		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-152	B	07/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,20	1,00	1,00	78,70	0,23		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-153	B	10/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,60	1,00	0,00	78,30	0,05		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-154	B	10/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,50	1,00	1,00	78,50	0,11		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-155	B	10/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,50	1,00	1,00	78,50	0,08		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-156	B	07/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,60	2,00	2,00	78,30	0,13		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-157	B	07/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,70	2,00	2,00	78,30	0,12		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-70	A	09/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,00	1,00	1,00	78,90	0,13		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-70	B	09/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,10	1,00	2,00	78,80	0,08		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-71	A	09/01/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,80	1,00	1,00	79,00	0,01		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-71	B	09/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,10	1,00	0,00	78,80	-0,04		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-72	A	09/01/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,00	1,00	2,00	78,90	0,12		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-72	B	09/01/2025	0,00%	0,00%	0,90	19,90	2,00	1,00	79,20	0,15		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-73	A	09/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,00	2,00	1,00	78,90	0,11		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-73	B	09/01/2025	0,00%	0,00%	0,70	20,60	2,00	1,00	78,80	0,26		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-74	A	09/01/2025	0,00%	0,00%	0,30	20,60	1,00	1,00	79,00	0,13		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-74	B	09/01/2025	0,00%	0,00%	0,50	18,90	1,00	1,00	80,60	0,12		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-75	A	09/01/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,00	1,00	1,00	78,80	0,13		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	C02 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
Enfermaria	PMG-75	B	09/01/2025	0,00%	0,00%	1,40	18,30	1,00	1,00	80,30	0,08		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-76	A	09/01/2025	0,00%	0,00%	0,30	20,70	1,00	2,00	79,00	0,04		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-76	B	09/01/2025	0,00%	0,00%	1,70	17,30	1,00	2,00	81,10	0,09		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-165	A	09/01/2025	0,00%	0,00%	0,30	20,90	1,00	2,00	78,80	-0,27		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-165	B	09/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,10	1,00	1,00	78,80	-0,31		0,00	0,00	
CAT	PMG-82	A	09/01/2025	0,00%	0,00%	1,70	19,50	1,00	0,00	78,80	0,08		0,00	0,00	
CAT	PMG-82	B	09/01/2025	0,00%	0,00%	4,60	16,70	1,00	0,00	78,70	0,05		0,00	0,00	
CAT	PMG-83	A	09/01/2025	0,00%	0,00%	1,90	19,00	1,00	0,00	79,10	0,03		0,00	0,00	
CAT	PMG-83	B	09/01/2025	0,00%	0,00%	4,30	16,80	1,00	0,00	78,90	0,02		0,00	0,00	
CAT	PMG-94	A	09/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,70	1,00	0,00	79,20	0,11		0,00	0,00	
CAT	PMG-94	B	09/01/2025	0,00%	0,00%	3,30	18,00	2,00	1,00	78,80	0,00		0,00	0,00	
CAT	PMG-95	A	09/01/2025	0,00%	0,00%	1,20	19,90	1,00	1,00	79,00	-0,03		0,00	0,00	
CAT	PMG-95	B	09/01/2025	0,00%	0,00%	1,30	20,10	1,00	0,00	78,50	0,03		0,00	0,00	
CAT	PMG-96	A	09/01/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,00	1,00	0,00	78,80	0,08		0,00	0,00	
CAT	PMG-96	B	09/01/2025	0,00%	0,00%	5,00	17,00	1,00	0,00	78,00	0,03		0,00	0,00	
CAT	PMG-97	A	09/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,80	1,00	1,00	79,10	0,09		0,00	0,00	
CAT	PMG-97	B	09/01/2025	0,00%	0,00%	3,40	18,20	1,00	0,00	78,40	-0,01		0,00	0,00	
CAT	PMG-98	A	09/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,90	1,00	1,00	79,00	0,09		0,00	0,00	
CAT	PMG-98	B	09/01/2025	0,00%	0,00%	0,30	20,90	1,00	1,00	78,80	0,09		0,00	0,00	
CAT	PMG-160	A	09/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,70	2,00	0,00	79,10	0,16		0,00	0,00	
CAT	PMG-160	B	09/01/2025	0,00%	0,00%	3,60	17,50	2,00	0,00	78,90	0,04		0,00	0,00	
CAT	PMG-161	A	09/01/2025	0,00%	0,00%	2,30	18,80	1,00	0,00	78,90	0,05		0,00	0,00	
CAT	PMG-161	B	09/01/2025	0,00%	0,00%	5,20	16,30	1,00	0,00	78,50	0,08		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-88	A	10/01/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,00	1,00	1,00	78,80	0,06		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-88	B	10/01/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,10	1,00	1,00	78,70	-0,01		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-89	A	10/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,20	1,00	1,00	78,70	0,18		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-89	B	10/01/2025	0,00%	0,00%	0,70	20,80	1,00	1,00	78,50	0,01		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-90	A	10/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,20	1,00	1,00	78,70	0,03		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-90	B	10/01/2025	0,00%	0,00%	0,50	20,90	1,00	1,00	78,60	0,12		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-91	A	10/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,20	1,00	1,00	78,70	0,07		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-91	B	10/01/2025	0,00%	0,00%	1,60	19,90	1,00	1,00	78,50	0,03		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-92	A	10/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,10	1,00	1,00	78,80	0,08		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-92	B	10/01/2025	0,00%	0,00%	0,70	20,60	1,00	1,00	78,70	0,01		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-93	A	10/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,10	1,00	1,00	78,80	-0,03		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-93	B	10/01/2025	0,00%	0,00%	0,90	20,30	1,00	1,00	78,80	-0,08		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-102		06/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,40	1,00	1,00	78,60	0,13		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-103		06/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	1,00	1,00	78,70	0,16		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-104		06/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	2,00	2,00	78,60	0,13		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-105		06/01/2025	0,00%	0,00%	1,00	20,40	1,00	1,00	78,60	0,14		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-106		06/01/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,20	1,00	1,00	78,60	0,12		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-107		06/01/2025	0,00%	0,00%	2,30	18,00	2,00	1,00	79,70	0,09		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-108		06/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,50	2,00	1,00	78,40	0,12		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-109	A	06/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,60	1,00	1,00	78,30	0,12		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-109	B	06/01/2025	0,00%	0,00%	0,70	21,10	1,00	1,00	78,20	0,08		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-110	A	06/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	1,00	2,00	78,60	0,15		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-110	B	06/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	1,00	2,00	78,70	0,28		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-111	A	06/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,40	1,00	1,00	78,60	0,12		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-111	B	06/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,30	1,00	1,00	78,60	0,14		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-112		06/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,80	2,00	1,00	78,20	0,09		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-162	A	06/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,30	2,00	2,00	78,60	0,04		0,00	0,00	



Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	CO2 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
Ginásio Poliesportivo	PMG-162	B	06/01/2025	0,00%	0,00%	1,00	20,30	1,00	1,00	78,70	-0,09		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-166	A	06/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,40	1,00	1,00	78,60	0,13		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-166	B	06/01/2025	0,00%	0,00%	1,20	18,60	1,00	1,00	80,20	0,18		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-119	A	06/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,40	1,00	2,00	78,50	0,12		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-119	B	06/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,40	1,00	1,00	78,50	0,08		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-119	C	06/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,50	2,00	2,00	78,50	0,12		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-120	A	06/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,40	1,00	1,00	78,50	-0,05		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-120	B	06/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,40	1,00	2,00	78,60	0,11		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-120	C	06/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,40	1,00	1,00	78,50	0,17		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-163	B	06/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,50	1,00	1,00	78,50	0,21		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-164	B	06/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,40	2,00	2,00	78,60	0,08		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-164	C	06/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,40	1,00	2,00	78,60	0,15		0,00	0,00	
Transportes	PMG-121	A	09/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,50	1,00	1,00	78,40	0,11		0,00	0,00	
Transportes	PMG-121	B	09/01/2025	0,00%	0,00%	3,00	17,60	1,00	1,00	79,40	-0,04		0,00	0,00	
Transportes	PMG-122	A	09/01/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,20	1,00	1,00	78,60	0,03		0,00	0,00	
Transportes	PMG-122	B	09/01/2025	0,00%	0,00%	4,60	17,10	1,00	1,00	78,20	0,08		0,00	0,00	
Transportes	PMG-123	A	09/01/2025	0,00%	0,00%	0,50	21,00	1,00	1,00	78,50	0,07		0,00	0,00	
Transportes	PMG-123	B	09/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,30	1,00	0,00	78,60	0,16		0,00	0,00	
Transportes	PMG-124	A	09/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,20	1,00	1,00	78,70	0,13		0,00	0,00	
Transportes	PMG-124	B	09/01/2025	0,00%	0,00%	2,50	19,40	1,00	1,00	78,20	0,14		0,00	0,00	
Transportes	PMG-158	B	09/01/2025	0,00%	0,00%	4,60	21,30	1,00	1,00	74,00	0,00		0,00	0,00	
Transportes	PMG-159	B	09/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,40	1,00	1,00	78,50	0,08		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-125	A	09/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,40	1,00	1,00	78,50	0,13		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-125	B	09/01/2025	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	Não medido. Água no momento de medição.
Posto Guarda Universitário	PMG-126	A	09/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	1,00	2,00	78,60	0,17		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-126	B	09/01/2025	0,00%	0,00%	3,40	15,80	1,00	3,00	80,80	0,23		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-127	A	09/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,10	1,00	2,00	78,80	0,13		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-127	B	09/01/2025	0,00%	0,00%	1,60	20,10	1,00	2,00	78,40	0,12		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-128	A	09/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,40	1,00	2,00	78,60	0,11		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-128	B	09/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,40	1,00	2,00	78,60	0,08		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-129	A	09/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,40	1,00	2,00	78,60	0,18		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-129	B	09/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	2,00	3,00	78,70	-0,03		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-130	A	09/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	0,00	2,00	78,60	0,12		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-130	B	09/01/2025	0,00%	0,00%	2,70	18,70	1,00	2,00	78,60	-0,06		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-131	A	09/01/2025	0,00%	0,00%	0,40	20,90	1,00	2,00	78,80	0,14		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-131	B	09/01/2025	0,00%	0,00%	0,90	20,50	1,00	2,00	78,60	0,35		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-16	A	15/01/2025	0,00%	0,00%	2,00	19,70	1,00	2,00	78,40	0,16		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-16	B	15/01/2025	0,00%	0,00%	2,30	19,20	1,00	2,00	78,50	0,23		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-17	A	15/01/2025	0,00%	0,00%	0,30	21,20	2,00	2,00	78,50	0,15		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-17	B	15/01/2025	0,00%	0,00%	0,70	20,70	2,00	2,00	78,60	0,14		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-18	A	15/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,50	2,00	0,00	79,40	0,08		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-18	B	15/01/2025	0,00%	0,00%	1,70	19,20	2,00	0,00	79,10	-0,09		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-20	A	15/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,00	1,00	1,00	78,90	0,11		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-20	B	15/01/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,00	1,00	1,00	78,90	0,08		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-22	A	15/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,90	1,00	0,00	79,00	-0,01		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-22	B	15/01/2025	0,00%	0,00%	2,10	18,70	1,00	0,00	79,10	0,13		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-23	A	15/01/2025	0,00%	0,00%	0,40	20,60	2,00	0,00	79,00	0,08		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-23	B	15/01/2025	0,00%	0,00%	1,00	20,10	2,00	0,00	78,90	0,05		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-113	A	15/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,60	1,00	0,00	79,30	0,04		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-113	B	15/01/2025	0,00%	0,00%	1,30	19,40	2,00	0,00	79,20	-0,03		0,00	0,00	



Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	C02 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
Edifício I 1	PMG-114 A	15/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,90	1,00	0,00	79,00	0,00			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-114 B	15/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,00	2,00	0,00	79,00	0,06			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-115 A	15/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,70	1,00	0,00	79,20	-0,04			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-115 B	15/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	20,90	2,00	0,00	79,10	-0,03			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-11 A	15/01/2025	0,00%	0,00%	0,90	20,90	1,00	2,00	78,20	0,07			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-11 B	15/01/2025	0,00%	0,00%	0,80	20,60	1,00	1,00	78,50	0,18			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-12 A	15/01/2025	0,00%	0,00%	2,00	19,60	1,00	2,00	78,50	0,14			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-12 B	15/01/2025	0,00%	0,00%	1,00	20,50	1,00	2,00	78,50	0,10			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-13 A	15/01/2025	0,00%	0,00%	1,10	20,40	1,00	2,00	78,50	0,16			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-13 B	15/01/2025	0,00%	0,00%	1,60	19,70	1,00	1,00	78,70	0,18			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-14 A	15/01/2025	0,00%	0,00%	1,80	19,20	1,00	2,00	78,90	0,13			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-14 B	15/01/2025	0,00%	0,00%	2,80	17,90	1,00	1,00	79,30	0,13			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-15 A	15/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,50	1,00	2,00	78,40	0,20			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-15 B	15/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,60	1,00	1,00	78,40	0,18			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-19 A	15/01/2025	0,00%	0,00%	0,40	21,10	1,00	2,00	78,50	0,09			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-19 B	15/01/2025	0,00%	0,00%	0,60	20,70	1,00	1,00	78,70	0,15			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-21 A	15/01/2025	0,00%	0,00%	0,80	20,90	1,00	1,00	78,30	0,09			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-21 B	15/01/2025	0,00%	0,00%	1,50	19,90	1,00	1,00	78,60	0,03			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-24 A	15/01/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,30	1,00	2,00	78,50	0,21			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-24 B	15/01/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,30	1,00	2,00	78,50	0,14			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-135 A	15/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,80	1,00	0,00	79,10	0,03			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-135 B	15/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,00	1,00	0,00	79,00	0,01			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-136 B	15/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,90	2,00	0,00	79,00	0,03			0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-25 A	14/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,30	1,00	1,00	78,60	0,14			0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-25 B	14/01/2025	0,00%	0,00%	0,80	20,70	1,00	1,00	78,50	0,13			0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-26 A	14/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,30	1,00	1,00	78,50	0,17			0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-26 B	14/01/2025	0,00%	0,00%	0,60	20,70	1,00	1,00	78,70	0,09			0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-27 A	14/01/2025	0,00%	0,00%	0,70	20,60	1,00	1,00	78,60	0,01			0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-27 B	14/01/2025	0,00%	0,00%	2,90	18,50	2,00	1,00	78,60	0,22			0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-28 A	14/01/2025	0,00%	0,00%	0,90	19,40	1,00	2,00	79,70	0,05			0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-28 B	14/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,40	1,00	1,00	78,50	0,13			0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-29 A	14/01/2025	0,00%	0,00%	0,30	21,30	1,00	2,00	78,50	0,07			0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-29 B	14/01/2025	0,00%	0,00%	0,90	20,70	2,00	2,00	78,50	0,17			0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-44 A	14/01/2025	0,00%	0,00%	0,30	21,30	1,00	2,00	78,40	0,13			0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-44 B	14/01/2025	0,00%	0,00%	0,50	21,10	2,00	2,00	78,30	0,09			0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-45 A	14/01/2025	0,00%	0,00%	0,30	21,00	1,00	2,00	78,70	0,14			0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-45 B	14/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,50	2,00	2,00	78,40	0,18			0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-134 B	14/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,60	1,00	2,00	78,40	0,12			0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-30 A	14/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,80	1,00	0,00	79,10	-0,04			0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-30 B	14/01/2025	0,00%	0,00%	1,20	19,90	2,00	0,00	78,90	-0,03			0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-31 A	14/01/2025	0,00%	0,00%	0,30	20,50	2,00	0,00	79,20	-0,02			0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-31 B	14/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,80	1,00	0,00	79,10	0,07			0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-32 A	14/01/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,90	1,00	0,00	78,90	-0,02			0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-32 B	14/01/2025	0,00%	0,00%	0,80	20,30	1,00	0,00	78,90	0,16			0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-33 A	14/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,00	1,00	1,00	78,90	-0,01			0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-33 B	14/01/2025	0,00%	0,00%	3,30	17,90	1,00	0,00	78,80	-0,03			0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-34 A	14/01/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,80	1,00	1,00	79,00	-0,03			0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-34 B	14/01/2025	0,00%	0,00%	0,90	20,40	1,00	1,00	78,70	0,05			0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-35 A	14/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,20	1,00	1,00	78,70	0,07			0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-35 B	14/01/2025	0,00%	0,00%	1,10	20,50	2,00	1,00	78,40	0,12			0,00	0,00	



Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	C02 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
I-3 Biblioteca	PMG-36 A	14/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,20	2,00	1,00	78,70	0,11			0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-36 B	14/01/2025	0,00%	0,00%	2,30	18,70	1,00	1,00	79,00	0,16			0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-37 A	14/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,30	1,00	1,00	78,70	0,05			0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-37 B	14/01/2025	0,00%	0,00%	1,00	20,50	1,00	1,00	78,60	0,16			0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-38 A	14/01/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,00	2,00	0,00	78,80	0,08			0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-38 B	14/01/2025	0,00%	0,00%	0,30	20,80	2,00	1,00	78,80	0,10			0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-39 A	14/01/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,00	2,00	0,00	78,80	0,06			0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-39 B	14/01/2025	0,00%	0,00%	7,40	13,30	2,00	1,00	79,30	0,05			0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-40 A	14/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,10	2,00	1,00	78,70	0,08			0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-40 B	14/01/2025	0,00%	0,00%	0,30	21,00	1,00	1,00	78,70	0,09			0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-41 A	14/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,90	2,00	0,00	79,00	0,02			0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-41 B	14/01/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,90	1,00	0,00	78,90	-0,01			0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-42 A	14/01/2025	0,00%	0,00%	0,60	20,50	2,00	0,00	78,90	0,03			0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-42 B	14/01/2025	0,00%	0,00%	5,30	16,60	2,00	0,00	78,10	0,01			0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-43 A	14/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,80	1,00	0,00	79,10	0,04			0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-43 B	14/01/2025	0,00%	0,00%	0,40	20,70	1,00	0,00	78,90	-0,05			0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-132 A	14/01/2025	0,00%	0,00%	0,40	20,10	2,00	0,00	79,40	0,00			0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-132 B	14/01/2025	0,00%	0,00%	0,30	20,40	1,00	0,00	79,30	-0,06			0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-133 A	14/01/2025	0,00%	0,00%	0,60	20,30	1,00	1,00	79,20	0,11			0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-133 B	14/01/2025	0,00%	0,00%	0,30	20,90	1,00	1,00	78,70	-0,03			0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-63 A	17/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,10	1,00	1,00	78,80	-0,02			0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-63 B	17/01/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,10	1,00	0,00	78,80	-0,04			0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-64 A	17/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,10	1,00	1,00	78,80	-0,08			0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-64 B	17/01/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,00	1,00	1,00	78,80	-0,25			0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-65 A	17/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,80	1,00	1,00	79,10	-0,10			0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-65 B	17/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,10	1,00	1,00	78,80	-0,16			0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-66 A	17/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,00	1,00	1,00	78,80	-0,03			0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-66 B	17/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,20	1,00	1,00	78,80	-0,10			0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-67 A	16/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	3,00	1,00	78,60	0,09			0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-67 B	16/01/2025	0,00%	0,00%	0,50	20,90	4,00	1,00	78,60	0,17			0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-68 A	17/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,10	1,00	0,00	78,90	-0,13			0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-68 B	17/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,10	1,00	0,00	78,90	-0,13			0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-69 A	17/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,10	2,00	1,00	78,80	-0,12			0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-69 B	17/01/2025	0,00%	0,00%	1,40	19,40	1,00	1,00	79,10	-0,13			0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-77 A	16/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,40	3,00	2,00	78,60	0,18			0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-77 B	16/01/2025	0,00%	0,00%	0,90	19,90	3,00	2,00	79,20	0,16			0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-78 A	16/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	3,00	1,00	78,70	0,09			0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-78 B	16/01/2025	0,00%	0,00%	1,10	20,00	2,00	1,00	78,90	0,13			0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-79 A	17/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,90	1,00	0,00	79,00	-0,12			0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-79 B	17/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,00	1,00	0,00	79,00	-0,04			0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-80 A	17/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,00	2,00	0,00	78,90	-0,13			0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-80 B	17/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,00	1,00	0,00	78,90	-0,08			0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-81 A	16/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,40	2,00	1,00	78,60	0,13			0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-81 B	16/01/2025	0,00%	0,00%	0,40	21,10	2,00	1,00	78,50	0,12			0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-144 B	16/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,40	3,00	1,00	78,60	0,13			0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-145 B	16/01/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,10	2,00	2,00	78,80	0,13			0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-146 B	16/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,40	3,00	2,00	78,50	0,07			0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-147 B	16/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,40	4,00	1,00	78,60	0,03			0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-148 B	17/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,20	1,00	1,00	78,70	-0,03			0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-149 B	17/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,20	1,00	1,00	78,70	-0,10			0,00	0,00	



Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	CO2 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
Edifício I-4	PMG-150 B		17/01/2025	0,00%	0,00%	3,80	15,80	1,00	1,00	80,40	-0,08		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-151 B		17/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,10	1,00	1,00	78,90	-0,20		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-46 A		16/01/2025	0,00%	0,00%	0,40	20,90	4,00	2,00	78,70	0,11		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-46 B		16/01/2025	0,00%	0,00%	3,80	17,70	4,00	1,00	78,50	0,07		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-47 A		16/01/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,90	4,00	2,00	78,90	0,05		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-47 B		16/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,40	4,00	1,00	78,60	-0,02		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-48 A		17/01/2025	0,00%	0,00%	0,30	21,00	1,00	1,00	78,70	-0,05		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-48 B		17/01/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,10	1,00	1,00	78,70	-0,04		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-49 A		17/01/2025	0,00%	0,00%	0,40	20,80	1,00	1,00	78,80	-0,13		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-49 B		17/01/2025	0,00%	0,00%	4,60	17,00	1,00	1,00	78,40	0,02		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-50 A		17/01/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,00	1,00	1,00	78,80	-0,09		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-50 B		17/01/2025	0,00%	0,00%	1,80	19,70	2,00	1,00	78,50	-0,09		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-51 A		16/01/2025	0,00%	0,00%	0,30	20,90	1,00	1,00	78,80	0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-51 B		16/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,00	1,00	1,00	78,90	-0,10		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-52 A		16/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,00	1,00	0,00	78,90	0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-52 B		16/01/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,90	1,00	1,00	78,90	-0,01		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-53 A		16/01/2025	0,00%	0,00%	0,70	20,30	2,00	0,00	79,10	0,05		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-53 B		16/01/2025	1,30%	1,30%	0,60	19,90	2,00	1,00	78,20	0,11		0,00	73,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-54 A		16/01/2025	0,00%	0,00%	0,30	20,30	1,00	0,00	79,50	0,02		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-54 B		16/01/2025	0,50%	0,50%	4,00	15,20	2,00	0,00	80,30	0,03		0,00	32,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-55 A		16/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,80	2,00	1,00	79,10	0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-55 B		16/01/2025	0,00%	0,00%	5,10	15,00	1,00	0,00	79,90	0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-56 A		16/01/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,70	6,00	1,00	79,20	0,11		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-56 B		16/01/2025	0,00%	0,00%	1,20	20,40	6,00	1,00	78,40	0,06		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-57 A		16/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,10	1,00	1,00	78,80	0,06		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-57 B		16/01/2025	0,00%	0,00%	1,20	20,00	1,00	1,00	78,80	0,13		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-58 A		16/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,10	2,00	1,00	78,80	0,09		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-58 B		16/01/2025	0,00%	0,00%	1,60	19,90	4,00	1,00	78,50	0,23		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-59 A		16/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,10	7,00	2,00	78,80	-0,01		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-59 B		16/01/2025	0,00%	0,00%	4,30	17,50	8,00	1,00	78,30	-0,01		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-60 A		16/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,10	8,00	1,00	78,80	0,07		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-60 B		16/01/2025	0,00%	0,00%	3,30	15,90	8,00	1,00	80,80	0,07		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-61 A		16/01/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,80	7,00	1,00	79,00	0,06		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-61 B		16/01/2025	0,00%	0,00%	8,00	12,00	7,00	2,00	80,00	-0,18		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-137 B		17/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,30	1,00	1,00	78,70	-0,09		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-138 B		17/01/2025	0,00%	0,00%	3,90	17,70	1,00	1,00	78,40	-0,04		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-139 A		16/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,00	1,00	0,00	79,00	-0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-139 B		16/01/2025	14,60%	14,60%	6,20	12,30	1,00	3,00	66,90	0,11		0,00	100,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-140 A		16/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,90	2,00	0,00	79,00	0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-140 B		16/01/2025	1,80%	1,80%	0,40	20,70	1,00	0,00	77,20	0,01		0,00	50,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-141 B		16/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,10	1,00	1,00	78,80	0,12		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-62 A		16/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,10	1,00	1,00	78,90	0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-62 B		16/01/2025	0,00%	2,00%	0,00	21,00	1,00	1,00	79,00	0,17		0,00	11,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-01 A		15/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,40	1,00	1,00	78,60	0,10		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-01 B		15/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,50	1,00	2,00	78,50	0,17		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-02 A		15/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,40	1,00	2,00	78,50	0,14		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-02 B		15/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,50	2,00	2,00	78,50	0,15		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-03 A		15/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,40	1,00	1,00	78,50	0,11		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-03 B		15/01/2025	0,00%	0,00%	2,20	19,60	1,00	2,00	78,20	0,24		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-04 A		15/01/2025	0,00%	0,00%	0,30	21,30	1,00	2,00	78,50	0,15		0,00	0,00	



Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	CO2 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-04 B	15/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,50	1,00	2,00	78,40	0,16			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-05 A	15/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,40	1,00	2,00	78,50	0,13			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-05 B	15/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,50	1,00	2,00	78,50	0,22			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-06 A	15/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,50	1,00	2,00	78,40	0,15			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-06 B	15/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,60	1,00	2,00	78,40	0,15			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-07 A	15/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,50	1,00	2,00	78,50	0,13			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-07 B	15/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,60	1,00	2,00	78,40	0,03			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-08 A	15/01/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,10	1,00	1,00	78,70	0,17			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-08 B	15/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,40	1,00	1,00	78,60	0,11			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-09 A	15/01/2025	0,00%	0,00%	1,10	20,30	1,00	1,00	78,60	0,09			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-09 B	15/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	1,00	1,00	78,70	0,13			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-10 A	15/01/2025	0,00%	0,00%	0,50	20,60	1,00	1,00	78,90	0,08			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-10 B	15/01/2025	0,00%	0,00%	2,20	19,00	1,00	1,00	78,80	0,08			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-84 A	15/01/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,10	1,00	1,00	78,70	0,11			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-84 B	15/01/2025	0,00%	0,00%	4,60	16,90	2,00	1,00	78,50	0,19			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-85 A	15/01/2025	0,00%	0,00%	0,70	20,70	1,00	0,00	78,60	0,13			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-85 B	15/01/2025	0,00%	0,00%	1,90	20,10	1,00	1,00	78,00	0,08			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-86 A	15/01/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,90	1,00	1,00	78,90	0,08			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-86 B	15/01/2025	0,00%	0,00%	1,10	19,60	1,00	1,00	79,30	0,05			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-87 A	15/01/2025	0,00%	0,00%	2,80	16,80	1,00	2,00	80,40	0,10			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-87 B	15/01/2025	0,00%	0,00%	2,80	17,70	1,00	1,00	79,50	0,05			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-152 A	15/01/2025	0,00%	0,00%	0,30	20,90	1,00	2,00	78,80	0,08			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-152 B	15/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,30	1,00	1,00	78,70	0,03			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-153 B	15/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,50	1,00	1,00	78,40	0,17			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-154 B	15/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,50	1,00	2,00	78,50	-0,01			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-155 B	15/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,50	2,00	1,00	78,40	0,11			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-156 B	15/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,60	1,00	2,00	78,40	0,14			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-157 B	15/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,60	1,00	2,00	78,40	0,13			0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-70 A	17/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,20	1,00	2,00	78,70	-0,02			0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-70 B	17/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	2,00	2,00	78,70	-0,02			0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-71 A	17/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,10	1,00	2,00	78,80	-0,11			0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-71 B	17/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,10	1,00	2,00	78,80	0,00			0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-72 A	17/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,00	1,00	2,00	78,90	-0,01			0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-72 B	17/01/2025	0,00%	0,00%	0,90	19,50	1,00	2,00	79,60	-0,08			0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-73 A	17/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,00	1,00	1,00	78,90	0,00			0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-73 B	17/01/2025	0,00%	0,00%	0,60	20,60	1,00	2,00	78,80	-0,03			0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-74 A	17/01/2025	0,00%	0,00%	0,30	20,60	1,00	2,00	79,10	0,05			0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-74 B	17/01/2025	0,00%	0,00%	0,80	16,90	2,00	2,00	82,30	0,04			0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-75 A	17/01/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,90	2,00	2,00	79,00	0,03			0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-75 B	17/01/2025	0,00%	0,00%	1,20	18,80	2,00	2,00	80,10	-0,04			0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-76 A	17/01/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,80	1,00	2,00	78,90	-0,02			0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-76 B	17/01/2025	0,00%	0,00%	2,00	16,90	2,00	2,00	81,10	-0,06			0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-165 A	17/01/2025	0,00%	0,00%	0,30	20,90	1,00	2,00	78,80	-0,01			0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-165 B	17/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,20	1,00	2,00	78,70	-0,12			0,00	0,00	
CAT	PMG-82 A	17/01/2025	0,00%	0,00%	1,30	19,80	2,00	1,00	78,90	-0,07			0,00	0,00	
CAT	PMG-82 B	17/01/2025	0,00%	0,00%	6,40	14,80	2,00	1,00	78,80	-0,01			0,00	0,00	
CAT	PMG-83 A	17/01/2025	0,00%	0,00%	2,00	18,70	2,00	1,00	79,20	-0,04			0,00	0,00	
CAT	PMG-83 B	17/01/2025	0,00%	0,00%	3,30	17,30	1,00	1,00	79,40	-0,03			0,00	0,00	
CAT	PMG-94 A	17/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,10	1,00	2,00	78,80	-0,13			0,00	0,00	
CAT	PMG-94 B	17/01/2025	0,00%	0,00%	3,80	17,30	1,00	2,00	78,90	-0,11			0,00	0,00	



Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	CO2 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
CAT	PMG-95	A	17/01/2025	0,00%	0,00%	1,00	20,30	1,00	1,00	78,70	-0,15		0,00	0,00	
CAT	PMG-95	B	17/01/2025	0,00%	0,00%	1,60	20,20	2,00	1,00	78,20	-0,03		0,00	0,00	
CAT	PMG-96	A	17/01/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,20	2,00	1,00	78,60	-0,03		0,00	0,00	
CAT	PMG-96	B	17/01/2025	0,00%	0,00%	5,50	14,80	1,00	1,00	79,70	-0,10		0,00	0,00	
CAT	PMG-97	A	17/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,10	1,00	1,00	78,80	-0,04		0,00	0,00	
CAT	PMG-97	B	17/01/2025	0,00%	0,00%	3,40	17,90	1,00	1,00	78,80	0,01		0,00	0,00	
CAT	PMG-98	A	17/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,20	2,00	2,00	78,70	0,05		0,00	0,00	
CAT	PMG-98	B	17/01/2025	0,00%	0,00%	0,30	21,00	2,00	1,00	78,70	-0,14		0,00	0,00	
CAT	PMG-160	A	17/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,20	1,00	1,00	78,70	-0,06		0,00	0,00	
CAT	PMG-160	B	17/01/2025	0,00%	0,00%	3,30	17,90	1,00	1,00	78,80	-0,03		0,00	0,00	
CAT	PMG-161	A	17/01/2025	0,00%	0,00%	2,00	18,70	2,00	1,00	79,30	-0,28		0,00	0,00	
CAT	PMG-161	B	17/01/2025	0,00%	0,00%	4,50	16,80	2,00	1,00	78,60	0,04		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-88	A	17/01/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,30	1,00	2,00	78,50	0,04		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-88	B	17/01/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,30	2,00	1,00	78,50	-0,22		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-89	A	17/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,20	1,00	2,00	78,70	-0,17		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-89	B	17/01/2025	0,00%	0,00%	0,70	20,90	2,00	1,00	78,50	0,02		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-90	A	17/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,40	2,00	2,00	78,60	-0,02		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-90	B	17/01/2025	0,00%	0,00%	0,40	21,10	1,00	2,00	78,50	0,07		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-91	A	17/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,40	1,00	2,00	78,60	-0,02		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-91	B	17/01/2025	0,00%	0,00%	1,60	19,90	1,00	2,00	78,50	0,09		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-92	A	17/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,30	1,00	1,00	78,60	-0,02		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-92	B	17/01/2025	0,00%	0,00%	0,80	20,60	1,00	1,00	78,60	-0,02		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-93	A	17/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,30	1,00	2,00	78,60	0,12		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-93	B	17/01/2025	0,00%	0,00%	1,00	20,30	1,00	2,00	78,70	-0,08		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-102		14/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,70	1,00	2,00	78,30	0,13		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-103		14/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,60	1,00	2,00	78,40	0,08		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-104		14/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,50	1,00	1,00	78,30	0,11		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-105		14/01/2025	0,00%	0,00%	1,00	20,70	1,00	1,00	78,30	0,08		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-106		14/01/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,20	1,00	2,00	78,60	-0,04		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-107		14/01/2025	0,00%	0,00%	2,40	17,80	1,00	2,00	79,80	0,09		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-108		14/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,60	1,00	1,00	78,30	0,08		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-109	A	14/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,70	1,00	1,00	78,20	0,11		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-109	B	14/01/2025	0,00%	0,00%	0,90	20,60	2,00	1,00	78,50	0,07		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-110	A	14/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,60	1,00	1,00	78,30	0,08		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-110	B	14/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,70	1,00	2,00	78,30	0,21		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-111	A	14/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,70	1,00	2,00	78,30	0,13		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-111	B	14/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,50	1,00	2,00	78,40	0,03		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-112		14/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,90	2,00	1,00	78,10	0,10		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-162	A	14/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,50	2,00	2,00	78,50	0,13		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-162	B	14/01/2025	0,00%	0,00%	3,90	15,00	1,00	1,00	81,10	0,12		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-166	A	14/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,70	1,00	1,00	78,30	0,12		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-166	B	14/01/2025	0,00%	0,00%	0,90	19,50	1,00	2,00	79,60	0,18		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-119	A	14/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,60	2,00	1,00	78,40	0,16		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-119	B	14/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,60	1,00	1,00	78,40	0,12		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-119	C	14/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,70	2,00	1,00	78,30	0,12		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-120	A	14/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,60	2,00	2,00	78,40	0,13		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-120	B	14/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,60	2,00	2,00	78,40	0,13		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-120	C	14/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,70	2,00	2,00	78,30	-0,03		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-163	B	14/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,60	1,00	1,00	78,30	0,04		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-164	B	14/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,60	1,00	2,00	78,40	0,11		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	CO2 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%;															
Portaria P3	PMG-164	C	14/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,60	2,00	2,00	78,40	0,13		0,00	0,00	
Transportes	PMG-121	A	15/01/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,10	2,00	2,00	78,60	0,14		0,00	0,00	
Transportes	PMG-121	B	15/01/2025	0,00%	0,00%	5,60	14,00	1,00	1,00	80,30	0,08		0,00	0,00	
Transportes	PMG-122	A	15/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,20	2,00	2,00	78,70	0,13		0,00	0,00	
Transportes	PMG-122	B	15/01/2025	0,00%	0,00%	5,80	14,80	2,00	2,00	79,40	0,23		0,00	0,00	
Transportes	PMG-123	A	15/01/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,20	1,00	2,00	78,60	0,06		0,00	0,00	
Transportes	PMG-123	B	15/01/2025	0,00%	0,00%	1,20	19,60	1,00	2,00	79,20	0,08		0,00	0,00	
Transportes	PMG-124	A	15/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,30	1,00	2,00	78,70	0,11		0,00	0,00	
Transportes	PMG-124	B	15/01/2025	0,00%	0,00%	2,40	19,30	1,00	2,00	78,30	0,02		0,00	0,00	
Transportes	PMG-158	B	15/01/2025	0,00%	0,00%	0,30	20,90	1,00	2,00	78,80	0,23		0,00	0,00	
Transportes	PMG-159	B	15/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,40	1,00	2,00	78,60	0,13		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-125	A	16/01/2025	0,00%	0,00%	0,0	21,4	2,0	1,0	78,5	0,1		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-125	B	16/01/2025	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	Não medido. Agua durante a medição.
Posto Guarda Universitário	PMG-126	A	16/01/2025	0,00%	0,00%	0,0	21,4	2,0	2,0	78,6	0,1		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-126	B	16/01/2025	0,00%	0,00%	4,2	16,0	2,0	2,0	79,8	-0,8		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-127	A	16/01/2025	0,00%	0,00%	0,0	21,3	2,0	2,0	78,7	-0,4		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-127	B	16/01/2025	0,00%	0,00%	2,6	18,4	1,0	1,0	79,0	0,0		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-128	A	16/01/2025	0,00%	0,00%	0,0	21,3	2,0	2,0	78,6	0,0		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-128	B	16/01/2025	0,00%	0,00%	6,8	13,1	2,0	2,0	80,1	-0,1		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-129	A	16/01/2025	0,00%	0,00%	0,1	20,9	1,0	2,0	79,0	0,1		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-129	B	16/01/2025	0,00%	0,00%	0,8	20,3	1,0	3,0	78,9	-0,2		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-130	A	16/01/2025	0,00%	0,00%	0,1	21,2	0,0	2,0	78,7	0,2		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-130	B	16/01/2025	0,00%	0,00%	3,2	17,9	1,0	2,0	78,9	0,0		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-131	A	17/01/2025	0,00%	0,00%	0,30	20,60	1,00	0,00	79,10	-0,09		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-131	B	17/01/2025	0,00%	0,00%	1,10	19,90	1,00	0,00	79,10	-0,13		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-16	A	21/01/2025	0,00%	0,00%	1,80	19,60	1,00	1,00	78,60	0,03		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-16	B	21/01/2025	0,00%	0,00%	2,50	18,70	1,00	2,00	78,80	-0,14		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-17	A	21/01/2025	0,00%	0,00%	0,30	21,00	1,00	2,00	78,70	0,03		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-17	B	21/01/2025	0,00%	0,00%	1,20	20,20	1,00	2,00	78,70	-0,03		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-18	A	21/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,50	3,00	0,00	78,40	-0,16		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-18	B	21/01/2025	0,00%	0,00%	2,00	19,70	2,00	0,00	78,30	-0,20		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-20	A	21/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,10	2,00	0,00	78,80	-0,05		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-20	B	21/01/2025	0,00%	0,00%	0,40	20,60	2,00	0,00	79,00	-0,08		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-22	A	21/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,90	2,00	1,00	78,10	0,07		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-22	B	21/01/2025	0,00%	0,00%	1,90	19,60	1,00	1,00	78,50	-0,04		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-23	A	21/01/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,10	2,00	0,00	78,60	-0,03		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-23	B	21/01/2025	0,00%	0,00%	0,90	20,40	2,00	1,00	78,60	-0,23		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-113	A	24/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,70	2,00	1,00	79,30	-0,10		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-113	B	24/01/2025	0,00%	0,00%	1,20	19,40	2,00	0,00	79,40	-0,03		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-114	A	24/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,70	2,00	1,00	79,20	-0,10		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-114	B	24/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	20,80	2,00	1,00	79,10	-0,08		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-115	A	24/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,60	2,00	1,00	79,40	-0,11		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-115	B	24/01/2025	0,00%	0,00%	0,50	20,40	2,00	1,00	79,20	-0,14		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-11	A	21/01/2025	0,00%	0,00%	0,70	20,80	2,00	2,00	78,40	0,00		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-11	B	21/01/2025	0,00%	0,00%	0,50	21,00	2,00	2,00	78,50	-0,08		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-12	A	21/01/2025	0,00%	0,00%	1,80	20,10	1,00	2,00	78,10	-0,03		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-12	B	21/01/2025	0,00%	0,00%	2,30	19,30	2,00	2,00	78,40	-0,09		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-13	A	21/01/2025	0,00%	0,00%	0,30	21,00	2,00	2,00	78,70	0,05		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-13	B	21/01/2025	0,00%	0,00%	1,60	19,80	1,00	2,00	78,60	0,13		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-14	A	21/01/2025	0,00%	0,00%	2,60	18,40	1,00	2,00	79,00	-0,03		0,00	0,00	



Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	CO2 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
Edifício I 1	PMG-14 B		21/01/2025	0,00%	0,00%	3,60	17,10	2,00	2,00	79,30	-0,03		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-15 A		21/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,30	1,00	2,00	78,60	-0,03		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-15 B		21/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,40	1,00	2,00	78,60	-0,07		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-19 A		21/01/2025	0,00%	0,00%	0,40	21,30	2,00	2,00	78,30	-0,15		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-19 B		21/01/2025	0,00%	0,00%	0,70	20,80	1,00	2,00	78,50	0,02		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-21 A		21/01/2025	0,00%	0,00%	1,20	20,20	1,00	1,00	78,60	0,00		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-21 B		21/01/2025	0,00%	0,00%	1,50	20,00	1,00	2,00	78,50	0,04		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-24 A		21/01/2025	0,00%	0,00%	0,40	21,10	2,00	2,00	78,40	-0,07		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-24 B		21/01/2025	0,00%	0,00%	0,30	21,30	1,00	1,00	78,40	0,02		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-135 A		24/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,60	1,00	2,00	79,30	-0,10		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG -135 B		24/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	20,80	2,00	1,00	79,20	-0,06		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-136 B		24/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,70	2,00	1,00	79,20	-0,03		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-25 A		20/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,10	1,00	1,00	78,80	-0,03		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-25 B		20/01/2025	0,00%	0,00%	1,00	20,40	1,00	1,00	78,60	-0,03		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-26 A		20/01/2025	0,00%	0,00%	0,40	20,40	2,00	1,00	79,30	0,00		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-26 B		20/01/2025	0,00%	0,00%	0,80	20,00	2,00	2,00	79,20	-0,03		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-27 A		20/01/2025	0,00%	0,00%	1,20	19,30	1,00	1,00	79,50	-0,08		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-27 B		20/01/2025	0,00%	0,00%	3,20	17,50	1,00	2,00	79,30	0,03		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-28 A		20/01/2025	0,00%	0,00%	1,00	19,40	1,00	2,00	79,60	0,05		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-28 B		20/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,10	1,00	1,00	78,80	-0,05		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-29 A		20/01/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,10	2,00	1,00	78,80	-0,01		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-29 B		20/01/2025	0,00%	0,00%	0,90	20,40	1,00	1,00	78,70	-0,08		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-44 A		20/01/2025	0,00%	0,00%	0,60	20,40	2,00	2,00	79,00	-0,05		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-44 B		20/01/2025	0,00%	0,00%	0,60	20,30	1,00	2,00	79,10	0,01		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-45 A		20/01/2025	0,00%	0,00%	0,30	20,50	2,00	2,00	79,20	0,13		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-45 B		20/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	1,00	2,00	78,70	-0,01		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-134 B		20/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	2,00	2,00	78,70	0,02		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-30 A		20/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,40	2,00	0,00	79,50	-0,08		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-30 B		20/01/2025	0,00%	0,00%	1,10	19,60	2,00	0,00	79,30	-0,13		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-31 A		20/01/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,10	3,00	0,00	79,70	-0,10		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-31 B		20/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,30	3,00	0,00	79,60	-0,19		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-32 A		20/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,90	1,00	1,00	78,90	-0,08		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-32 B		20/01/2025	0,00%	0,00%	0,70	20,40	1,00	1,00	78,90	0,02		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-33 A		20/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,90	1,00	0,00	79,00	-0,07		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-33 B		20/01/2025	0,00%	0,00%	3,20	17,90	1,00	0,00	78,90	-0,12		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-34 A		20/01/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,70	1,00	0,00	79,10	-0,07		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-34 B		20/01/2025	0,00%	0,00%	1,30	19,80	2,00	0,00	78,90	-0,16		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-35 A		20/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,00	2,00	1,00	78,90	-0,06		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-35 B		20/01/2025	0,00%	0,00%	1,10	20,30	1,00	1,00	78,70	-0,10		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-36 A		20/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,10	1,00	1,00	78,90	-0,07		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-36 B		20/01/2025	0,00%	0,00%	2,30	18,60	2,00	1,00	79,00	0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-37 A		20/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,10	2,00	1,00	78,90	-0,08		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-37 B		20/01/2025	0,00%	0,00%	1,10	20,10	2,00	1,00	78,70	-0,14		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-38 A		20/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,90	1,00	1,00	78,90	-0,07		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-38 B		20/01/2025	0,00%	0,00%	0,30	20,70	1,00	1,00	79,00	-0,05		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-39 A		20/01/2025	0,00%	0,00%	0,40	20,60	2,00	1,00	79,00	-0,12		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-39 B		20/01/2025	0,00%	0,00%	7,70	12,90	1,00	1,00	79,50	-0,18		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-40 A		20/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,00	1,00	1,00	78,90	-0,02		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-40 B		20/01/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,90	1,00	1,00	78,90	-0,09		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-41 A		20/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,70	2,00	0,00	79,20	-0,08		0,00	0,00	



Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	CO2 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15% ,															
I-3 Biblioteca	PMG-41 B		20/01/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,60	2,00	0,00	79,20	-0,13		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-42 A		20/01/2025	0,00%	0,00%	0,70	20,10	1,00	0,00	79,10	-0,08		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-42 B		20/01/2025	0,00%	0,00%	4,90	16,70	2,00	0,00	78,40	-0,09		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-43 A		20/01/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,60	2,00	0,00	79,20	-0,11		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-43 B		20/01/2025	0,00%	0,00%	0,50	20,50	2,00	0,00	79,00	0,01		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-132 A		20/01/2025	0,00%	0,00%	0,20	19,70	4,00	1,00	80,10	-0,09		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-132 B		20/01/2025	0,00%	0,00%	0,30	19,70	3,00	0,00	80,00	-0,05		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-133 A		20/01/2025	0,00%	0,00%	0,50	20,20	1,00	1,00	79,30	-0,07		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-133 B		20/01/2025	0,00%	0,00%	0,60	20,40	1,00	1,00	79,00	-0,07		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-63 A		22/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,50	3,00	1,00	78,50	-0,08		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-63 B		22/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,40	3,00	1,00	78,40	-0,03		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-64 A		22/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	2,00	1,00	78,70	-0,03		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-64 B		22/01/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,20	2,00	1,00	78,70	0,08		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-65 A		22/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,20	2,00	1,00	78,70	-0,05		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-65 B		22/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,30	3,00	1,00	78,60	0,05		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-66 A		22/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,20	2,00	2,00	78,70	-0,13		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-66 B		22/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,40	2,00	1,00	78,60	0,03		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-67 A		22/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,00	2,00	3,00	78,90	-0,01		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-67 B		22/01/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,90	2,00	2,00	78,90	-0,07		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-68 A		22/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,40	2,00	2,00	78,50	0,03		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-68 B		22/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,40	1,00	3,00	78,50	0,00		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-69 A		22/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,30	3,00	1,00	78,60	-0,03		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-69 B		22/01/2025	0,00%	0,00%	1,50	19,50	3,00	2,00	79,00	-0,15		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-77 A		22/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,20	1,00	2,00	78,80	-0,03		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-77 B		22/01/2025	0,00%	0,00%	0,90	19,80	2,00	2,00	79,30	0,02		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-78 A		22/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,10	2,00	2,00	78,80	0,03		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-78 B		22/01/2025	0,00%	0,00%	1,10	19,80	1,00	2,00	79,10	-0,01		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-79 A		22/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	1,00	2,00	78,60	0,01		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-79 B		22/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,50	1,00	2,00	78,50	-0,08		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-80 A		22/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,40	1,00	2,00	78,60	0,03		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-80 B		22/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,40	1,00	2,00	78,60	-0,02		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-81 A		22/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,20	2,00	2,00	78,80	0,13		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-81 B		22/01/2025	0,00%	0,00%	0,50	20,60	2,00	2,00	78,90	-0,08		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-144 B		22/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,20	2,00	2,00	78,80	-0,02		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-145 B		22/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,10	2,00	2,00	78,80	-0,03		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-146 B		22/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,20	2,00	3,00	78,70	0,05		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-147 B		22/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,10	2,00	2,00	78,90	-0,15		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-148 B		22/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,40	2,00	2,00	78,60	-0,03		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-149 B		22/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,20	2,00	1,00	78,80	-0,03		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-150 B		22/01/2025	0,00%	0,00%	2,30	18,20	3,00	1,00	79,50	-0,03		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-151 B		22/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,40	1,00	3,00	78,60	-0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-46 A		22/01/2025	0,00%	0,00%	0,50	20,60	3,00	2,00	78,90	-0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-46 B		22/01/2025	0,00%	0,00%	3,60	17,60	4,00	1,00	78,80	-0,01		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-47 A		22/01/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,60	4,00	2,00	79,20	0,00		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-47 B		22/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,20	4,00	2,00	78,70	0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-48 A		22/01/2025	0,00%	0,00%	0,30	20,90	3,00	2,00	78,80	-0,02		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-48 B		22/01/2025	0,00%	0,00%	0,30	20,90	3,00	2,00	78,80	-0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-49 A		22/01/2025	0,00%	0,00%	0,30	20,80	2,00	3,00	78,80	-0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-49 B		22/01/2025	0,00%	0,00%	4,90	16,60	2,00	2,00	78,50	0,02		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-50 A		22/01/2025	0,00%	0,00%	0,30	20,90	3,00	2,00	78,80	0,02		0,00	0,00	



Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	CO2 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15%,															
Conjunto Laboratorial	PMG-50 B		22/01/2025	0,00%	0,00%	1,90	19,50	2,00	2,00	78,60	0,05		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-51 A		22/01/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,70	2,00	1,00	79,10	-0,06		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-51 B		22/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,90	2,00	1,00	79,10	-0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-52 A		22/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,80	2,00	0,00	79,10	0,02		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-52 B		22/01/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,70	2,00	1,00	79,20	-0,11		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-53 A		22/01/2025	0,00%	0,00%	0,50	20,40	2,00	1,00	79,20	-0,05		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-53 B		22/01/2025	1,10%	1,10%	0,70	19,60	2,00	0,00	78,60	-0,07		0,00	57,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-54 A		22/01/2025	0,00%	0,00%	0,30	20,30	2,00	1,00	79,50	-0,06		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-54 B		22/01/2025	0,60%	0,60%	3,70	15,50	2,00	0,00	80,20	-0,03		0,00	21,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-55 A		22/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,70	3,00	1,00	79,20	-0,10		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-55 B		22/01/2025	0,00%	0,00%	5,00	15,10	3,00	0,00	80,00	-0,12		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-56 A		22/01/2025	0,00%	0,00%	1,50	19,80	2,00	2,00	78,70	-0,02		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-56 B		22/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,80	2,00	2,00	79,00	-0,01		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-57 A		22/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,60	2,00	1,00	78,30	-0,05		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-57 B		22/01/2025	0,00%	0,00%	1,60	20,20	2,00	1,00	78,20	-0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-58 A		22/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,00	2,00	2,00	79,00	-0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-58 B		22/01/2025	0,00%	0,00%	1,50	19,90	2,00	1,00	78,60	-0,12		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-59 A		22/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,90	2,00	1,00	79,00	-0,02		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-59 B		22/01/2025	0,00%	0,00%	4,00	17,40	2,00	2,00	78,60	0,00		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-60 A		22/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,80	3,00	2,00	79,10	-0,01		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-60 B		22/01/2025	0,00%	0,00%	2,20	17,30	3,00	2,00	80,50	-0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-61 A		22/01/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,70	2,00	2,00	79,10	-0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-61 B		22/01/2025	0,00%	0,00%	5,80	14,30	2,00	2,00	79,80	-0,06		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-137 B		22/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	3,00	2,00	78,70	-0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-138 B		22/01/2025	0,00%	0,00%	4,00	17,40	3,00	2,00	78,60	-0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-139 A		22/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	20,80	1,00	1,00	79,20	0,02		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-139 B		22/01/2025	11,70%	11,70%	6,80	11,10	2,00	3,00	70,40	-0,01		0,00	100,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-140 A		22/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,70	2,00	1,00	79,20	-0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-140 B		22/01/2025	0,40%	0,40%	0,10	20,60	2,00	0,00	78,90	-0,08		0,00	18,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-141 B		22/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,00	2,00	1,00	79,00	0,02		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-62 A		22/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,90	1,00	1,00	79,10	-0,07		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-62 B		22/01/2025	0,40%	1,40%	0,20	20,60	2,00	1,00	78,80	-0,08		0,00	11,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-01 A		21/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,20	1,00	1,00	78,70	0,04		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-01 B		21/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,40	1,00	2,00	78,60	-0,03		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-02 A		21/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,30	1,00	2,00	78,60	0,02		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-02 B		21/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,40	2,00	2,00	78,60	0,07		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-03 A		21/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,20	2,00	2,00	78,70	-0,09		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-03 B		21/01/2025	0,00%	0,00%	1,50	20,20	1,00	1,00	78,30	0,03		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-04 A		21/01/2025	0,00%	0,00%	0,30	21,00	2,00	2,00	78,70	0,01		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-04 B		21/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,40	1,00	2,00	78,60	-0,06		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-05 A		21/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	1,00	2,00	78,60	0,02		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-05 B		21/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,40	1,00	2,00	78,60	-0,05		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-06 A		21/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,30	1,00	2,00	78,60	0,07		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-06 B		21/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,40	1,00	2,00	78,60	-0,02		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-07 A		21/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,30	1,00	2,00	78,70	0,05		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-07 B		21/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,40	2,00	2,00	78,60	-0,03		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-08 A		21/01/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,00	1,00	2,00	78,80	-0,01		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-08 B		21/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,30	1,00	1,00	78,60	-0,03		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-09 A		21/01/2025	0,00%	0,00%	0,80	20,30	1,00	1,00	78,90	-0,08		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-09 B		21/01/2025	0,00%	0,00%	0,50	20,60	1,00	2,00	79,00	0,07		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	CO2 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15% ,															
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-10 A		21/01/2025	0,00%	0,00%	0,30	20,80	1,00	1,00	78,90	0,04		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-10 B		21/01/2025	0,00%	0,00%	2,50	18,60	1,00	1,00	78,90	-0,11		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-84 A		21/01/2025	0,00%	0,00%	0,30	20,80	2,00	1,00	78,90	-0,26		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-84 B		21/01/2025	0,00%	0,00%	4,60	16,70	2,00	1,00	78,70	-0,20		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-85 A		21/01/2025	0,00%	0,00%	0,80	20,20	2,00	1,00	79,00	-0,14		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-85 B		21/01/2025	0,00%	0,00%	1,90	19,70	1,00	1,00	78,40	-0,08		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-86 A		21/01/2025	0,00%	0,00%	0,30	20,60	1,00	1,00	79,10	-0,10		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-86 B		21/01/2025	0,00%	0,00%	0,90	19,90	2,00	1,00	79,20	-0,08		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-87 A		21/01/2025	0,00%	0,00%	2,40	17,50	1,00	1,00	80,10	-0,04		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-87 B		21/01/2025	0,00%	0,00%	2,10	18,40	1,00	1,00	79,50	-0,12		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-152 A		21/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,80	1,00	1,00	79,00	-0,13		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-152 B		21/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,00	1,00	1,00	78,90	-0,07		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-153 B		21/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,20	1,00	1,00	78,70	0,03		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-154 B		21/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,40	1,00	2,00	78,50	0,12		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-155 B		21/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,40	1,00	2,00	78,60	-0,06		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-156 B		21/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,40	2,00	2,00	78,60	-0,02		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-157 B		21/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,40	2,00	2,00	78,60	-0,03		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-70 A		23/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,90	1,00	2,00	79,00	0,08		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-70 B		23/01/2025	0,00%	0,00%	0,70	19,70	1,00	2,00	79,60	0,06		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-71 A		23/01/2025	0,00%	0,00%	0,30	20,40	1,00	1,00	79,30	-0,05		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-71 B		23/01/2025	0,30%	0,30%	1,30	9,30	1,00	1,00	89,10	-0,03		0,00	9,00	
Enfermaria	PMG-72 A		23/01/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,70	2,00	2,00	79,10	-0,02		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-72 B		23/01/2025	0,00%	0,00%	0,90	19,50	1,00	2,00	79,60	-0,02		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-73 A		23/01/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,80	2,00	2,00	79,00	-0,02		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-73 B		23/01/2025	0,00%	0,00%	0,80	20,40	1,00	2,00	78,80	-0,03		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-74 A		23/01/2025	0,00%	0,00%	0,30	20,60	2,00	2,00	79,20	0,03		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-74 B		23/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,10	2,00	1,00	78,80	-0,01		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-75 A		23/01/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,90	2,00	2,00	79,00	0,03		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-75 B		23/01/2025	0,00%	0,00%	1,80	17,30	2,00	2,00	80,90	0,02		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-76 A		23/01/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,60	2,00	2,00	79,20	-0,04		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-76 B		23/01/2025	0,00%	0,00%	2,00	16,20	2,00	2,00	818,00	0,00		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-165 A		23/01/2025	0,00%	0,00%	0,30	20,30	2,00	2,00	79,30	-0,03		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-165 B		23/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,00	2,00	1,00	78,90	-0,04		0,00	0,00	
CAT	PMG-82 A		23/01/2025	0,00%	0,00%	1,60	19,30	2,00	1,00	79,10	-0,15		0,00	0,00	
CAT	PMG-82 B		23/01/2025	0,00%	0,00%	6,70	14,60	2,00	0,00	78,70	-0,05		0,00	0,00	
CAT	PMG-83 A		23/01/2025	0,00%	0,00%	2,70	18,20	2,00	0,00	79,20	-0,03		0,00	0,00	
CAT	PMG-83 B		23/01/2025	0,00%	0,00%	5,10	15,30	2,00	0,00	79,60	0,09		0,00	0,00	
CAT	PMG-94 A		23/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,70	2,00	0,00	79,20	-0,11		0,00	0,00	
CAT	PMG-94 B		23/01/2025	0,00%	0,00%	4,20	16,70	2,00	1,00	79,10	-0,19		0,00	0,00	
CAT	PMG-95 A		23/01/2025	0,00%	0,00%	0,60	20,40	1,00	0,00	78,90	-0,07		0,00	0,00	
CAT	PMG-95 B		23/01/2025	0,00%	0,00%	2,00	19,90	1,00	1,00	78,10	-0,17		0,00	0,00	
CAT	PMG-96 A		23/01/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,70	1,00	1,00	79,10	0,00		0,00	0,00	
CAT	PMG-96 B		23/01/2025	0,00%	0,00%	4,20	15,80	1,00	1,00	80,00	0,15		0,00	0,00	
CAT	PMG-97 A		23/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,00	2,00	1,00	78,90	-0,03		0,00	0,00	
CAT	PMG-97 B		23/01/2025	0,00%	0,00%	3,20	18,10	1,00	1,00	78,70	-0,06		0,00	0,00	
CAT	PMG-98 A		23/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,90	1,00	1,00	79,00	0,02		0,00	0,00	
CAT	PMG-98 B		23/01/2025	0,00%	0,00%	0,30	20,70	1,00	1,00	79,00	-0,04		0,00	0,00	
CAT	PMG-160 A		23/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,70	2,00	1,00	79,20	-0,11		0,00	0,00	
CAT	PMG-160 B		23/01/2025	0,00%	0,00%	3,30	17,50	2,00	0,00	79,20	-0,21		0,00	0,00	
CAT	PMG-161 A		23/01/2025	0,00%	0,00%	1,80	19,00	1,00	1,00	79,30	-0,10		0,00	0,00	



Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	CO2 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
CAT	PMG-161	B	23/01/2025	0,00%	0,00%	4,60	16,50	2,00	1,00	78,80	-0,15		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-88	A	24/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,80	2,00	2,00	79,10	-0,03		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-88	B	24/01/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,80	2,00	2,00	79,10	-0,07		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-89	A	24/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,90	2,00	2,00	78,90	-0,12		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-89	B	24/01/2025	0,00%	0,00%	0,70	20,40	1,00	2,00	78,90	0,03		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-90	A	24/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,00	1,00	2,00	79,00	-0,07		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-90	B	24/01/2025	0,00%	0,00%	0,50	20,60	1,00	2,00	78,90	-0,01		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-91	A	24/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,90	1,00	2,00	79,00	-0,01		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-91	B	24/01/2025	0,00%	0,00%	1,60	19,40	2,00	2,00	79,00	-0,08		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-92	A	24/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,90	1,00	2,00	79,00	-0,03		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-92	B	24/01/2025	0,00%	0,00%	0,80	20,30	2,00	2,00	78,90	-0,02		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-93	A	24/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,00	1,00	2,00	78,90	-0,08		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-93	B	24/01/2025	0,00%	0,00%	1,00	20,20	1,00	2,00	78,90	-0,09		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-102		20/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,20	1,00	2,00	78,80	0,02		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-103		20/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,20	1,00	2,00	78,80	0,06		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-104		20/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,20	2,00	1,00	78,80	0,02		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-105		20/01/2025	0,00%	0,00%	1,10	20,10	1,00	2,00	78,80	0,02		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-106		20/01/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,10	1,00	2,00	78,70	-0,12		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-107		20/01/2025	0,00%	0,00%	2,40	17,60	2,00	2,00	80,00	-0,01		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-108		20/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,40	2,00	1,00	78,50	-0,01		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-109	A	20/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,40	1,00	2,00	78,50	0,01		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-109	B	20/01/2025	0,00%	0,00%	0,80	20,80	1,00	2,00	78,40	-0,06		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-110	A	20/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,20	1,00	2,00	78,80	0,02		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-110	B	20/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,20	1,00	2,00	78,80	-0,02		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-111	A	20/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	1,00	2,00	78,70	0,04		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-111	B	20/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,10	1,00	2,00	78,80	-0,04		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-112		20/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,70	2,00	2,00	78,30	-0,14		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-162	A	20/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,20	1,00	2,00	78,80	0,00		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-162	B	20/01/2025	0,00%	0,00%	1,50	19,30	1,00	2,00	79,30	-0,03		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-166	A	20/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,20	1,00	2,00	78,80	-0,02		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-166	B	20/01/2025	0,00%	0,00%	1,20	18,40	2,00	2,00	80,40	0,00		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-119	A	20/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,20	1,00	2,00	78,70	0,00		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-119	B	20/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,10	2,00	2,00	78,80	0,03		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-119	C	20/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,20	2,00	2,00	78,70	-0,06		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-120	A	20/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,10	1,00	3,00	78,80	0,09		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-120	B	20/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,10	1,00	2,00	78,80	-0,01		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-120	C	20/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,10	1,00	2,00	78,80	0,02		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-163	B	20/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,20	2,00	2,00	78,70	-0,01		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-164	B	20/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,10	1,00	2,00	78,90	-0,04		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-164	C	20/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,10	2,00	2,00	78,80	0,03		0,00	0,00	
Transportes	PMG-121	A	23/01/2025	0,00%	0,00%	0,30	21,00	1,00	1,00	78,80	-0,03		0,00	0,00	
Transportes	PMG-121	B	23/01/2025	0,00%	0,00%	5,30	14,40	2,00	1,00	80,30	-0,04		0,00	0,00	
Transportes	PMG-122	A	23/01/2025	0,00%	0,00%	0,50	20,50	1,00	1,00	79,00	-0,11		0,00	0,00	
Transportes	PMG-122	B	23/01/2025	0,00%	0,00%	5,50	15,20	2,00	0,00	79,20	0,00		0,00	0,00	
Transportes	PMG-123	A	23/01/2025	0,00%	0,00%	0,60	20,30	1,00	1,00	79,10	-0,11		0,00	0,00	
Transportes	PMG-123	B	23/01/2025	0,00%	0,00%	1,30	19,20	2,00	1,00	79,60	-0,01		0,00	0,00	
Transportes	PMG-124	A	23/01/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,80	1,00	1,00	79,00	-0,03		0,00	0,00	
Transportes	PMG-124	B	23/01/2025	0,00%	0,00%	3,10	18,20	2,00	1,00	78,70	-0,06		0,00	0,00	
Transportes	PMG-158	B	23/01/2025	0,00%	0,00%	2,00	18,90	2,00	1,00	79,10	-0,12		0,00	0,00	
Transportes	PMG-159	B	23/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,00	2,00	0,00	79,00	-0,08		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	CO2 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15% ,															
Posto Guarda Universitário	PMG-125 A		23/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,20	2,00	2,00	78,80	0,01		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-125 B		23/01/2025	0,00%	0,00%	3,10	18,10	2,00	3,00	78,90	-0,23		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-126 A		23/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,00	1,00	2,00	79,00	0,02		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-126 B		23/01/2025	0,00%	0,00%	4,60	16,10	2,00	2,00	79,20	0,02		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-127 A		23/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,00	1,00	2,00	78,90	0,03		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-127 B		23/01/2025	0,00%	0,00%	3,00	18,00	1,00	3,00	79,00	0,01		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-128 A		23/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,10	1,00	2,00	78,80	0,03		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-128 B		23/01/2025	0,00%	0,00%	7,50	12,70	1,00	3,00	79,80	-0,35		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-129 A		23/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,90	1,00	2,00	79,00	-0,04		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-129 B		23/01/2025	0,00%	0,00%	1,30	19,50	1,00	3,00	79,20	0,16		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-130 A		23/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,00	1,00	3,00	78,90	-0,04		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-130 B		23/01/2025	0,00%	0,00%	3,60	16,90	1,00	3,00	79,50	0,01		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-131 A		23/01/2025	0,00%	0,00%	0,40	20,40	1,00	3,00	79,20	0,01		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-131 B		23/01/2025	0,00%	0,00%	1,10	19,90	1,00	3,00	79,00	0,35		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-16 A		28/01/2025	0,00%	0,00%	2,00	19,50	1,00	1,00	78,50	-0,02		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-16 B		28/01/2025	0,00%	0,00%	2,60	18,80	1,00	2,00	78,60	-0,03		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-17 A		28/01/2025	0,00%	0,00%	0,40	20,90	2,00	2,00	78,70	0,00		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-17 B		28/01/2025	0,00%	0,00%	0,90	20,40	1,00	1,00	78,80	-0,03		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-18 A		28/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,30	3,00	1,00	79,50	-0,18		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-18 B		28/01/2025	0,00%	0,00%	1,60	19,00	3,00	0,00	79,40	0,04		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-20 A		28/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,90	2,00	1,00	79,00	-0,06		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-20 B		28/01/2025	0,00%	0,00%	0,30	20,40	2,00	1,00	79,20	-0,10		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-22 A		28/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,30	1,00	2,00	78,60	0,01		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-22 B		28/01/2025	0,00%	0,00%	2,20	18,80	2,00	2,00	79,00	-0,13		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-23 A		28/01/2025	0,00%	0,00%	0,40	20,50	2,00	1,00	79,10	-0,07		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-23 B		28/01/2025	0,00%	0,00%	1,10	19,80	2,00	1,00	79,10	-0,07		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-113 A		28/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,60	2,00	1,00	79,40	-0,10		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-113 B		28/01/2025	0,00%	0,00%	1,30	19,20	2,00	1,00	79,50	-0,10		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-114 A		28/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,80	2,00	1,00	79,10	-0,13		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-114 B		28/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	20,90	2,00	1,00	79,10	-0,13		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-115 A		28/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,70	1,00	1,00	79,20	-0,14		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-115 B		28/01/2025	0,00%	0,00%	0,30	20,50	2,00	1,00	79,20	-0,11		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-11 A		28/01/2025	0,00%	0,00%	1,40	19,60	1,00	2,00	79,00	-0,01		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-11 B		28/01/2025	0,40%	0,70%	1,30	19,80	2,00	1,00	78,50	0,00		0,00	4,00	
Edifício I 1	PMG-12 A		28/01/2025	0,00%	0,00%	3,20	17,50	1,00	2,00	79,30	0,01		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-12 B		28/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,40	2,00	2,00	78,50	-0,08		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-13 A		28/01/2025	0,00%	0,00%	1,10	20,20	1,00	2,00	78,70	0,01		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-13 B		28/01/2025	0,00%	0,00%	1,50	19,50	1,00	2,00	79,00	0,02		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-14 A		28/01/2025	0,00%	0,00%	2,80	18,30	2,00	2,00	78,90	-0,13		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-14 B		28/01/2025	0,00%	0,00%	3,30	17,60	2,00	1,00	79,10	-0,03		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-15 A		28/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,50	1,00	2,00	78,50	-0,05		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-15 B		28/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,50	1,00	1,00	78,40	0,02		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-19 A		28/01/2025	0,00%	0,00%	0,60	20,90	1,00	2,00	78,50	-0,10		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-19 B		28/01/2025	0,00%	0,00%	1,20	20,30	2,00	1,00	78,50	-0,03		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-21 A		28/01/2025	0,00%	0,00%	1,50	19,70	2,00	2,00	78,80	-0,08		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-21 B		28/01/2025	0,00%	0,00%	2,10	19,10	1,00	1,00	78,90	-0,02		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-24 A		28/01/2025	0,00%	0,00%	0,70	20,70	1,00	1,00	78,70	-0,09		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-24 B		28/01/2025	0,00%	0,00%	0,90	20,50	1,00	2,00	78,60	0,07		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-135 A		28/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,70	2,00	0,00	79,20	-0,08		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-135 B		28/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	20,90	2,00	0,00	79,10	-0,12		0,00	0,00	



Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	CO2 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
Edifício I 1	PMG-136	B	28/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	20,80	2,00	1,00	79,10	-0,11		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-25	A	27/01/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,90	1,00	1,00	78,90	0,03		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-25	B	27/01/2025	0,00%	0,00%	1,30	20,00	2,00	0,00	78,70	-0,15		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-26	A	27/01/2025	0,00%	0,00%	0,30	20,70	2,00	0,00	79,00	-0,11		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-26	B	27/01/2025	0,00%	0,00%	0,90	19,90	2,00	0,00	79,20	-0,08		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-27	A	27/01/2025	0,00%	0,00%	1,40	19,10	1,00	0,00	79,50	-0,09		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-27	B	27/01/2025	0,00%	0,00%	3,60	17,10	2,00	0,00	79,40	-0,11		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-28	A	27/01/2025	0,00%	0,00%	0,90	19,90	1,00	1,00	79,20	-0,06		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-28	B	27/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,10	1,00	1,00	78,80	-0,06		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-29	A	27/01/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,90	1,00	1,00	78,80	-0,02		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-29	B	27/01/2025	0,00%	0,00%	0,40	20,80	2,00	1,00	78,80	-0,08		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-44	A	27/01/2025	0,00%	0,00%	0,60	20,30	1,00	1,00	79,10	-0,01		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-44	B	27/01/2025	0,00%	0,00%	0,60	20,40	1,00	1,00	79,00	0,01		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-45	A	27/01/2025	0,00%	0,00%	0,40	19,90	1,00	1,00	79,70	-0,08		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-45	B	27/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,20	1,00	1,00	78,80	-0,04		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-134	B	27/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,20	1,00	1,00	78,70	-0,04		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-30	A	27/01/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,40	2,00	0,00	79,40	-0,18		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-30	B	27/01/2025	0,00%	0,00%	1,20	19,50	2,00	0,00	79,30	-0,17		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-31	A	27/01/2025	0,00%	0,00%	0,30	20,10	2,00	0,00	79,60	-0,22		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-31	B	27/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,40	2,00	0,00	79,50	-0,16		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-32	A	27/01/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,70	2,00	0,00	79,10	-0,12		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-32	B	27/01/2025	0,00%	0,00%	1,00	19,90	2,00	0,00	79,10	-0,13		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-33	A	27/01/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,80	2,00	0,00	79,10	-0,14		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-33	B	27/01/2025	0,00%	0,00%	2,80	18,20	2,00	0,00	79,00	-0,06		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-34	A	27/01/2025	0,00%	0,00%	0,30	20,50	2,00	0,00	79,20	-0,20		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-34	B	27/01/2025	0,00%	0,00%	0,80	20,30	2,00	0,00	78,90	-0,10		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-35	A	27/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,90	2,00	0,00	79,00	-0,07		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-35	B	27/01/2025	0,00%	0,00%	1,30	19,80	2,00	1,00	79,00	0,00		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-36	A	27/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,90	2,00	0,00	79,00	-0,11		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-36	B	27/01/2025	0,00%	0,00%	2,80	18,10	2,00	1,00	79,10	-0,07		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-37	A	27/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,90	1,00	1,00	79,00	-0,08		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-37	B	27/01/2025	0,00%	0,00%	1,20	20,00	2,00	0,00	78,80	-0,12		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-38	A	27/01/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,70	2,00	0,00	79,10	-0,23		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-38	B	27/01/2025	0,00%	0,00%	0,40	20,40	2,00	0,00	79,10	-0,08		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-39	A	27/01/2025	0,00%	0,00%	0,30	20,70	2,00	0,00	79,00	-0,08		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-39	B	27/01/2025	0,00%	0,00%	8,60	12,10	2,00	0,00	79,30	-0,29		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-40	A	27/01/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,80	2,00	0,00	79,00	-0,11		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-40	B	27/01/2025	0,00%	0,00%	0,50	20,50	2,00	0,00	79,10	-0,29		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-41	A	27/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,70	2,00	0,00	79,20	-0,16		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-41	B	27/01/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,70	2,00	0,00	79,10	-0,09		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-42	A	27/01/2025	0,00%	0,00%	0,80	20,20	2,00	0,00	79,00	-0,13		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-42	B	27/01/2025	0,00%	0,00%	5,20	16,50	2,00	0,00	78,30	-0,06		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-43	A	27/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,50	2,00	0,00	79,40	-0,16		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-43	B	27/01/2025	0,00%	0,00%	0,70	20,30	2,00	0,00	79,00	-0,10		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-132	A	27/01/2025	0,00%	0,00%	0,30	19,90	3,00	0,00	79,90	-0,15		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-132	B	27/01/2025	0,00%	0,00%	0,30	19,90	3,00	0,00	79,80	-0,07		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-133	A	27/01/2025	0,00%	0,00%	0,80	19,40	2,00	0,00	79,80	-0,16		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-133	B	27/01/2025	0,00%	0,00%	0,90	19,90	2,00	0,00	79,30	-0,04		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-63	A	29/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,70	2,00	1,00	78,30	-0,04		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-63	B	29/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,70	2,00	1,00	78,30	-0,17		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	CO2 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15%,															
Edifício I-4	PMG-64 A		29/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,50	2,00	1,00	78,50	-0,09		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-64 B		29/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,50	2,00	1,00	78,50	-0,07		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-65 A		29/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,50	2,00	1,00	78,40	-0,12		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-65 B		29/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,60	4,00	1,00	78,40	-0,11		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-66 A		29/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,40	2,00	1,00	78,40	-0,14		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-66 B		29/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,50	2,00	1,00	78,40	-0,13		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-67 A		29/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,20	1,00	2,00	78,80	0,07		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-67 B		29/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,20	1,00	2,00	78,80	0,02		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-68 A		29/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,40	1,00	2,00	78,60	0,00		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-68 B		29/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,40	1,00	2,00	78,60	0,13		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-69 A		29/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,60	2,00	1,00	78,30	-0,07		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-69 B		29/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,60	2,00	1,00	78,30	0,00		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-77 A		29/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	1,00	2,00	78,70	0,00		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-77 B		29/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	1,00	2,00	78,70	0,15		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-78 A		29/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,20	1,00	2,00	78,70	-0,03		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-78 B		29/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	1,00	2,00	78,70	0,00		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-79 A		29/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	1,00	2,00	78,60	0,02		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-79 B		29/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,40	1,00	2,00	78,60	0,08		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-80 A		29/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,40	2,00	2,00	78,60	0,03		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-80 B		29/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,40	2,00	2,00	78,60	0,05		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-81 A		29/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,20	1,00	2,00	78,70	0,00		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-81 B		29/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	2,00	2,00	78,70	-0,03		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-144 B		29/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	1,00	2,00	78,70	0,05		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-145 B		29/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	2,00	3,00	78,70	0,01		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-146 B		29/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,20	1,00	2,00	78,80	0,03		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-147 B		29/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,20	1,00	2,00	78,80	-0,01		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-148 B		29/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,50	2,00	2,00	78,50	-0,07		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-149 B		29/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,60	3,00	2,00	78,40	-0,06		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-150 B		29/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,60	3,00	2,00	78,40	-0,16		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-151 B		29/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,40	2,00	2,00	78,60	0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-46 A		29/01/2025	0,00%	0,00%	0,70	20,60	2,00	1,00	78,80	-0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-46 B		29/01/2025	0,00%	0,00%	5,90	16,30	2,00	1,00	77,70	0,00		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-47 A		29/01/2025	0,00%	0,00%	0,40	20,30	1,00	2,00	79,30	0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-47 B		29/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,10	2,00	2,00	78,80	-0,05		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-48 A		29/01/2025	0,00%	0,00%	0,40	20,70	2,00	2,00	78,90	0,02		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-48 B		29/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,20	2,00	2,00	78,70	0,01		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-49 A		29/01/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,10	1,00	2,00	78,70	-0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-49 B		29/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	1,00	2,00	78,70	-0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-50 A		29/01/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,90	1,00	2,00	78,80	-0,04		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-50 B		29/01/2025	0,00%	0,00%	1,40	20,00	2,00	2,00	78,60	-0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-51 A		29/01/2025	0,00%	0,00%	0,40	20,70	1,00	1,00	78,90	-0,02		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-51 B		29/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,90	2,00	1,00	79,00	-0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-52 A		29/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,90	2,00	1,00	79,00	-0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-52 B		29/01/2025	0,00%	0,00%	0,50	20,60	1,00	0,00	78,90	-0,05		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-53 A		29/01/2025	0,00%	0,00%	0,80	20,20	2,00	1,00	79,00	-0,07		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-53 B		29/01/2025	3,60%	3,60%	1,90	17,70	2,00	1,00	76,80	-0,11		0,00	76,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-54 A		29/01/2025	0,00%	0,00%	0,30	20,70	2,00	0,00	79,00	-0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-54 B		29/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,00	2,00	0,00	79,00	-0,19		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-55 A		29/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,90	3,00	0,00	79,00	-0,17		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-55 B		29/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,00	3,00	0,00	79,00	-0,12		0,00	0,00	



Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	CO2 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
Conjunto Laboratorial	PMG-56 A	29/01/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,10	1,00	2,00	79,60	-0,08			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-56 B	29/01/2025	0,00%	0,00%	2,00	19,50	2,00	1,00	78,40	-0,06			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-57 A	29/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,70	2,00	1,00	78,20	-0,09			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-57 B	29/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,70	1,00	1,00	78,20	-0,06			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-58 A	29/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,00	2,00	2,00	78,90	-0,10			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-58 B	29/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,20	1,00	1,00	78,80	-0,03			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-59 A	29/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,00	1,00	1,00	78,80	0,00			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-59 B	29/01/2025	0,00%	0,00%	8,90	9,10	2,00	2,00	82,00	0,18			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-60 A	29/01/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,50	2,00	2,00	79,30	-0,02			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-60 B	29/01/2025	0,00%	0,00%	0,30	20,50	2,00	2,00	79,10	-0,07			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-61 A	29/01/2025	0,00%	0,00%	0,30	20,70	2,00	2,00	78,90	-0,11			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-61 B	29/01/2025	0,00%	0,00%	12,30	5,10	1,00	2,00	82,60	-0,24			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-137 B	29/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	1,00	2,00	78,70	-0,01			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-138 B	29/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	1,00	2,00	78,70	0,00			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-139 A	29/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	20,90	1,00	0,00	79,10	-0,10			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-139 B	29/01/2025	87,00%	17,40%	9,10	7,50	2,00	5,00	66,00	-0,09			0,00	100,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-140 A	29/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,80	1,00	1,00	79,10	-0,04			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-140 B	29/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,90	2,00	1,00	79,10	-0,18			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-141 B	29/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,00	1,00	1,00	78,90	-0,17			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-62 A	29/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,00	1,00	2,00	79,00	-0,07			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-62 B	29/01/2025	0,30%	4,20%	0,30	20,30	2,00	2,00	79,10	0,09			0,00	23,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-01 A	28/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,50	1,00	2,00	78,50	-0,08			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-01 B	28/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,50	1,00	2,00	78,40	-0,03			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-02 A	28/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,50	2,00	3,00	78,50	-0,03			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-02 B	28/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,60	1,00	2,00	78,40	0,01			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-03 A	28/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,60	2,00	3,00	78,40	0,02			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-03 B	28/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,60	2,00	2,00	78,40	-0,12			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-04 A	28/01/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,50	1,00	2,00	78,40	-0,02			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-04 B	28/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,60	2,00	1,00	78,40	-0,05			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-05 A	28/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,50	1,00	2,00	78,50	-0,04			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-05 B	28/01/2025	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	Não medido. Água durante a medição.
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-06 A	28/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,40	1,00	2,00	78,50	-0,06			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-06 B	28/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,50	1,00	2,00	78,50	-0,02			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-07 A	28/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,40	1,00	2,00	78,50	-0,02			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-07 B	28/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,50	2,00	2,00	78,50	-0,07			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-08 A	28/01/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,20	1,00	2,00	78,60	-0,04			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-08 B	28/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,50	2,00	2,00	78,50	0,00			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-09 A	28/01/2025	0,00%	0,00%	0,60	20,80	2,00	2,00	78,60	-0,05			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-09 B	28/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	2,00	1,00	78,60	-0,08			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-10 A	28/01/2025	0,00%	0,00%	0,40	21,10	1,00	2,00	78,50	0,01			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-10 B	28/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,40	2,00	2,00	78,60	-0,05			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-84 A	28/01/2025	0,00%	0,00%	0,30	20,80	2,00	1,00	78,90	-0,06			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-84 B	28/01/2025	0,00%	0,00%	5,00	16,40	2,00	2,00	78,50	-0,04			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-85 A	28/01/2025	0,00%	0,00%	1,00	20,20	2,00	2,00	78,80	-0,05			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-85 B	28/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,10	2,00	1,00	78,80	-0,07			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-86 A	28/01/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,00	1,00	1,00	78,80	-0,06			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-86 B	28/01/2025	0,00%	0,00%	0,50	20,70	2,00	2,00	78,80	-0,03			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-87 A	28/01/2025	0,00%	0,00%	2,80	17,00	2,00	2,00	80,20	-0,06			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-87 B	28/01/2025	0,00%	0,00%	1,70	18,70	1,00	2,00	79,60	0,02			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-152 A	28/01/2025	0,00%	0,00%	0,40	21,00	1,00	2,00	78,70	-0,08			0,00	0,00	



Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	CO2 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15% ,															
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-152	B	28/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,20	2,00	2,00	78,70	-0,01		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-153	B	28/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,50	1,00	2,00	78,50	0,01		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-154	B	28/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,60	1,00	1,00	78,40	0,01		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-155	B	28/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,60	2,00	2,00	78,40	-0,03		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-156	B	28/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,50	1,00	2,00	78,50	-0,09		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-157	B	28/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,50	1,00	1,00	78,50	-0,08		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-70	A	30/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,50	2,00	2,00	79,40	0,00		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-70	B	30/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,00	2,00	2,00	79,00	-0,04		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-71	A	30/01/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,50	1,00	1,00	79,20	-0,08		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-71	B	30/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,80	2,00	1,00	79,00	0,11		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-72	A	30/01/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,40	1,00	1,00	79,40	-0,06		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-72	B	30/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,90	2,00	1,00	79,00	0,00		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-73	A	30/01/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,50	1,00	2,00	79,30	-0,03		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-73	B	30/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,00	2,00	2,00	78,90	-0,01		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-74	A	30/01/2025	0,00%	0,00%	0,30	19,80	2,00	2,00	79,90	0,00		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-74	B	30/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,90	2,00	2,00	79,00	-0,02		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-75	A	30/01/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,70	2,00	2,00	79,10	-0,03		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-75	B	30/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,10	1,00	1,00	78,80	-0,13		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-76	A	30/01/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,50	2,00	2,00	79,30	-0,13		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-76	B	30/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,10	2,00	1,00	78,90	-0,04		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-165	A	30/01/2025	0,00%	0,00%	0,30	19,70	1,00	0,00	80,00	-0,05		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-165	B	30/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,90	2,00	1,00	79,00	0,03		0,00	0,00	
CAT	PMG-82	A	30/01/2025	0,00%	0,00%	1,70	19,30	2,00	0,00	79,10	-0,13		0,00	0,00	
CAT	PMG-82	B	30/01/2025	0,00%	0,00%	4,50	16,90	2,00	0,00	78,70	-0,10		0,00	0,00	
CAT	PMG-83	A	30/01/2025	0,00%	0,00%	2,60	18,80	2,00	1,00	78,60	-0,14		0,00	0,00	
CAT	PMG-83	B	30/01/2025	0,00%	0,00%	4,20	17,00	2,00	1,00	78,70	-0,08		0,00	0,00	
CAT	PMG-94	A	30/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,70	2,00	0,00	79,20	-0,14		0,00	0,00	
CAT	PMG-94	B	30/01/2025	0,00%	0,00%	4,10	17,80	3,00	0,00	78,10	-0,04		0,00	0,00	
CAT	PMG-95	A	30/01/2025	0,00%	0,00%	1,00	20,30	2,00	0,00	78,70	-0,13		0,00	0,00	
CAT	PMG-95	B	30/01/2025	0,00%	0,00%	1,20	20,30	2,00	1,00	78,50	-0,17		0,00	0,00	
CAT	PMG-96	A	30/01/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,90	1,00	1,00	79,00	-0,05		0,00	0,00	
CAT	PMG-96	B	30/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,00	2,00	0,00	79,00	-0,13		0,00	0,00	
CAT	PMG-97	A	30/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,00	1,00	1,00	79,00	-0,03		0,00	0,00	
CAT	PMG-97	B	30/01/2025	0,00%	0,00%	2,30	19,30	2,00	1,00	78,40	-0,08		0,00	0,00	
CAT	PMG-98	A	30/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,90	1,00	1,00	79,00	0,00		0,00	0,00	
CAT	PMG-98	B	30/01/2025	0,00%	0,00%	0,30	20,80	1,00	1,00	79,00	-0,14		0,00	0,00	
CAT	PMG-160	A	30/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,80	2,00	0,00	79,00	-0,11		0,00	0,00	
CAT	PMG-160	B	30/01/2025	0,00%	0,00%	2,90	18,70	2,00	0,00	78,40	-0,15		0,00	0,00	
CAT	PMG-161	A	30/01/2025	0,00%	0,00%	2,70	19,30	1,00	1,00	78,00	-0,12		0,00	0,00	
CAT	PMG-161	B	30/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,80	3,00	0,00	79,10	-0,18		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-88	A	31/01/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,00	2,00	2,00	78,80	-0,09		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-88	B	31/01/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,00	1,00	1,00	78,80	-0,12		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-89	A	31/01/2025	0,00%	0,00%	0,30	20,90	1,00	1,00	78,80	-0,08		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-89	B	31/01/2025	0,00%	0,00%	0,90	20,50	1,00	1,00	78,60	-0,10		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-90	A	31/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,10	1,00	2,00	78,80	-0,03		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-90	B	31/01/2025	0,00%	0,00%	0,60	20,80	2,00	1,00	78,70	-0,08		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-91	A	31/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,10	1,00	2,00	78,90	-0,18		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-91	B	31/01/2025	0,00%	0,00%	1,70	19,50	1,00	2,00	78,80	-0,18		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-92	A	31/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,00	2,00	2,00	78,90	-0,07		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-92	B	31/01/2025	0,00%	0,00%	0,90	20,40	1,00	1,00	78,70	-0,09		0,00	0,00	



Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	CO2 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
Incubadora	PMG-93	A	31/01/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,90	1,00	1,00	78,90	-0,14		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-93	B	31/01/2025	0,00%	0,00%	1,00	20,40	1,00	2,00	78,60	-0,05		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-102		27/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	1,00	2,00	78,70	0,02		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-103		27/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,10	1,00	2,00	78,80	-0,01		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-104		27/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,10	1,00	3,00	78,80	0,00		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-105		27/01/2025	0,00%	0,00%	1,20	20,10	2,00	2,00	78,80	-0,05		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-106		27/01/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,00	2,00	2,00	78,80	-0,08		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-107		27/01/2025	0,00%	0,00%	2,60	17,00	2,00	1,00	80,30	-0,08		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-108		27/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,20	1,00	2,00	78,70	-0,03		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-109	A	27/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	2,00	2,00	78,60	-0,08		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-109	B	27/01/2025	0,00%	0,00%	1,00	20,00	1,00	1,00	79,00	0,02		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-110	A	27/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,20	1,00	2,00	78,70	-0,02		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-110	B	27/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	1,00	2,00	78,70	-0,12		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-111	A	27/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	1,00	2,00	78,70	0,00		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-111	B	27/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,10	2,00	2,00	78,80	0,04		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-112		27/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,40	1,00	2,00	78,50	-0,02		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-162	A	27/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,00	2,00	2,00	78,90	0,00		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-162	B	27/01/2025	0,00%	0,00%	3,20	17,90	2,00	2,00	78,90	-0,01		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-166	A	27/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	1,00	2,00	78,70	0,00		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-166	B	27/01/2025	0,00%	0,00%	1,40	18,30	1,00	2,00	80,40	0,00		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-119	A	27/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,70	2,00	1,00	78,20	-0,11		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-119	B	27/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,70	3,00	1,00	78,20	-0,03		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-119	C	27/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,70	2,00	2,00	78,30	-0,02		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-120	A	27/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,50	2,00	1,00	78,50	0,00		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-120	B	27/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,50	2,00	1,00	78,40	-0,12		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-120	C	27/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,50	2,00	1,00	78,50	-0,17		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-163	B	27/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,70	2,00	2,00	78,30	-0,09		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-164	B	27/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,60	2,00	1,00	78,40	-0,06		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-164	C	27/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,50	2,00	1,00	78,40	-0,06		0,00	0,00	
Transportes	PMG-121	A	30/01/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,20	1,00	1,00	78,60	-0,05		0,00	0,00	
Transportes	PMG-121	B	30/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,40	2,00	1,00	78,50	-0,20		0,00	0,00	
Transportes	PMG-122	A	30/01/2025	0,00%	0,00%	0,50	20,80	1,00	1,00	78,70	-0,08		0,00	0,00	
Transportes	PMG-122	B	30/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,20	1,00	1,00	78,80	0,32		0,00	0,00	
Transportes	PMG-123	A	30/01/2025	0,00%	0,00%	0,60	20,70	1,00	1,00	78,70	-0,18		0,00	0,00	
Transportes	PMG-123	B	30/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	1,00	1,00	78,70	0,00		0,00	0,00	
Transportes	PMG-124	A	30/01/2025	0,00%	0,00%	0,50	20,40	1,00	0,00	79,10	-0,08		0,00	0,00	
Transportes	PMG-124	B	30/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,20	2,00	1,00	78,80	0,01		0,00	0,00	
Transportes	PMG-158	B	30/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,30	2,00	1,00	78,60	-0,05		0,00	0,00	
Transportes	PMG-159	B	30/01/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,20	2,00	1,00	78,70	-0,23		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-125	A	30/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,20	1,00	1,00	78,70	-0,01		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-125	B	30/01/2025	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	Não medido. Água durante a medição
Posto Guarda Universitário	PMG-126	A	30/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,20	2,00	2,00	78,80	0,00		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-126	B	30/01/2025	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	Não medido. Água durante a medição
Posto Guarda Universitário	PMG-127	A	30/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,20	1,00	2,00	78,80	-0,02		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-127	B	30/01/2025	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	Não medido. Água durante a medição
Posto Guarda Universitário	PMG-128	A	30/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,20	1,00	2,00	78,80	0,02		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-128	B	30/01/2025	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	Não medido. Água durante a medição
Posto Guarda Universitário	PMG-129	A	30/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,10	2,00	2,00	78,80	0,01		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-129	B	30/01/2025	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	Não medido. Água durante a medição
Posto Guarda Universitário	PMG-130	A	30/01/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,20	1,00	2,00	78,80	0,02		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	CO2 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15% ;															
Posto Guarda Universitário	PMG-130	B	30/01/2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Não medido. Água durante a medição
Posto Guarda Universitário	PMG-131	A	30/01/2025	0,00%	0,00%	0,30	20,90	1,00	2,00	78,80	0,03		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-131	B	30/01/2025	0,00%	0,00%	1,00	20,40	1,00	3,00	78,60	-0,20		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-16	A	04/02/2025	0,00%	0,00%	1,80	20,00	1,00	1,00	78,20	-0,12		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-16	B	04/02/2025	0,00%	0,00%	1,80	19,90	1,00	2,00	78,30	-0,05		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-17	A	04/02/2025	0,00%	0,00%	0,30	21,10	1,00	1,00	78,50	-0,04		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-17	B	04/02/2025	0,00%	0,00%	1,50	19,90	1,00	2,00	78,50	-0,10		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-18	A	04/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,50	2,00	1,00	79,40	-0,13		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-18	B	04/02/2025	0,00%	0,00%	1,50	19,40	2,00	0,00	79,10	-0,22		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-20	A	04/02/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,70	1,00	1,00	79,20	-0,08		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-20	B	04/02/2025	0,00%	0,00%	0,40	20,40	2,00	1,00	79,20	-0,13		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-22	A	04/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,50	1,00	1,00	78,50	-0,06		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-22	B	04/02/2025	0,00%	0,00%	2,30	19,20	1,00	1,00	78,50	-0,07		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-23	A	04/02/2025	0,00%	0,00%	0,30	20,60	1,00	1,00	79,10	-0,08		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-23	B	04/02/2025	0,00%	0,00%	1,00	20,00	2,00	1,00	79,00	-0,12		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-113	A	04/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,60	2,00	0,00	79,30	-0,14		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-113	B	04/02/2025	0,00%	0,00%	1,40	19,40	2,00	0,00	79,20	-0,17		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-114	A	04/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,80	1,00	0,00	79,10	-0,33		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-114	B	04/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	20,90	2,00	1,00	79,10	-0,12		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-115	A	04/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,60	2,00	0,00	79,30	-0,20		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-115	B	04/02/2025	0,00%	0,00%	0,60	20,20	2,00	0,00	79,20	-0,15		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-11	A	04/02/2025	0,00%	0,00%	1,00	19,90	1,00	2,00	79,00	-0,05		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-11	B	04/02/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,90	2,00	1,00	78,90	-0,06		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-12	A	04/02/2025	0,00%	0,00%	3,50	17,20	2,00	2,00	79,30	-0,02		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-12	B	04/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,30	2,00	2,00	78,60	0,00		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-13	A	04/02/2025	0,00%	0,00%	0,80	20,60	3,00	2,00	78,50	-0,02		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-13	B	04/02/2025	0,00%	0,00%	1,20	20,10	3,00	1,00	78,70	-0,03		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-14	A	04/02/2025	0,00%	0,00%	2,70	17,50	2,00	1,00	79,90	-0,08		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-14	B	04/02/2025	0,00%	0,00%	4,00	15,60	2,00	1,00	80,40	-0,09		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-15	A	04/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,40	3,00	1,00	78,60	-0,03		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-15	B	04/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,50	3,00	1,00	78,40	-0,10		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-19	A	04/02/2025	0,00%	0,00%	0,30	20,90	1,00	1,00	78,70	-0,03		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-19	B	04/02/2025	0,00%	0,00%	0,80	20,60	1,00	1,00	78,60	0,02		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-21	A	04/02/2025	0,00%	0,00%	1,10	19,70	2,00	1,00	79,10	-0,08		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-21	B	04/02/2025	0,00%	0,00%	1,60	19,30	2,00	1,00	79,10	-0,03		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-24	A	04/02/2025	0,00%	0,00%	0,80	20,30	3,00	1,00	79,00	-0,02		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-24	B	04/02/2025	0,00%	0,00%	0,40	21,00	3,00	1,00	78,60	0,03		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-135	A	04/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,80	1,00	0,00	79,10	-0,10		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG -135	B	04/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	20,80	1,00	0,00	79,10	-0,14		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-136	B	04/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,70	1,00	0,00	79,20	-0,13		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-25	A	03/02/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,00	1,00	1,00	78,80	0,00		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-25	B	03/02/2025	0,00%	0,00%	1,30	20,10	1,00	1,00	78,60	-0,06		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-26	A	03/02/2025	0,00%	0,00%	0,70	20,10	1,00	1,00	79,20	-0,05		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-26	B	03/02/2025	0,00%	0,00%	1,40	19,20	1,00	1,00	79,40	-0,12		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-27	A	03/02/2025	0,00%	0,00%	1,80	18,50	1,00	0,00	79,70	-0,08		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-27	B	03/02/2025	0,00%	0,00%	3,40	17,00	1,00	1,00	79,50	-0,10		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-28	A	03/02/2025	0,00%	0,00%	1,00	19,70	1,00	1,00	79,30	-0,06		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-28	B	03/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,20	1,00	1,00	78,80	-0,14		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-29	A	03/02/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,10	1,00	1,00	78,70	-0,08		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-29	B	03/02/2025	0,00%	0,00%	1,00	20,30	1,00	1,00	78,70	-0,04		0,00	0,00	



Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	CO2 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15%,															
I-5 Auditórios	PMG-44	A	03/02/2025	0,00%	0,00%	0,90	20,00	1,00	1,00	79,10	-0,08		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-44	B	03/02/2025	0,00%	0,00%	0,80	20,00	1,00	1,00	79,20	0,02		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-45	A	03/02/2025	0,00%	0,00%	0,40	20,10	1,00	1,00	79,50	-0,04		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-45	B	03/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,20	1,00	0,00	78,70	-0,06		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-134	B	03/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	2,00	1,00	78,70	-0,08		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-30	A	03/02/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,60	2,00	0,00	79,20	-0,30		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-30	B	03/02/2025	0,00%	0,00%	1,60	19,40	2,00	0,00	79,00	-0,32		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-31	A	03/02/2025	0,00%	0,00%	0,50	20,10	2,00	0,00	79,40	-0,19		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-31	B	03/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,60	2,00	0,00	79,40	-0,27		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-32	A	03/02/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,70	1,00	0,00	79,10	-0,14		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-32	B	03/02/2025	0,00%	0,00%	1,00	20,00	1,00	0,00	79,00	-0,11		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-33	A	03/02/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,80	1,00	0,00	79,00	-0,12		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-33	B	03/02/2025	0,00%	0,00%	3,20	18,00	1,00	0,00	78,80	-0,14		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-34	A	03/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,80	2,00	0,00	79,10	-0,08		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-34	B	03/02/2025	0,00%	0,00%	0,90	20,30	1,00	0,00	78,80	-0,17		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-35	A	03/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,00	1,00	0,00	78,90	-0,13		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-35	B	03/02/2025	0,00%	0,00%	1,00	20,30	2,00	1,00	78,60	-0,02		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-36	A	03/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,00	1,00	1,00	78,90	-0,16		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-36	B	03/02/2025	0,00%	0,00%	2,50	18,60	1,00	1,00	78,80	-0,06		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-37	A	03/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,00	1,00	1,00	78,90	-0,12		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-37	B	03/02/2025	0,00%	0,00%	1,10	20,20	2,00	0,00	78,70	-0,08		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-38	A	03/02/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,90	1,00	1,00	78,90	-0,17		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-38	B	03/02/2025	0,00%	0,00%	0,30	20,80	2,00	0,00	78,90	-0,18		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-39	A	03/02/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,80	2,00	1,00	78,90	-0,07		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-39	B	03/02/2025	0,00%	0,00%	5,10	15,90	2,00	0,00	79,00	-0,18		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-40	A	03/02/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,90	1,00	0,00	78,90	-0,07		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-40	B	03/02/2025	0,00%	0,00%	0,30	20,70	1,00	0,00	79,00	-0,13		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-41	A	03/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,70	2,00	0,00	79,20	-0,13		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-41	B	03/02/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,70	1,00	0,00	79,10	-0,06		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-42	A	03/02/2025	0,00%	0,00%	1,00	20,00	1,00	0,00	79,10	-0,15		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-42	B	03/02/2025	0,00%	0,00%	9,20	12,90	2,00	0,00	77,90	-0,12		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-43	A	03/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,30	1,00	0,00	79,50	-0,22		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-43	B	03/02/2025	0,00%	0,00%	0,60	20,40	1,00	0,00	79,00	-0,14		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-132	A	03/02/2025	0,00%	0,00%	0,50	19,90	2,00	0,00	79,60	-0,18		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-132	B	03/02/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,30	2,00	0,00	79,50	-0,11		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-133	A	03/02/2025	0,00%	0,00%	0,40	20,50	1,00	0,00	79,10	-0,11		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-133	B	03/02/2025	0,00%	0,00%	0,50	20,60	1,00	0,00	78,90	-0,04		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-63	A	05/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,90	1,00	1,00	78,10	-0,12		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-63	B	05/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,90	1,00	1,00	78,10	-0,11		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-64	A	05/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,50	2,00	1,00	78,50	-0,08		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-64	B	05/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,50	2,00	1,00	78,50	-0,06		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-65	A	05/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,60	1,00	1,00	78,30	-0,12		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-65	B	05/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,60	1,00	1,00	78,30	-0,04		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-66	A	05/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,50	1,00	1,00	78,40	-0,08		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-66	B	05/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,60	1,00	1,00	78,40	-0,18		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-67	A	05/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,10	2,00	2,00	78,80	-0,07		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-67	B	05/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,20	2,00	2,00	78,80	-0,13		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-68	A	05/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,20	2,00	2,00	78,70	0,00		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-68	B	05/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	1,00	2,00	78,70	0,01		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-69	A	05/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,70	1,00	1,00	78,20	-0,10		0,00	0,00	



Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	CO2 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15%,															
Edifício I-4	PMG-69	B	05/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,70	1,00	1,00	78,20	-0,14		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-77	A	05/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,20	1,00	2,00	78,70	0,00		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-77	B	05/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	1,00	1,00	78,70	-0,02		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-78	A	05/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,20	2,00	1,00	78,80	0,03		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-78	B	05/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,20	1,00	1,00	78,80	-0,09		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-79	A	05/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,20	2,00	2,00	78,70	-0,30		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-79	B	05/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	2,00	2,00	78,70	0,02		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-80	A	05/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	1,00	2,00	78,70	-0,09		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-80	B	05/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	1,00	2,00	78,70	-0,16		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-81	A	05/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,20	2,00	2,00	78,70	-0,13		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-81	B	05/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	2,00	1,00	78,70	-0,08		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-144	B	05/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	2,00	2,00	78,70	-0,02		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-145	B	05/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,20	1,00	2,00	78,80	-0,01		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-146	B	05/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	2,00	2,00	78,70	-0,31		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-147	B	05/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,20	2,00	2,00	78,80	-0,08		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-148	B	05/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,60	1,00	1,00	78,40	-0,04		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-149	B	05/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,60	1,00	1,00	78,40	-0,07		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-150	B	05/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,70	1,00	1,00	78,30	-0,06		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-151	B	05/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	1,00	2,00	78,60	0,01		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-46	A	05/02/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,00	3,00	1,00	78,70	-0,05		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-46	B	05/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	3,00	2,00	78,70	-0,01		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-47	A	05/02/2025	0,00%	0,00%	0,30	20,70	2,00	2,00	79,00	-0,06		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-47	B	05/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	2,00	1,00	78,70	-0,11		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-48	A	05/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,20	1,00	2,00	78,60	0,02		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-48	B	05/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,40	1,00	1,00	78,60	-0,07		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-49	A	05/02/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,20	1,00	2,00	78,60	-0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-49	B	05/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,40	1,00	2,00	78,60	-0,02		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-50	A	05/02/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,20	1,00	2,00	78,60	0,00		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-50	B	05/02/2025	0,00%	0,00%	1,50	20,00	1,00	2,00	78,60	-0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-51	A	05/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,90	1,00	1,00	79,00	-0,11		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-51	B	05/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,00	1,00	1,00	79,00	-0,23		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-52	A	05/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	20,90	1,00	1,00	79,00	-0,05		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-52	B	05/02/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,80	1,00	0,00	79,00	-0,13		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-53	A	05/02/2025	0,00%	0,00%	0,50	20,50	2,00	1,00	79,00	-0,12		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-53	B	05/02/2025	0,80%	0,80%	1,00	19,00	2,00	0,00	79,20	-0,04		0,00	28,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-54	A	05/02/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,70	2,00	1,00	79,10	-0,14		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-54	B	05/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,90	1,00	1,00	79,10	0,00		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-55	A	05/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,70	2,00	0,00	79,20	-0,14		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-55	B	05/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	20,80	2,00	0,00	79,10	-0,04		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-56	A	05/02/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,60	4,00	1,00	79,20	-0,04		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-56	B	05/02/2025	0,00%	0,00%	1,00	20,40	3,00	1,00	78,60	-0,07		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-57	A	05/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,00	1,00	1,00	78,90	-0,07		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-57	B	05/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,20	1,00	1,00	78,80	-0,10		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-58	A	05/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,10	3,00	1,00	78,80	-0,07		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-58	B	05/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	4,00	1,00	78,70	-0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-59	A	05/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,10	4,00	2,00	78,80	-0,07		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-59	B	05/02/2025	0,00%	0,00%	4,70	14,20	5,00	1,00	81,10	-0,04		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-60	A	05/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,90	5,00	1,00	79,10	-0,06		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-60	B	05/02/2025	0,00%	0,00%	2,10	17,50	5,00	2,00	80,30	-0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-61	A	05/02/2025	0,00%	0,00%	0,30	20,70	4,00	1,00	79,00	-0,03		0,00	0,00	



Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	CO2 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
Conjunto Laboratorial	PMG-61 B		05/02/2025	0,00%	0,00%	7,90	11,90	4,00	1,00	80,20	-0,13		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-137 B		05/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,40	1,00	2,00	78,60	-0,04		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-138 B		05/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,40	2,00	2,00	78,60	0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-139 A		05/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	20,90	1,00	0,00	79,10	-0,07		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-139 B		05/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,80	1,00	1,00	79,10	-0,07		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-140 A		05/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,80	1,00	1,00	79,10	-0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-140 B		05/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	20,90	2,00	1,00	79,00	-0,06		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-141 B		05/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,00	2,00	1,00	78,90	-0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-62 A		05/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,00	1,00	1,00	78,90	-0,13		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-62 B		05/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,00	2,00	1,00	78,90	-0,15		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-01 A		04/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,40	1,00	2,00	78,60	-0,06		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-01 B		04/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,50	1,00	2,00	78,50	-0,04		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-02 A		04/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,40	1,00	2,00	78,50	-0,04		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-02 B		04/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,50	1,00	1,00	78,40	0,01		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-03 A		04/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,50	1,00	1,00	78,50	-0,08		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-03 B		04/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,50	1,00	1,00	78,50	-0,12		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-04 A		04/02/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,40	2,00	1,00	78,50	-0,04		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-04 B		04/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,50	1,00	2,00	78,50	0,04		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-05 A		04/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,40	1,00	2,00	78,50	-0,03		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-05 B		04/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,50	1,00	1,00	78,50	-0,07		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-06 A		04/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,40	1,00	2,00	78,50	-0,08		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-06 B		04/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,50	1,00	1,00	78,50	0,08		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-07 A		04/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,60	1,00	1,00	78,30	-0,13		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-07 B		04/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,60	1,00	1,00	78,30	-0,01		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-08 A		04/02/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,10	1,00	2,00	78,70	-0,03		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-08 B		04/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,40	1,00	1,00	78,60	-0,09		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-09 A		04/02/2025	0,00%	0,00%	0,70	20,80	1,00	1,00	78,50	-0,13		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-09 B		04/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,20	1,00	1,00	78,70	0,02		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-10 A		04/02/2025	0,00%	0,00%	0,40	21,00	1,00	1,00	78,70	-0,08		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-10 B		04/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,30	2,00	2,00	78,70	0,07		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-84 A		04/02/2025	0,00%	0,00%	0,30	20,90	1,00	1,00	78,90	-0,07		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-84 B		04/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,10	1,00	0,00	78,90	-0,13		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-85 A		04/02/2025	0,00%	0,00%	0,60	20,70	1,00	1,00	78,70	-0,09		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-85 B		04/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,10	1,00	1,00	78,90	0,06		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-86 A		04/02/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,90	2,00	1,00	78,90	0,00		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-86 B		04/02/2025	0,00%	0,00%	0,30	20,70	1,00	1,00	78,90	-0,06		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-87 A		04/02/2025	0,00%	0,00%	2,60	17,50	1,00	1,00	79,80	-0,05		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-87 B		04/02/2025	0,00%	0,00%	2,40	18,50	1,00	1,00	79,10	-0,22		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-152 A		04/02/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,00	1,00	2,00	78,90	-0,05		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-152 B		04/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,20	1,00	1,00	78,80	-0,03		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-153 B		04/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,40	1,00	2,00	78,50	-0,08		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-154 B		04/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,60	1,00	2,00	78,40	-0,13		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-155 B		04/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,50	2,00	2,00	78,40	-0,06		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-156 B		04/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,50	1,00	1,00	78,50	0,01		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-157 B		04/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,50	1,00	2,00	78,50	-0,03		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-70 A		06/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,80	1,00	2,00	79,10	-0,07		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-70 B		06/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,00	1,00	2,00	78,90	0,00		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-71 A		06/02/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,80	2,00	1,00	79,10	-0,05		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-71 B		06/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,00	1,00	1,00	79,00	0,04		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-72 A		06/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,70	2,00	2,00	79,20	-0,02		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	CO2 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15% ;															
Enfermaria	PMG-72	B	06/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,10	1,00	1,00	78,90	-0,04		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-73	A	06/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,90	2,00	1,00	79,00	0,02		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-73	B	06/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,10	2,00	2,00	78,80	0,06		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-74	A	06/02/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,50	2,00	2,00	79,30	-0,03		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-74	B	06/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,10	2,00	2,00	78,90	-0,07		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-75	A	06/02/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,80	2,00	2,00	79,00	-0,02		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-75	B	06/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,10	2,00	1,00	78,80	-0,77		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-76	A	06/02/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,70	1,00	2,00	79,20	-0,02		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-76	B	06/02/2025	0,00%	0,00%	0,50	20,40	2,00	2,00	79,10	-0,06		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-165	A	06/02/2025	0,00%	0,00%	0,40	20,30	1,00	1,00	79,30	-0,03		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-165	B	06/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,00	1,00	1,00	78,90	-0,01		0,00	0,00	
CAT	PMG-82	A	06/02/2025	0,00%	0,00%	1,30	19,60	2,00	0,00	79,00	-0,12		0,00	0,00	
CAT	PMG-82	B	06/02/2025	0,00%	0,00%	5,90	15,40	2,00	0,00	78,70	-0,12		0,00	0,00	
CAT	PMG-83	A	06/02/2025	0,00%	0,00%	2,30	18,60	2,00	0,00	79,00	-0,12		0,00	0,00	
CAT	PMG-83	B	06/02/2025	0,00%	0,00%	4,00	17,00	2,00	0,00	79,00	-0,01		0,00	0,00	
CAT	PMG-94	A	06/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,70	2,00	1,00	79,20	-0,08		0,00	0,00	
CAT	PMG-94	B	06/02/2025	0,00%	0,00%	1,90	18,80	3,00	0,00	79,20	-0,18		0,00	0,00	
CAT	PMG-95	A	06/02/2025	0,00%	0,00%	0,90	20,50	2,00	1,00	78,60	-0,23		0,00	0,00	
CAT	PMG-95	B	06/02/2025	0,00%	0,00%	0,80	20,70	2,00	0,00	78,50	0,07		0,00	0,00	
CAT	PMG-96	A	06/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,80	2,00	1,00	79,00	-0,08		0,00	0,00	
CAT	PMG-96	B	06/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	20,90	2,00	1,00	79,00	0,14		0,00	0,00	
CAT	PMG-97	A	06/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,90	2,00	1,00	79,00	-0,13		0,00	0,00	
CAT	PMG-97	B	06/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,00	2,00	1,00	79,00	-0,14		0,00	0,00	
CAT	PMG-98	A	06/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,00	2,00	1,00	79,00	-0,07		0,00	0,00	
CAT	PMG-98	B	06/02/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,90	1,00	1,00	78,90	-0,06		0,00	0,00	
CAT	PMG-160	A	06/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,70	3,00	1,00	79,20	-0,13		0,00	0,00	
CAT	PMG-160	B	06/02/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,60	2,00	0,00	79,20	-0,13		0,00	0,00	
CAT	PMG-161	A	06/02/2025	0,00%	0,00%	1,90	19,60	2,00	1,00	78,50	-0,13		0,00	0,00	
CAT	PMG-161	B	06/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,90	2,00	1,00	79,00	-0,15		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-88	A	07/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,50	2,00	1,00	79,30	-0,08		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-88	B	07/02/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,60	2,00	1,00	79,20	-0,12		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-89	A	07/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,80	2,00	2,00	79,10	0,02		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-89	B	07/02/2025	0,00%	0,00%	0,60	20,30	1,00	2,00	79,10	-0,09		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-90	A	07/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	20,90	2,00	2,00	79,10	0,01		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-90	B	07/02/2025	0,00%	0,00%	0,30	20,60	1,00	2,00	79,10	-0,03		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-91	A	07/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	20,90	2,00	2,00	79,00	0,03		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-91	B	07/02/2025	0,00%	0,00%	1,10	19,70	2,00	2,00	79,30	0,03		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-92	A	07/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,90	2,00	2,00	79,00	-0,04		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-92	B	07/02/2025	0,00%	0,00%	0,70	20,20	2,00	2,00	79,00	-0,01		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-93	A	07/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,90	2,00	0,00	79,00	-0,09		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-93	B	07/02/2025	0,00%	0,00%	0,70	20,40	2,00	2,00	78,90	-0,06		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-102		03/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,20	1,00	1,00	78,80	-0,04		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-103		03/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,00	1,00	2,00	78,90	-0,08		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-104		03/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,00	1,00	1,00	78,90	-0,04		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-105		03/02/2025	0,00%	0,00%	1,20	20,00	2,00	1,00	78,80	-0,04		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-106		03/02/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,80	1,00	1,00	79,00	-0,09		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-107		03/02/2025	0,00%	0,00%	2,30	17,70	1,00	1,00	80,00	-0,08		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-108		03/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,20	1,00	1,00	78,70	-0,09		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-109	A	03/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,30	2,00	1,00	78,60	-0,04		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-109	B	03/02/2025	0,00%	0,00%	0,90	20,50	2,00	0,00	78,60	-0,16		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	CO2 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15% ;															
Ginásio Poliesportivo	PMG-110	A	03/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,10	1,00	2,00	78,80	-0,04		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-110	B	03/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,20	2,00	1,00	78,80	0,01		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-111	A	03/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,20	2,00	2,00	78,80	-0,02		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-111	B	03/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,10	1,00	1,00	78,80	0,03		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-112		03/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,50	2,00	1,00	78,50	-0,17		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-162	A	03/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,00	1,00	1,00	79,00	-0,07		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-162	B	03/02/2025	0,00%	0,00%	3,10	17,70	1,00	1,00	79,20	-0,11		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-166	A	03/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,10	1,00	1,00	78,80	-0,07		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-166	B	03/02/2025	0,00%	0,00%	1,30	18,30	1,00	1,00	80,40	-0,14		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-119	A	03/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,30	1,00	1,00	78,60	-0,13		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-119	B	03/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,40	1,00	1,00	78,60	-0,09		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-119	C	03/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,40	2,00	1,00	78,60	0,06		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-120	A	03/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,00	1,00	1,00	78,70	0,03		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-120	B	03/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,40	1,00	1,00	78,60	-0,11		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-120	C	03/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	1,00	1,00	78,60	-0,09		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-163	B	03/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,40	1,00	1,00	78,60	-0,21		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-164	B	03/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,40	1,00	1,00	78,60	-0,05		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-164	C	03/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,40	1,00	1,00	78,60	-0,05		0,00	0,00	
Transportes	PMG-121	A	06/02/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,00	1,00	1,00	78,80	-0,07		0,00	0,00	
Transportes	PMG-121	B	06/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,20	1,00	1,00	78,70	-0,04		0,00	0,00	
Transportes	PMG-122	A	06/02/2025	0,00%	0,00%	0,50	20,70	1,00	1,00	78,80	-0,11		0,00	0,00	
Transportes	PMG-122	B	06/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,00	1,00	1,00	79,00	-0,18		0,00	0,00	
Transportes	PMG-123	A	06/02/2025	0,00%	0,00%	0,50	20,40	1,00	1,00	79,10	-0,04		0,00	0,00	
Transportes	PMG-123	B	06/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,00	1,00	1,00	79,00	-0,06		0,00	0,00	
Transportes	PMG-124	A	06/02/2025	0,00%	0,00%	0,80	19,90	1,00	1,00	79,30	0,06		0,00	0,00	
Transportes	PMG-124	B	06/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	20,90	2,00	1,00	79,00	-0,06		0,00	0,00	
Transportes	PMG-158	B	06/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,00	1,00	1,00	78,90	-0,11		0,00	0,00	
Transportes	PMG-159	B	06/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,00	1,00	1,00	78,90	-0,14		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-125	A	06/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,20	2,00	2,00	78,70	-0,04		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-125	B	06/02/2025	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	Não medido. Agua durante a medição.
Posto Guarda Universitário	PMG-126	A	06/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,20	1,00	2,00	78,80	-0,03		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-126	B	06/02/2025	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	Não medido. Agua durante a medição.
Posto Guarda Universitário	PMG-127	A	06/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,20	1,00	2,00	78,80	0,03		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-127	B	06/02/2025	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	Não medido. Agua durante a medição.
Posto Guarda Universitário	PMG-128	A	06/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,20	2,00	2,00	78,80	0,00		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-128	B	06/02/2025	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	Não medido. Agua durante a medição.
Posto Guarda Universitário	PMG-129	A	06/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,10	1,00	2,00	78,90	0,00		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-129	B	06/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,10	2,00	3,00	78,90	-0,03		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-130	A	06/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,00	1,00	2,00	78,90	-0,03		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-130	B	06/02/2025	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	Não medido. Agua durante a medição.
Posto Guarda Universitário	PMG-131	A	06/02/2025	0,00%	0,00%	0,30	20,70	0,00	6,00	79,10	0,03		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-131	B	06/02/2025	0,00%	0,00%	1,10	20,00	0,00	5,00	78,90	0,18		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-16	A	11/02/2025	0,00%	0,00%	1,80	19,90	1,00	2,00	78,30	-0,04		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-16	B	11/02/2025	0,00%	0,00%	2,00	19,70	1,00	2,00	78,30	-0,14		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-17	A	11/02/2025	0,00%	0,00%	0,40	21,00	1,00	1,00	78,50	0,00		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-17	B	11/02/2025	0,00%	0,00%	1,00	20,50	1,00	2,00	78,50	0,07		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-18	A	11/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,00	1,00	0,00	78,90	-0,11		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-18	B	11/02/2025	0,00%	0,00%	1,60	19,60	1,00	1,00	78,70	-0,06		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-20	A	11/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,90	1,00	1,00	79,00	-0,14		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-20	B	11/02/2025	0,00%	0,00%	0,30	20,70	1,00	1,00	79,00	-0,11		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	C02 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15% ,															
Edifício I 1	PMG-22 A		11/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,40	1,00	2,00	78,50	-0,03		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-22 B		11/02/2025	0,00%	0,00%	2,30	19,00	1,00	2,00	78,70	-0,01		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-23 A		11/02/2025	0,00%	0,00%	0,40	20,60	1,00	2,00	79,00	-0,09		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-23 B		11/02/2025	0,00%	0,00%	0,80	20,20	1,00	1,00	79,00	-0,07		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-113 A		11/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,00	2,00	1,00	79,00	-0,08		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-113 B		11/02/2025	0,00%	0,00%	1,30	19,60	1,00	1,00	79,10	-0,05		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-114 A		11/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,00	1,00	1,00	79,00	-0,10		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-114 B		11/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,10	1,00	1,00	78,90	-0,03		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-115 A		11/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,80	1,00	1,00	79,10	-0,13		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-115 B		11/02/2025	0,00%	0,00%	0,60	20,50	1,00	1,00	78,90	-0,05		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-11 A		11/02/2025	0,00%	0,00%	1,10	20,10	1,00	0,00	78,90	-0,20		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-11 B		11/02/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,00	1,00	0,00	78,80	-0,15		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-12 A		11/02/2025	0,00%	0,00%	1,90	18,90	2,00	2,00	79,20	-0,04		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-12 B		11/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,40	1,00	2,00	78,50	-0,20		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-13 A		11/02/2025	0,00%	0,00%	1,00	20,40	2,00	2,00	78,60	0,01		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-13 B		11/02/2025	0,00%	0,00%	1,50	19,80	1,00	1,00	78,70	0,01		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-14 A		11/02/2025	0,00%	0,00%	2,30	19,10	1,00	0,00	78,60	-0,12		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-14 B		11/02/2025	0,00%	0,00%	3,80	16,60	1,00	1,00	79,60	-0,02		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-15 A		11/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,50	1,00	2,00	78,40	-0,08		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-15 B		11/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,60	1,00	1,00	78,40	-0,03		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-19 A		11/02/2025	0,00%	0,00%	0,40	21,00	1,00	0,00	78,60	-0,21		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-19 B		11/02/2025	0,00%	0,00%	0,70	20,60	1,00	1,00	78,70	-0,10		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-21 A		11/02/2025	0,00%	0,00%	1,10	20,40	2,00	1,00	78,50	-0,18		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-21 B		11/02/2025	0,00%	0,00%	1,30	20,30	2,00	1,00	78,40	-0,16		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-24 A		11/02/2025	0,00%	0,00%	0,40	20,90	1,00	1,00	78,70	-0,09		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-24 B		11/02/2025	0,00%	0,00%	0,40	21,00	1,00	1,00	78,60	-0,08		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-135 A		11/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,90	1,00	1,00	79,00	-0,15		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG -135 B		11/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,00	1,00	1,00	78,90	-0,12		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-136 B		11/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,00	1,00	0,00	79,00	-0,14		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-25 A		10/02/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,00	2,00	2,00	78,90	-0,02		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-25 B		10/02/2025	0,00%	0,00%	0,80	20,40	1,00	1,00	78,80	0,03		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-26 A		10/02/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,00	1,00	2,00	78,80	0,00		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-26 B		10/02/2025	0,00%	0,00%	1,10	20,00	1,00	2,00	78,90	-0,04		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-27 A		10/02/2025	0,00%	0,00%	1,10	20,10	2,00	2,00	78,90	0,12		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-27 B		10/02/2025	0,00%	0,00%	3,30	17,60	2,00	2,00	79,20	0,05		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-28 A		10/02/2025	0,00%	0,00%	0,90	19,10	1,00	2,00	80,00	0,00		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-28 B		10/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,10	2,00	2,00	78,80	-0,03		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-29 A		10/02/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,00	2,00	2,00	78,80	0,04		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-29 B		10/02/2025	0,00%	0,00%	0,60	20,40	1,00	2,00	78,90	-0,02		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-44 A		10/02/2025	0,00%	0,00%	0,50	20,90	1,00	2,00	78,60	0,01		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-44 B		10/02/2025	0,00%	0,00%	0,60	20,90	2,00	1,00	78,60	-0,01		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-45 A		10/02/2025	0,00%	0,00%	0,40	20,40	2,00	2,00	79,20	0,00		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-45 B		10/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,20	2,00	2,00	78,80	0,00		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-134 B		10/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	1,00	2,00	78,70	0,08		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-30 A		10/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,40	2,00	1,00	79,50	-0,13		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-30 B		10/02/2025	0,00%	0,00%	0,50	20,00	2,00	0,00	79,50	-0,15		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-31 A		10/02/2025	0,00%	0,00%	0,30	19,90	3,00	1,00	79,80	-0,15		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-31 B		10/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,30	3,00	0,00	79,60	-0,18		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-32 A		14/02/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,90	2,00	2,00	79,00	-0,14		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-32 B		14/02/2025	0,00%	0,00%	0,90	20,20	1,00	2,00	78,90	-0,06		0,00	0,00	



Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	CO2 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15%,															
I-3 Biblioteca	PMG-33 A	10/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,80	2,00	0,00	79,10	-0,16			0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-33 B	10/02/2025	0,00%	0,00%	3,00	18,00	2,00	1,00	79,00	-0,10			0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-34 A	10/02/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,60	1,00	1,00	79,20	-0,07			0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-34 B	10/02/2025	0,00%	0,00%	1,10	20,10	2,00	0,00	78,80	0,00			0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-35 A	10/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,00	2,00	2,00	79,00	-0,03			0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-35 B	10/02/2025	0,00%	0,00%	0,90	20,40	1,00	1,00	78,70	-0,04			0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-36 A	10/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,00	2,00	1,00	78,90	-0,03			0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-36 B	10/02/2025	0,00%	0,00%	2,60	18,40	2,00	1,00	78,90	0,01			0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-37 A	10/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,00	2,00	2,00	78,90	-0,10			0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-37 B	10/02/2025	0,00%	0,00%	0,90	20,30	2,00	1,00	78,80	-0,05			0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-38 A	10/02/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,80	2,00	2,00	79,00	-0,17			0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-38 B	10/02/2025	0,00%	0,00%	0,30	20,70	2,00	1,00	79,00	0,00			0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-39 A	10/02/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,70	2,00	1,00	79,00	-0,06			0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-39 B	10/02/2025	0,00%	0,00%	5,10	15,90	2,00	1,00	78,90	-0,06			0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-40 A	10/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,00	2,00	2,00	78,90	-0,06			0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-40 B	10/02/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,80	2,00	1,00	79,00	-0,08			0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-41 A	10/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,60	2,00	1,00	79,30	0,00			0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-41 B	10/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,60	2,00	0,00	79,20	-0,08			0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-42 A	10/02/2025	0,00%	0,00%	0,60	20,20	2,00	0,00	79,20	-0,08			0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-42 B	10/02/2025	0,00%	0,00%	4,70	16,70	2,00	1,00	78,60	0,02			0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-43 A	10/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,50	2,00	1,00	79,40	-0,13			0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-43 B	10/02/2025	0,00%	0,00%	0,50	20,40	2,00	1,00	79,10	-0,07			0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-132 A	10/02/2025	0,00%	0,00%	0,50	19,40	4,00	0,00	80,10	-0,13			0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-132 B	10/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,00	4,00	0,00	79,90	-0,14			0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-133 A	10/02/2025	0,00%	0,00%	0,50	20,30	1,00	1,00	79,20	-0,02			0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-133 B	10/02/2025	0,00%	0,00%	0,60	20,40	1,00	1,00	79,00	-0,03			0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-63 A	12/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,40	2,00	1,00	78,50	-0,07			0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-63 B	12/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,40	3,00	1,00	78,50	-0,07			0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-64 A	12/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,10	2,00	1,00	78,80	-0,08			0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-64 B	12/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,20	2,00	1,00	78,80	0,02			0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-65 A	12/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,20	2,00	1,00	78,70	-0,06			0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-65 B	12/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,20	2,00	1,00	78,70	-0,04			0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-66 A	12/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,10	2,00	1,00	78,80	-0,02			0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-66 B	12/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,20	2,00	1,00	78,70	-0,14			0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-67 A	12/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,10	1,00	2,00	78,80	0,01			0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-67 B	12/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,20	1,00	2,00	78,80	-0,04			0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-68 A	12/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,50	1,00	1,00	78,50	-0,03			0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-68 B	12/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,50	2,00	2,00	78,40	-0,04			0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-69 A	12/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,30	3,00	1,00	78,70	-0,08			0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-69 B	12/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	2,00	1,00	78,70	-0,06			0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-77 A	12/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	2,00	2,00	78,70	-0,01			0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-77 B	12/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	2,00	1,00	78,70	-0,02			0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-78 A	12/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,20	2,00	2,00	78,70	-0,09			0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-78 B	12/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	2,00	2,00	78,70	0,05			0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-79 A	12/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	2,00	2,00	78,60	0,01			0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-79 B	12/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,50	2,00	2,00	78,50	0,07			0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-80 A	12/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,40	2,00	1,00	78,60	-0,08			0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-80 B	12/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,40	2,00	1,00	78,60	-0,03			0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-81 A	12/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	1,00	2,00	78,70	0,04			0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-81 B	12/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	2,00	1,00	78,60	0,00			0,00	0,00	



Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	CO2 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15%,															
Edifício I-4	PMG-144 B		12/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,20	3,00	2,00	78,70	0,00		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-145 B		12/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,20	2,00	2,00	78,80	0,01		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-146 B		12/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	2,00	2,00	78,70	0,04		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-147 B		12/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,20	1,00	2,00	78,80	-0,14		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-148 B		12/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,20	2,00	1,00	78,70	-0,03		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-149 B		12/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,20	2,00	1,00	78,70	-0,07		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-150 B		12/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	2,00	1,00	78,70	-0,02		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-151 B		12/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,50	2,00	2,00	78,50	0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-46 A		12/02/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,00	2,00	1,00	78,80	-0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-46 B		12/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,20	2,00	1,00	78,70	-0,01		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-47 A		12/02/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,80	2,00	1,00	79,00	0,02		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-47 B		12/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,20	2,00	1,00	78,70	-0,09		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-48 A		12/02/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,10	2,00	1,00	78,70	-0,04		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-48 B		12/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	1,00	1,00	78,70	-0,07		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-49 A		12/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,20	1,00	2,00	78,70	-0,13		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-49 B		12/02/2025	0,00%	0,00%	0,40	21,00	1,00	2,00	78,60	-0,01		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-50 A		12/02/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,10	1,00	2,00	78,60	0,02		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-50 B		12/02/2025	0,00%	0,00%	1,20	20,20	1,00	1,00	78,60	0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-51 A		12/02/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,80	2,00	0,00	79,10	-0,22		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-51 B		12/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,90	2,00	0,00	79,10	-0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-52 A		12/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,80	1,00	1,00	79,10	-0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-52 B		12/02/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,70	2,00	1,00	79,10	-0,11		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-53 A		12/02/2025	0,00%	0,00%	0,50	20,30	2,00	0,00	79,20	-0,15		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-53 B		12/02/2025	0,10%	0,10%	0,50	19,80	1,00	1,00	79,50	-0,10		0,00	3,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-54 A		12/02/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,70	1,00	1,00	79,20	-0,07		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-54 B		12/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,90	2,00	1,00	79,10	-0,21		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-55 A		12/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,50	2,00	0,00	79,40	-0,13		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-55 B		12/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,60	2,00	0,00	79,30	-0,12		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-56 A		12/02/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,70	2,00	2,00	79,10	-0,04		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-56 B		12/02/2025	0,00%	0,00%	1,10	20,30	2,00	1,00	78,60	-0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-57 A		12/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,50	2,00	1,00	78,40	-0,06		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-57 B		12/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,60	2,00	0,00	78,40	-0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-58 A		12/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,00	2,00	1,00	78,90	-0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-58 B		12/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,20	2,00	1,00	78,80	0,04		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-59 A		12/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,00	2,00	1,00	78,90	-0,04		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-59 B		12/02/2025	0,00%	0,00%	0,50	20,60	2,00	1,00	78,90	-0,13		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-60 A		12/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,00	2,00	1,00	78,90	-0,05		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-60 B		12/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,10	2,00	1,00	78,90	-0,10		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-61 A		12/02/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,80	2,00	1,00	79,00	-0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-61 B		12/02/2025	0,00%	0,00%	6,40	13,60	2,00	1,00	80,00	-0,05		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-137 B		12/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	1,00	2,00	78,70	-0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-138 B		12/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	1,00	2,00	78,70	-0,05		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-139 A		12/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,70	2,00	1,00	79,20	-0,15		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-139 B		12/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	20,80	2,00	0,00	79,10	-0,10		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-140 A		12/02/2025	0,00%	0,00%	1,00	20,80	1,00	0,00	79,10	-0,10		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-140 B		12/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	20,90	2,00	0,00	79,10	-0,10		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-141 B		12/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,90	2,00	0,00	79,00	-0,16		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-62 A		12/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	20,90	2,00	0,00	79,00	-0,06		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-62 B		12/02/2025	0,10%	0,70%	0,10	20,90	2,00	0,00	78,90	-0,25		0,00	7,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-01 A		11/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,40	1,00	2,00	78,50	-0,08		0,00	0,00	



Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	CO2 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-01 B		11/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,50	1,00	2,00	78,50	-0,14		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-02 A		11/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,40	1,00	2,00	78,50	-0,12		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-02 B		11/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,50	1,00	2,00	78,50	0,02		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-03 A		11/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,60	2,00	1,00	78,40	-0,06		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-03 B		11/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,60	1,00	1,00	78,40	-0,06		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-04 A		11/02/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,40	1,00	2,00	78,40	-0,04		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-04 B		11/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,50	1,00	2,00	78,40	0,04		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-05 A		11/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,40	1,00	1,00	78,50	-0,01		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-05 B		11/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,40	1,00	2,00	78,50	0,06		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-06 A		11/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,40	1,00	2,00	78,50	-0,05		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-06 B		11/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,50	1,00	2,00	78,40	-0,03		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-07 A		14/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,70	2,00	0,00	79,20	-0,06		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-07 B		14/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	20,80	1,00	0,00	79,20	-0,13		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-08 A		11/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,20	2,00	2,00	78,70	-0,07		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-08 B		11/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,40	2,00	2,00	78,50	0,00		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-09 A		11/02/2025	0,00%	0,00%	0,50	20,80	1,00	1,00	78,70	-0,17		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-09 B		11/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	1,00	2,00	78,70	-0,03		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-10 A		11/02/2025	0,00%	0,00%	0,40	20,90	1,00	2,00	78,70	-0,03		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-10 B		11/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,30	2,00	1,00	78,70	-0,06		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-84 A		11/02/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,00	2,00	1,00	78,80	-0,17		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-84 B		11/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,20	1,00	2,00	78,80	-0,05		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-85 A		11/02/2025	0,00%	0,00%	0,90	20,50	1,00	1,00	78,70	-0,02		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-85 B		11/02/2025	0,00%	0,00%	1,60	20,20	1,00	1,00	78,20	-0,16		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-86 A		11/02/2025	0,00%	0,00%	0,30	20,90	1,00	2,00	78,90	-0,12		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-86 B		11/02/2025	0,00%	0,00%	0,80	20,20	1,00	1,00	79,00	-0,01		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-87 A		11/02/2025	0,00%	0,00%	2,50	17,60	1,00	2,00	79,90	-0,13		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-87 B		11/02/2025	0,00%	0,00%	2,30	18,80	1,00	1,00	78,90	0,03		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-152 A		11/02/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,00	1,00	2,00	78,90	0,06		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-152 B		11/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,20	1,00	1,00	78,80	-0,09		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-153 B		11/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,40	2,00	1,00	78,50	-0,02		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-154 B		11/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,50	2,00	1,00	78,40	-0,07		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-155 B		11/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,60	2,00	1,00	78,40	-0,05		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-156 B		11/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,50	1,00	2,00	78,50	-0,04		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-157 B		11/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,60	2,00	1,00	78,40	-0,03		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-70 A		13/02/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,70	1,00	1,00	79,10	0,05		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-70 B		13/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,90	1,00	1,00	79,00	-0,13		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-71 A		13/02/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,60	2,00	0,00	79,20	-0,06		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-71 B		13/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,90	2,00	0,00	79,00	-0,08		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-72 A		13/02/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,50	1,00	1,00	79,30	-0,04		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-72 B		13/02/2025	0,00%	0,00%	0,90	18,70	1,00	1,00	80,40	-0,07		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-73 A		13/02/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,70	1,00	1,00	79,10	-0,04		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-73 B		13/02/2025	0,00%	0,00%	0,90	20,00	1,00	1,00	79,10	-0,11		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-74 A		13/02/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,60	1,00	1,00	79,20	-0,05		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-74 B		13/02/2025	0,00%	0,00%	0,40	19,10	1,00	2,00	80,50	-0,04		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-75 A		13/02/2025	0,00%	0,00%	0,30	20,60	1,00	1,00	79,20	-0,02		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-75 B		13/02/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,70	1,00	1,00	79,00	0,01		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-76 A		13/02/2025	0,00%	0,00%	0,30	20,40	1,00	1,00	79,30	-0,03		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-76 B		13/02/2025	0,00%	0,00%	1,10	17,90	1,00	1,00	81,00	0,00		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-165 A		13/02/2025	0,00%	0,00%	0,40	20,10	1,00	1,00	79,50	-0,06		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-165 B		13/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,90	1,00	1,00	79,00	-0,04		0,00	0,00	



Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	CO2 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15%,															
CAT	PMG-82	A	13/02/2025	0,00%	0,00%	1,70	19,30	2,00	0,00	79,00	-0,12		0,00	0,00	
CAT	PMG-82	B	13/02/2025	0,00%	0,00%	5,50	15,90	2,00	0,00	78,60	-0,11		0,00	0,00	
CAT	PMG-83	A	13/02/2025	0,00%	0,00%	2,30	18,60	1,00	0,00	79,10	-0,08		0,00	0,00	
CAT	PMG-83	B	13/02/2025	0,00%	0,00%	3,50	17,50	2,00	0,00	79,00	-0,06		0,00	0,00	
CAT	PMG-94	A	13/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,60	2,00	0,00	79,30	-0,16		0,00	0,00	
CAT	PMG-94	B	13/02/2025	0,00%	0,00%	2,10	18,60	2,00	0,00	79,30	-0,17		0,00	0,00	
CAT	PMG-95	A	13/02/2025	0,00%	0,00%	0,70	20,40	2,00	0,00	78,90	-0,08		0,00	0,00	
CAT	PMG-95	B	13/02/2025	0,00%	0,00%	1,90	20,00	1,00	0,00	78,10	-0,14		0,00	0,00	
CAT	PMG-96	A	13/02/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,60	2,00	0,00	79,20	-0,14		0,00	0,00	
CAT	PMG-96	B	13/02/2025	0,00%	0,00%	2,40	19,20	2,00	0,00	78,40	-0,13		0,00	0,00	
CAT	PMG-97	A	13/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,70	2,00	0,00	79,20	-0,13		0,00	0,00	
CAT	PMG-97	B	13/02/2025	0,00%	0,00%	3,10	18,50	1,00	1,00	78,30	-0,09		0,00	0,00	
CAT	PMG-98	A	13/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,70	1,00	1,00	79,20	-0,05		0,00	0,00	
CAT	PMG-98	B	13/02/2025	0,00%	0,00%	0,30	20,70	1,00	1,00	79,00	-0,11		0,00	0,00	
CAT	PMG-160	A	13/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,60	2,00	0,00	79,30	-0,13		0,00	0,00	
CAT	PMG-160	B	13/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	19,70	2,00	0,00	79,30	-0,15		0,00	0,00	
CAT	PMG-161	A	13/02/2025	0,00%	0,00%	1,90	19,50	1,00	0,00	78,60	-0,03		0,00	0,00	
CAT	PMG-161	B	13/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,70	2,00	0,00	79,20	-0,16		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-88	A	14/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,90	2,00	2,00	79,00	-0,04		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-88	B	14/02/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,80	1,00	2,00	79,10	-0,05		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-89	A	14/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,90	1,00	2,00	78,90	-0,03		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-89	B	14/02/2025	0,00%	0,00%	0,80	20,40	1,00	2,00	78,90	-0,03		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-90	A	14/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	20,90	1,00	2,00	79,00	-0,04		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-90	B	14/02/2025	0,00%	0,00%	0,40	20,60	2,00	1,00	78,90	-0,05		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-91	A	14/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,90	2,00	2,00	79,00	-0,03		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-91	B	14/02/2025	0,00%	0,00%	1,40	19,50	1,00	2,00	79,10	-0,09		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-92	A	14/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,90	2,00	2,00	79,00	-0,07		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-92	B	14/02/2025	0,00%	0,00%	0,70	20,40	1,00	2,00	78,90	-0,04		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-93	A	14/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,00	2,00	2,00	78,90	-0,06		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-93	B	14/02/2025	0,00%	0,00%	0,60	20,50	1,00	2,00	78,90	-0,12		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-102		10/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,10	1,00	1,00	78,80	-0,03		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-103		10/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,20	1,00	1,00	78,80	-0,03		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-104		10/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,10	1,00	2,00	78,80	-0,03		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-105		10/02/2025	0,00%	0,00%	1,00	20,20	1,00	1,00	78,80	-0,08		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-106		10/02/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,90	1,00	2,00	78,90	-0,13		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-107		10/02/2025	0,00%	0,00%	2,30	17,70	2,00	1,00	80,00	-0,04		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-108		10/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	1,00	2,00	78,60	-0,29		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-109	A	10/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,40	2,00	1,00	78,50	-0,06		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-109	B	10/02/2025	0,00%	0,00%	0,80	20,60	1,00	2,00	78,60	-0,13		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-110	A	10/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,10	1,00	2,00	78,80	-0,01		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-110	B	10/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,20	1,00	2,00	78,80	-0,08		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-111	A	10/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,20	2,00	2,00	78,80	0,03		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-111	B	10/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,10	2,00	1,00	78,80	0,01		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-112		10/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,60	1,00	1,00	78,40	-0,07		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-162	A	10/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,10	1,00	1,00	78,90	-0,03		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-162	B	10/02/2025	0,00%	0,00%	1,90	18,10	1,00	1,00	80,00	-0,08		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-166	A	10/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,10	1,00	1,00	78,80	-0,03		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-166	B	10/02/2025	0,00%	0,00%	1,30	18,20	1,00	2,00	80,40	-0,06		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-119	A	10/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	2,00	3,00	78,70	0,00		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-119	B	10/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,10	1,00	2,00	78,70	0,10		0,00	0,00	



Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	C02 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15%,															
Portaria P3	PMG-119	C	10/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	2,00	2,00	78,70	-0,06		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-120	A	10/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,20	1,00	2,00	78,80	-0,01		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-120	B	10/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,20	2,00	2,00	78,70	-0,08		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-120	C	10/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	1,00	1,00	78,70	-0,13		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-163	B	10/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	1,00	2,00	78,70	-0,11		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-164	B	10/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	1,00	2,00	78,70	0,03		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-164	C	10/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	1,00	2,00	78,70	-0,16		0,00	0,00	
Transportes	PMG-121	A	13/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,90	1,00	1,00	79,00	-0,05		0,00	0,00	
Transportes	PMG-121	B	13/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,00	1,00	1,00	78,90	-0,03		0,00	0,00	
Transportes	PMG-122	A	13/02/2025	0,00%	0,00%	0,40	20,60	1,00	1,00	79,00	-0,07		0,00	0,00	
Transportes	PMG-122	B	13/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,00	2,00	1,00	78,90	-0,11		0,00	0,00	
Transportes	PMG-123	A	13/02/2025	0,00%	0,00%	0,60	20,20	1,00	1,00	79,20	-0,04		0,00	0,00	
Transportes	PMG-123	B	13/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,00	1,00	1,00	79,00	-0,16		0,00	0,00	
Transportes	PMG-124	A	13/02/2025	0,00%	0,00%	0,90	19,40	1,00	1,00	79,70	-0,07		0,00	0,00	
Transportes	PMG-124	B	13/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	20,90	1,00	1,00	79,00	-0,01		0,00	0,00	
Transportes	PMG-158	B	13/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,00	1,00	1,00	78,90	-0,08		0,00	0,00	
Transportes	PMG-159	B	13/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,10	1,00	1,00	78,90	-0,03		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-125	A	13/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,00	1,00	2,00	79,00	-0,13		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-125	B	13/02/2025	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	Não medido. Agua durante a medição.
Posto Guarda Universitário	PMG-126	A	13/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,00	0,00	3,00	78,90	-0,03		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-126	B	13/02/2025	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	Não medido. Agua durante a medição.
Posto Guarda Universitário	PMG-127	A	13/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,00	0,00	2,00	78,90	-0,03		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-127	B	13/02/2025	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	Não medido. Agua durante a medição.
Posto Guarda Universitário	PMG-128	A	13/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,10	1,00	2,00	78,90	-0,11		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-128	B	13/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,00	1,00	2,00	79,00	-0,03		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-129	A	13/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,00	1,00	2,00	79,00	-0,03		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-129	B	13/02/2025	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	Não medido. Agua durante a medição.
Posto Guarda Universitário	PMG-130	A	13/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,90	0,00	1,00	79,10	-0,03		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-130	B	13/02/2025	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	Não medido. Agua durante a medição.
Posto Guarda Universitário	PMG-131	A	13/02/2025	0,00%	0,00%	0,60	20,20	1,00	2,00	79,20	0,01		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-131	B	13/02/2025	0,00%	0,00%	1,60	19,40	1,00	2,00	79,00	-0,08		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-16	A	18/02/2025	0,00%	0,00%	1,50	20,00	2,00	2,00	78,50	0,13		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-16	B	18/02/2025	0,00%	0,00%	1,80	19,60	1,00	2,00	78,50	0,05		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-17	A	18/02/2025	0,00%	0,00%	0,50	20,80	2,00	2,00	78,70	0,01		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-17	B	18/02/2025	0,00%	0,00%	1,50	19,80	2,00	1,00	78,70	0,21		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-18	A	18/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,60	2,00	1,00	79,30	0,13		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-18	B	18/02/2025	0,00%	0,00%	1,10	19,70	2,00	1,00	79,20	0,04		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-20	A	18/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,70	1,00	1,00	79,20	0,11		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-20	B	18/02/2025	0,00%	0,00%	0,40	20,40	2,00	1,00	79,30	0,15		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-22	A	18/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,30	1,00	2,00	78,60	0,13		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-22	B	18/02/2025	0,00%	0,00%	2,00	19,30	1,00	2,00	78,70	0,14		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-23	A	18/02/2025	0,00%	0,00%	0,30	20,40	1,00	1,00	79,20	0,01		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-23	B	18/02/2025	0,00%	0,00%	0,70	20,00	2,00	1,00	79,30	0,05		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-113	A	18/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,60	2,00	1,00	79,30	-0,03		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-113	B	18/02/2025	0,00%	0,00%	1,30	19,40	2,00	1,00	79,40	-0,03		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-114	A	18/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,70	1,00	1,00	79,20	0,01		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-114	B	18/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	20,80	2,00	1,00	79,20	0,10		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-115	A	18/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,60	2,00	1,00	79,30	0,05		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-115	B	18/02/2025	0,00%	0,00%	0,50	20,40	2,00	0,00	79,20	0,03		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-11	A	18/02/2025	0,00%	0,00%	0,90	20,40	2,00	1,00	78,70	0,06		0,00	0,00	



Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	CO2 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15%,															
Edifício I 1	PMG-11 B		18/02/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,10	2,00	1,00	78,60	0,07		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-12 A		18/02/2025	0,00%	0,00%	2,50	18,20	1,00	2,00	79,30	0,10		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-12 B		18/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,40	2,00	1,00	78,50	0,10		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-13 A		18/02/2025	0,00%	0,00%	1,00	20,30	1,00	2,00	78,70	0,14		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-13 B		18/02/2025	0,00%	0,00%	1,20	20,10	2,00	2,00	78,70	0,19		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-14 A		18/02/2025	0,00%	0,00%	2,70	18,80	2,00	1,00	78,50	0,09		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-14 B		18/02/2025	0,00%	0,00%	3,40	17,60	1,00	1,00	79,00	-0,03		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-15 A		18/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,40	2,00	2,00	78,50	0,03		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-15 B		18/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,50	1,00	2,00	78,40	0,08		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-19 A		18/02/2025	0,00%	0,00%	0,30	21,30	2,00	2,00	78,40	0,08		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-19 B		18/02/2025	0,00%	0,00%	0,60	20,90	1,00	1,00	78,50	0,11		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-21 A		18/02/2025	0,00%	0,00%	0,90	20,60	2,00	1,00	78,50	0,00		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-21 B		18/02/2025	0,00%	0,00%	1,40	20,10	2,00	1,00	78,40	0,10		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-24 A		18/02/2025	0,00%	0,00%	0,60	20,70	2,00	2,00	78,60	0,08		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-24 B		18/02/2025	0,00%	0,00%	0,40	21,00	1,00	2,00	78,60	0,17		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-135 A		18/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,70	1,00	1,00	79,20	-0,06		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-135 B		18/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	20,80	2,00	1,00	79,20	0,04		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-136 B		18/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,70	2,00	1,00	79,20	0,03		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-25 A		17/02/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,00	1,00	1,00	78,80	0,13		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-25 B		17/02/2025	0,00%	0,00%	1,30	20,00	1,00	2,00	78,70	0,13		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-26 A		17/02/2025	0,00%	0,00%	0,30	20,70	2,00	2,00	79,00	0,12		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-26 B		17/02/2025	0,00%	0,00%	0,60	20,30	2,00	1,00	79,10	0,08		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-27 A		17/02/2025	0,00%	0,00%	1,50	19,30	2,00	2,00	79,30	0,10		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-27 B		17/02/2025	0,00%	0,00%	2,90	17,30	2,00	2,00	79,70	0,16		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-28 A		17/02/2025	0,00%	0,00%	1,00	19,20	1,00	2,00	79,80	0,09		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-28 B		17/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,00	2,00	2,00	78,90	0,02		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-29 A		17/02/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,00	2,00	2,00	78,80	0,05		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-29 B		17/02/2025	0,00%	0,00%	0,80	20,30	2,00	2,00	78,80	0,17		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-44 A		17/02/2025	0,00%	0,00%	0,70	20,00	1,00	2,00	79,20	0,15		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-44 B		17/02/2025	0,00%	0,00%	0,80	20,10	1,00	2,00	79,10	0,16		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-45 A		17/02/2025	0,00%	0,00%	0,40	19,80	2,00	2,00	79,80	0,13		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-45 B		17/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,20	1,00	2,00	78,80	0,13		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-134 B		17/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	2,00	2,00	78,70	0,04		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-30 A		17/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,90	1,00	1,00	79,00	0,02		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-30 B		17/02/2025	0,00%	0,00%	1,10	19,90	2,00	0,00	79,00	0,14		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-31 A		17/02/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,70	2,00	0,00	79,10	-0,02		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-31 B		17/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,00	2,00	0,00	79,00	0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-32 A		17/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,90	1,00	1,00	79,00	0,06		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-32 B		17/02/2025	0,00%	0,00%	0,80	20,20	2,00	1,00	78,90	0,01		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-33 A		17/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,90	1,00	1,00	79,00	0,07		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-33 B		17/02/2025	0,00%	0,00%	3,20	17,80	2,00	0,00	79,00	-0,08		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-34 A		17/02/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,80	1,00	1,00	79,00	-0,02		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-34 B		17/02/2025	0,00%	0,00%	1,10	20,20	1,00	1,00	78,80	0,04		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-35 A		17/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,00	1,00	2,00	78,90	0,11		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-35 B		17/02/2025	0,00%	0,00%	0,70	20,60	2,00	2,00	78,70	0,04		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-36 A		17/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,10	1,00	1,00	78,80	0,08		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-36 B		17/02/2025	0,00%	0,00%	2,30	18,80	1,00	2,00	78,90	0,05		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-37 A		17/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,10	1,00	1,00	78,80	0,10		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-37 B		17/02/2025	0,00%	0,00%	1,10	20,30	1,00	2,00	78,70	0,16		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-38 A		17/02/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,90	1,00	1,00	78,80	0,10		0,00	0,00	



Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	CO2 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
I-3 Biblioteca	PMG-38 B		17/02/2025	0,00%	0,00%	0,30	20,90	1,00	1,00	78,90	0,11		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-39 A		17/02/2025	0,00%	0,00%	0,30	20,70	1,00	2,00	79,00	0,10		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-39 B		17/02/2025	0,00%	0,00%	6,30	15,20	2,00	1,00	78,50	-0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-40 A		17/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,10	1,00	1,00	78,90	0,10		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-40 B		17/02/2025	0,00%	0,00%	0,30	20,80	1,00	1,00	78,90	0,16		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-41 A		17/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,90	2,00	0,00	79,00	0,04		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-41 B		17/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,90	2,00	1,00	79,00	0,07		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-42 A		18/02/2025	0,00%	0,00%	0,80	20,50	2,00	1,00	78,70	0,24		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-42 B		18/02/2025	0,00%	0,00%	5,10	16,60	1,00	2,00	78,30	0,00		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-43 A		18/02/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,00	1,00	2,00	78,80	0,09		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-43 B		18/02/2025	0,00%	0,00%	0,50	20,70	2,00	2,00	78,80	0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-132 A		17/02/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,60	2,00	1,00	79,20	-0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-132 B		17/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,90	2,00	0,00	79,10	0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-133 A		17/02/2025	0,00%	0,00%	0,50	20,40	1,00	1,00	79,20	0,08		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-133 B		17/02/2025	0,00%	0,00%	0,40	20,70	1,00	1,00	78,90	0,03		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-63 A		19/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,40	1,00	0,00	78,50	-0,05		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-63 B		19/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,40	2,00	0,00	78,50	0,00		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-64 A		19/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,10	2,00	1,00	78,90	0,05		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-64 B		19/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,10	2,00	1,00	78,90	0,05		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-65 A		19/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,20	1,00	1,00	78,80	0,09		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-65 B		19/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,20	2,00	1,00	78,80	-0,02		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-66 A		19/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,10	1,00	1,00	78,80	-0,02		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-66 B		19/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,10	1,00	1,00	78,80	-0,03		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-67 A		19/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,00	1,00	2,00	78,90	0,29		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-67 B		19/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,00	2,00	2,00	79,00	0,22		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-68 A		19/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,20	1,00	2,00	78,70	0,24		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-68 B		19/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	1,00	2,00	78,70	0,23		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-69 A		19/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,30	1,00	1,00	78,70	0,06		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-69 B		19/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	2,00	1,00	78,70	0,08		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-77 A		19/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,00	1,00	1,00	78,90	0,13		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-77 B		19/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,10	1,00	1,00	78,90	0,10		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-78 A		19/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,00	2,00	1,00	79,00	0,02		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-78 B		19/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,00	1,00	1,00	78,90	0,07		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-79 A		19/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,20	2,00	2,00	78,70	0,13		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-79 B		19/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	1,00	2,00	78,70	0,27		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-80 A		19/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,20	2,00	2,00	78,70	0,13		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-80 B		19/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	2,00	2,00	78,70	0,23		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-81 A		19/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,20	1,00	2,00	78,80	0,18		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-81 B		19/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	1,00	2,00	78,70	-0,03		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-144 B		19/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,00	2,00	1,00	78,90	-0,03		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-145 B		19/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,00	1,00	1,00	79,00	0,09		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-146 B		19/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,20	1,00	2,00	78,80	0,09		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-147 B		19/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,00	1,00	2,00	79,00	0,18		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-148 B		19/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,10	1,00	1,00	78,80	0,06		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-149 B		19/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,20	2,00	1,00	78,80	0,08		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-150 B		19/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,20	2,00	1,00	78,80	0,04		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-151 B		19/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	1,00	2,00	78,70	0,30		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-46 A		19/02/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,90	2,00	1,00	78,90	0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-46 B		19/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,10	2,00	1,00	78,80	0,11		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-47 A		19/02/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,90	2,00	1,00	79,00	0,13		0,00	0,00	



Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	CO2 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
Conjunto Laboratorial	PMG-47 B		19/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,10	2,00	2,00	78,80	0,13		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-48 A		19/02/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,90	1,00	1,00	78,90	0,05		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-48 B		19/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,20	2,00	1,00	78,80	0,11		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-49 A		19/02/2025	0,00%	0,00%	0,30	20,90	1,00	1,00	78,80	0,13		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-49 B		19/02/2025	0,00%	0,00%	3,70	18,60	1,00	1,00	77,70	0,07		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-50 A		19/02/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,90	2,00	2,00	78,90	0,17		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-50 B		19/02/2025	0,00%	0,00%	1,70	19,70	2,00	2,00	78,60	0,22		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-51 A		19/02/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,70	2,00	1,00	79,10	0,10		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-51 B		19/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	20,90	1,00	0,00	79,10	0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-52 A		19/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,80	1,00	1,00	79,10	0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-52 B		19/02/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,70	2,00	0,00	79,10	0,11		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-53 A		19/02/2025	0,00%	0,00%	0,50	20,40	2,00	0,00	79,10	-0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-53 B		19/02/2025	0,10%	0,10%	0,70	19,60	2,00	0,00	79,60	-0,03		0,00	4,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-54 A		21/02/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,70	2,00	1,00	79,10	0,06		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-54 B		21/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	20,90	3,00	1,00	79,00	0,01		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-55 A		19/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,60	3,00	0,00	79,30	-0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-55 B		19/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,70	3,00	0,00	79,20	0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-56 A		19/02/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,50	2,00	2,00	79,30	0,05		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-56 B		19/02/2025	0,00%	0,00%	1,10	20,30	3,00	2,00	78,70	0,06		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-57 A		21/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,90	2,00	0,00	79,00	0,04		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-57 B		21/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,00	2,00	0,00	78,90	0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-58 A		19/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,90	1,00	1,00	79,00	0,07		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-58 B		19/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,00	1,00	1,00	78,90	0,07		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-59 A		19/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,80	1,00	1,00	79,10	0,12		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-59 B		19/02/2025	0,00%	0,00%	0,90	19,40	1,00	1,00	79,70	0,02		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-60 A		19/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,80	2,00	1,00	79,10	0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-60 B		19/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,00	2,00	1,00	79,00	0,07		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-61 A		19/02/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,70	2,00	2,00	79,10	0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-61 B		19/02/2025	0,00%	0,00%	6,30	13,50	2,00	1,00	80,20	0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-137 B		19/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,20	1,00	2,00	78,80	0,07		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-138 B		19/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,20	2,00	2,00	78,80	0,13		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-139 A		19/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,70	2,00	0,00	79,30	0,05		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-139 B		19/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,80	2,00	0,00	79,20	0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-140 A		19/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,70	2,00	0,00	79,20	0,07		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-140 B		19/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	20,90	2,00	0,00	79,10	0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-141 B		19/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,00	2,00	1,00	79,00	0,19		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-62 A		19/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	20,90	1,00	1,00	79,00	-0,01		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-62 B		19/02/2025	0,00%	0,40%	0,10	20,90	1,00	1,00	79,10	0,28		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-01 A		18/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,40	2,00	2,00	78,60	0,14		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-01 B		18/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,40	2,00	2,00	78,50	0,25		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-02 A		18/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,30	2,00	3,00	78,60	0,13		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-02 B		18/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,50	2,00	2,00	78,50	0,05		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-03 A		18/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,50	1,00	3,00	78,50	-0,01		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-03 B		18/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,50	2,00	2,00	78,50	0,17		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-04 A		18/02/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,30	1,00	2,00	78,50	0,11		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-04 B		18/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,50	2,00	2,00	78,50	0,17		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-05 A		18/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,30	2,00	2,00	78,60	0,16		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-05 B		18/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,20	1,00	2,00	78,80	0,08		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-06 A		20/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,10	1,00	2,00	78,80	0,18		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-06 B		20/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,20	2,00	2,00	78,70	0,18		0,00	0,00	



Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	CO2 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-07	A	20/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,10	1,00	3,00	78,80	0,16		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-07	B	20/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,20	1,00	2,00	78,80	0,11		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-08	A	18/02/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,00	1,00	2,00	78,80	0,13		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-08	B	18/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,40	1,00	1,00	78,50	0,15		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-09	A	18/02/2025	0,00%	0,00%	0,60	20,60	2,00	2,00	78,80	0,09		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-09	B	18/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,10	2,00	2,00	78,90	0,03		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-10	A	18/02/2025	0,00%	0,00%	0,40	20,70	2,00	2,00	78,90	0,13		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-10	B	18/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,20	1,00	1,00	78,80	0,08		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-84	A	18/02/2025	0,00%	0,00%	0,30	20,60	2,00	1,00	79,20	0,08		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-84	B	18/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	20,90	1,00	2,00	79,10	0,08		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-85	A	18/02/2025	0,00%	0,00%	0,80	20,20	1,00	1,00	79,00	0,10		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-85	B	18/02/2025	0,00%	0,00%	1,90	19,80	2,00	2,00	78,30	-0,08		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-86	A	18/02/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,60	2,00	2,00	79,20	0,08		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-86	B	18/02/2025	0,00%	0,00%	0,80	19,90	1,00	2,00	79,30	0,15		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-87	A	18/02/2025	0,00%	0,00%	2,20	17,90	1,00	2,00	79,90	0,13		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-87	B	18/02/2025	0,00%	0,00%	2,20	18,90	1,00	2,00	78,90	0,18		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-152	A	18/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,90	1,00	2,00	79,00	0,08		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-152	B	18/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,10	2,00	2,00	78,90	0,11		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-153	B	18/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,40	2,00	2,00	78,60	0,12		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-154	B	18/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,50	2,00	2,00	78,50	0,05		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-155	B	18/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,50	2,00	3,00	78,50	0,13		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-156	B	18/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,40	2,00	2,00	78,60	0,18		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-157	B	20/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,20	1,00	3,00	78,80	0,13		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-70	A	20/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,70	1,00	1,00	79,10	0,08		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-70	B	20/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,00	2,00	1,00	78,90	0,08		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-71	A	20/02/2025	0,00%	0,00%	0,30	19,70	2,00	2,00	80,00	0,09		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-71	B	20/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,90	2,00	1,00	79,00	0,09		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-72	A	20/02/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,50	1,00	2,00	79,30	0,07		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-72	B	20/02/2025	0,00%	0,00%	0,70	19,40	1,00	2,00	79,90	0,11		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-73	A	20/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,50	2,00	1,00	78,40	0,06		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-73	B	20/02/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,60	2,00	1,00	78,30	-0,04		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-74	A	20/02/2025	0,00%	0,00%	0,30	20,10	2,00	2,00	79,70	0,14		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-74	B	20/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,00	2,00	3,00	78,90	0,13		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-75	A	20/02/2025	0,00%	0,00%	0,30	20,60	1,00	2,00	79,20	0,09		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-75	B	20/02/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,80	1,00	2,00	79,10	0,11		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-76	A	20/02/2025	0,00%	0,00%	0,30	20,40	1,00	2,00	79,30	0,11		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-76	B	20/02/2025	0,00%	0,00%	0,90	19,70	1,00	2,00	79,50	0,12		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-165	A	20/02/2025	0,00%	0,00%	0,40	20,10	1,00	2,00	79,40	0,20		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-165	B	20/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,00	1,00	2,00	79,00	-0,03		0,00	0,00	
CAT	PMG-82	A	20/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,30	2,00	0,00	79,60	-0,02		0,00	0,00	
CAT	PMG-82	B	20/02/2025	0,00%	0,00%	2,40	18,60	2,00	1,00	79,00	0,07		0,00	0,00	
CAT	PMG-83	A	20/02/2025	0,00%	0,00%	3,50	17,30	1,00	1,00	79,20	0,07		0,00	0,00	
CAT	PMG-83	B	20/02/2025	0,00%	0,00%	5,60	14,90	2,00	1,00	79,40	-0,03		0,00	0,00	
CAT	PMG-94	A	20/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,30	1,00	1,00	79,50	-0,03		0,00	0,00	
CAT	PMG-94	B	20/02/2025	0,00%	0,00%	5,40	15,20	1,00	0,00	79,40	-0,06		0,00	0,00	
CAT	PMG-95	A	21/02/2025	0,00%	0,00%	0,80	20,20	2,00	2,00	79,00	0,13		0,00	0,00	
CAT	PMG-95	B	21/02/2025	0,00%	0,00%	1,50	19,90	2,00	2,00	78,60	0,06		0,00	0,00	
CAT	PMG-96	A	20/02/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,40	1,00	1,00	79,40	0,13		0,00	0,00	
CAT	PMG-96	B	20/02/2025	0,00%	0,00%	4,20	17,30	2,00	1,00	78,50	0,03		0,00	0,00	
CAT	PMG-97	A	20/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,60	2,00	1,00	79,30	0,12		0,00	0,00	



Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	CO2 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
CAT	PMG-97	B	20/02/2025	0,00%	0,00%	5,00	16,10	2,00	1,00	78,90	0,15		0,00	0,00	
CAT	PMG-98	A	20/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,60	1,00	1,00	79,30	0,10		0,00	0,00	
CAT	PMG-98	B	20/02/2025	0,00%	0,00%	0,50	20,50	2,00	1,00	79,00	0,10		0,00	0,00	
CAT	PMG-160	A	20/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,40	1,00	0,00	79,50	-0,03		0,00	0,00	
CAT	PMG-160	B	20/02/2025	0,00%	0,00%	2,60	18,00	2,00	1,00	79,40	0,08		0,00	0,00	
CAT	PMG-161	A	21/02/2025	0,00%	0,00%	1,50	19,70	2,00	2,00	78,80	0,07		0,00	0,00	
CAT	PMG-161	B	21/02/2025	0,00%	0,00%	1,00	20,20	1,00	2,00	78,80	0,13		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-88	A	21/02/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,90	2,00	2,00	79,00	0,10		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-88	B	21/02/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,90	2,00	2,00	78,90	0,12		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-89	A	21/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,10	1,00	2,00	78,80	0,08		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-89	B	21/02/2025	0,00%	0,00%	0,70	20,60	1,00	2,00	78,60	-0,05		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-90	A	21/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,20	1,00	2,00	78,80	0,13		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-90	B	21/02/2025	0,00%	0,00%	0,40	20,80	1,00	1,00	78,70	0,24		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-91	A	21/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,20	1,00	2,00	78,80	0,15		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-91	B	21/02/2025	0,00%	0,00%	1,60	19,50	2,00	3,00	78,90	0,08		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-92	A	21/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,10	2,00	2,00	78,80	0,08		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-92	B	21/02/2025	0,00%	0,00%	0,70	20,60	1,00	2,00	78,70	0,14		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-93	A	21/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,10	1,00	3,00	78,80	0,15		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-93	B	21/02/2025	0,00%	0,00%	0,60	20,70	2,00	2,00	78,70	0,11		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-102		17/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,00	1,00	1,00	79,00	0,12		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-103		17/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,00	2,00	1,00	79,00	0,10		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-104		17/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,80	2,00	2,00	79,10	0,11		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-105		17/02/2025	0,00%	0,00%	1,10	19,90	2,00	1,00	79,00	0,06		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-106		17/02/2025	0,00%	0,00%	0,30	20,60	1,00	1,00	79,10	0,11		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-107		17/02/2025	0,00%	0,00%	2,80	16,80	2,00	1,00	80,50	0,12		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-108		17/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,10	1,00	2,00	78,90	0,02		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-109	A	17/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,10	2,00	2,00	78,80	0,10		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-109	B	17/02/2025	0,00%	0,00%	0,60	20,50	2,00	2,00	78,90	0,23		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-110	A	17/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,00	1,00	2,00	79,00	0,09		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-110	B	17/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,00	1,00	2,00	79,00	0,11		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-111	A	17/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,00	1,00	1,00	79,00	0,13		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-111	B	17/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,00	1,00	2,00	78,90	0,10		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-112		17/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	2,00	1,00	78,60	0,04		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-162	A	17/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,80	2,00	2,00	79,10	0,11		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-162	B	17/02/2025	0,00%	0,00%	1,40	19,10	1,00	1,00	79,50	0,08		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-166	A	17/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	20,90	2,00	2,00	79,10	0,12		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-166	B	17/02/2025	0,00%	0,00%	1,00	18,70	1,00	1,00	80,30	0,10		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-119	A	17/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,20	1,00	2,00	78,80	0,14		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-119	B	17/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,00	2,00	1,00	78,80	0,21		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-119	C	17/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	1,00	2,00	78,70	-0,04		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-120	A	17/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,10	1,00	2,00	78,80	0,21		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-120	B	17/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,10	2,00	2,00	78,80	0,12		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-120	C	17/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	2,00	2,00	78,70	0,23		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-163	B	17/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	2,00	2,00	78,70	0,16		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-164	B	17/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,20	1,00	2,00	78,80	0,15		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-164	C	17/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,20	1,00	2,00	78,80	0,03		0,00	0,00	
Transportes	PMG-121	A	20/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,40	2,00	1,00	78,50	0,11		0,00	0,00	
Transportes	PMG-121	B	20/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,40	2,00	1,00	78,50	0,14		0,00	0,00	
Transportes	PMG-122	A	20/02/2025	0,00%	0,00%	1,00	21,30	2,00	2,00	78,60	-0,04		0,00	0,00	
Transportes	PMG-122	B	20/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,40	2,00	1,00	78,60	0,07		0,00	0,00	



Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	CO2 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
Transportes	PMG-123 A	20/02/2025	0,00%	0,00%	0,50	20,70	2,00	2,00	78,80	0,18			0,00	0,00	
Transportes	PMG-123 B	20/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,40	2,00	1,00	78,60	-0,05			0,00	0,00	
Transportes	PMG-124 A	20/02/2025	0,00%	0,00%	0,80	20,10	2,00	2,00	79,10	0,12			0,00	0,00	
Transportes	PMG-124 B	20/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	2,00	1,00	78,70	0,08			0,00	0,00	
Transportes	PMG-158 B	20/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,40	2,00	2,00	78,60	0,09			0,00	0,00	
Transportes	PMG-159 B	20/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,40	2,00	2,00	78,60	0,03			0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-125 A	20/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,00	2,00	2,00	79,00	0,17			0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-125 B	20/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,00	1,00	2,00	79,00	0,16			0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-126 A	20/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	20,90	1,00	2,00	79,10	0,15			0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-126 B	20/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,00	2,00	1,00	79,00	0,16			0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-127 A	20/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,00	1,00	2,00	79,00	0,15			0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-127 B	20/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,00	1,00	2,00	79,00	0,17			0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-128 A	20/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,10	1,00	2,00	78,90	0,18			0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-128 B	20/02/2025	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	Não medido. Agua durante a medição.
Posto Guarda Universitário	PMG-129 A	20/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,00	1,00	3,00	79,00	0,18			0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-129 B	20/02/2025	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	Não medido. Agua durante a medição.
Posto Guarda Universitário	PMG-130 A	20/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	20,90	1,00	3,00	79,00	0,16			0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-130 B	20/02/2025	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	Não medido. Agua durante a medição.
Posto Guarda Universitário	PMG-131 A	20/02/2025	0,00%	0,00%	0,50	20,30	1,00	2,00	79,20	0,11			0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-131 B	20/02/2025	0,00%	0,00%	1,60	19,60	1,00	2,00	78,80	0,24			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-16 A	25/02/2025	0,00%	0,00%	1,60	19,70	1,00	2,00	78,80	0,11			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-16 B	25/02/2025	0,00%	0,00%	1,90	19,30	1,00	1,00	78,80	0,13			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-17 A	25/02/2025	0,00%	0,00%	0,60	20,50	1,00	2,00	78,80	0,11			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-17 B	25/02/2025	0,00%	0,00%	1,30	19,70	1,00	1,00	79,10	0,24			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-18 A	25/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,10	2,00	0,00	79,80	0,03			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-18 B	25/02/2025	0,00%	0,00%	1,70	18,90	2,00	0,00	79,40	0,10			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-20 A	25/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,60	2,00	0,00	79,30	0,03			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-20 B	25/02/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,40	2,00	1,00	79,40	-0,03			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-22 A	25/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,30	1,00	1,00	78,60	0,10			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-22 B	25/02/2025	0,00%	0,00%	2,10	19,20	1,00	1,00	78,70	0,09			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-23 A	25/02/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,40	1,00	1,00	79,40	0,13			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-23 B	25/02/2025	0,00%	0,00%	0,80	19,80	1,00	0,00	79,30	0,07			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-113 A	25/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,20	2,00	0,00	79,70	0,03			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-113 B	25/02/2025	0,00%	0,00%	1,90	18,70	2,00	0,00	79,40	0,03			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-114 A	25/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,50	1,00	0,00	79,40	-0,02			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-114 B	25/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	20,50	2,00	0,00	79,40	0,03			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-115 A	25/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,30	2,00	0,00	79,60	0,10			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-115 B	25/02/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,10	3,00	0,00	79,80	0,01			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-11 A	25/02/2025	0,00%	0,00%	1,10	19,90	1,00	1,00	79,00	0,08			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-11 B	25/02/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,80	2,00	1,00	79,00	0,10			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-12 A	25/02/2025	0,00%	0,00%	2,00	19,00	1,00	1,00	78,90	0,11			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-12 B	25/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,30	1,00	1,00	78,60	0,14			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-13 A	25/02/2025	0,00%	0,00%	1,10	20,10	1,00	2,00	78,80	0,13			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-13 B	25/02/2025	0,00%	0,00%	1,40	19,70	1,00	2,00	78,90	0,12			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-14 A	25/02/2025	0,00%	0,00%	2,70	18,50	2,00	1,00	78,90	-0,01			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-14 B	25/02/2025	0,00%	0,00%	4,00	17,00	1,00	1,00	79,00	0,05			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-15 A	25/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	1,00	2,00	78,70	0,10			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-15 B	25/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,40	1,00	2,00	78,60	0,17			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-19 A	25/02/2025	0,00%	0,00%	0,30	20,80	1,00	1,00	78,90	0,07			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-19 B	25/02/2025	0,00%	0,00%	0,70	20,40	1,00	1,00	78,90	0,03			0,00	0,00	



Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	CO2 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
Edifício I 1	PMG-21 A	25/02/2025	0,00%	0,00%	0,80	20,30	1,00	1,00	78,90	0,11			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-21 B	25/02/2025	0,00%	0,00%	1,30	19,80	1,00	0,00	78,90	0,07			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-24 A	25/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,20	2,00	2,00	78,60	0,17			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-24 B	25/02/2025	0,00%	0,00%	0,40	21,00	1,00	2,00	78,60	0,22			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-135 A	25/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,40	1,00	0,00	79,50	0,05			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-135 B	25/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,50	2,00	0,00	79,50	0,00			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-136 B	25/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,40	2,00	0,00	79,50	-0,02			0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-25 A	24/02/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,70	1,00	1,00	79,00	0,17			0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-25 B	24/02/2025	0,00%	0,00%	1,30	19,50	1,00	1,00	79,10	0,20			0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-26 A	24/02/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,60	1,00	2,00	79,10	-0,02			0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-26 B	24/02/2025	0,00%	0,00%	1,10	19,70	1,00	1,00	79,20	0,13			0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-27 A	24/02/2025	0,00%	0,00%	1,10	19,80	1,00	1,00	79,10	0,08			0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-27 B	24/02/2025	0,00%	0,00%	3,60	17,30	2,00	1,00	79,10	0,13			0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-28 A	24/02/2025	0,00%	0,00%	1,10	18,10	1,00	1,00	80,90	0,17			0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-28 B	24/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	20,90	1,00	2,00	79,10	0,08			0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-29 A	24/02/2025	0,00%	0,00%	0,30	20,80	1,00	1,00	78,90	0,12			0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-29 B	24/02/2025	0,00%	0,00%	0,70	20,20	2,00	2,00	79,10	0,18			0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-44 A	24/02/2025	0,00%	0,00%	0,50	20,70	1,00	1,00	78,80	0,06			0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-44 B	24/02/2025	0,00%	0,00%	0,60	20,60	2,00	1,00	78,70	0,15			0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-45 A	24/02/2025	0,00%	0,00%	0,40	20,30	1,00	2,00	79,30	0,11			0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-45 B	24/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,00	1,00	2,00	78,90	0,15			0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-134 B	24/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,10	2,00	1,00	78,80	0,12			0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-30 A	24/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,40	2,00	0,00	79,40	0,03			0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-30 B	24/02/2025	0,00%	0,00%	1,20	19,50	2,00	0,00	79,30	0,09			0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-31 A	24/02/2025	0,00%	0,00%	0,30	20,00	3,00	0,00	79,70	0,03			0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-31 B	24/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,40	2,00	0,00	79,50	-0,01			0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-32 A	24/02/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,60	1,00	0,00	79,20	0,02			0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-32 B	24/02/2025	0,00%	0,00%	0,90	20,00	2,00	0,00	79,10	-0,08			0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-33 A	24/02/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,60	2,00	0,00	79,20	0,10			0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-33 B	24/02/2025	0,00%	0,00%	3,10	17,80	2,00	0,00	79,10	0,06			0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-34 A	24/02/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,60	2,00	0,00	79,20	0,05			0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-34 B	24/02/2025	0,00%	0,00%	1,10	20,00	2,00	0,00	78,90	0,02			0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-35 A	24/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,70	1,00	1,00	79,20	0,13			0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-35 B	24/02/2025	0,00%	0,00%	0,80	20,20	1,00	1,00	79,00	0,03			0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-36 A	24/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,80	2,00	1,00	79,20	0,15			0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-36 B	24/02/2025	0,00%	0,00%	2,50	18,30	1,00	1,00	79,10	0,14			0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-37 A	24/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,80	1,00	1,00	79,10	0,11			0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-37 B	24/02/2025	0,00%	0,00%	1,10	20,00	1,00	1,00	78,90	0,13			0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-38 A	24/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,80	2,00	0,00	79,10	0,08			0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-38 B	24/02/2025	0,00%	0,00%	0,40	20,50	2,00	0,00	79,10	0,15			0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-39 A	24/02/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,60	1,00	0,00	79,10	0,06			0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-39 B	24/02/2025	0,00%	0,00%	6,50	15,00	2,00	0,00	78,50	0,03			0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-40 A	24/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,80	1,00	0,00	79,10	-0,01			0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-40 B	24/02/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,70	1,00	0,00	79,10	0,11			0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-41 A	24/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,60	2,00	0,00	79,40	0,05			0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-41 B	24/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,60	2,00	0,00	79,30	-0,05			0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-42 A	24/02/2025	0,00%	0,00%	0,70	20,20	1,00	1,00	79,20	0,12			0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-42 B	24/02/2025	0,00%	0,00%	5,10	16,20	2,00	1,00	78,70	0,11			0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-43 A	24/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,70	2,00	1,00	79,30	0,29			0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-43 B	24/02/2025	0,00%	0,00%	0,60	20,40	1,00	2,00	79,00	0,08			0,00	0,00	



Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	CO2 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15% ,															
I-3 Biblioteca	PMG-132	A	24/02/2025	0,00%	0,00%	0,40	19,70	4,00	0,00	79,90	-0,02		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-132	B	24/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,10	3,00	0,00	79,80	0,13		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-133	A	24/02/2025	0,00%	0,00%	0,50	20,10	1,00	0,00	79,40	0,06		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-133	B	24/02/2025	0,00%	0,00%	0,70	20,10	1,00	0,00	79,20	0,07		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-63	A	27/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,90	3,00	2,00	79,00	0,13		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-63	B	27/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,10	3,00	2,00	78,80	0,22		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-64	A	26/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,20	2,00	2,00	78,80	0,07		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-64	B	26/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	1,00	2,00	78,70	0,05		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-65	A	26/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	2,00	2,00	78,70	0,13		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-65	B	26/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	1,00	2,00	78,70	0,11		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-66	A	26/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,20	2,00	2,00	78,70	0,16		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-66	B	26/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	2,00	2,00	78,70	0,13		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-67	A	26/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,10	5,00	3,00	78,80	0,09		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-67	B	26/02/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,90	5,00	2,00	78,90	0,11		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-68	A	26/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,40	2,00	2,00	78,60	0,13		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-68	B	26/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,50	1,00	2,00	78,50	0,05		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-69	A	26/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,40	2,00	2,00	78,60	0,08		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-69	B	26/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,40	2,00	1,00	78,60	0,07		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-77	A	26/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,30	3,00	2,00	78,70	0,14		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-77	B	26/02/2025	0,00%	0,00%	0,60	19,60	3,00	2,00	79,80	0,10		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-78	A	26/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,20	3,00	2,00	78,70	0,13		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-78	B	26/02/2025	0,00%	0,00%	0,90	19,60	1,00	2,00	79,50	0,11		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-79	A	26/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,30	2,00	2,00	78,60	0,17		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-79	B	26/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,50	1,00	2,00	78,50	0,00		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-80	A	26/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,40	2,00	2,00	78,60	0,18		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-80	B	26/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,40	2,00	2,00	78,60	0,20		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-81	A	26/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	4,00	2,00	78,70	0,09		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-81	B	26/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,20	4,00	2,00	78,70	0,08		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-144	B	26/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,20	3,00	2,00	78,80	0,08		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-145	B	26/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	2,00	2,00	78,70	0,10		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-146	B	26/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,40	4,00	2,00	78,60	0,13		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-147	B	26/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,20	5,00	3,00	78,80	0,26		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-148	B	26/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	2,00	2,00	78,70	0,16		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-149	B	26/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,40	2,00	1,00	78,70	0,05		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-150	B	26/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,40	2,00	2,00	78,60	0,14		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-151	B	26/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,50	2,00	2,00	78,50	0,13		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-46	A	26/02/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,10	8,00	1,00	78,80	0,13		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-46	B	26/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	8,00	3,00	78,70	0,14		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-47	A	26/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,00	7,00	2,00	78,80	0,15		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-47	B	26/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	7,00	2,00	78,70	0,22		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-48	A	26/02/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,10	2,00	2,00	78,70	0,14		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-48	B	26/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,40	2,00	2,00	78,50	0,19		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-49	A	26/02/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,20	2,00	2,00	78,60	0,19		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-49	B	26/02/2025	0,00%	0,00%	1,90	19,80	1,00	2,00	78,20	0,26		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-50	A	26/02/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,20	2,00	3,00	78,60	0,19		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-50	B	26/02/2025	0,00%	0,00%	2,00	19,60	1,00	2,00	78,40	0,17		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-51	A	26/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,80	1,00	1,00	79,10	0,14		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-51	B	26/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	20,80	1,00	2,00	79,10	0,13		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-52	A	26/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	20,80	1,00	1,00	79,10	0,11		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-52	B	26/02/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,70	2,00	1,00	79,10	0,16		0,00	0,00	



Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	CO2 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15%,															
Conjunto Laboratorial	PMG-53 A	26/02/2025	0,00%	0,00%	0,40	20,40	1,00	1,00	79,20	0,06			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-53 B	26/02/2025	0,00%	0,00%	0,60	19,80	2,00	1,00	79,60	0,06			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-54 A	26/02/2025	0,00%	0,00%	0,30	20,50	2,00	0,00	79,30	-0,04			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-54 B	26/02/2025	1,80%	1,80%	1,60	19,30	2,00	1,00	77,20	0,04			0,00	100,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-55 A	26/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,70	2,00	1,00	79,20	0,00			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-55 B	26/02/2025	0,00%	0,00%	2,20	18,00	2,00	1,00	79,80	0,00			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-56 A	26/02/2025	0,00%	0,00%	1,20	20,20	12,00	2,00	78,70	0,16			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-56 B	26/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,10	11,00	2,00	78,90	0,08			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-57 A	26/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,00	1,00	2,00	79,00	0,14			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-57 B	26/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,10	2,00	2,00	78,80	0,11			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-58 A	26/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,00	1,00	2,00	79,00	0,14			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-58 B	26/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,10	1,00	2,00	78,90	0,15			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-59 A	26/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,10	24,00	2,00	78,80	0,13			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-59 B	26/02/2025	0,00%	0,00%	0,50	20,70	23,00	2,00	78,70	0,20			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-60 A	26/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,10	19,00	2,00	78,80	0,13			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-60 B	26/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,20	17,00	2,00	78,80	0,06			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-61 A	26/02/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,90	15,00	2,00	78,90	0,15			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-61 B	26/02/2025	0,00%	0,00%	5,70	14,80	14,00	2,00	79,50	0,12			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-137 B	26/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,50	2,00	2,00	78,50	0,13			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-138 B	26/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,50	1,00	2,00	78,50	0,15			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-139 A	26/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	20,80	1,00	1,00	79,20	0,04			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-139 B	26/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	20,90	1,00	1,00	79,10	0,26			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-140 A	26/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,80	1,00	1,00	79,10	0,02			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-140 B	26/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	20,90	2,00	1,00	79,10	-0,01			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-141 B	26/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	20,90	1,00	2,00	79,00	0,10			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-62 A	26/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	20,90	1,00	2,00	79,10	0,16			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-62 B	26/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	20,90	1,00	2,00	79,10	0,11			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-01 A	25/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,60	2,00	1,00	78,40	0,04			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-01 B	25/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,60	1,00	1,00	78,30	0,04			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-02 A	25/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,10	1,00	1,00	78,80	0,11			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-02 B	25/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	2,00	2,00	78,70	0,09			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-03 A	25/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,20	2,00	2,00	78,70	0,01			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-03 B	25/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,40	1,00	2,00	78,60	0,08			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-04 A	25/02/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,00	1,00	2,00	78,80	0,14			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-04 B	25/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	2,00	1,00	78,70	0,19			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-05 A	25/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,20	1,00	1,00	78,70	0,06			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-05 B	25/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	2,00	2,00	78,70	0,09			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-06 A	25/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,20	1,00	2,00	78,70	-0,16			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-06 B	25/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	1,00	2,00	78,70	0,08			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-07 A	25/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,20	1,00	2,00	78,70	0,08			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-07 B	25/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	2,00	2,00	78,70	-0,02			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-08 A	25/02/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,90	1,00	1,00	78,90	0,13			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-08 B	25/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,30	1,00	1,00	78,60	0,13			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-09 A	25/02/2025	0,00%	0,00%	0,70	20,40	1,00	1,00	78,90	0,10			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-09 B	25/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,00	2,00	1,00	78,90	0,02			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-10 A	25/02/2025	0,00%	0,00%	0,40	20,70	1,00	1,00	78,90	0,09			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-10 B	25/02/2025	0,00%	0,00%	0,80	20,10	1,00	1,00	79,10	0,08			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-84 A	25/02/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,70	2,00	0,00	79,10	0,09			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-84 B	25/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,80	2,00	0,00	79,10	0,13			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-85 A	25/02/2025	0,00%	0,00%	0,80	20,30	2,00	1,00	78,90	0,02			0,00	0,00	



Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	CO2 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15% ,															
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-85	B	25/02/2025	0,00%	0,00%	1,90	19,80	1,00	1,00	78,20	-0,10		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-86	A	25/02/2025	0,00%	0,00%	0,30	20,50	1,00	1,00	79,30	0,08		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-86	B	25/02/2025	0,00%	0,00%	1,10	19,10	2,00	1,00	79,80	0,11		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-87	A	25/02/2025	0,00%	0,00%	1,80	18,20	1,00	0,00	80,00	0,03		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-87	B	25/02/2025	0,00%	0,00%	2,00	19,00	1,00	1,00	79,10	0,18		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-152	A	25/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,80	1,00	1,00	79,10	0,12		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-152	B	25/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,00	1,00	1,00	79,00	0,07		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-153	B	25/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,70	1,00	1,00	78,30	0,05		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-154	B	25/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,40	2,00	2,00	78,60	0,16		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-155	B	25/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	2,00	1,00	78,60	0,00		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-156	B	25/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	2,00	1,00	78,60	0,03		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-157	B	25/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	2,00	2,00	78,60	0,12		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-70	A	27/02/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,40	2,00	2,00	79,50	0,13		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-70	B	27/02/2025	0,00%	0,00%	0,80	19,00	2,00	2,00	80,20	0,21		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-71	A	27/02/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,60	1,00	1,00	79,20	0,18		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-71	B	27/02/2025	0,60%	0,60%	1,50	7,60	1,00	2,00	90,20	0,23		0,00	17,00	
Enfermaria	PMG-72	A	27/02/2025	0,00%	0,00%	0,30	20,20	2,00	2,00	79,40	0,16		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-72	B	27/02/2025	0,00%	0,00%	1,10	18,70	2,00	2,00	80,20	0,14		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-73	A	27/02/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,60	2,00	2,00	79,20	0,12		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-73	B	27/02/2025	0,00%	0,00%	0,80	20,00	2,00	2,00	79,20	0,16		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-74	A	27/02/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,30	3,00	1,00	79,50	0,16		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-74	B	27/02/2025	0,00%	0,00%	0,90	16,50	3,00	2,00	82,70	0,16		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-75	A	27/02/2025	0,00%	0,00%	0,30	20,10	4,00	2,00	79,70	0,25		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-75	B	27/02/2025	0,00%	0,00%	1,30	17,70	4,00	2,00	81,00	0,12		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-76	A	27/02/2025	0,00%	0,00%	0,30	20,00	4,00	2,00	79,70	0,17		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-76	B	27/02/2025	0,00%	0,00%	2,00	14,80	3,00	2,00	83,20	0,09		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-165	A	27/02/2025	0,00%	0,00%	0,50	19,40	1,00	2,00	80,20	0,13		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-165	B	27/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	20,90	1,00	2,00	79,00	0,15		0,00	0,00	
CAT	PMG-82	A	27/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,60	2,00	1,00	79,30	0,07		0,00	0,00	
CAT	PMG-82	B	27/02/2025	0,00%	0,00%	2,30	20,20	2,00	1,00	77,50	0,03		0,00	0,00	
CAT	PMG-83	A	27/02/2025	0,00%	0,00%	2,40	18,50	2,00	0,00	79,00	-0,04		0,00	0,00	
CAT	PMG-83	B	27/02/2025	0,00%	0,00%	4,70	16,20	2,00	1,00	79,00	0,04		0,00	0,00	
CAT	PMG-94	A	27/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,50	2,00	0,00	79,40	0,03		0,00	0,00	
CAT	PMG-94	B	27/02/2025	0,00%	0,00%	3,00	17,60	2,00	0,00	79,40	0,04		0,00	0,00	
CAT	PMG-95	A	27/02/2025	0,00%	0,00%	0,70	20,40	2,00	0,00	78,90	0,00		0,00	0,00	
CAT	PMG-95	B	27/02/2025	0,00%	0,00%	1,90	20,10	2,00	1,00	78,10	0,02		0,00	0,00	
CAT	PMG-96	A	27/02/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,70	1,00	1,00	79,20	-0,03		0,00	0,00	
CAT	PMG-96	B	27/02/2025	0,00%	0,00%	4,20	15,90	2,00	0,00	79,90	0,12		0,00	0,00	
CAT	PMG-97	A	27/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,60	2,00	1,00	79,30	0,07		0,00	0,00	
CAT	PMG-97	B	27/02/2025	0,00%	0,00%	3,00	17,60	1,00	1,00	79,40	0,17		0,00	0,00	
CAT	PMG-98	A	27/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,70	2,00	1,00	79,20	0,07		0,00	0,00	
CAT	PMG-98	B	27/02/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,70	2,00	1,00	79,10	-0,03		0,00	0,00	
CAT	PMG-160	A	27/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,50	2,00	1,00	79,40	-0,05		0,00	0,00	
CAT	PMG-160	B	27/02/2025	0,00%	0,00%	2,40	18,10	2,00	1,00	79,50	0,08		0,00	0,00	
CAT	PMG-161	A	27/02/2025	0,00%	0,00%	1,50	19,40	2,00	1,00	79,10	0,02		0,00	0,00	
CAT	PMG-161	B	27/02/2025	0,00%	0,00%	1,60	19,70	2,00	0,00	78,70	0,02		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-88	A	27/02/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,80	2,00	0,00	79,00	0,07		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-88	B	27/02/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,80	2,00	1,00	79,10	0,08		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-89	A	27/02/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,70	2,00	1,00	79,10	0,10		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-89	B	27/02/2025	0,00%	0,00%	0,70	20,30	1,00	1,00	79,00	0,08		0,00	0,00	



Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	CO2 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H ₂ S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
Incubadora	PMG-90	A	27/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,00	1,00	2,00	79,00	0,10		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-90	B	27/02/2025	0,00%	0,00%	0,30	20,60	2,00	1,00	79,10	0,18		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-91	A	27/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,00	1,00	1,00	79,00	0,06		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-91	B	27/02/2025	0,00%	0,00%	1,30	19,70	1,00	2,00	79,10	0,13		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-92	A	27/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,90	1,00	2,00	79,00	0,01		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-92	B	27/02/2025	0,00%	0,00%	0,90	20,10	1,00	1,00	79,00	0,09		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-93	A	27/02/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,90	1,00	2,00	78,90	0,13		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-93	B	27/02/2025	0,00%	0,00%	0,80	20,10	1,00	2,00	79,10	0,12		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-102		24/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	20,80	1,00	2,00	79,10	0,09		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-103		24/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	20,80	1,00	1,00	79,10	0,11		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-104		24/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,70	1,00	1,00	79,20	0,10		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-105		24/02/2025	0,00%	0,00%	1,20	19,70	2,00	1,00	79,10	0,05		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-106		24/02/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,60	1,00	2,00	79,20	0,09		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-107		24/02/2025	0,00%	0,00%	2,50	17,20	2,00	0,00	80,30	0,09		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-108		24/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,80	2,00	1,00	79,10	0,10		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-109	A	24/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,10	1,00	1,00	78,80	0,04		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-109	B	24/02/2025	0,00%	0,00%	0,80	20,30	2,00	1,00	78,90	0,12		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-110	A	24/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,70	1,00	2,00	79,20	0,15		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-110	B	24/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	20,80	2,00	1,00	79,20	0,33		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-111	A	24/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	20,80	1,00	1,00	79,10	0,10		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-111	B	24/02/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,70	1,00	1,00	79,20	0,22		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-112		24/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,40	2,00	1,00	78,60	0,06		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-162	A	24/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,90	2,00	0,00	79,10	0,09		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-162	B	24/02/2025	0,00%	0,00%	1,70	18,10	1,00	0,00	80,20	-0,01		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-166	A	24/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	20,80	2,00	1,00	79,10	0,13		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-166	B	24/02/2025	0,00%	0,00%	1,10	18,50	2,00	1,00	80,40	0,12		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-119	A	24/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,10	2,00	1,00	78,90	0,14		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-119	B	24/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,00	1,00	1,00	78,90	0,18		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-119	C	24/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,10	1,00	2,00	78,80	-0,04		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-120	A	24/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,10	1,00	2,00	78,90	0,17		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-120	B	24/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,10	1,00	2,00	78,90	0,24		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-120	C	24/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,20	2,00	1,00	78,80	0,17		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-163	B	24/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,20	1,00	2,00	78,80	0,08		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-164	B	24/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,10	1,00	2,00	78,90	0,15		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-164	C	24/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,10	1,00	2,00	78,90	0,11		0,00	0,00	
Transportes	PMG-121	A	27/02/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,60	2,00	1,00	79,20	0,10		0,00	0,00	
Transportes	PMG-121	B	27/02/2025	0,00%	0,00%	2,60	17,20	2,00	2,00	80,20	0,03		0,00	0,00	
Transportes	PMG-122	A	27/02/2025	0,00%	0,00%	0,40	20,20	1,00	1,00	79,30	0,13		0,00	0,00	
Transportes	PMG-122	B	27/02/2025	0,00%	0,00%	7,20	13,80	2,00	1,00	79,10	0,08		0,00	0,00	
Transportes	PMG-123	A	27/02/2025	0,00%	0,00%	0,40	20,10	1,00	2,00	79,50	0,12		0,00	0,00	
Transportes	PMG-123	B	27/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,80	1,00	1,00	79,10	0,13		0,00	0,00	
Transportes	PMG-124	A	27/02/2025	0,00%	0,00%	0,50	19,60	1,00	2,00	79,90	0,15		0,00	0,00	
Transportes	PMG-124	B	27/02/2025	0,00%	0,00%	3,70	16,70	2,00	1,00	79,60	0,10		0,00	0,00	
Transportes	PMG-158	B	27/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,60	1,00	1,00	79,30	0,16		0,00	0,00	
Transportes	PMG-159	B	27/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,80	2,00	2,00	79,10	0,10		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-125	A	26/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	2,00	3,00	78,70	0,18		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-125	B	26/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	2,00	2,00	78,60	0,01		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-126	A	26/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,10	1,00	2,00	78,90	0,15		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-126	B	26/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,20	2,00	3,00	78,80	-0,80		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-127	A	26/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	1,00	2,00	78,70	0,14		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	CO2 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15% ,															
Posto Guarda Universitário	PMG-127	B	26/02/2025	0,00%	0,00%	6,30	17,60	2,00	2,00	76,10	-0,04		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-128	A	26/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,20	1,00	2,00	78,70	0,12		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-128	B	26/02/2025	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	Não medido. Água durante a medição.
Posto Guarda Universitário	PMG-129	A	26/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,40	2,00	2,00	78,60	0,17		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-129	B	26/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,50	2,00	2,00	78,50	0,03		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-130	A	26/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,90	0,00	6,00	78,90	0,16		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-130	B	26/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	0,00	4,00	78,70	0,10		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-131	A	26/02/2025	0,00%	0,00%	0,60	20,50	1,00	3,00	78,90	0,16		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-131	B	26/02/2025	0,00%	0,00%	1,90	19,30	1,00	3,00	78,80	-0,15		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-16	A	06/03/2025	0,00%	0,00%	1,50	19,80	2,00	1,00	78,80	0,09		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-16	B	06/03/2025	0,00%	0,00%	2,20	18,80	1,00	2,00	79,10	0,10		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-17	A	06/03/2025	0,00%	0,00%	0,30	21,00	2,00	1,00	78,70	0,09		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-17	B	06/03/2025	0,00%	0,00%	0,60	20,70	2,00	2,00	78,70	0,09		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-18	A	06/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,30	2,00	0,00	79,60	0,02		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-18	B	06/03/2025	0,00%	0,00%	1,70	18,90	2,00	0,00	79,30	-0,02		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-20	A	06/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,70	2,00	0,00	79,20	-0,07		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-20	B	06/03/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,60	2,00	0,00	79,20	-0,01		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-22	A	06/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,60	1,00	0,00	79,20	-0,06		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-22	B	06/03/2025	0,00%	0,00%	1,80	19,00	2,00	0,00	79,30	0,10		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-23	A	06/03/2025	0,00%	0,00%	0,30	20,40	2,00	0,00	79,30	0,20		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-23	B	06/03/2025	0,00%	0,00%	0,70	20,00	2,00	1,00	79,30	0,08		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-113	A	06/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,40	2,00	0,00	79,50	0,08		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-113	B	06/03/2025	0,00%	0,00%	1,90	18,70	2,00	0,00	79,40	-0,10		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-114	A	06/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,60	1,00	1,00	79,30	0,02		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-114	B	06/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,70	1,00	0,00	79,30	0,10		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-115	A	06/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,40	1,00	0,00	79,50	0,13		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-115	B	06/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,50	2,00	0,00	79,40	0,02		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-11	A	06/03/2025	0,00%	0,00%	1,00	20,20	1,00	1,00	78,80	0,12		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-11	B	06/03/2025	0,10%	0,10%	0,80	20,30	1,00	1,00	78,80	0,07		0,00	4,00	
Edifício I 1	PMG-12	A	06/03/2025	0,00%	0,00%	3,20	18,00	2,00	2,00	78,80	0,13		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-12	B	06/03/2025	0,00%	0,00%	3,20	17,90	2,00	1,00	78,90	-0,09		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-13	A	06/03/2025	0,00%	0,00%	1,20	20,10	2,00	2,00	78,80	0,14		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-13	B	06/03/2025	0,00%	0,00%	1,50	19,50	2,00	1,00	79,00	0,06		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-14	A	06/03/2025	0,00%	0,00%	3,30	18,00	2,00	1,00	78,70	0,13		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-14	B	06/03/2025	0,00%	0,00%	4,70	16,40	1,00	1,00	78,90	0,07		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-15	A	06/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,40	2,00	1,00	78,60	0,05		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-15	B	06/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,40	1,00	1,00	78,50	0,05		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-19	A	06/03/2025	0,00%	0,00%	0,40	20,80	1,00	2,00	78,80	0,06		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-19	B	06/03/2025	0,00%	0,00%	0,60	20,50	1,00	1,00	78,90	-0,01		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-21	A	06/03/2025	0,00%	0,00%	1,00	20,00	2,00	1,00	79,00	0,11		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-21	B	06/03/2025	0,00%	0,00%	1,50	19,50	1,00	1,00	78,90	0,17		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-24	A	07/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,60	2,00	1,00	78,30	0,14		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-24	B	07/03/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,50	2,00	1,00	78,30	0,09		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-135	A	06/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,50	2,00	1,00	79,40	0,05		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG -135	B	06/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,60	2,00	0,00	79,30	0,03		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-136	B	06/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,40	2,00	1,00	79,40	-0,11		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-25	A	28/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,70	2,00	1,00	78,20	0,08		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-25	B	28/02/2025	0,00%	0,00%	0,80	20,90	2,00	1,00	78,20	0,04		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-26	A	28/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,60	2,00	1,00	78,30	0,11		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-26	B	28/02/2025	0,00%	0,00%	1,00	20,40	2,00	1,00	78,50	0,03		0,00	0,00	



Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	CO2 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
I-5 Auditórios	PMG-27	A	28/02/2025	0,00%	0,00%	0,70	20,90	1,00	1,00	78,30	0,10		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-27	B	28/02/2025	0,00%	0,00%	3,20	18,00	1,00	1,00	78,80	0,03		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-28	A	06/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	19,60	2,00	2,00	79,40	0,11		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-28	B	06/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	2,00	1,00	78,70	0,10		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-29	A	06/03/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,20	2,00	1,00	78,60	0,10		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-29	B	06/03/2025	0,00%	0,00%	0,90	20,50	2,00	2,00	78,60	0,12		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-44	A	28/02/2025	0,00%	0,00%	0,30	20,90	2,00	2,00	78,70	0,05		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-44	B	28/02/2025	0,00%	0,00%	0,60	20,70	1,00	2,00	78,70	0,08		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-45	A	28/02/2025	0,00%	0,00%	0,40	20,40	1,00	2,00	79,30	0,10		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-45	B	28/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,40	1,00	2,00	78,60	0,08		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-134	B	28/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,40	1,00	2,00	78,50	0,13		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-30	A	28/02/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,70	1,00	0,00	79,20	0,01		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-30	B	28/02/2025	0,00%	0,00%	1,10	19,70	1,00	0,00	79,10	0,08		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-31	A	28/02/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,40	2,00	0,00	79,40	0,01		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-31	B	28/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,70	2,00	0,00	79,20	-0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-32	A	28/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,80	2,00	0,00	79,10	0,06		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-32	B	28/02/2025	0,00%	0,00%	0,90	20,00	1,00	1,00	79,00	0,04		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-33	A	28/02/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,70	1,00	1,00	79,10	0,08		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-33	B	28/02/2025	0,00%	0,00%	3,00	17,90	2,00	0,00	79,10	-0,13		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-34	A	28/02/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,70	2,00	1,00	79,10	0,02		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-34	B	28/02/2025	0,00%	0,00%	1,10	20,00	1,00	1,00	78,90	0,08		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-35	A	28/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,90	2,00	1,00	79,00	0,25		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-35	B	28/02/2025	0,00%	0,00%	0,90	20,30	2,00	1,00	78,90	0,02		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-36	A	28/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,90	1,00	1,00	79,00	0,13		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-36	B	28/02/2025	0,00%	0,00%	1,90	19,00	1,00	1,00	79,10	0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-37	A	28/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,00	1,00	2,00	79,00	-0,06		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-37	B	28/02/2025	0,00%	0,00%	1,10	20,20	1,00	1,00	78,80	0,10		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-38	A	28/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,90	2,00	1,00	79,00	0,10		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-38	B	28/02/2025	0,00%	0,00%	0,30	20,70	2,00	2,00	79,00	0,09		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-39	A	28/02/2025	0,00%	0,00%	0,30	20,60	2,00	1,00	79,10	0,09		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-39	B	28/02/2025	0,00%	0,00%	6,30	15,10	2,00	1,00	78,60	0,05		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-40	A	28/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,90	1,00	2,00	79,00	0,13		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-40	B	28/02/2025	0,00%	0,00%	0,30	20,70	1,00	2,00	79,00	0,04		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-41	A	28/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,80	1,00	0,00	79,20	0,06		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-41	B	28/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,80	1,00	0,00	79,10	0,16		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-42	A	28/02/2025	0,00%	0,00%	0,70	20,30	2,00	1,00	79,00	0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-42	B	28/02/2025	0,00%	0,00%	5,00	16,60	2,00	0,00	78,40	-0,04		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-43	A	28/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,60	1,00	1,00	79,30	0,05		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-43	B	28/02/2025	0,00%	0,00%	0,60	20,40	2,00	1,00	79,00	0,04		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-132	A	28/02/2025	0,00%	0,00%	0,40	20,10	1,00	1,00	79,50	0,02		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-132	B	28/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,60	2,00	0,00	79,30	-0,08		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-133	A	28/02/2025	0,00%	0,00%	0,50	20,20	2,00	1,00	79,40	0,11		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-133	B	28/02/2025	0,00%	0,00%	0,50	20,50	1,00	1,00	79,10	0,00		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-63	A	07/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,40	1,00	2,00	78,50	0,19		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-63	B	07/03/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,40	1,00	1,00	78,50	0,08		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-64	A	07/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,40	1,00	3,00	78,60	0,12		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-64	B	07/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,30	1,00	2,00	78,60	0,09		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-65	A	07/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,20	1,00	1,00	78,70	0,15		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-65	B	07/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,40	1,00	2,00	78,60	0,14		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-66	A	07/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,20	1,00	2,00	78,70	0,16		0,00	0,00	



Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	C02 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
Edifício I-4	PMG-66	B	07/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,40	1,00	2,00	78,60	0,08		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-67	A	07/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	1,00	2,00	78,70	0,13		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-67	B	07/03/2025	0,00%	0,00%	0,50	20,70	1,00	2,00	78,80	0,23		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-68	A	07/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	1,00	2,00	78,60	0,13		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-68	B	07/03/2025	0,00%	0,00%	0,30	20,90	1,00	2,00	78,80	0,11		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-69	A	07/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	1,00	2,00	78,70	0,12		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-69	B	07/03/2025	0,00%	0,00%	1,70	18,90	1,00	2,00	79,30	0,03		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-77	A	07/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	1,00	1,00	78,70	0,13		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-77	B	07/03/2025	0,00%	0,00%	0,80	19,70	2,00	2,00	79,50	0,13		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-78	A	07/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,10	2,00	2,00	78,80	0,14		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-78	B	07/03/2025	0,00%	0,00%	1,70	19,00	1,00	2,00	79,30	0,15		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-79	A	07/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,20	2,00	1,00	78,70	0,14		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-79	B	07/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,40	1,00	2,00	78,60	0,08		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-80	A	07/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,20	2,00	2,00	78,70	0,15		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-80	B	07/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,20	1,00	2,00	78,70	0,12		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-81	A	07/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	1,00	1,00	78,70	0,05		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-81	B	07/03/2025	0,00%	0,00%	0,60	20,90	2,00	2,00	78,50	0,21		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-144	B	07/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	2,00	1,00	78,70	0,13		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-145	B	07/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,20	1,00	2,00	78,70	0,12		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-146	B	07/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	2,00	2,00	78,60	0,03		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-147	B	07/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	2,00	2,00	78,70	0,13		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-148	B	07/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,50	1,00	2,00	78,50	0,18		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-149	B	07/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,40	1,00	2,00	78,50	0,13		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-150	B	07/03/2025	1,40%	1,40%	4,00	15,40	1,00	2,00	79,30	0,07		0,00	25,00	
Edifício I-4	PMG-151	B	07/03/2025	0,00%	0,00%	1,10	20,00	2,00	2,00	78,90	0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-46	A	07/03/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,00	3,00	2,00	78,70	0,12		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-46	B	07/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	3,00	2,00	78,60	0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-47	A	07/03/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,10	1,00	1,00	78,70	0,11		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-47	B	07/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,40	2,00	2,00	78,60	0,02		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-48	A	07/03/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,00	3,00	2,00	78,70	0,02		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-48	B	07/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,40	3,00	1,00	78,60	0,04		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-49	A	07/03/2025	0,00%	0,00%	0,30	21,00	2,00	2,00	78,70	0,09		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-49	B	07/03/2025	0,00%	0,00%	1,90	19,90	2,00	2,00	78,20	0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-50	A	07/03/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,10	1,00	2,00	78,70	0,12		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-50	B	07/03/2025	0,00%	0,00%	1,60	19,90	2,00	2,00	78,50	0,04		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-51	A	07/03/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,70	2,00	1,00	79,10	0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-51	B	07/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,60	2,00	0,00	79,30	0,04		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-52	A	07/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,70	1,00	1,00	79,20	0,06		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-52	B	07/03/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,60	1,00	1,00	79,20	0,02		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-53	A	07/03/2025	0,00%	0,00%	0,40	20,00	2,00	1,00	79,60	-0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-53	B	07/03/2025	0,00%	0,00%	0,70	19,50	2,00	0,00	79,80	0,12		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-54	A	07/03/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,80	1,00	1,00	79,00	0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-54	B	07/03/2025	2,70%	2,70%	4,10	14,90	2,00	2,00	78,30	0,09		0,00	100,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-55	A	07/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,40	2,00	1,00	79,50	0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-55	B	07/03/2025	0,00%	0,00%	3,60	16,10	2,00	0,00	80,30	-0,02		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-56	A	07/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,90	4,00	1,00	79,00	0,01		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-56	B	07/03/2025	0,00%	0,00%	1,20	20,30	3,00	1,00	78,40	0,18		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-57	A	07/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,10	1,00	1,00	78,80	0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-57	B	07/03/2025	0,00%	0,00%	1,50	19,90	2,00	1,00	78,60	-0,01		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-58	A	07/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,10	2,00	2,00	78,80	0,13		0,00	0,00	



Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	CO2 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15% ;															
Conjunto Laboratorial	PMG-58 B		07/03/2025	0,00%	0,00%	1,20	20,10	2,00	1,00	78,70	0,05		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-59 A		07/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,10	4,00	1,00	78,80	0,12		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-59 B		07/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,20	4,00	1,00	78,80	-0,10		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-60 A		07/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,10	4,00	1,00	78,80	0,10		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-60 B		07/03/2025	0,00%	0,00%	3,30	16,90	4,00	1,00	79,80	0,11		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-61 A		07/03/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,90	4,00	2,00	78,90	0,10		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-61 B		07/03/2025	0,00%	0,00%	5,90	14,90	4,00	1,00	79,30	0,10		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-137 B		07/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,40	2,00	2,00	78,60	0,24		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-138 B		07/03/2025	0,00%	0,00%	1,10	20,60	2,00	2,00	78,30	0,09		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-139 A		07/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	20,60	2,00	1,00	79,40	0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-139 B		07/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	20,70	1,00	0,00	79,20	0,04		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-140 A		07/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,70	1,00	1,00	79,30	0,04		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-140 B		07/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	20,80	2,00	0,00	79,20	0,11		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-141 B		07/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	20,90	2,00	1,00	79,10	0,17		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-62 A		07/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,00	2,00	1,00	78,90	0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-62 B		07/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,00	1,00	1,00	78,90	-0,16		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-01 A		06/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,30	2,00	2,00	78,70	0,06		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-01 B		06/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	1,00	2,00	78,60	0,10		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-02 A		06/03/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,70	2,00	1,00	79,20	0,10		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-02 B		06/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,00	2,00	1,00	79,00	0,10		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-03 A		06/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,90	2,00	1,00	79,00	0,05		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-03 B		06/03/2025	0,00%	0,00%	3,10	17,80	1,00	1,00	79,10	0,10		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-04 A		06/03/2025	0,00%	0,00%	0,40	20,40	2,00	1,00	79,20	0,09		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-04 B		06/03/2025	0,00%	0,00%	0,80	20,20	2,00	1,00	79,00	0,24		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-05 A		06/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,20	1,00	1,00	78,70	0,08		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-05 B		06/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	2,00	2,00	78,70	0,05		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-06 A		06/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,20	1,00	1,00	78,70	0,00		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-06 B		06/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	1,00	1,00	78,60	0,12		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-07 A		06/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,20	2,00	1,00	78,70	0,07		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-07 B		06/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	2,00	1,00	78,70	0,09		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-08 A		06/03/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,00	1,00	1,00	78,70	0,10		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-08 B		06/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,40	1,00	1,00	78,50	0,03		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-09 A		06/03/2025	0,00%	0,00%	0,70	20,50	1,00	1,00	78,90	-0,09		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-09 B		06/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,00	2,00	1,00	78,80	0,07		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-10 A		06/03/2025	0,00%	0,00%	0,40	20,70	1,00	1,00	78,90	0,13		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-10 B		06/03/2025	0,00%	0,00%	1,20	19,50	2,00	1,00	79,30	0,08		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-84 A		06/03/2025	0,00%	0,00%	0,30	20,70	2,00	1,00	79,00	0,04		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-84 B		06/03/2025	0,00%	0,00%	3,90	18,20	2,00	0,00	77,90	0,09		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-85 A		06/03/2025	0,00%	0,00%	0,90	20,10	2,00	1,00	79,10	0,02		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-85 B		06/03/2025	0,00%	0,00%	2,00	19,40	2,00	1,00	78,50	0,07		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-86 A		06/03/2025	0,00%	0,00%	0,40	20,50	2,00	1,00	79,20	0,08		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-86 B		06/03/2025	0,00%	0,00%	1,50	18,70	2,00	1,00	79,80	-0,03		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-87 A		06/03/2025	0,00%	0,00%	2,00	18,00	2,00	1,00	80,10	0,09		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-87 B		06/03/2025	0,00%	0,00%	2,10	18,50	1,00	1,00	79,40	0,05		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-152 A		06/03/2025	0,00%	0,00%	0,30	20,70	2,00	1,00	79,00	0,09		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-152 B		06/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,10	2,00	2,00	78,80	0,07		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-153 B		06/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	1,00	2,00	78,60	0,10		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-154 B		06/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,00	2,00	0,00	78,90	0,03		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-155 B		06/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,10	2,00	1,00	78,90	0,10		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-156 B		06/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	1,00	2,00	78,60	0,08		0,00	0,00	



Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	CO2 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15%,															
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-157	B	06/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,40	2,00	2,00	78,60	0,11		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-70	A	07/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,10	1,00	2,00	78,80	0,13		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-70	B	07/03/2025	0,00%	0,00%	0,90	19,20	1,00	2,00	79,80	0,11		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-71	A	07/03/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,70	2,00	2,00	79,20	0,15		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-71	B	07/03/2025	0,40%	0,40%	1,20	11,20	1,00	2,00	87,30	0,16		0,00	13,00	
Enfermaria	PMG-72	A	07/03/2025	0,00%	0,00%	0,30	20,60	1,00	3,00	79,20	0,16		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-72	B	07/03/2025	0,00%	0,00%	1,20	18,00	1,00	2,00	80,80	0,13		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-73	A	07/03/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,90	1,00	2,00	78,90	0,12		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-73	B	07/03/2025	0,00%	0,00%	0,90	19,20	1,00	2,00	79,90	0,13		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-74	A	07/03/2025	0,00%	0,00%	0,30	20,20	1,00	2,00	79,50	0,07		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-74	B	07/03/2025	0,40%	0,40%	0,70	15,80	1,00	3,00	83,10	0,14		0,00	15,00	
Enfermaria	PMG-75	A	07/03/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,70	1,00	2,00	79,20	0,12		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-75	B	07/03/2025	0,00%	0,00%	2,80	14,70	1,00	2,00	82,40	0,22		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-76	A	07/03/2025	0,00%	0,00%	0,30	20,40	1,00	3,00	79,30	0,24		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-76	B	07/03/2025	0,00%	0,00%	2,00	14,90	1,00	2,00	83,20	0,17		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-165	A	07/03/2025	0,00%	0,00%	0,40	20,40	1,00	2,00	79,20	0,21		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-165	B	07/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,10	2,00	2,00	78,80	0,18		0,00	0,00	
CAT	PMG-82	A	28/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,20	1,00	2,00	78,80	-0,01		0,00	0,00	
CAT	PMG-82	B	28/02/2025	0,00%	0,00%	1,90	19,40	2,00	2,00	78,40	0,18		0,00	0,00	
CAT	PMG-83	A	28/02/2025	0,00%	0,00%	2,10	19,30	1,00	2,00	78,70	0,16		0,00	0,00	
CAT	PMG-83	B	28/02/2025	0,00%	0,00%	3,60	17,60	1,00	2,00	78,70	0,29		0,00	0,00	
CAT	PMG-94	A	28/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,10	1,00	2,00	78,90	0,08		0,00	0,00	
CAT	PMG-94	B	28/02/2025	0,00%	0,00%	3,30	17,40	1,00	2,00	79,30	0,19		0,00	0,00	
CAT	PMG-95	A	28/02/2025	0,00%	0,00%	0,70	20,60	1,00	2,00	78,70	0,07		0,00	0,00	
CAT	PMG-95	B	28/02/2025	0,00%	0,00%	1,10	20,50	1,00	2,00	78,30	0,22		0,00	0,00	
CAT	PMG-96	A	28/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,00	1,00	2,00	78,90	0,24		0,00	0,00	
CAT	PMG-96	B	28/02/2025	0,00%	0,00%	2,90	17,10	1,00	2,00	80,00	0,13		0,00	0,00	
CAT	PMG-97	A	28/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,00	1,00	3,00	78,90	0,01		0,00	0,00	
CAT	PMG-97	B	28/02/2025	0,00%	0,00%	2,90	17,60	1,00	2,00	79,50	0,12		0,00	0,00	
CAT	PMG-98	A	28/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,00	2,00	2,00	78,90	0,15		0,00	0,00	
CAT	PMG-98	B	28/02/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,90	2,00	2,00	78,90	0,21		0,00	0,00	
CAT	PMG-160	A	28/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,10	2,00	2,00	78,90	0,11		0,00	0,00	
CAT	PMG-160	B	28/02/2025	0,00%	0,00%	2,50	18,10	2,00	2,00	79,30	0,03		0,00	0,00	
CAT	PMG-161	A	28/02/2025	0,00%	0,00%	1,40	19,80	1,00	3,00	78,80	0,15		0,00	0,00	
CAT	PMG-161	B	28/02/2025	0,00%	0,00%	17,00	19,80	1,00	2,00	78,50	0,18		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-88	A	07/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,30	2,00	1,00	78,60	0,09		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-88	B	07/03/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,10	1,00	2,00	78,70	0,21		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-89	A	07/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,20	2,00	2,00	78,70	0,11		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-89	B	07/03/2025	0,00%	0,00%	0,70	20,60	1,00	1,00	78,70	0,13		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-90	A	07/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,20	1,00	2,00	78,80	0,11		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-90	B	07/03/2025	0,00%	0,00%	0,40	20,80	1,00	2,00	78,90	0,03		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-91	A	07/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,20	1,00	2,00	78,80	0,14		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-91	B	07/03/2025	0,00%	0,00%	1,50	19,50	1,00	2,00	79,00	0,18		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-92	A	07/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,00	1,00	2,00	78,90	0,08		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-92	B	07/03/2025	0,00%	0,00%	0,90	20,20	1,00	2,00	78,90	0,09		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-93	A	07/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,00	2,00	2,00	78,90	0,13		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-93	B	07/03/2025	0,00%	0,00%	0,70	20,30	1,00	2,00	79,00	0,08		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-102		28/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,00	1,00	2,00	78,90	0,15		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-103		28/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,00	1,00	2,00	78,90	0,17		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-104		28/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,80	2,00	2,00	79,10	0,13		0,00	0,00	



Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	CO2 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%;															
Ginásio Poliesportivo	PMG-105		28/02/2025	0,00%	0,00%	1,20	19,70	1,00	2,00	79,00	0,12		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-106		28/02/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,70	1,00	2,00	79,10	0,08		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-107		28/02/2025	0,00%	0,00%	2,30	17,20	1,00	2,00	80,40	0,12		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-108		28/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,70	1,00	2,00	79,20	0,01		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-109 A		28/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,00	1,00	2,00	79,00	0,13		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-109 B		28/02/2025	0,00%	0,00%	0,90	19,60	1,00	2,00	79,60	0,13		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-110 A		28/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,00	2,00	2,00	78,90	0,18		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-110 B		28/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,10	1,00	2,00	78,90	0,14		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-111 A		28/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,00	1,00	2,00	78,90	0,13		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-111 B		28/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,00	1,00	2,00	79,00	0,13		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-112		28/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,00	2,00	2,00	78,90	0,15		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-162 A		28/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,90	1,00	2,00	79,10	0,12		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-162 B		28/02/2025	0,00%	0,00%	1,40	19,10	1,00	1,00	79,50	0,13		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-166 A		28/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,00	1,00	2,00	79,00	0,12		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-166 B		28/02/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,40	1,00	2,00	79,40	0,15		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-119 A		28/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,10	1,00	1,00	78,90	0,13		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-119 B		28/02/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,90	1,00	2,00	78,90	0,10		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-119 C		28/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,10	1,00	1,00	78,80	0,12		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-120 A		28/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,10	1,00	1,00	78,80	0,21		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-120 B		28/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,10	1,00	2,00	78,90	0,11		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-120 C		28/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,20	1,00	2,00	78,80	0,08		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-163 B		28/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,10	2,00	2,00	78,80	0,08		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-164 B		28/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,10	1,00	2,00	78,90	0,13		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-164 C		28/02/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,10	1,00	2,00	78,90	0,12		0,00	0,00	
Transportes	PMG-121 A		06/03/2025	0,00%	0,00%	0,40	20,60	1,00	2,00	79,10	0,03		0,00	0,00	
Transportes	PMG-121 B		06/03/2025	0,00%	0,00%	3,40	16,60	2,00	2,00	80,10	0,08		0,00	0,00	
Transportes	PMG-122 A		06/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	20,90	2,00	2,00	79,00	0,06		0,00	0,00	
Transportes	PMG-122 B		06/03/2025	0,00%	0,00%	5,50	15,00	2,00	2,00	79,50	0,07		0,00	0,00	
Transportes	PMG-123 A		06/03/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,80	1,00	2,00	79,00	0,08		0,00	0,00	
Transportes	PMG-123 B		06/03/2025	0,00%	0,00%	1,30	20,00	1,00	2,00	78,70	0,13		0,00	0,00	
Transportes	PMG-124 A		06/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,00	1,00	3,00	79,00	0,18		0,00	0,00	
Transportes	PMG-124 B		06/03/2025	0,00%	0,00%	3,10	18,30	1,00	3,00	78,70	0,09		0,00	0,00	
Transportes	PMG-158 B		06/03/2025	0,00%	0,00%	0,90	19,90	1,00	2,00	79,20	0,02		0,00	0,00	
Transportes	PMG-159 B		06/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,10	1,00	3,00	78,90	0,12		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-125 A		06/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,50	2,00	2,00	78,50	0,08		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-125 B		06/03/2025	0,00%	0,00%	4,50	16,70	2,00	2,00	78,80	-0,11		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-126 A		06/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,10	1,00	2,00	78,90	-0,03		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-126 B		06/03/2025	0,00%	0,00%	9,10	14,10	2,00	2,00	76,80	-0,10		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-127 A		06/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,00	2,00	1,00	79,00	0,10		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-127 B		06/03/2025	0,00%	0,00%	6,70	16,10	1,00	2,00	77,20	-1,69		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-128 A		06/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,90	2,00	1,00	79,00	-0,07		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-128 B		06/03/2025	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	Não medido. Agua durante a medição.
Posto Guarda Universitário	PMG-129 A		06/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,00	1,00	2,00	78,90	0,07		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-129 B		06/03/2025	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	Não medido. Agua durante a medição.
Posto Guarda Universitário	PMG-130 A		06/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,90	1,00	4,00	79,10	0,10		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-130 B		06/03/2025	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	Não medido. Agua durante a medição.
Posto Guarda Universitário	PMG-131 A		06/03/2025	0,00%	0,00%	0,70	20,00	1,00	3,00	79,30	0,13		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-131 B		06/03/2025	0,00%	0,00%	1,60	19,10	1,00	2,00	79,20	0,17		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-16 A		11/03/2025	0,00%	0,00%	1,60	19,30	2,00	2,00	79,10	0,12		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-16 B		11/03/2025	0,00%	0,00%	2,20	18,50	2,00	2,00	79,40	0,16		0,00	0,00	



Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	CO2 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15% ,															
Edifício I 1	PMG-17 A	11/03/2025	0,00%	0,00%	0,50	20,60	1,00	2,00	78,90	0,08			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-17 B	11/03/2025	0,00%	0,00%	1,60	19,60	1,00	2,00	78,80	0,07			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-18 A	11/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,20	2,00	0,00	79,70	0,03			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-18 B	11/03/2025	0,00%	0,00%	1,50	19,00	2,00	0,00	79,50	-0,03			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-20 A	11/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,60	2,00	1,00	79,30	0,11			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-20 B	11/03/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,50	2,00	1,00	79,30	0,19			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-22 A	11/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,60	1,00	2,00	78,30	0,02			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-22 B	11/03/2025	0,00%	0,00%	1,90	19,40	1,00	2,00	78,70	0,01			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-23 A	11/03/2025	0,00%	0,00%	0,30	20,40	1,00	1,00	79,30	0,01			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-23 B	11/03/2025	0,00%	0,00%	0,70	19,80	2,00	0,00	79,50	0,11			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-113 A	11/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,30	2,00	1,00	79,60	-0,74			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-113 B	11/03/2025	0,00%	0,00%	1,80	18,60	2,00	1,00	79,70	0,03			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-114 A	11/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,60	1,00	1,00	79,40	0,11			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-114 B	11/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	20,70	2,00	1,00	79,30	0,04			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-115 A	11/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,30	1,00	1,00	79,60	0,06			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-115 B	11/03/2025	0,00%	0,00%	0,90	19,80	2,00	1,00	79,30	0,08			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-11 A	11/03/2025	0,00%	0,00%	0,80	20,30	1,00	3,00	78,90	0,22			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-11 B	11/03/2025	0,00%	0,00%	0,80	20,10	2,00	2,00	79,00	0,13			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-12 A	11/03/2025	0,00%	0,00%	2,90	18,40	1,00	2,00	78,70	0,19			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-12 B	11/03/2025	0,00%	0,00%	2,80	18,40	2,00	2,00	78,80	-0,03			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-13 A	11/03/2025	0,00%	0,00%	1,10	20,00	1,00	2,00	78,90	0,13			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-13 B	11/03/2025	0,00%	0,00%	1,30	19,70	1,00	3,00	79,00	0,07			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-14 A	11/03/2025	0,00%	0,00%	2,40	18,80	1,00	2,00	78,80	0,13			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-14 B	11/03/2025	0,00%	0,00%	3,40	17,90	1,00	2,00	78,70	-0,03			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-15 A	11/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,20	2,00	2,00	78,80	0,14			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-15 B	11/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	2,00	2,00	78,70	0,05			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-19 A	11/03/2025	0,00%	0,00%	0,40	20,90	2,00	2,00	78,70	0,16			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-19 B	11/03/2025	0,00%	0,00%	0,70	20,40	2,00	2,00	78,90	0,17			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-21 A	11/03/2025	0,00%	0,00%	0,70	20,50	1,00	2,00	78,70	0,13			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-21 B	11/03/2025	0,00%	0,00%	1,20	20,10	1,00	2,00	78,70	0,07			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-24 A	11/03/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,10	1,00	2,00	78,70	0,11			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-24 B	11/03/2025	0,00%	0,00%	0,40	21,00	1,00	2,00	78,70	0,07			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-135 A	11/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,50	2,00	1,00	79,40	0,10			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-135 B	11/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	20,50	2,00	0,00	79,40	0,04			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-136 B	11/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,40	2,00	1,00	79,50	0,03			0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-25 A	10/03/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,00	1,00	2,00	78,90	0,16			0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-25 B	10/03/2025	0,00%	0,00%	1,30	20,00	1,00	1,00	78,70	0,05			0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-26 A	10/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,10	2,00	1,00	78,80	0,14			0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-26 B	10/03/2025	0,00%	0,00%	1,00	20,30	2,00	1,00	78,70	0,08			0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-27 A	10/03/2025	0,00%	0,00%	1,00	20,00	2,00	2,00	79,00	0,09			0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-27 B	10/03/2025	0,00%	0,00%	3,30	17,80	2,00	1,00	78,90	0,17			0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-28 A	10/03/2025	0,00%	0,00%	1,10	18,70	1,00	2,00	80,20	0,14			0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-28 B	10/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	2,00	2,00	78,70	0,09			0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-29 A	10/03/2025	0,00%	0,00%	0,30	20,80	2,00	2,00	78,90	0,11			0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-29 B	10/03/2025	0,00%	0,00%	1,00	20,20	2,00	2,00	78,80	0,10			0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-44 A	10/03/2025	0,00%	0,00%	0,40	20,80	1,00	2,00	78,80	0,10			0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-44 B	10/03/2025	0,00%	0,00%	0,70	20,50	2,00	1,00	78,80	0,06			0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-45 A	10/03/2025	0,00%	0,00%	0,30	20,40	2,00	1,00	79,30	0,08			0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-45 B	10/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,10	1,00	1,00	78,90	0,10			0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-134 B	10/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,20	2,00	2,00	78,80	0,18			0,00	0,00	



Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	CO2 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15%,															
I-3 Biblioteca	PMG-30	A	10/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,40	2,00	1,00	79,50	0,22		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-30	B	10/03/2025	0,00%	0,00%	1,20	19,40	2,00	0,00	79,40	0,02		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-31	A	10/03/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,20	2,00	1,00	79,60	0,19		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-31	B	10/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,40	2,00	1,00	79,50	0,07		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-32	A	10/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,70	2,00	1,00	79,20	0,06		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-32	B	10/03/2025	0,00%	0,00%	0,90	20,00	1,00	0,00	79,10	0,09		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-33	A	10/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,80	1,00	1,00	79,10	0,08		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-33	B	10/03/2025	0,00%	0,00%	1,60	19,20	1,00	1,00	79,10	-0,02		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-34	A	10/03/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,70	2,00	1,00	79,10	0,08		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-34	B	10/03/2025	0,00%	0,00%	1,30	19,80	2,00	1,00	78,90	-0,01		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-35	A	10/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,90	2,00	2,00	79,00	0,08		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-35	B	10/03/2025	0,00%	0,00%	1,00	20,30	2,00	1,00	78,80	0,08		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-36	A	10/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,00	2,00	1,00	78,90	0,12		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-36	B	10/03/2025	0,00%	0,00%	2,40	18,40	1,00	2,00	79,20	0,20		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-37	A	10/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,10	1,00	1,00	78,90	0,14		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-37	B	10/03/2025	0,00%	0,00%	1,00	20,20	2,00	1,00	78,70	0,08		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-38	A	10/03/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,90	1,00	1,00	78,90	0,07		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-38	B	10/03/2025	0,00%	0,00%	0,30	20,70	2,00	1,00	79,00	-0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-39	A	10/03/2025	0,00%	0,00%	0,30	20,60	1,00	1,00	79,10	-0,02		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-39	B	10/03/2025	0,00%	0,00%	4,60	16,60	2,00	1,00	78,80	0,08		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-40	A	10/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,00	1,00	2,00	78,90	0,13		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-40	B	10/03/2025	0,00%	0,00%	0,30	20,70	2,00	1,00	79,00	0,06		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-41	A	10/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,60	2,00	1,00	79,40	0,10		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-41	B	10/03/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,60	2,00	0,00	79,30	0,08		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-42	A	10/03/2025	0,00%	0,00%	0,70	20,00	2,00	1,00	79,30	0,08		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-42	B	10/03/2025	0,00%	0,00%	5,40	16,10	2,00	1,00	78,50	0,01		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-43	A	10/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,50	1,00	1,00	79,40	0,07		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-43	B	10/03/2025	0,00%	0,00%	0,60	20,30	2,00	0,00	79,10	0,05		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-132	A	10/03/2025	0,00%	0,00%	0,20	19,90	2,00	1,00	79,90	-0,02		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-132	B	10/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,20	3,00	0,00	79,70	0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-133	A	10/03/2025	0,00%	0,00%	0,40	20,50	2,00	1,00	79,20	0,10		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-133	B	10/03/2025	0,00%	0,00%	0,50	20,50	2,00	2,00	79,00	0,10		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-63	A	12/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,10	2,00	1,00	78,80	0,11		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-63	B	12/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,10	2,00	1,00	78,80	0,08		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-64	A	12/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,10	1,00	2,00	78,90	-0,02		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-64	B	12/03/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,90	2,00	1,00	78,90	0,06		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-65	A	12/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,10	2,00	1,00	78,90	0,11		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-65	B	12/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,20	2,00	1,00	78,70	0,07		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-66	A	12/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,00	2,00	1,00	78,90	0,08		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-66	B	12/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,20	2,00	1,00	78,80	0,13		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-67	A	12/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,90	8,00	2,00	79,00	0,11		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-67	B	12/03/2025	0,00%	0,00%	0,60	20,10	7,00	1,00	79,40	0,06		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-68	A	12/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,10	3,00	2,00	78,90	0,20		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-68	B	12/03/2025	0,00%	0,00%	0,50	20,60	2,00	2,00	78,90	0,08		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-69	A	12/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	2,00	1,00	78,60	0,08		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-69	B	12/03/2025	0,00%	0,00%	1,80	18,20	2,00	2,00	80,00	0,07		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-77	A	12/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,00	5,00	2,00	78,90	0,11		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-77	B	12/03/2025	0,00%	0,00%	1,00	19,20	4,00	1,00	79,80	0,10		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-78	A	12/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,00	3,00	2,00	79,00	0,12		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-78	B	12/03/2025	0,00%	0,00%	1,20	19,60	3,00	1,00	79,20	0,10		0,00	0,00	



Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	C02 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15%,															
Edifício I-4	PMG-79 A	12/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,00	3,00	1,00	79,00	0,12			0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-79 B	12/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,20	3,00	1,00	78,70	0,19			0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-80 A	12/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,40	2,00	2,00	78,50	0,08			0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-80 B	12/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,50	2,00	1,00	78,50	0,08			0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-81 A	12/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	6,00	1,00	78,60	0,09			0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-81 B	12/03/2025	0,00%	0,00%	0,50	20,70	6,00	1,00	78,80	0,06			0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-144 B	12/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,00	4,00	1,00	78,90	0,07			0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-145 B	12/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,00	4,00	2,00	78,90	0,08			0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-146 B	12/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,10	7,00	1,00	78,90	0,11			0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-147 B	12/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,00	7,00	2,00	79,00	0,16			0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-148 B	12/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,20	1,00	1,00	78,80	0,06			0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-149 B	12/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,90	2,00	1,00	79,00	0,11			0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-150 B	12/03/2025	0,00%	0,00%	3,90	15,60	2,00	1,00	80,50	-0,03			0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-151 B	12/03/2025	0,00%	0,00%	1,40	19,60	3,00	2,00	79,00	0,13			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-46 A	12/03/2025	0,00%	0,00%	0,30	20,90	2,00	2,00	78,80	0,06			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-46 B	12/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,20	2,00	2,00	78,80	0,05			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-47 A	12/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,90	3,00	2,00	78,90	0,10			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-47 B	12/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,20	2,00	1,00	78,80	0,13			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-48 A	12/03/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,00	2,00	2,00	78,90	0,10			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-48 B	12/03/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,00	2,00	2,00	78,80	0,09			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-49 A	12/03/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,00	2,00	1,00	78,80	0,14			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-49 B	12/03/2025	0,00%	0,00%	2,40	19,10	2,00	2,00	78,50	0,19			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-50 A	12/03/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,00	2,00	2,00	78,80	0,14			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-50 B	12/03/2025	0,00%	0,00%	2,00	19,50	2,00	2,00	78,50	0,07			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-51 A	12/03/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,60	1,00	1,00	79,20	0,10			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-51 B	12/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,50	2,00	0,00	79,30	0,18			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-52 A	12/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	20,70	2,00	0,00	79,30	-0,02			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-52 B	12/03/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,60	2,00	0,00	79,20	0,08			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-53 A	12/03/2025	0,00%	0,00%	0,40	20,20	2,00	0,00	79,40	0,03			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-53 B	12/03/2025	0,00%	0,00%	0,70	19,50	2,00	0,00	79,80	0,11			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-54 A	12/03/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,30	2,00	1,00	79,40	0,08			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-54 B	12/03/2025	0,90%	0,90%	2,90	16,10	2,00	0,00	80,00	-0,02			0,00	58,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-55 A	12/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,40	3,00	0,00	79,50	0,00			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-55 B	12/03/2025	1,50%	1,50%	4,60	14,90	2,00	0,00	78,90	0,08			0,00	62,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-56 A	12/03/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,50	10,00	1,00	79,30	0,08			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-56 B	12/03/2025	0,00%	0,00%	1,10	20,30	10,00	1,00	78,70	0,08			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-57 A	12/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,80	2,00	1,00	79,10	-0,03			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-57 B	12/03/2025	0,00%	0,00%	1,10	20,10	3,00	1,00	78,80	0,00			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-58 A	12/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,10	16,00	1,00	78,80	0,01			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-58 B	12/03/2025	0,00%	0,00%	1,40	19,80	16,00	1,00	78,70	0,09			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-59 A	12/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,00	14,00	1,00	78,90	0,08			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-59 B	12/03/2025	0,00%	0,00%	1,00	20,20	14,00	2,00	78,80	0,13			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-60 A	12/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,90	13,00	1,00	79,00	0,09			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-60 B	12/03/2025	0,00%	0,00%	1,30	19,40	13,00	1,00	79,30	0,06			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-61 A	12/03/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,80	12,00	2,00	79,00	0,09			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-61 B	12/03/2025	0,00%	0,00%	61,00	14,30	12,00	1,00	79,60	0,14			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-137 B	12/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,20	2,00	2,00	78,70	0,08			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-138 B	12/03/2025	0,00%	0,00%	1,90	19,80	2,00	2,00	78,30	0,11			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-139 A	12/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	20,60	2,00	1,00	79,40	-0,02			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-139 B	12/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	20,70	2,00	0,00	79,30	-0,01			0,00	0,00	



Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	C02 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
Conjunto Laboratorial	PMG-140 A	12/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,60	2,00	1,00	79,30	-0,05			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-140 B	12/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	20,70	2,00	0,00	79,30	-0,01			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-141 B	12/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	20,80	2,00	1,00	79,20	0,01			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-62 A	12/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	20,80	1,00	1,00	79,20	0,00			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-62 B	12/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	20,80	2,00	1,00	79,20	0,13			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-01 A	11/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,70	1,00	2,00	79,30	0,10			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-01 B	11/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	20,90	1,00	2,00	79,10	0,01			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-02 A	11/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,90	2,00	2,00	79,00	0,17			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-02 B	11/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,10	2,00	1,00	78,90	0,11			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-03 A	11/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,10	1,00	2,00	78,90	0,11			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-03 B	11/03/2025	0,00%	0,00%	1,50	19,20	1,00	2,00	79,30	0,10			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-04 A	11/03/2025	0,00%	0,00%	0,30	20,80	2,00	2,00	78,90	0,18			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-04 B	11/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,10	1,00	2,00	78,80	0,09			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-05 A	11/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,10	1,00	2,00	78,80	0,05			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-05 B	11/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,20	2,00	2,00	78,80	0,12			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-06 A	11/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,80	1,00	1,00	79,00	0,12			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-06 B	11/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,00	2,00	2,00	79,00	0,11			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-07 A	11/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,00	1,00	2,00	78,90	0,13			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-07 B	11/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,10	1,00	2,00	78,80	0,09			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-08 A	11/03/2025	0,00%	0,00%	0,30	20,50	2,00	2,00	79,20	0,11			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-08 B	11/03/2025	0,00%	0,00%	1,80	18,30	2,00	1,00	79,80	0,11			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-09 A	14/03/2025	0,00%	0,00%	1,50	19,30	2,00	2,00	79,20	0,08			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-09 B	14/03/2025	0,50%	0,50%	5,70	15,20	1,00	1,00	78,60	0,12			0,00	33,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-10 A	14/03/2025	0,00%	0,00%	0,40	20,30	2,00	1,00	79,20	0,08			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-10 B	14/03/2025	0,00%	0,00%	2,50	17,70	1,00	1,00	79,80	0,09			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-84 A	11/03/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,70	2,00	1,00	79,10	0,08			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-84 B	11/03/2025	0,00%	0,00%	3,60	18,40	2,00	1,00	78,00	0,05			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-85 A	11/03/2025	0,00%	0,00%	0,80	20,00	2,00	2,00	79,20	0,07			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-85 B	11/03/2025	0,00%	0,00%	1,80	19,20	2,00	1,00	79,00	0,12			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-86 A	11/03/2025	0,00%	0,00%	0,30	20,40	2,00	1,00	79,30	0,13			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-86 B	11/03/2025	0,00%	0,00%	1,10	19,20	2,00	1,00	79,70	0,22			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-87 A	11/03/2025	0,00%	0,00%	2,30	17,20	1,00	1,00	80,50	0,13			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-87 B	11/03/2025	0,00%	0,00%	2,40	17,70	2,00	1,00	79,90	0,02			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-152 A	14/03/2025	0,00%	0,00%	0,30	20,30	2,00	1,00	79,50	0,04			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-152 B	14/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,80	2,00	1,00	79,00	0,03			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-153 B	11/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	20,90	2,00	2,00	79,00	0,13			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-154 B	11/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,20	1,00	2,00	78,80	0,13			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-155 B	11/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,10	1,00	2,00	78,80	0,09			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-156 B	11/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	1,00	2,00	78,70	0,14			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-157 B	11/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,10	1,00	2,00	78,90	0,07			0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-70 A	13/03/2025	0,00%	0,00%	0,20	19,60	2,00	1,00	80,20	0,12			0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-70 B	13/03/2025	0,00%	0,00%	1,10	18,10	2,00	1,00	80,80	0,14			0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-71 A	13/03/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,00	2,00	1,00	79,80	0,08			0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-71 B	13/03/2025	0,20%	0,20%	1,30	10,00	1,00	0,00	88,40	0,08			0,00	7,00	
Enfermaria	PMG-72 A	13/03/2025	0,00%	0,00%	0,40	19,50	1,00	1,00	80,10	0,16			0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-72 B	13/03/2025	0,00%	0,00%	1,50	16,40	2,00	1,00	82,20	0,13			0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-73 A	13/03/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,00	2,00	1,00	79,70	0,15			0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-73 B	13/03/2025	0,00%	0,00%	1,00	18,30	2,00	2,00	80,70	0,17			0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-74 A	13/03/2025	0,00%	0,00%	0,30	19,80	1,00	1,00	80,00	-0,03			0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-74 B	13/03/2025	0,80%	0,80%	0,90	14,70	2,00	1,00	83,60	0,12			0,00	38,00	



Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	CO2 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
Enfermaria	PMG-75	A	13/03/2025	0,00%	0,00%	0,30	19,90	2,00	1,00	79,80	0,15		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-75	B	13/03/2025	0,00%	0,00%	1,70	17,10	2,00	1,00	81,20	0,09		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-76	A	13/03/2025	0,00%	0,00%	0,40	19,30	1,00	2,00	80,30	0,09		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-76	B	13/03/2025	0,00%	0,00%	2,50	12,90	1,00	1,00	84,60	0,21		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-165	A	13/03/2025	0,00%	0,00%	0,40	17,90	1,00	1,00	81,60	0,16		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-165	B	13/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,40	2,00	1,00	79,50	0,08		0,00	0,00	
CAT	PMG-82	A	13/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	20,90	1,00	1,00	79,10	0,09		0,00	0,00	
CAT	PMG-82	B	13/03/2025	0,00%	0,00%	1,20	19,70	2,00	2,00	79,10	0,18		0,00	0,00	
CAT	PMG-83	A	13/03/2025	0,00%	0,00%	2,80	18,30	2,00	2,00	78,90	0,16		0,00	0,00	
CAT	PMG-83	B	13/03/2025	0,00%	0,00%	3,30	17,60	1,00	1,00	79,10	0,12		0,00	0,00	
CAT	PMG-94	A	13/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,80	1,00	2,00	79,20	0,18		0,00	0,00	
CAT	PMG-94	B	13/03/2025	0,00%	0,00%	3,90	16,70	2,00	2,00	79,40	0,22		0,00	0,00	
CAT	PMG-95	A	13/03/2025	0,00%	0,00%	0,80	20,20	1,00	2,00	78,90	0,31		0,00	0,00	
CAT	PMG-95	B	13/03/2025	0,00%	0,00%	1,80	19,70	1,00	2,00	78,40	0,31		0,00	0,00	
CAT	PMG-96	A	13/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,80	2,00	2,00	79,10	0,18		0,00	0,00	
CAT	PMG-96	B	13/03/2025	0,00%	0,00%	4,00	14,30	2,00	2,00	81,60	0,14		0,00	0,00	
CAT	PMG-97	A	13/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,90	2,00	1,00	79,10	0,18		0,00	0,00	
CAT	PMG-97	B	13/03/2025	0,00%	0,00%	3,00	17,50	2,00	2,00	79,40	0,10		0,00	0,00	
CAT	PMG-98	A	13/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,80	1,00	2,00	79,10	0,17		0,00	0,00	
CAT	PMG-98	B	13/03/2025	0,00%	0,00%	0,40	20,60	2,00	1,00	79,00	0,17		0,00	0,00	
CAT	PMG-160	A	13/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,50	1,00	2,00	79,40	0,13		0,00	0,00	
CAT	PMG-160	B	13/03/2025	0,00%	0,00%	2,70	17,80	2,00	1,00	79,50	0,17		0,00	0,00	
CAT	PMG-161	A	13/03/2025	0,00%	0,00%	1,80	19,30	2,00	2,00	79,00	0,05		0,00	0,00	
CAT	PMG-161	B	13/03/2025	0,00%	0,00%	2,50	18,70	1,00	2,00	78,80	0,11		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-88	A	14/03/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,90	2,00	2,00	78,90	0,11		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-88	B	14/03/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,00	1,00	2,00	78,80	0,03		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-89	A	14/03/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,00	1,00	2,00	78,80	0,13		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-89	B	14/03/2025	0,00%	0,00%	0,80	20,30	1,00	2,00	78,90	0,09		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-90	A	14/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,20	1,00	2,00	78,80	0,13		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-90	B	14/03/2025	0,00%	0,00%	0,30	20,80	1,00	2,00	78,90	0,01		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-91	A	14/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,10	1,00	2,00	78,80	0,07		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-91	B	14/03/2025	0,00%	0,00%	1,60	19,30	1,00	2,00	79,10	0,13		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-92	A	14/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,10	1,00	2,00	78,80	0,14		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-92	B	14/03/2025	0,00%	0,00%	0,90	20,10	2,00	2,00	79,00	0,17		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-93	A	14/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,10	1,00	2,00	78,80	0,13		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-93	B	14/03/2025	0,00%	0,00%	1,00	20,10	2,00	1,00	78,90	0,15		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-102		13/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	20,60	2,00	1,00	79,40	0,06		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-103		13/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	20,50	2,00	1,00	79,50	0,08		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-104		13/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,40	2,00	0,00	79,50	0,09		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-105		13/03/2025	0,00%	0,00%	1,60	19,00	1,00	0,00	79,30	0,08		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-106		13/03/2025	0,00%	0,00%	0,30	20,10	2,00	0,00	79,60	0,11		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-107		13/03/2025	0,00%	0,00%	4,10	14,30	3,00	0,00	81,50	0,11		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-108		13/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,20	2,00	0,00	79,70	-0,09		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-109	A	13/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,20	2,00	0,00	79,60	0,04		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-109	B	13/03/2025	0,00%	0,00%	1,00	19,10	2,00	0,00	79,90	-0,30		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-110	A	13/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,50	1,00	1,00	79,40	0,11		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-110	B	13/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	20,60	1,00	0,00	79,30	0,11		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-111	A	13/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,50	1,00	1,00	79,40	0,03		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-111	B	13/03/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,30	1,00	1,00	79,50	0,03		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-112		13/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,20	3,00	0,00	79,70	-0,08		0,00	0,00	



Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	CO2 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15% ,															
Ginásio Poliesportivo	PMG-162	A	13/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,30	2,00	0,00	79,60	0,08		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-162	B	13/03/2025	1,00%	1,00%	2,40	16,60	2,00	0,00	79,90	0,11		0,00	75,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-166	A	13/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,50	1,00	1,00	79,40	0,09		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-166	B	13/03/2025	0,00%	0,00%	1,30	17,60	2,00	0,00	81,10	0,07		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-119	A	10/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,20	1,00	2,00	78,80	0,12		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-119	B	10/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,10	1,00	2,00	78,80	0,04		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-119	C	10/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,40	2,00	1,00	78,60	0,11		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-120	A	10/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,20	1,00	1,00	78,70	0,10		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-120	B	10/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,10	1,00	2,00	78,80	0,19		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-120	C	10/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,40	2,00	2,00	78,60	0,04		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-163	B	10/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,40	1,00	2,00	78,60	0,16		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-164	B	10/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,10	1,00	2,00	78,80	0,09		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-164	C	10/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	1,00	2,00	78,70	0,13		0,00	0,00	
Transportes	PMG-121	A	14/03/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,90	1,00	2,00	79,00	0,12		0,00	0,00	
Transportes	PMG-121	B	14/03/2025	0,00%	0,00%	6,90	11,80	1,00	2,00	81,40	0,20		0,00	0,00	
Transportes	PMG-122	A	14/03/2025	0,00%	0,00%	0,70	20,10	2,00	2,00	79,20	0,10		0,00	0,00	
Transportes	PMG-122	B	14/03/2025	0,00%	0,00%	6,90	14,00	2,00	2,00	79,10	0,05		0,00	0,00	
Transportes	PMG-123	A	14/03/2025	0,00%	0,00%	0,70	20,00	1,00	2,00	79,30	0,18		0,00	0,00	
Transportes	PMG-123	B	14/03/2025	0,00%	0,00%	1,20	19,30	1,00	2,00	79,50	0,09		0,00	0,00	
Transportes	PMG-124	A	14/03/2025	0,00%	0,00%	0,30	20,60	1,00	2,00	79,10	0,08		0,00	0,00	
Transportes	PMG-124	B	14/03/2025	0,00%	0,00%	3,30	17,80	1,00	1,00	78,90	0,11		0,00	0,00	
Transportes	PMG-158	B	14/03/2025	0,00%	0,00%	4,60	16,40	1,00	2,00	79,00	0,06		0,00	0,00	
Transportes	PMG-159	B	14/03/2025	0,00%	0,00%	1,30	19,00	2,00	2,00	79,70	0,12		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-125	A	13/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,30	2,00	1,00	78,60	0,00		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-125	B	13/03/2025	0,00%	0,00%	5,20	15,80	1,00	1,00	79,00	0,04		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-126	A	13/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,90	1,00	1,00	79,00	0,05		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-126	B	13/03/2025	0,00%	0,00%	5,70	16,60	1,00	1,00	77,70	-0,98		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-127	A	13/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,90	2,00	1,00	79,00	-0,02		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-127	B	13/03/2025	0,00%	0,00%	4,80	17,10	1,00	1,00	78,10	0,11		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-128	A	13/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,90	2,00	0,00	79,10	0,03		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-128	B	13/03/2025	0,00%	0,00%	8,80	13,30	1,00	2,00	77,90	-2,06		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-129	A	13/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,50	1,00	1,00	79,40	0,04		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-129	B	13/03/2025	0,00%	0,00%	3,00	17,00	1,00	2,00	79,90	-1,77		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-130	A	13/03/2025	0,00%	0,00%	0,30	20,30	1,00	1,00	79,40	0,11		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-130	B	13/03/2025	0,00%	0,00%	5,30	15,80	1,00	1,00	78,80	0,14		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-131	A	13/03/2025	0,00%	0,00%	0,80	19,50	1,00	2,00	79,70	0,12		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-131	B	13/03/2025	0,00%	0,00%	1,50	18,90	1,00	1,00	79,60	0,01		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-16	A	18/03/2025	0,00%	0,00%	2,80	18,10	1,00	1,00	79,20	0,09		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-16	B	18/03/2025	0,00%	0,00%	3,20	17,30	2,00	1,00	79,50	0,00		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-17	A	18/03/2025	0,00%	0,00%	1,00	20,00	2,00	1,00	79,00	0,09		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-17	B	18/03/2025	0,00%	0,00%	2,10	19,20	2,00	1,00	78,80	0,09		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-18	A	18/03/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,30	2,00	0,00	79,60	-0,08		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-18	B	18/03/2025	0,00%	0,00%	3,10	17,80	2,00	0,00	79,00	0,01		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-20	A	18/03/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,60	3,00	0,00	79,30	0,03		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-20	B	18/03/2025	0,00%	0,00%	0,30	20,60	1,00	1,00	79,10	0,11		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-22	A	18/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,90	1,00	3,00	79,00	0,12		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-22	B	18/03/2025	0,00%	0,00%	4,00	16,90	1,00	2,00	79,20	0,15		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-23	A	18/03/2025	0,00%	0,00%	0,40	20,30	2,00	0,00	79,20	0,08		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-23	B	18/03/2025	0,00%	0,00%	1,50	19,00	2,00	0,00	79,50	0,03		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-113	A	18/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,30	2,00	0,00	79,60	-0,29		0,00	0,00	



Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	CO2 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15%,															
Edifício I 1	PMG-113	B	18/03/2025	0,00%	0,00%	2,70	17,70	2,00	0,00	79,60	-0,37		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-114	A	18/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,50	1,00	0,00	79,30	0,19		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-114	B	18/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,60	2,00	0,00	79,30	0,23		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-115	A	18/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,40	2,00	0,00	79,50	-0,02		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-115	B	18/03/2025	0,00%	0,00%	0,80	20,00	2,00	0,00	79,20	-0,03		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-11	A	20/03/2025	0,00%	0,00%	1,10	20,10	1,00	1,00	78,80	0,13		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-11	B	20/03/2025	0,30%	0,30%	0,80	20,40	1,00	1,00	78,50	0,12		0,00	26,00	
Edifício I 1	PMG-12	A	18/03/2025	0,00%	0,00%	3,90	16,90	1,00	1,00	79,10	0,13		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-12	B	18/03/2025	0,00%	0,00%	4,70	15,90	1,00	1,00	79,30	0,08		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-13	A	18/03/2025	0,00%	0,00%	1,60	19,50	1,00	2,00	78,90	0,13		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-13	B	18/03/2025	0,00%	0,00%	2,10	18,90	2,00	1,00	79,10	0,07		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-14	A	18/03/2025	0,00%	0,00%	3,50	17,40	1,00	3,00	79,10	0,14		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-14	B	18/03/2025	0,00%	0,00%	5,00	15,70	1,00	2,00	79,30	0,05		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-15	A	18/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,20	2,00	1,00	78,80	0,11		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-15	B	18/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,20	1,00	1,00	78,70	0,19		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-19	A	18/03/2025	0,00%	0,00%	0,70	20,00	1,00	2,00	79,20	0,18		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-19	B	18/03/2025	0,00%	0,00%	1,10	19,60	1,00	2,00	79,30	0,09		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-21	A	20/03/2025	0,00%	0,00%	0,80	20,50	1,00	1,00	78,70	0,12		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-21	B	20/03/2025	0,00%	0,00%	1,30	19,90	0,00	1,00	78,80	0,02		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-24	A	18/03/2025	0,00%	0,00%	0,30	20,80	1,00	2,00	78,90	0,09		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-24	B	18/03/2025	0,00%	0,00%	0,50	20,60	1,00	1,00	78,90	0,12		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-135	A	18/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,50	1,00	0,00	79,30	0,02		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-135	B	18/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,60	2,00	0,00	79,30	0,03		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-136	B	18/03/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,40	2,00	0,00	79,40	-0,03		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-25	A	17/03/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,00	1,00	1,00	78,80	0,09		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-25	B	17/03/2025	0,00%	0,00%	1,00	20,20	1,00	1,00	78,80	0,10		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-26	A	17/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,00	2,00	1,00	78,90	0,05		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-26	B	17/03/2025	0,00%	0,00%	0,70	20,40	2,00	1,00	78,90	0,06		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-27	A	17/03/2025	0,00%	0,00%	0,80	20,30	1,00	1,00	78,90	0,12		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-27	B	17/03/2025	0,00%	0,00%	3,20	17,90	2,00	1,00	78,90	0,06		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-28	A	17/03/2025	0,00%	0,00%	1,30	19,00	2,00	1,00	79,80	0,15		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-28	B	17/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,20	2,00	1,00	78,70	0,25		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-29	A	17/03/2025	0,00%	0,00%	0,40	21,00	1,00	1,00	78,70	0,08		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-29	B	17/03/2025	0,00%	0,00%	1,50	19,80	2,00	1,00	78,70	0,09		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-44	A	17/03/2025	0,00%	0,00%	0,30	20,90	2,00	1,00	78,80	0,09		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-44	B	17/03/2025	0,00%	0,00%	1,00	20,40	2,00	1,00	78,60	0,06		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-45	A	17/03/2025	0,00%	0,00%	0,50	20,40	2,00	2,00	79,10	0,02		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-45	B	17/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,10	2,00	1,00	78,80	0,07		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-134	B	17/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,20	2,00	2,00	78,70	0,11		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-30	A	17/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,50	2,00	1,00	79,40	-0,06		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-30	B	17/03/2025	0,00%	0,00%	1,10	19,50	2,00	0,00	79,40	0,11		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-31	A	17/03/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,10	2,00	1,00	79,70	0,02		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-31	B	17/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,40	2,00	0,00	79,50	0,05		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-32	A	21/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,30	2,00	0,00	79,60	0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-32	B	21/03/2025	0,00%	0,00%	0,90	19,70	1,00	0,00	79,40	0,12		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-33	A	17/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,80	1,00	0,00	79,10	0,08		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-33	B	17/03/2025	0,00%	0,00%	2,70	18,20	1,00	1,00	79,10	0,05		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-34	A	17/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,70	1,00	1,00	79,10	0,01		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-34	B	17/03/2025	0,00%	0,00%	1,20	19,80	2,00	0,00	78,90	0,09		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-35	A	17/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,00	1,00	1,00	78,90	0,07		0,00	0,00	



Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	C02 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
I-3 Biblioteca	PMG-35	B	17/03/2025	0,00%	0,00%	1,00	20,30	2,00	1,00	78,70	0,08		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-36	A	17/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,00	2,00	1,00	78,90	0,09		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-36	B	17/03/2025	0,00%	0,00%	2,10	18,80	2,00	1,00	79,10	0,06		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-37	A	17/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,10	1,00	1,00	78,80	0,09		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-37	B	17/03/2025	0,00%	0,00%	1,00	20,20	2,00	1,00	78,80	0,02		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-38	A	17/03/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,80	1,00	1,00	79,00	-0,26		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-38	B	17/03/2025	0,00%	0,00%	0,30	20,70	2,00	1,00	79,00	0,15		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-39	A	17/03/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,80	2,00	1,00	79,00	0,07		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-39	B	17/03/2025	0,00%	0,00%	7,80	13,80	1,00	1,00	78,40	0,05		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-40	A	17/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,90	2,00	2,00	79,00	0,06		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-40	B	17/03/2025	0,00%	0,00%	0,30	20,70	1,00	2,00	79,00	0,09		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-41	A	17/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,60	2,00	0,00	79,30	-0,18		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-41	B	17/03/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,50	1,00	0,00	79,20	0,04		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-42	A	17/03/2025	0,00%	0,00%	0,70	20,20	1,00	1,00	79,20	0,07		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-42	B	17/03/2025	0,00%	0,00%	5,70	15,90	2,00	0,00	78,40	0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-43	A	17/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,80	2,00	0,00	79,20	0,01		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-43	B	17/03/2025	0,00%	0,00%	0,40	20,60	2,00	0,00	79,00	-0,02		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-132	A	17/03/2025	0,00%	0,00%	0,50	19,40	2,00	0,00	80,00	0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-132	B	17/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,10	2,00	0,00	79,80	-0,04		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-133	A	17/03/2025	0,00%	0,00%	0,40	20,20	2,00	1,00	79,30	0,09		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-133	B	17/03/2025	0,00%	0,00%	0,50	20,40	1,00	1,00	79,10	-0,04		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-63	A	19/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	1,00	2,00	78,70	0,10		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-63	B	19/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,30	2,00	2,00	78,60	0,14		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-64	A	19/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	1,00	2,00	78,70	0,01		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-64	B	19/03/2025	0,00%	0,00%	0,50	20,50	1,00	2,00	79,00	0,18		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-65	A	19/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,20	1,00	1,00	78,80	0,22		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-65	B	19/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,40	2,00	1,00	78,60	0,16		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-66	A	19/03/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,10	1,00	2,00	78,70	0,11		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-66	B	19/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,40	1,00	2,00	78,60	0,07		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-67	A	19/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,00	1,00	2,00	78,90	0,09		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-67	B	19/03/2025	0,00%	0,00%	1,60	17,60	2,00	2,00	80,80	0,03		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-68	A	19/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,30	1,00	2,00	78,60	0,13		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-68	B	19/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,40	1,00	1,00	78,60	-0,09		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-69	A	19/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,40	1,00	2,00	78,50	0,08		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-69	B	19/03/2025	0,00%	0,00%	2,40	18,10	2,00	2,00	79,40	0,05		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-77	A	19/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,20	1,00	1,00	78,70	0,03		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-77	B	19/03/2025	0,00%	0,00%	1,60	18,90	2,00	1,00	79,60	0,09		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-78	A	19/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,00	1,00	2,00	78,90	-0,02		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-78	B	19/03/2025	0,00%	0,00%	2,90	18,00	1,00	1,00	79,10	0,23		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-79	A	19/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,20	2,00	1,00	78,80	0,10		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-79	B	19/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,30	2,00	1,00	78,60	-0,01		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-80	A	19/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,60	2,00	2,00	78,40	0,13		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-80	B	19/03/2025	0,00%	0,00%	1,50	19,80	2,00	2,00	78,80	0,14		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-81	A	19/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,10	2,00	2,00	78,80	0,17		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-81	B	19/03/2025	0,00%	0,00%	0,80	20,60	1,00	2,00	78,60	0,03		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-144	B	19/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	2,00	2,00	78,70	0,13		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-145	B	19/03/2025	0,00%	0,00%	0,90	19,60	1,00	2,00	79,50	0,12		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-146	B	19/03/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,90	2,00	2,00	78,80	0,13		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-147	B	19/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,20	2,00	2,00	78,80	0,10		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-148	B	19/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	1,00	1,00	78,70	0,07		0,00	0,00	



Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	CO2 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
Edifício I-4	PMG-149 B		19/03/2025	0,00%	0,00%	0,40	20,80	2,00	2,00	78,80	0,17		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-150 B		19/03/2025	0,00%	0,00%	3,80	17,20	1,00	1,00	79,00	0,03		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-151 B		19/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,40	1,00	1,00	78,60	0,06		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-46 A		19/03/2025	0,00%	0,00%	0,40	20,90	1,00	2,00	78,60	0,04		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-46 B		19/03/2025	0,00%	0,00%	1,00	20,30	1,00	2,00	78,70	0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-47 A		19/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,20	1,00	2,00	78,60	0,06		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-47 B		19/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,40	1,00	2,00	78,60	0,12		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-48 A		19/03/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,10	1,00	1,00	78,70	0,05		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-48 B		19/03/2025	0,00%	0,00%	0,30	21,00	1,00	2,00	78,70	0,00		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-49 A		19/03/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,20	1,00	1,00	78,60	0,11		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-49 B		19/03/2025	0,00%	0,00%	2,50	18,90	1,00	1,00	78,60	0,15		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-50 A		19/03/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,10	1,00	2,00	78,70	0,12		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-50 B		19/03/2025	0,00%	0,00%	2,80	18,70	2,00	2,00	78,50	0,16		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-51 A		19/03/2025	0,00%	0,00%	0,40	20,60	2,00	1,00	79,00	0,13		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-51 B		19/03/2025	2,60%	4,50%	0,80	19,40	1,00	2,00	77,20	-0,25		0,00	76,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-52 A		19/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,90	1,00	1,00	79,00	0,19		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-52 B		19/03/2025	0,00%	0,00%	0,40	20,70	2,00	1,00	78,90	0,01		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-53 A		19/03/2025	0,00%	0,00%	0,70	20,20	1,00	0,00	79,10	0,04		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-53 B		19/03/2025	0,10%	0,10%	1,80	18,10	1,00	1,00	80,00	-0,07		0,00	5,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-54 A		19/03/2025	0,00%	0,00%	0,30	20,50	2,00	0,00	79,20	0,04		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-54 B		19/03/2025	1,60%	1,60%	6,20	11,40	1,00	1,00	80,90	-0,03		0,00	34,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-55 A		19/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,60	3,00	0,00	79,20	0,11		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-55 B		19/03/2025	5,30%	5,30%	10,40	7,70	3,00	0,00	76,60	-0,01		0,00	100,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-56 A		19/03/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,50	1,00	1,00	79,30	0,09		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-56 B		19/03/2025	0,00%	0,00%	1,80	19,90	1,00	1,00	78,30	-0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-57 A		19/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,00	1,00	1,00	78,90	0,07		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-57 B		19/03/2025	0,00%	0,00%	2,10	19,40	1,00	1,00	78,50	0,18		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-58 A		19/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,00	1,00	1,00	78,90	0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-58 B		19/03/2025	0,00%	0,00%	3,30	15,80	1,00	1,00	80,90	0,05		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-59 A		19/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,80	1,00	2,00	79,10	0,07		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-59 B		19/03/2025	0,00%	0,00%	2,00	18,90	1,00	2,00	79,10	0,07		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-60 A		19/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,80	1,00	2,00	79,10	0,09		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-60 B		19/03/2025	0,00%	0,00%	4,90	15,60	1,00	1,00	79,50	0,05		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-61 A		19/03/2025	0,00%	0,00%	0,30	20,60	1,00	2,00	79,10	0,07		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-61 B		19/03/2025	0,00%	0,00%	9,60	9,70	2,00	2,00	80,70	0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-137 B		19/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,40	2,00	2,00	78,60	0,19		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-138 B		19/03/2025	0,00%	0,00%	0,80	20,80	1,00	1,00	78,40	0,10		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-139 A		19/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	20,90	1,00	1,00	79,10	0,07		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-139 B		19/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,00	2,00	1,00	79,00	0,02		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-140 A		19/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,90	1,00	1,00	79,00	-0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-140 B		19/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,00	2,00	2,00	79,00	0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-141 B		19/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,10	2,00	1,00	78,80	0,11		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-62 A		19/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,10	1,00	1,00	78,80	0,09		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-62 B		19/03/2025	0,50%	1,10%	0,20	20,60	2,00	2,00	78,60	0,13		0,00	23,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-01 A		18/03/2025	0,00%	0,00%	1,00	20,80	1,00	1,00	79,20	0,16		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-01 B		18/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	20,90	2,00	2,00	79,10	0,06		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-02 A		18/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,80	1,00	1,00	79,10	0,11		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-02 B		18/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,00	2,00	1,00	79,00	0,02		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-03 A		18/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,90	1,00	1,00	79,00	0,03		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-03 B		18/03/2025	0,00%	0,00%	2,90	16,70	1,00	2,00	80,30	0,14		0,00	0,00	



Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	CO2 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-04 A	18/03/2025	0,00%	0,00%	0,40	20,30	1,00	1,00	79,40	0,15			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-04 B	18/03/2025	0,00%	0,00%	0,50	20,20	2,00	2,00	79,30	0,10			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-05 A	18/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,90	1,00	2,00	79,00	0,11			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-05 B	18/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,60	2,00	1,00	79,30	0,24			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-06 A	18/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,90	1,00	2,00	79,00	0,11			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-06 B	18/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,00	1,00	2,00	79,00	0,08			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-07 A	18/03/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,50	1,00	1,00	79,30	0,12			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-07 B	18/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,90	2,00	0,00	79,00	0,14			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-08 A	18/03/2025	0,00%	0,00%	0,40	20,30	1,00	0,00	79,30	0,09			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-08 B	18/03/2025	0,00%	0,00%	6,60	12,60	2,00	1,00	80,80	0,07			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-09 A	20/03/2025	0,00%	0,00%	1,60	19,20	1,00	2,00	79,20	0,08			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-09 B	20/03/2025	0,10%	0,10%	7,20	13,60	1,00	1,00	79,10	0,15			0,00	6,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-10 A	20/03/2025	0,00%	0,00%	0,50	20,50	1,00	1,00	79,10	0,05			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-10 B	20/03/2025	0,00%	0,00%	3,00	17,40	1,00	1,00	79,70	0,06			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-84 A	18/03/2025	0,00%	0,00%	0,40	20,50	2,00	0,00	79,10	0,40			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-84 B	18/03/2025	0,00%	0,00%	6,40	16,30	2,00	0,00	77,20	0,05			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-85 A	18/03/2025	0,00%	0,00%	1,70	18,90	2,00	0,00	79,30	-0,02			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-85 B	18/03/2025	0,00%	0,00%	2,70	17,90	2,00	0,00	79,30	-0,70			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-86 A	18/03/2025	0,00%	0,00%	0,50	20,10	2,00	1,00	79,40	0,04			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-86 B	18/03/2025	0,00%	0,00%	2,00	17,80	1,00	0,00	80,30	0,06			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-87 A	18/03/2025	0,00%	0,00%	3,40	15,10	2,00	0,00	81,50	0,02			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-87 B	18/03/2025	0,00%	0,00%	3,80	16,20	2,00	0,00	80,00	0,12			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-152 A	20/03/2025	0,00%	0,00%	0,30	20,60	1,00	1,00	79,00	0,08			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-152 B	20/03/2025	0,00%	0,00%	0,40	20,60	1,00	1,00	78,90	0,08			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-153 B	18/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	20,90	2,00	2,00	79,10	0,08			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-154 B	18/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,10	1,00	2,00	78,90	0,11			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-155 B	18/03/2025	0,00%	0,00%	1,10	19,60	1,00	1,00	79,30	0,17			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-156 B	18/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,00	1,00	2,00	79,00	0,16			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-157 B	18/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,00	1,00	2,00	79,00	0,20			0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-70 A	20/03/2025	0,00%	0,00%	0,20	19,70	2,00	1,00	80,10	0,14			0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-70 B	20/03/2025	0,00%	0,00%	0,30	20,40	1,00	1,00	79,40	-0,05			0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-71 A	20/03/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,20	1,00	1,00	79,60	0,09			0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-71 B	20/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,80	1,00	0,00	79,10	0,04			0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-72 A	20/03/2025	0,00%	0,00%	0,30	20,20	1,00	1,00	79,50	0,08			0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-72 B	20/03/2025	0,00%	0,00%	1,10	18,00	1,00	1,00	80,90	-0,11			0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-73 A	20/03/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,50	1,00	1,00	79,30	0,11			0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-73 B	20/03/2025	0,00%	0,00%	1,10	18,60	1,00	1,00	80,30	0,21			0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-74 A	20/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,80	2,00	1,00	79,10	0,05			0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-74 B	20/03/2025	2,10%	2,10%	1,20	10,60	1,00	1,00	86,00	0,03			0,00	60,00	
Enfermaria	PMG-75 A	20/03/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,20	1,00	1,00	79,60	0,11			0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-75 B	20/03/2025	0,00%	0,00%	1,70	17,60	1,00	1,00	80,70	0,18			0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-76 A	20/03/2025	0,00%	0,00%	0,40	19,80	1,00	1,00	79,80	0,11			0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-76 B	20/03/2025	0,00%	0,00%	2,70	12,00	1,00	1,00	85,30	0,11			0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-165 A	20/03/2025	0,00%	0,00%	0,50	18,70	1,00	1,00	80,80	0,00			0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-165 B	20/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,80	1,00	1,00	79,10	0,08			0,00	0,00	
CAT	PMG-82 A	20/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,60	2,00	0,00	79,40	-0,04			0,00	0,00	
CAT	PMG-82 B	20/03/2025	0,00%	0,00%	2,20	19,40	2,00	0,00	78,50	-0,05			0,00	0,00	
CAT	PMG-83 A	20/03/2025	0,00%	0,00%	3,10	18,40	1,00	0,00	78,50	0,02			0,00	0,00	
CAT	PMG-83 B	20/03/2025	0,00%	0,00%	4,00	17,10	1,00	0,00	78,90	-0,03			0,00	0,00	
CAT	PMG-94 A	20/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,30	2,00	0,00	79,60	-0,04			0,00	0,00	



Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	C02 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
CAT	PMG-94	B	20/03/2025	0,00%	0,00%	3,30	17,40	2,00	0,00	79,20	-0,03		0,00	0,00	
CAT	PMG-95	A	20/03/2025	0,00%	0,00%	1,00	20,00	1,00	1,00	78,90	-0,03		0,00	0,00	
CAT	PMG-95	B	20/03/2025	0,00%	0,00%	2,00	19,60	1,00	1,00	78,40	0,02		0,00	0,00	
CAT	PMG-96	A	20/03/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,70	1,00	1,00	79,10	0,08		0,00	0,00	
CAT	PMG-96	B	20/03/2025	0,00%	0,00%	5,40	12,30	1,00	0,00	82,20	0,10		0,00	0,00	
CAT	PMG-97	A	20/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,40	1,00	0,00	79,40	0,17		0,00	0,00	
CAT	PMG-97	B	20/03/2025	0,00%	0,00%	3,30	17,00	2,00	1,00	79,70	0,06		0,00	0,00	
CAT	PMG-98	A	20/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,70	1,00	1,00	79,20	0,08		0,00	0,00	
CAT	PMG-98	B	20/03/2025	0,00%	0,00%	0,30	20,60	1,00	1,00	79,10	0,10		0,00	0,00	
CAT	PMG-160	A	20/03/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,30	2,00	0,00	79,50	0,01		0,00	0,00	
CAT	PMG-160	B	20/03/2025	0,00%	0,00%	3,70	16,70	2,00	0,00	79,60	-0,14		0,00	0,00	
CAT	PMG-161	A	20/03/2025	0,00%	0,00%	1,70	19,20	2,00	0,00	79,00	0,04		0,00	0,00	
CAT	PMG-161	B	20/03/2025	0,00%	0,00%	2,00	19,20	1,00	0,00	78,80	0,04		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-88	A	21/03/2025	0,00%	0,00%	0,30	20,90	2,00	1,00	78,80	0,06		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-88	B	21/03/2025	0,00%	0,00%	0,30	20,90	1,00	1,00	78,80	0,04		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-89	A	21/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,20	1,00	1,00	78,70	0,09		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-89	B	21/03/2025	0,00%	0,00%	0,70	20,40	1,00	2,00	78,80	0,04		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-90	A	21/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,20	1,00	1,00	78,80	0,06		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-90	B	21/03/2025	0,00%	0,00%	0,40	20,70	1,00	1,00	78,80	-0,06		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-91	A	21/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,20	1,00	1,00	78,70	0,15		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-91	B	21/03/2025	0,00%	0,00%	1,50	19,40	1,00	2,00	79,00	0,03		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-92	A	21/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,10	1,00	2,00	78,80	0,03		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-92	B	21/03/2025	0,00%	0,00%	0,70	20,40	1,00	1,00	78,90	0,13		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-93	A	21/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,10	1,00	2,00	78,80	0,06		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-93	B	21/03/2025	0,00%	0,00%	0,90	20,10	1,00	2,00	79,00	0,19		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-102		17/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,20	1,00	2,00	78,70	0,11		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-103		17/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,10	2,00	2,00	78,90	0,11		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-104		17/03/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,10	2,00	2,00	78,80	0,15		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-105		17/03/2025	0,00%	0,00%	2,20	19,10	1,00	2,00	78,70	0,10		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-106		17/03/2025	0,00%	0,00%	0,30	20,90	2,00	1,00	78,80	0,03		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-107		17/03/2025	0,00%	0,00%	4,30	14,20	1,00	2,00	81,40	0,11		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-108		17/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,10	1,00	2,00	78,90	0,03		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-109	A	17/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,50	1,00	2,00	78,40	0,13		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-109	B	17/03/2025	0,00%	0,00%	1,10	20,00	2,00	1,00	78,80	0,05		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-110	A	17/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,20	1,00	2,00	78,80	0,10		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-110	B	17/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,20	2,00	2,00	78,70	0,18		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-111	A	17/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,20	1,00	2,00	78,80	0,15		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-111	B	17/03/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,00	1,00	2,00	78,80	0,05		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-112		17/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,70	2,00	1,00	78,30	0,10		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-162	A	17/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	1,00	1,00	78,60	0,08		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-162	B	17/03/2025	1,40%	1,40%	8,30	7,30	2,00	1,00	82,90	0,07		0,00	26,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-166	A	17/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	2,00	2,00	78,70	0,09		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-166	B	17/03/2025	0,00%	0,00%	1,80	17,10	1,00	1,00	81,00	0,10		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-119	A	17/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,20	2,00	1,00	78,80	0,08		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-119	B	17/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,20	1,00	2,00	78,70	0,10		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-119	C	17/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	1,00	1,00	78,60	0,08		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-120	A	17/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,40	1,00	2,00	78,60	0,02		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-120	B	17/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	1,00	2,00	78,60	0,11		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-120	C	17/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,40	1,00	2,00	78,60	0,04		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-163	B	17/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,40	1,00	1,00	78,60	-0,01		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	CO2 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15%,															
Portaria P3	PMG-164 B		17/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	1,00	2,00	78,70	0,13		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-164 C		17/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	1,00	1,00	78,70	0,08		0,00	0,00	
Transportes	PMG-121 A		20/03/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,20	1,00	0,00	78,70	0,08		0,00	0,00	
Transportes	PMG-121 B		20/03/2025	0,00%	0,00%	5,80	13,60	1,00	1,00	80,60	0,03		0,00	0,00	
Transportes	PMG-122 A		20/03/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,80	1,00	1,00	79,00	0,03		0,00	0,00	
Transportes	PMG-122 B		20/03/2025	0,00%	0,00%	5,30	16,10	1,00	1,00	78,60	0,07		0,00	0,00	
Transportes	PMG-123 A		20/03/2025	0,00%	0,00%	0,50	20,70	1,00	1,00	78,80	0,12		0,00	0,00	
Transportes	PMG-123 B		20/03/2025	0,00%	0,00%	1,90	19,30	1,00	0,00	78,80	0,07		0,00	0,00	
Transportes	PMG-124 A		20/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,00	2,00	1,00	78,90	0,06		0,00	0,00	
Transportes	PMG-124 B		20/03/2025	0,00%	0,00%	2,20	19,30	1,00	1,00	78,50	0,03		0,00	0,00	
Transportes	PMG-158 B		20/03/2025	0,00%	0,00%	3,80	17,40	2,00	1,00	78,70	0,11		0,00	0,00	
Transportes	PMG-159 B		20/03/2025	0,00%	0,00%	1,40	19,40	1,00	1,00	79,20	0,08		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-125 A		20/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,80	1,00	2,00	79,20	-0,03		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-125 B		20/03/2025	0,00%	0,00%	4,50	15,90	1,00	1,00	79,60	-0,03		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-126 A		20/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,80	1,00	2,00	79,10	0,04		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-126 B		20/03/2025	0,00%	0,00%	4,10	17,10	1,00	2,00	78,80	-0,28		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-127 A		20/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,90	1,00	1,00	79,10	0,05		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-127 B		20/03/2025	0,00%	0,00%	3,90	17,50	2,00	1,00	78,90	0,08		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-128 A		20/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,90	1,00	1,00	79,00	0,20		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-128 B		20/03/2025	0,00%	0,00%	7,10	14,60	1,00	2,00	78,40	-2,61		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-129 A		20/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,90	1,00	1,00	79,00	0,11		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-129 B		20/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,20	1,00	2,00	78,80	0,05		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-130 A		20/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,80	1,00	2,00	79,10	0,08		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-130 B		20/03/2025	0,00%	0,00%	4,40	16,80	1,00	2,00	78,80	-0,02		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-131 A		20/03/2025	0,00%	0,00%	0,70	20,20	1,00	2,00	79,10	0,17		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-131 B		20/03/2025	0,00%	0,00%	1,20	19,60	1,00	2,00	79,20	0,01		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-16 A		25/03/2025	0,00%	0,00%	1,90	19,00	2,00	1,00	79,10	0,08		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-16 B		25/03/2025	0,00%	0,00%	1,90	18,90	2,00	1,00	79,20	0,06		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-17 A		25/03/2025	0,00%	0,00%	0,70	20,30	2,00	1,00	79,00	0,06		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-17 B		25/03/2025	0,00%	0,00%	0,80	20,30	2,00	1,00	79,00	0,12		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-18 A		25/03/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,20	2,00	0,00	79,60	0,01		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-18 B		25/03/2025	0,00%	0,00%	1,80	18,90	2,00	0,00	79,30	-0,04		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-20 A		25/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,50	4,00	0,00	79,40	0,02		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-20 B		25/03/2025	0,00%	0,00%	0,30	20,30	4,00	0,00	79,50	-0,14		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-22 A		25/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,70	2,00	1,00	78,20	0,06		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-22 B		25/03/2025	0,00%	0,00%	1,90	19,60	2,00	2,00	78,50	0,14		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-23 A		25/03/2025	0,00%	0,00%	0,40	20,40	2,00	1,00	79,10	0,00		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-23 B		25/03/2025	0,00%	0,00%	0,80	19,70	2,00	1,00	79,40	0,07		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-113 A		25/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,40	2,00	0,00	79,50	0,05		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-113 B		25/03/2025	0,00%	0,00%	2,00	18,60	2,00	0,00	79,40	0,32		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-114 A		25/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,40	3,00	0,00	79,40	-0,02		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-114 B		25/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,60	3,00	0,00	79,40	-0,03		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-115 A		25/03/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,30	2,00	0,00	79,60	-0,02		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-115 B		25/03/2025	0,00%	0,00%	0,60	20,40	2,00	0,00	79,00	0,02		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-11 A		25/03/2025	0,00%	0,00%	0,70	20,50	1,00	3,00	78,80	0,13		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-11 B		25/03/2025	0,10%	0,10%	0,30	21,00	2,00	2,00	78,70	0,13		0,00	5,00	
Edifício I 1	PMG-12 A		25/03/2025	0,00%	0,00%	2,00	18,70	1,00	2,00	79,30	0,13		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-12 B		25/03/2025	0,00%	0,00%	2,90	17,40	2,00	2,00	79,80	-0,08		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-13 A		25/03/2025	0,00%	0,00%	1,10	19,90	2,00	2,00	79,00	0,07		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-13 B		25/03/2025	0,00%	0,00%	1,70	19,30	2,00	1,00	79,10	0,02		0,00	0,00	



Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	C02 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
Edifício I 1	PMG-14 A	25/03/2025	0,00%	0,00%	2,20	18,90	2,00	2,00	78,80	0,12			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-14 B	25/03/2025	0,00%	0,00%	3,40	17,70	2,00	2,00	78,90	0,04			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-15 A	25/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,10	2,00	1,00	78,90	0,06			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-15 B	25/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,20	2,00	1,00	78,80	0,03			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-19 A	25/03/2025	0,00%	0,00%	0,30	21,20	2,00	2,00	78,50	0,13			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-19 B	25/03/2025	0,00%	0,00%	0,80	20,60	2,00	2,00	78,60	-0,01			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-21 A	25/03/2025	0,00%	0,00%	0,80	20,50	2,00	2,00	78,70	0,06			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-21 B	25/03/2025	0,00%	0,00%	1,20	20,10	1,00	2,00	78,70	0,22			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-24 A	25/03/2025	0,00%	0,00%	0,30	20,60	2,00	2,00	79,10	0,05			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-24 B	25/03/2025	0,00%	0,00%	0,40	20,70	2,00	1,00	78,90	0,13			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-135 A	25/03/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,40	2,00	0,00	79,40	0,02			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-135 B	25/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,50	3,00	0,00	79,40	-0,02			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-136 B	25/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,40	2,00	0,00	79,50	0,00			0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-25 A	24/03/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,90	1,00	1,00	78,90	0,13			0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-25 B	24/03/2025	0,00%	0,00%	0,70	20,50	1,00	2,00	78,80	0,00			0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-26 A	24/03/2025	0,00%	0,00%	0,30	20,60	1,00	2,00	79,10	-0,06			0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-26 B	24/03/2025	0,00%	0,00%	0,80	20,00	1,00	2,00	79,20	0,11			0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-27 A	24/03/2025	0,00%	0,00%	1,00	19,60	2,00	1,00	79,40	0,02			0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-27 B	24/03/2025	0,00%	0,00%	3,40	17,50	2,00	1,00	79,10	0,18			0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-28 A	24/03/2025	0,00%	0,00%	0,90	20,00	2,00	1,00	79,20	0,18			0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-28 B	24/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,20	1,00	2,00	78,70	0,08			0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-29 A	24/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,20	2,00	2,00	78,70	0,13			0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-29 B	24/03/2025	0,00%	0,00%	0,70	20,60	1,00	1,00	78,70	0,14			0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-44 A	24/03/2025	0,00%	0,00%	0,50	20,50	1,00	2,00	78,90	0,10			0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-44 B	24/03/2025	0,00%	0,00%	0,80	20,60	1,00	1,00	78,80	-0,03			0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-45 A	24/03/2025	0,00%	0,00%	0,50	20,40	2,00	2,00	79,10	0,03			0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-45 B	24/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,20	2,00	2,00	78,80	0,14			0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-134 B	24/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	1,00	1,00	78,70	0,09			0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-30 A	24/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,60	2,00	1,00	79,30	0,08			0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-30 B	24/03/2025	0,00%	0,00%	1,10	19,80	2,00	1,00	79,10	0,01			0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-31 A	24/03/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,40	2,00	0,00	79,40	0,02			0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-31 B	24/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,60	2,00	1,00	79,30	0,06			0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-32 A	28/03/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,50	2,00	0,00	79,30	0,03			0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-32 B	28/03/2025	0,00%	0,00%	0,90	19,90	2,00	1,00	79,20	-0,06			0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-33 A	24/03/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,70	2,00	0,00	79,10	0,06			0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-33 B	24/03/2025	0,00%	0,00%	2,80	18,00	2,00	1,00	79,10	0,06			0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-34 A	24/03/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,60	1,00	1,00	79,20	0,01			0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-34 B	24/03/2025	0,00%	0,00%	0,20	19,80	2,00	1,00	79,00	0,08			0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-35 A	24/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,00	2,00	1,00	79,00	0,12			0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-35 B	24/03/2025	0,00%	0,00%	1,20	20,10	1,00	1,00	78,70	0,05			0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-36 A	24/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,00	2,00	2,00	79,00	0,13			0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-36 B	24/03/2025	0,00%	0,00%	2,10	18,80	2,00	1,00	79,10	0,11			0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-37 A	24/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,00	1,00	1,00	78,90	0,08			0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-37 B	24/03/2025	0,00%	0,00%	0,90	20,30	1,00	1,00	78,80	0,08			0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-38 A	24/03/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,90	1,00	1,00	79,00	-0,01			0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-38 B	24/03/2025	0,00%	0,00%	0,40	20,60	1,00	1,00	79,00	0,19			0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-39 A	24/03/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,80	1,00	1,00	79,10	0,03			0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-39 B	24/03/2025	0,00%	0,00%	6,80	14,20	2,00	1,00	79,00	-0,04			0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-40 A	24/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,90	1,00	1,00	78,90	0,09			0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-40 B	24/03/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,80	2,00	1,00	78,90	0,12			0,00	0,00	



Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	CO2 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15% ;															
I-3 Biblioteca	PMG-41 A		24/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,70	1,00	1,00	79,20	0,14		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-41 B		24/03/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,70	1,00	0,00	79,20	0,08		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-42 A		24/03/2025	0,00%	0,00%	0,70	20,20	2,00	0,00	79,20	0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-42 B		24/03/2025	0,00%	0,00%	4,60	17,00	1,00	0,00	78,40	0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-43 A		24/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,60	1,00	1,00	79,30	0,08		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-43 B		24/03/2025	0,00%	0,00%	0,50	20,40	2,00	0,00	79,10	0,02		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-132 A		24/03/2025	0,00%	0,00%	0,30	20,20	2,00	1,00	79,50	0,07		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-132 B		24/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,50	2,00	0,00	79,40	0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-133 A		24/03/2025	0,00%	0,00%	0,40	20,30	1,00	1,00	79,30	0,28		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-133 B		24/03/2025	0,00%	0,00%	0,40	20,50	1,00	1,00	79,00	0,12		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-63 A		26/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,20	1,00	1,00	78,70	0,12		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-63 B		26/03/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,20	1,00	1,00	78,60	0,08		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-64 A		26/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,20	1,00	1,00	78,70	0,05		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-64 B		26/03/2025	0,00%	0,00%	0,50	20,50	2,00	1,00	79,00	0,02		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-65 A		26/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,10	1,00	1,00	78,80	0,07		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-65 B		26/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,30	1,00	1,00	78,70	0,08		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-66 A		26/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,20	1,00	1,00	78,70	0,13		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-66 B		26/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	2,00	1,00	78,70	0,04		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-67 A		26/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,10	1,00	2,00	78,80	0,23		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-67 B		26/03/2025	0,00%	0,00%	0,50	20,80	1,00	2,00	78,70	0,18		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-68 A		26/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,30	1,00	2,00	78,70	0,11		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-68 B		26/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	1,00	2,00	78,70	0,10		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-69 A		26/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	1,00	1,00	78,60	0,08		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-69 B		26/03/2025	0,00%	0,00%	1,50	19,80	2,00	1,00	78,70	0,10		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-77 A		26/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,20	1,00	2,00	78,80	0,07		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-77 B		26/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	19,90	1,00	2,00	79,10	0,16		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-78 A		26/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,10	2,00	2,00	78,80	0,08		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-78 B		26/03/2025	0,00%	0,00%	1,60	19,40	1,00	2,00	79,00	0,26		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-79 A		26/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,10	1,00	2,00	78,80	0,12		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-79 B		26/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,20	1,00	2,00	78,70	0,13		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-80 A		26/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,60	1,00	1,00	78,40	0,06		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-80 B		26/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,60	2,00	1,00	78,40	0,13		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-81 A		26/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,10	1,00	2,00	78,80	0,12		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-81 B		26/03/2025	0,00%	0,00%	0,50	20,80	2,00	2,00	78,70	0,24		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-144 B		26/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,20	1,00	2,00	78,80	-0,05		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-145 B		26/03/2025	0,00%	0,00%	0,30	20,50	1,00	2,00	79,20	0,13		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-146 B		26/03/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,10	1,00	2,00	78,70	0,14		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-147 B		26/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,20	1,00	2,00	78,80	0,11		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-148 B		26/03/2025	0,00%	0,00%	0,30	21,00	1,00	1,00	78,70	0,14		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-149 B		26/03/2025	0,00%	0,00%	0,40	21,00	1,00	1,00	78,60	0,11		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-150 B		26/03/2025	0,00%	0,00%	2,50	18,50	1,00	1,00	79,00	0,04		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-151 B		26/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	1,00	1,00	78,60	0,07		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-46 A		26/03/2025	0,00%	0,00%	0,30	20,70	1,00	2,00	79,00	0,10		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-46 B		26/03/2025	0,00%	0,00%	2,40	18,90	1,00	1,00	78,70	0,11		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-47 A		26/03/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,70	2,00	2,00	79,10	0,04		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-47 B		26/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,10	2,00	2,00	78,90	0,06		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-48 A		26/03/2025	0,00%	0,00%	0,30	20,80	1,00	2,00	79,00	0,02		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-48 B		26/03/2025	0,00%	0,00%	0,40	20,60	1,00	2,00	79,00	-0,02		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-49 A		26/03/2025	0,00%	0,00%	0,30	20,90	1,00	1,00	78,90	0,18		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-49 B		26/03/2025	0,00%	0,00%	2,50	18,70	2,00	1,00	78,80	0,09		0,00	0,00	



Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	CO2 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15%,															
Conjunto Laboratorial	PMG-50 A	26/03/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,80	1,00	1,00	78,90	0,14			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-50 B	26/03/2025	0,00%	0,00%	1,50	19,80	1,00	1,00	78,70	-0,03			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-51 A	26/03/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,70	1,00	0,00	79,10	0,06			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-51 B	26/03/2025	0,10%	0,10%	0,10	20,70	1,00	0,00	79,10	0,05			0,00	10,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-52 A	26/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	20,80	1,00	1,00	79,10	0,04			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-52 B	26/03/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,70	1,00	1,00	79,10	0,13			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-53 A	26/03/2025	0,00%	0,00%	0,40	20,30	2,00	1,00	79,30	0,01			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-53 B	26/03/2025	0,00%	0,00%	0,50	19,90	2,00	1,00	79,60	0,04			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-54 A	26/03/2025	0,00%	0,00%	0,30	20,30	2,00	0,00	79,50	0,01			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-54 B	26/03/2025	0,30%	0,30%	1,70	17,90	1,00	0,00	80,00	0,02			0,00	32,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-55 A	26/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,70	2,00	0,00	79,20	-0,04			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-55 B	26/03/2025	0,00%	0,00%	4,50	15,20	2,00	0,00	80,20	-0,06			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-56 A	26/03/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,20	2,00	1,00	79,60	0,10			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-56 B	26/03/2025	0,00%	0,00%	1,20	20,10	1,00	1,00	78,70	0,01			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-57 A	28/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,80	2,00	0,00	79,10	0,03			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-57 B	28/03/2025	0,00%	0,00%	1,30	19,90	2,00	0,00	78,70	0,03			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-58 A	26/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,90	1,00	0,00	79,00	0,05			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-58 B	26/03/2025	0,00%	0,00%	2,50	17,90	2,00	1,00	79,70	0,11			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-59 A	26/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,90	2,00	1,00	79,00	0,09			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-59 B	26/03/2025	0,00%	0,00%	0,90	20,20	2,00	1,00	78,90	0,04			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-60 A	26/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,90	1,00	1,00	79,10	0,09			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-60 B	26/03/2025	0,00%	0,00%	1,90	18,60	1,00	2,00	79,50	0,08			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-61 A	26/03/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,70	1,00	1,00	79,10	0,08			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-61 B	26/03/2025	0,00%	0,00%	10,90	8,30	1,00	1,00	80,80	0,11			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-137 B	26/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,10	1,00	1,00	78,80	0,10			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-138 B	26/03/2025	0,00%	0,00%	2,10	19,60	1,00	1,00	78,30	0,13			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-139 A	26/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	20,70	2,00	0,00	79,20	0,02			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-139 B	26/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	20,80	2,00	0,00	79,20	0,02			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-140 A	26/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,70	1,00	1,00	79,20	0,05			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-140 B	26/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	20,80	2,00	0,00	79,20	0,08			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-141 B	26/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	20,90	2,00	1,00	79,10	0,04			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-62 A	26/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,80	1,00	0,00	79,10	0,05			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-62 B	26/03/2025	0,00%	0,80%	0,10	20,80	1,00	1,00	79,00	0,09			0,00	19,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-01 A	25/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,70	3,00	1,00	79,20	0,09			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-01 B	25/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	20,90	2,00	1,00	79,00	0,05			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-02 A	25/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,90	2,00	2,00	79,00	0,08			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-02 B	25/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,00	2,00	1,00	78,90	0,07			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-03 A	25/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,90	1,00	2,00	79,00	0,07			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-03 B	25/03/2025	0,00%	0,00%	2,20	18,20	2,00	2,00	79,70	0,04			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-04 A	25/03/2025	0,00%	0,00%	0,40	20,50	2,00	1,00	79,10	0,08			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-04 B	25/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,90	2,00	1,00	79,00	0,05			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-05 A	26/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,20	1,00	2,00	78,80	0,07			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-05 B	26/03/2025	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	Não medido. Agua durante a medição.
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-06 A	25/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,90	2,00	2,00	79,00	0,15			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-06 B	25/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,10	2,00	2,00	78,90	0,03			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-07 A	25/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,00	1,00	2,00	79,00	0,18			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-07 B	25/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,10	1,00	2,00	78,90	0,19			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-08 A	25/03/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,60	2,00	1,00	79,20	0,07			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-08 B	25/03/2025	0,00%	0,00%	3,30	16,60	3,00	1,00	80,10	0,07			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-09 A	26/03/2025	0,00%	0,00%	1,00	20,10	2,00	2,00	78,90	0,16			0,00	0,00	



Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	CO2 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-09 B		26/03/2025	0,00%	0,00%	8,50	12,00	2,00	2,00	79,40	0,07		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-10 A		26/03/2025	0,00%	0,00%	0,50	20,50	1,00	2,00	79,00	0,14		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-10 B		26/03/2025	0,00%	0,00%	1,40	19,30	1,00	2,00	79,30	0,14		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-84 A		25/03/2025	0,00%	0,00%	0,30	20,50	4,00	0,00	79,30	0,03		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-84 B		25/03/2025	0,00%	0,00%	3,00	18,60	4,00	1,00	78,50	-0,01		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-85 A		25/03/2025	0,00%	0,00%	1,40	19,20	3,00	1,00	79,40	0,01		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-85 B		25/03/2025	0,00%	0,00%	2,90	17,70	3,00	0,00	79,40	0,03		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-86 A		25/03/2025	0,00%	0,00%	0,40	20,20	3,00	1,00	79,50	0,06		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-86 B		25/03/2025	0,00%	0,00%	1,40	18,90	3,00	0,00	79,70	0,09		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-87 A		25/03/2025	0,00%	0,00%	2,70	16,50	2,00	0,00	80,80	0,04		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-87 B		25/03/2025	0,00%	0,00%	1,70	18,40	2,00	1,00	79,90	0,03		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-152 A		26/03/2025	0,00%	0,00%	0,50	20,50	1,00	2,00	79,00	0,13		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-152 B		26/03/2025	0,00%	0,00%	2,80	18,20	1,00	2,00	79,10	0,12		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-153 B		25/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,00	3,00	1,00	79,00	0,08		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-154 B		25/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,10	2,00	2,00	78,90	0,14		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-155 B		25/03/2025	0,00%	0,00%	0,30	20,70	2,00	2,00	79,00	0,13		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-156 B		26/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,10	1,00	2,00	78,80	-0,01		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-157 B		25/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,10	2,00	2,00	78,90	0,03		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-70 A		28/03/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,60	1,00	2,00	79,10	0,13		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-70 B		28/03/2025	0,00%	0,00%	1,30	18,60	1,00	2,00	80,10	-0,14		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-71 A		27/03/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,20	1,00	1,00	79,60	0,07		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-71 B		27/03/2025	0,00%	0,00%	0,90	13,20	1,00	1,00	85,90	0,19		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-72 A		27/03/2025	0,00%	0,00%	0,50	19,50	2,00	2,00	80,00	0,11		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-72 B		27/03/2025	0,00%	0,00%	1,40	17,80	2,00	1,00	80,80	0,03		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-73 A		27/03/2025	0,00%	0,00%	0,30	20,30	2,00	1,00	79,40	0,05		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-73 B		27/03/2025	0,00%	0,00%	1,00	19,00	2,00	1,00	80,00	0,12		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-74 A		28/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,90	1,00	2,00	79,00	12,00		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-74 B		28/03/2025	2,30%	2,30%	1,10	11,60	1,00	2,00	85,00	0,09		0,00	48,00	
Enfermaria	PMG-75 A		27/03/2025	0,00%	0,00%	0,30	20,10	1,00	1,00	79,60	0,13		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-75 B		27/03/2025	0,00%	0,00%	2,10	16,70	1,00	1,00	81,20	0,08		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-76 A		27/03/2025	0,00%	0,00%	0,40	19,50	2,00	1,00	80,10	0,15		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-76 B		27/03/2025	0,00%	0,00%	3,30	10,60	1,00	2,00	86,00	0,06		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-165 A		27/03/2025	0,00%	0,00%	0,50	19,70	2,00	0,00	79,90	0,12		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-165 B		27/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,70	2,00	1,00	79,20	0,11		0,00	0,00	
CAT	PMG-82 A		27/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,50	2,00	0,00	79,40	-0,02		0,00	0,00	
CAT	PMG-82 B		27/03/2025	0,00%	0,00%	1,50	19,30	2,00	0,00	79,20	0,03		0,00	0,00	
CAT	PMG-83 A		27/03/2025	0,00%	0,00%	2,30	18,30	1,00	1,00	79,40	0,05		0,00	0,00	
CAT	PMG-83 B		27/03/2025	0,00%	0,00%	4,30	16,20	2,00	0,00	79,50	0,08		0,00	0,00	
CAT	PMG-94 A		27/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,20	2,00	0,00	79,70	-0,08		0,00	0,00	
CAT	PMG-94 B		27/03/2025	0,00%	0,00%	2,70	17,70	2,00	0,00	79,60	-0,07		0,00	0,00	
CAT	PMG-95 A		27/03/2025	0,00%	0,00%	0,60	20,00	2,00	0,00	79,40	-0,06		0,00	0,00	
CAT	PMG-95 B		27/03/2025	0,00%	0,00%	2,10	19,30	2,00	0,00	78,70	-0,01		0,00	0,00	
CAT	PMG-96 A		27/03/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,40	2,00	0,00	79,40	0,04		0,00	0,00	
CAT	PMG-96 B		27/03/2025	0,00%	0,00%	4,90	13,00	2,00	0,00	82,10	-0,13		0,00	0,00	
CAT	PMG-97 A		27/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,20	1,00	0,00	79,60	0,09		0,00	0,00	
CAT	PMG-97 B		27/03/2025	0,00%	0,00%	3,30	16,80	2,00	0,00	79,90	0,10		0,00	0,00	
CAT	PMG-98 A		27/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,50	1,00	1,00	79,40	0,08		0,00	0,00	
CAT	PMG-98 B		27/03/2025	0,00%	0,00%	0,40	20,30	1,00	0,00	79,30	0,08		0,00	0,00	
CAT	PMG-160 A		27/03/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,20	2,00	0,00	79,60	0,01		0,00	0,00	
CAT	PMG-160 B		27/03/2025	0,00%	0,00%	3,40	16,90	2,00	0,00	79,70	0,03		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	CO2 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H ₂ S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
CAT	PMG-161 A		27/03/2025	0,00%	0,00%	1,80	18,70	1,00	0,00	79,50	0,04		0,00	0,00	
CAT	PMG-161 B		27/03/2025	0,00%	0,00%	3,40	17,40	2,00	0,00	79,10	0,04		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-88 A		28/03/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,60	2,00	1,00	79,10	0,08		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-88 B		28/03/2025	0,00%	0,00%	0,30	20,60	1,00	2,00	79,10	0,05		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-89 A		28/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,90	1,00	2,00	78,90	0,13		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-89 B		28/03/2025	0,00%	0,00%	0,70	20,20	1,00	2,00	79,10	0,18		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-90 A		28/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,00	1,00	2,00	79,00	0,11		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-90 B		28/03/2025	0,00%	0,00%	0,50	20,50	2,00	1,00	79,00	0,05		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-91 A		28/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,00	1,00	2,00	79,00	0,00		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-91 B		28/03/2025	0,00%	0,00%	1,70	19,10	2,00	2,00	79,20	-0,02		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-92 A		28/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,90	1,00	2,00	79,00	0,06		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-92 B		28/03/2025	0,00%	0,00%	0,90	20,10	1,00	2,00	79,00	0,09		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-93 A		28/03/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,80	1,00	2,00	79,00	0,13		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-93 B		28/03/2025	0,00%	0,00%	1,20	19,60	1,00	2,00	79,20	0,08		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-102		24/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,00	1,00	1,00	79,00	0,13		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-103		24/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	20,90	2,00	1,00	79,10	0,11		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-104		24/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,90	1,00	1,00	79,00	0,08		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-105		24/03/2025	0,00%	0,00%	1,10	20,00	1,00	1,00	78,90	0,13		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-106		24/03/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,70	1,00	1,00	79,00	0,06		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-107		24/03/2025	0,00%	0,00%	2,50	17,30	2,00	1,00	80,20	0,07		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-108		24/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,10	2,00	1,00	78,90	0,05		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-109 A		24/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,10	1,00	1,00	78,80	0,10		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-109 B		24/03/2025	0,00%	0,00%	1,20	19,80	1,00	1,00	79,10	0,04		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-110 A		24/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,00	2,00	1,00	79,00	0,14		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-110 B		24/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,00	1,00	2,00	79,00	0,13		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-111 A		24/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,00	1,00	1,00	79,00	0,02		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-111 B		24/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,90	1,00	2,00	79,00	0,20		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-112		24/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	2,00	1,00	78,60	0,11		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-162 A		24/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,90	2,00	1,00	79,00	0,08		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-162 B		24/03/2025	0,00%	0,00%	2,40	17,40	1,00	1,00	80,20	0,11		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-166 A		24/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,00	1,00	1,00	79,00	0,13		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-166 B		24/03/2025	0,00%	0,00%	1,40	18,10	1,00	1,00	80,50	0,06		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-119 A		24/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	1,00	1,00	78,70	0,15		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-119 B		24/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,10	1,00	2,00	78,80	0,12		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-119 C		24/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,30	1,00	2,00	78,70	0,22		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-120 A		24/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	1,00	2,00	78,70	0,12		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-120 B		24/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	1,00	2,00	78,70	0,10		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-120 C		24/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	1,00	2,00	78,70	0,08		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-163 B		24/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,30	1,00	2,00	78,70	0,11		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-164 B		24/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,20	2,00	2,00	78,70	0,15		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-164 C		24/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,20	1,00	1,00	78,70	0,08		0,00	0,00	
Transportes	PMG-121 A		27/03/2025	0,00%	0,00%	0,50	20,70	1,00	1,00	78,80	0,08		0,00	0,00	
Transportes	PMG-121 B		27/03/2025	0,00%	0,00%	6,20	12,70	1,00	1,00	81,10	0,07		0,00	0,00	
Transportes	PMG-122 A		27/03/2025	0,00%	0,00%	0,40	20,50	1,00	2,00	79,10	0,24		0,00	0,00	
Transportes	PMG-122 B		27/03/2025	0,00%	0,00%	6,20	14,60	2,00	1,00	79,20	0,03		0,00	0,00	
Transportes	PMG-123 A		27/03/2025	0,00%	0,00%	0,50	20,50	2,00	1,00	79,00	-0,01		0,00	0,00	
Transportes	PMG-123 B		27/03/2025	0,00%	0,00%	1,80	19,20	1,00	1,00	79,00	0,12		0,00	0,00	
Transportes	PMG-124 A		27/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,90	1,00	1,00	79,00	0,02		0,00	0,00	
Transportes	PMG-124 B		27/03/2025	0,00%	0,00%	2,50	18,90	1,00	1,00	78,70	0,05		0,00	0,00	
Transportes	PMG-158 B		27/03/2025	0,00%	0,00%	4,90	16,00	1,00	1,00	79,10	0,08		0,00	0,00	



Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	CO2 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
Transportes	PMG-159	B	27/03/2025	0,00%	0,00%	1,90	18,30	1,00	1,00	79,80	0,10		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-125	A	28/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	20,80	2,00	0,00	79,20	0,03		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-125	B	28/03/2025	0,00%	0,00%	4,00	16,70	2,00	0,00	79,30	-0,04		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-126	A	28/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,40	2,00	1,00	79,50	-0,13		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-126	B	28/03/2025	0,00%	0,00%	3,40	17,50	2,00	1,00	79,10	-0,01		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-127	A	28/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,50	2,00	1,00	79,40	0,01		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-127	B	28/03/2025	0,00%	0,00%	3,20	17,90	2,00	1,00	78,90	0,03		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-128	A	28/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	20,60	2,00	0,00	79,40	0,16		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-128	B	28/03/2025	0,00%	0,00%	5,80	15,60	2,00	1,00	78,70	-1,72		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-129	A	28/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,50	2,00	1,00	79,50	0,05		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-129	B	28/03/2025	0,00%	0,00%	2,00	19,00	1,00	2,00	79,00	0,18		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-130	A	28/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,60	1,00	1,00	79,40	0,06		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-130	B	28/03/2025	0,00%	0,00%	3,80	17,30	1,00	1,00	79,00	-1,29		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-131	A	28/03/2025	0,00%	0,00%	0,70	19,80	2,00	1,00	79,50	0,12		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-131	B	28/03/2025	0,00%	0,00%	1,30	19,40	1,00	2,00	79,30	0,22		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-25	A	31/03/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,20	3,00	0,00	79,60	-0,08		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-25	B	31/03/2025	0,00%	0,00%	1,30	19,20	2,00	0,00	79,50	0,08		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-26	A	31/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,40	1,00	0,00	79,60	0,05		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-26	B	31/03/2025	0,00%	0,00%	1,20	19,30	2,00	0,00	79,50	-0,18		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-27	A	31/03/2025	0,00%	0,00%	0,90	19,90	2,00	0,00	79,20	0,05		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-27	B	31/03/2025	0,00%	0,00%	3,30	17,30	2,00	0,00	79,40	0,05		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-28	A	31/03/2025	0,00%	0,00%	1,00	19,20	2,00	0,00	79,80	0,04		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-28	B	31/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,90	2,00	0,00	79,10	0,08		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-29	A	31/03/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,50	2,00	0,00	79,20	0,11		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-29	B	31/03/2025	0,00%	0,00%	0,90	19,90	2,00	0,00	79,20	-0,08		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-44	A	31/03/2025	0,00%	0,00%	0,40	20,60	2,00	1,00	79,00	0,08		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-44	B	31/03/2025	0,00%	0,00%	0,60	20,40	2,00	0,00	79,00	-0,04		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-45	A	31/03/2025	0,00%	0,00%	0,50	20,10	2,00	0,00	79,50	0,08		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-45	B	31/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,80	3,00	0,00	79,10	0,13		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-134	B	31/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,00	2,00	1,00	78,90	0,05		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-102		31/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,00	1,00	2,00	79,00	0,18		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-103		31/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	20,90	1,00	2,00	79,10	0,13		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-104		31/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,90	1,00	2,00	79,00	0,15		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-105		31/03/2025	0,00%	0,00%	1,10	19,80	2,00	2,00	79,00	0,12		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-106		31/03/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,60	1,00	1,00	79,20	0,13		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-107		31/03/2025	0,00%	0,00%	2,40	17,10	2,00	2,00	80,50	0,13		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-108		31/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	20,90	1,00	2,00	79,00	0,13		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-109	A	31/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,00	1,00	2,00	78,90	0,14		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-109	B	31/03/2025	0,00%	0,00%	0,90	20,00	2,00	2,00	79,10	0,18		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-110	A	31/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,00	1,00	2,00	79,00	0,17		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-110	B	31/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,10	1,00	2,00	78,90	0,22		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-111	A	31/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,00	1,00	2,00	79,00	0,16		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-111	B	31/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,90	2,00	2,00	79,00	0,20		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-112		31/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,10	2,00	1,00	78,80	0,13		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-162	A	31/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,80	1,00	2,00	79,20	0,14		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-162	B	31/03/2025	0,00%	0,00%	4,90	14,20	2,00	1,00	80,80	0,13		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-166	A	31/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,00	1,00	2,00	79,00	0,16		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-166	B	31/03/2025	0,00%	0,00%	1,40	17,90	1,00	2,00	80,60	0,14		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-119	A	31/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,50	2,00	1,00	78,50	0,03		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-119	B	31/03/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,40	2,00	2,00	78,60	0,05		0,00	0,00	



Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	C02 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15%,															
Portaria P3	PMG-119	C	31/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,40	2,00	1,00	78,50	0,08		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-120	A	31/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,20	2,00	1,00	78,70	0,05		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-120	B	31/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,20	2,00	1,00	78,80	0,07		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-120	C	31/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,20	1,00	1,00	78,70	0,09		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-163	B	31/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,40	2,00	1,00	78,60	0,04		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-164	B	31/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	1,00	1,00	78,70	0,08		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-164	C	31/03/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,20	2,00	1,00	78,80	0,06		0,00	0,00	



ANEXO 4

TABELAS DE MEDIÇÕES QUINZENAIS NA INFRAESTRUTURA

Contrato 0000001/2022 - PUSP - CL
Processo Administrativo 22.1.00018.95.7

Edifício	Tipo	Ponto	Semana	PID	%LEL	Observação
Enfermaria	Espaço c/ pouca circulação de ar	4	17/01/2025	0	0	
Enfermaria	Espaço c/ pouca circulação de ar	5	17/01/2025	0	0	
Caixa d'água	Espaço c/ pouca circulação de ar	6	17/01/2025	0	0	
Edifício I-4	Espaço c/ pouca circulação de ar	7	16/01/2025	0	0	
Edifício I-4	Espaço c/ pouca circulação de ar	8	16/01/2025	0	0	
Casa de Máquinas	Espaço c/ pouca circulação de ar	9	17/01/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	1	15/01/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	2	15/01/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	3	15/01/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	4	15/01/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	5	15/01/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	6	15/01/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	7	15/01/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	8	15/01/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	9	15/01/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	12	15/01/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	13	15/01/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	14	15/01/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	15	15/01/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	16	15/01/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	17	15/01/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	18	15/01/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	19	15/01/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	20	15/01/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	21	15/01/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	22	15/01/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	23	15/01/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	24	15/01/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	25	15/01/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	26	15/01/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	27	15/01/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	28	15/01/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	30	15/01/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	31	15/01/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	32	15/01/2025	0	0	
I-5 Auditórios	Caixa de passagem	72	14/01/2025	0	0	
I-5 Auditórios	Caixa de passagem	73	14/01/2025	0	0	
I-5 Auditórios	Caixa de passagem	74	14/01/2025	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	159	14/01/2025	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	160	14/01/2025	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	162	14/01/2025	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	164	14/01/2025	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	165	14/01/2025	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	171	14/01/2025	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	174	14/01/2025	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	176	14/01/2025	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	177	14/01/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Caixa de passagem	57	14/01/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Caixa de passagem	58	14/01/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Caixa de passagem	59	14/01/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Caixa de passagem	60	14/01/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Caixa de passagem	67	14/01/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	139	14/01/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	140	14/01/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	141	14/01/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	142	14/01/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	143	14/01/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	144	14/01/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	145	14/01/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	146	14/01/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	147	14/01/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	148	14/01/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	149	14/01/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	150	14/01/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	151	14/01/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	95	16/01/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	97	16/01/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	99	16/01/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	106	16/01/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	96	16/01/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	104	16/01/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	307	16/01/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	122	16/01/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	111	16/01/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	117	16/01/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	100	16/01/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	101	16/01/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	105	16/01/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	91	16/01/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	102	16/01/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	88	16/01/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	108	16/01/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	107	16/01/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	94	16/01/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	92	16/01/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	90	16/01/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	89	16/01/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	87	16/01/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	123	16/01/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	121	16/01/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	120	16/01/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	119	16/01/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	114	16/01/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	113	16/01/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	112	16/01/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	109	16/01/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	110	16/01/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	13	16/01/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	15	16/01/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	16	16/01/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	18	16/01/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	21	16/01/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	24	16/01/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	28	16/01/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	33	16/01/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	37	16/01/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	38	16/01/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	39	16/01/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	40	16/01/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	32	16/01/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	34	16/01/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	36	16/01/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	37	16/01/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	38	16/01/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	40	16/01/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	41	16/01/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	42	16/01/2025	0	0	

Edifício	Tipo	Ponto	Semana	PID	%LEL	Observação
Conjunto Laboratorial	Ralo	43	16/01/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	44	16/01/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	45	16/01/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	46	16/01/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	47	16/01/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	48	16/01/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	49	16/01/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	50	16/01/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	53	16/01/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	54	16/01/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	55	16/01/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	56	16/01/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	57	16/01/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	58	16/01/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	60	16/01/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	61	16/01/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	62	16/01/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	63	16/01/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	64	16/01/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	65	16/01/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	66	16/01/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	67	16/01/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	69	16/01/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	70	16/01/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	71	16/01/2025	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	74	15/01/2025	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	75	15/01/2025	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	76	15/01/2025	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	77	15/01/2025	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	78	15/01/2025	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	79	15/01/2025	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	80	15/01/2025	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	81	15/01/2025	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	82	15/01/2025	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	83	15/01/2025	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	84	15/01/2025	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	85	15/01/2025	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	86	15/01/2025	0	0	
Enfermaria	Caixa de passagem	53	17/01/2025	0	0	
Enfermaria	Caixa de passagem	55	17/01/2025	0	0	
Enfermaria	Ralo	124	17/01/2025	0	0	
Enfermaria	Ralo	125	17/01/2025	0	0	
Enfermaria	Ralo	126	17/01/2025	0	0	
Enfermaria	Ralo	127	17/01/2025	0	0	
CAT 1	Ralo	136	17/01/2025	0	0	
CAT 1	Ralo	137	17/01/2025	0	0	
CAT 1	Ralo	138	17/01/2025	0	0	
CAT 2	Ralo	132	17/01/2025	0	0	
CAT 2	Ralo	133	17/01/2025	0	0	
CAT 2	Ralo	134	17/01/2025	0	0	
CAT 2	Ralo	135	17/01/2025	0	0	
Portaria 3	Ralo	186	14/01/2025	0	0	
Portaria 3	Ralo	187	14/01/2025	0	0	
Base Guarda Universitária	Ralo	188	16/01/2025	0	0	
Base Guarda Universitária	Ralo	189	16/01/2025	0	0	
Base Guarda Universitária	Ralo	190	16/01/2025	0	0	
Base Guarda Universitária	Ralo	191	16/01/2025	0	0	
Base Guarda Universitária	Ralo	192	16/01/2025	0	0	
Base Guarda Universitária	Ralo	193	16/01/2025	0	0	
Base Guarda Universitária	Ralo	194	16/01/2025	0	0	
I-5 Auditórios	Espaço c/ pouca circulação de ar	1	27/01/2025	0	0	
I-5 Auditórios	Espaço c/ pouca circulação de ar	2	27/01/2025	0	0	
I-3 Biblioteca	Espaço c/ pouca circulação de ar	3	27/01/2025	0	0	
Enfermaria	Espaço c/ pouca circulação de ar	4	30/01/2025	0	0	
Enfermaria	Espaço c/ pouca circulação de ar	5	30/01/2025	0	0	
Caixa d'água	Espaço c/ pouca circulação de ar	6	31/01/2025	0	0	
Edifício I-4	Espaço c/ pouca circulação de ar	7	29/01/2025	0	0	
Edifício I-4	Espaço c/ pouca circulação de ar	8	29/01/2025	0	0	
Casa de Máquinas	Espaço c/ pouca circulação de ar	9	31/01/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	1	28/01/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	2	28/01/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	3	28/01/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	4	28/01/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	5	28/01/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	6	28/01/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	7	28/01/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	8	28/01/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	9	28/01/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	12	28/01/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	13	28/01/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	14	28/01/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	15	28/01/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	16	28/01/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	17	28/01/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	18	28/01/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	19	28/01/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	20	28/01/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	21	28/01/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	22	28/01/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	23	28/01/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	24	28/01/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	25	28/01/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	26	28/01/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	27	28/01/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	28	28/01/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	30	28/01/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	31	28/01/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	32	28/01/2025	0	0	
I-5 Auditórios	Caixa de passagem	72	27/01/2025	0	0	
I-5 Auditórios	Caixa de passagem	73	27/01/2025	0	0	
I-5 Auditórios	Caixa de passagem	74	27/01/2025	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	159	27/01/2025	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	160	27/01/2025	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	162	27/01/2025	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	164	27/01/2025	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	165	27/01/2025	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	171	27/01/2025	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	174	27/01/2025	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	176	27/01/2025	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	177	27/01/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Caixa de passagem	57	27/01/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Caixa de passagem	58	27/01/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Caixa de passagem	59	27/01/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Caixa de passagem	60	27/01/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Caixa de passagem	67	27/01/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	139	27/01/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	140	27/01/2025	0	0	

Edifício	Tipo	Ponto	Semana	PID	%LEL	Observação
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	141	27/01/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	142	27/01/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	143	27/01/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	144	27/01/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	145	27/01/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	146	27/01/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	147	27/01/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	148	27/01/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	149	27/01/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	150	27/01/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	151	27/01/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	95	29/01/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	97	29/01/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	99	29/01/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	106	29/01/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	96	29/01/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	104	29/01/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	307	29/01/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	122	29/01/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	111	29/01/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	117	29/01/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	100	29/01/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	101	29/01/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	105	29/01/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	91	29/01/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	102	29/01/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	88	29/01/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	108	29/01/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	107	29/01/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	94	29/01/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	92	29/01/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	90	29/01/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	89	29/01/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	87	29/01/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	123	29/01/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	121	29/01/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	120	29/01/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	119	29/01/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	114	29/01/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	113	29/01/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	112	29/01/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	109	29/01/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	110	29/01/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	13	29/01/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	15	29/01/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	16	29/01/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	18	29/01/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	21	29/01/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	24	29/01/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	28	29/01/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	33	29/01/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	37	29/01/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	38	29/01/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	39	29/01/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	40	29/01/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	32	29/01/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	34	29/01/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	36	29/01/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	37	29/01/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	38	29/01/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	40	29/01/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	41	29/01/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	42	29/01/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	43	29/01/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	44	29/01/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	45	29/01/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	46	29/01/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	47	29/01/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	48	29/01/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	49	29/01/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	50	29/01/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	53	29/01/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	54	29/01/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	55	29/01/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	56	29/01/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	57	29/01/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	58	29/01/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	60	29/01/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	61	29/01/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	62	29/01/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	63	29/01/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	64	29/01/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	65	29/01/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	66	29/01/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	67	29/01/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	69	29/01/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	70	29/01/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	71	29/01/2025	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	74	28/01/2025	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	75	28/01/2025	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	76	28/01/2025	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	77	28/01/2025	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	78	28/01/2025	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	79	28/01/2025	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	80	28/01/2025	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	81	28/01/2025	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	82	28/01/2025	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	83	28/01/2025	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	84	28/01/2025	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	85	28/01/2025	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	86	28/01/2025	0	0	
Enfermaria	Caixa de passagem	53	30/01/2025	0	0	
Enfermaria	Caixa de passagem	55	30/01/2025	0	0	
Enfermaria	Ralo	124	30/01/2025	0	0	
Enfermaria	Ralo	125	30/01/2025	0	0	
Enfermaria	Ralo	126	30/01/2025	0	0	
Enfermaria	Ralo	127	30/01/2025	0	0	
CAT 1	Ralo	136	30/01/2025	0	0	
CAT 1	Ralo	137	30/01/2025	0	0	
CAT 1	Ralo	138	30/01/2025	0	0	
CAT 2	Ralo	132	31/01/2025	0	0	
CAT 2	Ralo	133	31/01/2025	0	0	
CAT 2	Ralo	134	31/01/2025	0	0	
CAT 2	Ralo	135	31/01/2025	0	0	
Portaria 3	Ralo	186	27/01/2025	0	0	

Edifício	Tipo	Ponto	Semana	PID	%LEL	Observação
Portaria 3	Ralo	187	27/01/2025	0	0	
Base Guarda Universitária	Ralo	188	30/01/2025	0	0	
Base Guarda Universitária	Ralo	189	30/01/2025	0	0	
Base Guarda Universitária	Ralo	190	30/01/2025	0	0	
Base Guarda Universitária	Ralo	191	30/01/2025	0	0	
Base Guarda Universitária	Ralo	192	30/01/2025	0	0	
Base Guarda Universitária	Ralo	193	30/01/2025	0	0	
Base Guarda Universitária	Ralo	194	30/01/2025	0	0	
I-5 Auditórios	Espaço c/ pouca circulação de ar	1	10/02/2025	0	0	
I-5 Auditórios	Espaço c/ pouca circulação de ar	2	10/02/2025	0	0	
I-3 Biblioteca	Espaço c/ pouca circulação de ar	3	10/02/2025	0	0	
Enfermaria	Espaço c/ pouca circulação de ar	4	13/02/2025	0	0	
Enfermaria	Espaço c/ pouca circulação de ar	5	13/02/2025	0	0	
Caixa d'água	Espaço c/ pouca circulação de ar	6	14/02/2025	0	0	
Edifício I-4	Espaço c/ pouca circulação de ar	7	12/02/2025	0	0	
Edifício I-4	Espaço c/ pouca circulação de ar	8	12/02/2025	0	0	
Casa de Máquinas	Espaço c/ pouca circulação de ar	9	14/02/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	1	11/02/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	2	11/02/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	3	11/02/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	4	11/02/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	5	11/02/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	6	11/02/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	7	11/02/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	8	11/02/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	9	11/02/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	12	11/02/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	13	11/02/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	14	11/02/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	15	11/02/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	16	11/02/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	17	11/02/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	18	11/02/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	19	11/02/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	20	11/02/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	21	11/02/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	22	11/02/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	23	11/02/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	24	11/02/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	25	11/02/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	26	11/02/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	27	11/02/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	28	11/02/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	30	11/02/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	31	11/02/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	32	11/02/2025	0	0	
I-5 Auditórios	Caixa de passagem	72	10/02/2025	0	0	
I-5 Auditórios	Caixa de passagem	73	10/02/2025	0	0	
I-5 Auditórios	Caixa de passagem	74	10/02/2025	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	159	10/02/2025	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	160	10/02/2025	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	162	10/02/2025	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	164	10/02/2025	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	165	10/02/2025	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	171	10/02/2025	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	174	10/02/2025	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	176	10/02/2025	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	177	10/02/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Caixa de passagem	57	10/02/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Caixa de passagem	58	10/02/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Caixa de passagem	59	10/02/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Caixa de passagem	60	10/02/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Caixa de passagem	67	10/02/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	139	10/02/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	140	10/02/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	141	10/02/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	142	10/02/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	143	10/02/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	144	10/02/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	145	10/02/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	146	10/02/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	147	10/02/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	148	10/02/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	149	10/02/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	150	10/02/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	151	10/02/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	95	12/02/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	97	12/02/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	99	12/02/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	106	12/02/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	96	12/02/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	104	12/02/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	307	12/02/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	122	12/02/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	111	12/02/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	117	12/02/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	100	12/02/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	101	12/02/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	105	12/02/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	91	12/02/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	102	12/02/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	88	12/02/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	108	12/02/2025	0	0	

Edifício	Tipo	Ponto	Semana	PID	%LEL	Observação
Central de Serviços I-4	Ralo	107	12/02/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	94	12/02/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	92	12/02/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	90	12/02/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	89	12/02/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	87	12/02/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	123	12/02/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	121	12/02/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	120	12/02/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	119	12/02/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	114	12/02/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	113	12/02/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	112	12/02/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	109	12/02/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	110	12/02/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	13	12/02/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	15	12/02/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	16	12/02/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	18	12/02/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	21	12/02/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	24	12/02/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	28	12/02/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	33	12/02/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	37	12/02/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	38	12/02/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	39	12/02/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	40	12/02/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	32	12/02/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	34	12/02/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	36	12/02/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	37	12/02/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	38	12/02/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	40	12/02/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	41	12/02/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	42	12/02/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	43	12/02/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	44	12/02/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	45	12/02/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	46	12/02/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	47	12/02/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	48	12/02/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	49	12/02/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	50	12/02/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	53	12/02/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	54	12/02/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	55	12/02/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	56	12/02/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	57	12/02/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	58	12/02/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	60	12/02/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	61	12/02/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	62	12/02/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	63	12/02/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	64	12/02/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	65	12/02/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	66	12/02/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	67	12/02/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	69	12/02/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	70	12/02/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	71	12/02/2025	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	74	11/02/2025	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	75	11/02/2025	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	76	11/02/2025	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	77	11/02/2025	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	78	11/02/2025	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	79	11/02/2025	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	80	11/02/2025	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	81	11/02/2025	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	82	11/02/2025	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	83	11/02/2025	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	84	11/02/2025	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	85	11/02/2025	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	86	11/02/2025	0	0	
Enfermaria	Caixa de passagem	53	13/02/2025	0	0	
Enfermaria	Caixa de passagem	55	13/02/2025	0	0	
Enfermaria	Ralo	124	13/02/2025	0	0	
Enfermaria	Ralo	125	13/02/2025	0	0	
Enfermaria	Ralo	126	13/02/2025	0	0	
Enfermaria	Ralo	127	13/02/2025	0	0	
CAT 1	Ralo	136	13/02/2025	0	0	
CAT 1	Ralo	137	13/02/2025	0	0	
CAT 1	Ralo	138	13/02/2025	0	0	
CAT 2	Ralo	132	14/02/2025	0	0	
CAT 2	Ralo	133	14/02/2025	0	0	
CAT 2	Ralo	134	14/02/2025	0	0	
CAT 2	Ralo	135	14/02/2025	0	0	
Portaria 3	Ralo	186	10/02/2025	0	0	
Portaria 3	Ralo	187	10/02/2025	0	0	
Base Guarda Universitária	Ralo	188	13/02/2025	0	0	
Base Guarda Universitária	Ralo	189	13/02/2025	0	0	
Base Guarda Universitária	Ralo	190	13/02/2025	0	0	
Base Guarda Universitária	Ralo	191	13/02/2025	0	0	
Base Guarda Universitária	Ralo	192	13/02/2025	0	0	
Base Guarda Universitária	Ralo	193	13/02/2025	0	0	

Edifício	Tipo	Ponto	Semana	PID	%LEL	Observação
Base Guarda Universitária	Ralo	194	13/02/2025	0	0	
I-5 Auditórios	Espaço c/ pouca circulação de ar	1	24/02/2025	0	0	
I-5 Auditórios	Espaço c/ pouca circulação de ar	2	24/02/2025	0	0	
I-3 Biblioteca	Espaço c/ pouca circulação de ar	3	24/02/2025	0	0	
Enfermaria	Espaço c/ pouca circulação de ar	4	27/02/2025	0	0	
Enfermaria	Espaço c/ pouca circulação de ar	5	27/02/2025	0	0	
Caixa d'água	Espaço c/ pouca circulação de ar	6	28/02/2025	0	0	
Edifício I-4	Espaço c/ pouca circulação de ar	7	26/02/2025	0	0	
Edifício I-4	Espaço c/ pouca circulação de ar	8	26/02/2025	0	0	
Casa de Máquinas	Espaço c/ pouca circulação de ar	9	28/02/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	1	25/02/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	2	25/02/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	3	25/02/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	4	25/02/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	5	25/02/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	6	25/02/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	7	25/02/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	8	25/02/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	9	25/02/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	12	25/02/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	13	25/02/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	14	25/02/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	15	25/02/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	16	25/02/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	17	25/02/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	18	25/02/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	19	25/02/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	20	25/02/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	21	25/02/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	22	25/02/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	23	25/02/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	24	25/02/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	25	25/02/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	26	25/02/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	27	25/02/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	28	25/02/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	30	25/02/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	31	25/02/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	32	25/02/2025	0	0	
I-5 Auditórios	Caixa de passagem	72	24/02/2025	0	0	
I-5 Auditórios	Caixa de passagem	73	24/02/2025	0	0	
I-5 Auditórios	Caixa de passagem	74	24/02/2025	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	159	24/02/2025	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	160	24/02/2025	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	162	24/02/2025	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	164	24/02/2025	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	165	24/02/2025	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	171	24/02/2025	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	174	24/02/2025	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	176	24/02/2025	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	177	24/02/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Caixa de passagem	57	24/02/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Caixa de passagem	58	24/02/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Caixa de passagem	59	24/02/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Caixa de passagem	60	24/02/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Caixa de passagem	67	24/02/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	139	24/02/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	140	24/02/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	141	24/02/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	142	24/02/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	143	24/02/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	144	24/02/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	145	24/02/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	146	24/02/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	147	24/02/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	148	24/02/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	149	24/02/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	150	24/02/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	151	24/02/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	95	26/02/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	97	26/02/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	99	26/02/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	106	26/02/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	96	26/02/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	104	26/02/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	307	26/02/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	122	26/02/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	111	26/02/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	117	26/02/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	100	26/02/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	101	26/02/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	105	26/02/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	91	26/02/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	102	26/02/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	88	26/02/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	108	26/02/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	107	26/02/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	94	26/02/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	92	26/02/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	90	26/02/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	89	26/02/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	87	26/02/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	123	26/02/2025	0	0	

Edifício	Tipo	Ponto	Semana	PID	%LEL	Observação
Central de Serviços I-4	Ralo	121	26/02/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	120	26/02/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	119	26/02/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	114	26/02/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	113	26/02/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	112	26/02/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	109	26/02/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	110	26/02/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	13	26/02/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	15	26/02/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	16	26/02/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	18	26/02/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	21	26/02/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	24	26/02/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	28	26/02/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	33	26/02/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	37	26/02/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	38	26/02/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	39	26/02/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	40	26/02/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	32	26/02/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	34	26/02/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	36	26/02/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	37	26/02/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	38	26/02/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	40	26/02/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	41	26/02/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	42	26/02/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	43	26/02/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	44	26/02/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	45	26/02/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	46	26/02/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	47	26/02/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	48	26/02/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	49	26/02/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	50	26/02/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	53	26/02/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	54	26/02/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	55	26/02/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	56	26/02/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	57	26/02/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	58	26/02/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	60	26/02/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	61	26/02/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	62	26/02/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	63	26/02/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	64	26/02/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	65	26/02/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	66	26/02/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	67	26/02/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	69	26/02/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	70	26/02/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	71	26/02/2025	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	74	25/02/2025	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	75	25/02/2025	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	76	25/02/2025	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	77	25/02/2025	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	78	25/02/2025	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	79	25/02/2025	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	80	25/02/2025	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	81	25/02/2025	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	82	25/02/2025	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	83	25/02/2025	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	84	25/02/2025	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	85	25/02/2025	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	86	25/02/2025	0	0	
Enfermaria	Caixa de passagem	53	27/02/2025	0	0	
Enfermaria	Caixa de passagem	55	27/02/2025	0	0	
Enfermaria	Ralo	124	27/02/2025	0	0	
Enfermaria	Ralo	125	27/02/2025	0	0	
Enfermaria	Ralo	126	27/02/2025	0	0	
Enfermaria	Ralo	127	27/02/2025	0	0	
CAT 1	Ralo	136	27/02/2025	0	0	
CAT 1	Ralo	137	27/02/2025	0	0	
CAT 1	Ralo	138	27/02/2025	0	0	
CAT 2	Ralo	132	27/02/2025	0	0	
CAT 2	Ralo	133	27/02/2025	0	0	
CAT 2	Ralo	134	27/02/2025	0	0	
CAT 2	Ralo	135	27/02/2025	0	0	
Portaria 3	Ralo	186	24/02/2025	0	0	
Portaria 3	Ralo	187	24/02/2025	0	0	
Base Guarda Universitária	Ralo	188	26/02/2025	0	0	
Base Guarda Universitária	Ralo	189	26/02/2025	0	0	
Base Guarda Universitária	Ralo	190	26/02/2025	0	0	
Base Guarda Universitária	Ralo	191	26/02/2025	0	0	
Base Guarda Universitária	Ralo	192	26/02/2025	0	0	
Base Guarda Universitária	Ralo	193	26/02/2025	0	0	
Base Guarda Universitária	Ralo	194	26/02/2025	0	0	
I-5 Auditórios	Espaço c/ pouca circulação de ar	1	10/03/2025	0	0	
I-5 Auditórios	Espaço c/ pouca circulação de ar	2	10/03/2025	0	0	
I-3 Biblioteca	Espaço c/ pouca circulação de ar	3	10/03/2025	0	0	
Enfermaria	Espaço c/ pouca circulação de ar	4	13/03/2025	0	0	
Enfermaria	Espaço c/ pouca circulação de ar	5	13/03/2025	0	0	
Caixa d'água	Espaço c/ pouca circulação de ar	6	14/03/2025	0	0	
Edifício I-4	Espaço c/ pouca circulação de ar	7	12/03/2025	0	0	

Edifício	Tipo	Ponto	Semana	PID	%LEL	Observação
Edifício I-4	Espaço c/ pouca circulação de ar	8	12/03/2025	0	0	
Casa de Máquinas	Espaço c/ pouca circulação de ar	9	14/03/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	1	11/03/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	2	11/03/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	3	11/03/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	4	11/03/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	5	11/03/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	6	11/03/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	7	11/03/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	8	11/03/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	9	11/03/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	12	11/03/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	13	11/03/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	14	11/03/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	15	11/03/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	16	11/03/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	17	11/03/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	18	11/03/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	19	11/03/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	20	11/03/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	21	11/03/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	22	11/03/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	23	11/03/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	24	11/03/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	25	11/03/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	26	11/03/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	27	11/03/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	28	11/03/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	30	11/03/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	31	11/03/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	32	11/03/2025	0	0	
I-5 Auditórios	Caixa de passagem	72	10/03/2025	0	0	
I-5 Auditórios	Caixa de passagem	73	10/03/2025	0	0	
I-5 Auditórios	Caixa de passagem	74	10/03/2025	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	159	10/03/2025	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	160	10/03/2025	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	162	10/03/2025	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	164	10/03/2025	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	165	10/03/2025	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	171	10/03/2025	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	174	10/03/2025	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	176	10/03/2025	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	177	10/03/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Caixa de passagem	57	10/03/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Caixa de passagem	58	10/03/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Caixa de passagem	59	10/03/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Caixa de passagem	60	10/03/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Caixa de passagem	67	10/03/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	139	10/03/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	140	10/03/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	141	10/03/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	142	10/03/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	143	10/03/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	144	10/03/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	145	10/03/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	146	10/03/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	147	10/03/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	148	10/03/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	149	10/03/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	150	10/03/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	151	10/03/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	95	12/03/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	97	12/03/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	99	12/03/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	106	12/03/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	96	12/03/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	104	12/03/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	307	12/03/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	122	12/03/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	111	12/03/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	117	12/03/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	100	12/03/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	101	12/03/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	105	12/03/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	91	12/03/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	102	12/03/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	88	12/03/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	108	12/03/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	107	12/03/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	94	12/03/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	92	12/03/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	90	12/03/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	89	12/03/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	87	12/03/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	123	12/03/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	121	12/03/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	120	12/03/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	119	12/03/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	114	12/03/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	113	12/03/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	112	12/03/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	109	12/03/2025	0	0	

Edifício	Tipo	Ponto	Semana	PID	%LEL	Observação
Central de Serviços I-4	Ralo	110	12/03/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	13	12/03/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	15	12/03/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	16	12/03/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	18	12/03/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	21	12/03/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	24	12/03/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	28	12/03/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	33	12/03/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	37	12/03/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	38	12/03/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	39	12/03/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	40	12/03/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	32	12/03/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	34	12/03/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	36	12/03/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	37	12/03/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	38	12/03/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	40	12/03/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	41	12/03/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	42	12/03/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	43	12/03/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	44	12/03/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	45	12/03/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	46	12/03/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	47	12/03/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	48	12/03/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	49	12/03/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	50	12/03/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	53	12/03/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	54	12/03/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	55	12/03/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	56	12/03/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	57	12/03/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	58	12/03/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	60	12/03/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	61	12/03/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	62	12/03/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	63	12/03/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	64	12/03/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	65	12/03/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	66	12/03/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	67	12/03/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	69	12/03/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	70	12/03/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	71	12/03/2025	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	74	11/03/2025	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	75	11/03/2025	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	76	11/03/2025	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	77	11/03/2025	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	78	11/03/2025	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	79	11/03/2025	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	80	11/03/2025	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	81	11/03/2025	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	82	11/03/2025	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	83	11/03/2025	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	84	11/03/2025	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	85	11/03/2025	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	86	11/03/2025	0	0	
Enfermaria	Caixa de passagem	53	13/03/2025	0	0	
Enfermaria	Caixa de passagem	55	13/03/2025	0	0	
Enfermaria	Ralo	124	13/03/2025	0	0	
Enfermaria	Ralo	125	13/03/2025	0	0	
Enfermaria	Ralo	126	13/03/2025	0	0	
Enfermaria	Ralo	127	13/03/2025	0	0	
CAT 1	Ralo	136	13/03/2025	0	0	
CAT 1	Ralo	137	13/03/2025	0	0	
CAT 1	Ralo	138	13/03/2025	0	0	
CAT 2	Ralo	132	14/03/2025	0	0	
CAT 2	Ralo	133	14/03/2025	0	0	
CAT 2	Ralo	134	14/03/2025	0	0	
CAT 2	Ralo	135	14/03/2025	0	0	
Portaria 3	Ralo	186	10/03/2025	0	0	
Portaria 3	Ralo	187	10/03/2025	0	0	
Base Guarda Universitária	Ralo	188	13/03/2025	0	0	
Base Guarda Universitária	Ralo	189	13/03/2025	0	0	
Base Guarda Universitária	Ralo	190	13/03/2025	0	0	
Base Guarda Universitária	Ralo	191	13/03/2025	0	0	
Base Guarda Universitária	Ralo	192	13/03/2025	0	0	
Base Guarda Universitária	Ralo	193	13/03/2025	0	0	
Base Guarda Universitária	Ralo	194	13/03/2025	0	0	
I-5 Auditórios	Espaço c/ pouca circulação de ar	1	24/03/2025	0	0	
I-5 Auditórios	Espaço c/ pouca circulação de ar	2	24/03/2025	0	0	
I-3 Biblioteca	Espaço c/ pouca circulação de ar	3	24/03/2025	0	0	
Enfermaria	Espaço c/ pouca circulação de ar	4	27/03/2025	0	0	
Enfermaria	Espaço c/ pouca circulação de ar	5	27/03/2025	0	0	
Caixa d'água	Espaço c/ pouca circulação de ar	6	28/03/2025	0	0	
Edifício I-4	Espaço c/ pouca circulação de ar	7	26/03/2025	0	0	
Edifício I-4	Espaço c/ pouca circulação de ar	8	26/03/2025	0	0	
Casa de Máquinas	Espaço c/ pouca circulação de ar	9	28/03/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	1	25/03/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	2	25/03/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	3	25/03/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	4	25/03/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	5	25/03/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	6	25/03/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	7	25/03/2025	0	0	


Edifício	Tipo	Ponto	Semana	PID	%LEL	Observação
Edifício I-1	Ralo	8	25/03/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	9	25/03/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	12	25/03/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	13	25/03/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	14	25/03/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	15	25/03/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	16	25/03/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	17	25/03/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	18	25/03/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	19	25/03/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	20	25/03/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	21	25/03/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	22	25/03/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	23	25/03/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	24	25/03/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	25	25/03/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	26	25/03/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	27	25/03/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	28	25/03/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	30	25/03/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	31	25/03/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	32	25/03/2025	0	0	
I-5 Auditórios	Caixa de passagem	72	24/03/2025	0	0	
I-5 Auditórios	Caixa de passagem	73	24/03/2025	0	0	
I-5 Auditórios	Caixa de passagem	74	24/03/2025	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	159	24/03/2025	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	160	24/03/2025	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	162	24/03/2025	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	164	24/03/2025	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	165	24/03/2025	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	171	24/03/2025	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	174	24/03/2025	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	176	24/03/2025	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	177	24/03/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Caixa de passagem	57	24/03/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Caixa de passagem	58	24/03/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Caixa de passagem	59	24/03/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Caixa de passagem	60	24/03/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Caixa de passagem	67	24/03/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	139	24/03/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	140	24/03/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	141	24/03/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	142	24/03/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	143	24/03/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	144	24/03/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	145	24/03/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	146	24/03/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	147	24/03/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	148	24/03/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	149	24/03/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	150	24/03/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	151	24/03/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	95	26/03/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	97	26/03/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	99	26/03/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	106	26/03/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	96	26/03/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	104	26/03/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	307	26/03/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	122	26/03/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	111	26/03/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	117	26/03/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	100	26/03/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	101	26/03/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	105	26/03/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	91	26/03/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	102	26/03/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	88	26/03/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	108	26/03/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	107	26/03/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	94	26/03/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	92	26/03/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	90	26/03/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	89	26/03/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	87	26/03/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	123	26/03/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	121	26/03/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	120	26/03/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	119	26/03/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	114	26/03/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	113	26/03/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	112	26/03/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	109	26/03/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	110	26/03/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	13	26/03/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	15	26/03/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	16	26/03/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	18	26/03/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	21	26/03/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	24	26/03/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	28	26/03/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	33	26/03/2025	0	0	


Edifício	Tipo	Ponto	Semana	PID	%LEL	Observação
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	37	26/03/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	38	26/03/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	39	26/03/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	40	26/03/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	32	26/03/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	34	26/03/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	36	26/03/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	37	26/03/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	38	26/03/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	40	26/03/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	41	26/03/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	42	26/03/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	43	26/03/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	44	26/03/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	45	26/03/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	46	26/03/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	47	26/03/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	48	26/03/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	49	26/03/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	50	26/03/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	53	26/03/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	54	26/03/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	55	26/03/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	56	26/03/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	57	26/03/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	58	26/03/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	60	26/03/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	61	26/03/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	62	26/03/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	63	26/03/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	64	26/03/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	65	26/03/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	66	26/03/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	67	26/03/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	69	26/03/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	70	26/03/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	71	26/03/2025	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	74	25/03/2025	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	75	25/03/2025	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	76	25/03/2025	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	77	25/03/2025	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	78	25/03/2025	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	79	25/03/2025	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	80	25/03/2025	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	81	25/03/2025	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	82	25/03/2025	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	83	25/03/2025	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	84	25/03/2025	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	85	25/03/2025	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	86	25/03/2025	0	0	
Enfermaria	Caixa de passagem	53	27/03/2025	0	0	
Enfermaria	Caixa de passagem	55	27/03/2025	0	0	
Enfermaria	Ralo	124	27/03/2025	0	0	
Enfermaria	Ralo	125	27/03/2025	0	0	
Enfermaria	Ralo	126	27/03/2025	0	0	
Enfermaria	Ralo	127	27/03/2025	0	0	
CAT 1	Ralo	136	27/03/2025	0	0	
CAT 1	Ralo	137	27/03/2025	0	0	
CAT 1	Ralo	138	27/03/2025	0	0	
CAT 2	Ralo	132	28/03/2025	0	0	
CAT 2	Ralo	133	28/03/2025	0	0	
CAT 2	Ralo	134	28/03/2025	0	0	
CAT 2	Ralo	135	28/03/2025	0	0	
Portaria 3	Ralo	186	24/03/2025	0	0	
Portaria 3	Ralo	187	24/03/2025	0	0	
Base Guarda Universitária	Ralo	188	28/03/2025	0	0	
Base Guarda Universitária	Ralo	189	28/03/2025	0	0	
Base Guarda Universitária	Ralo	190	28/03/2025	0	0	
Base Guarda Universitária	Ralo	191	28/03/2025	0	0	
Base Guarda Universitária	Ralo	192	28/03/2025	0	0	
Base Guarda Universitária	Ralo	193	28/03/2025	0	0	
Base Guarda Universitária	Ralo	194	28/03/2025	0	0	




ANEXO 5

EVOLUÇÃO DAS CONCENTRAÇÕES DE METANO X PRESSÃO (ABRIL/2014 A MARÇO/2025)

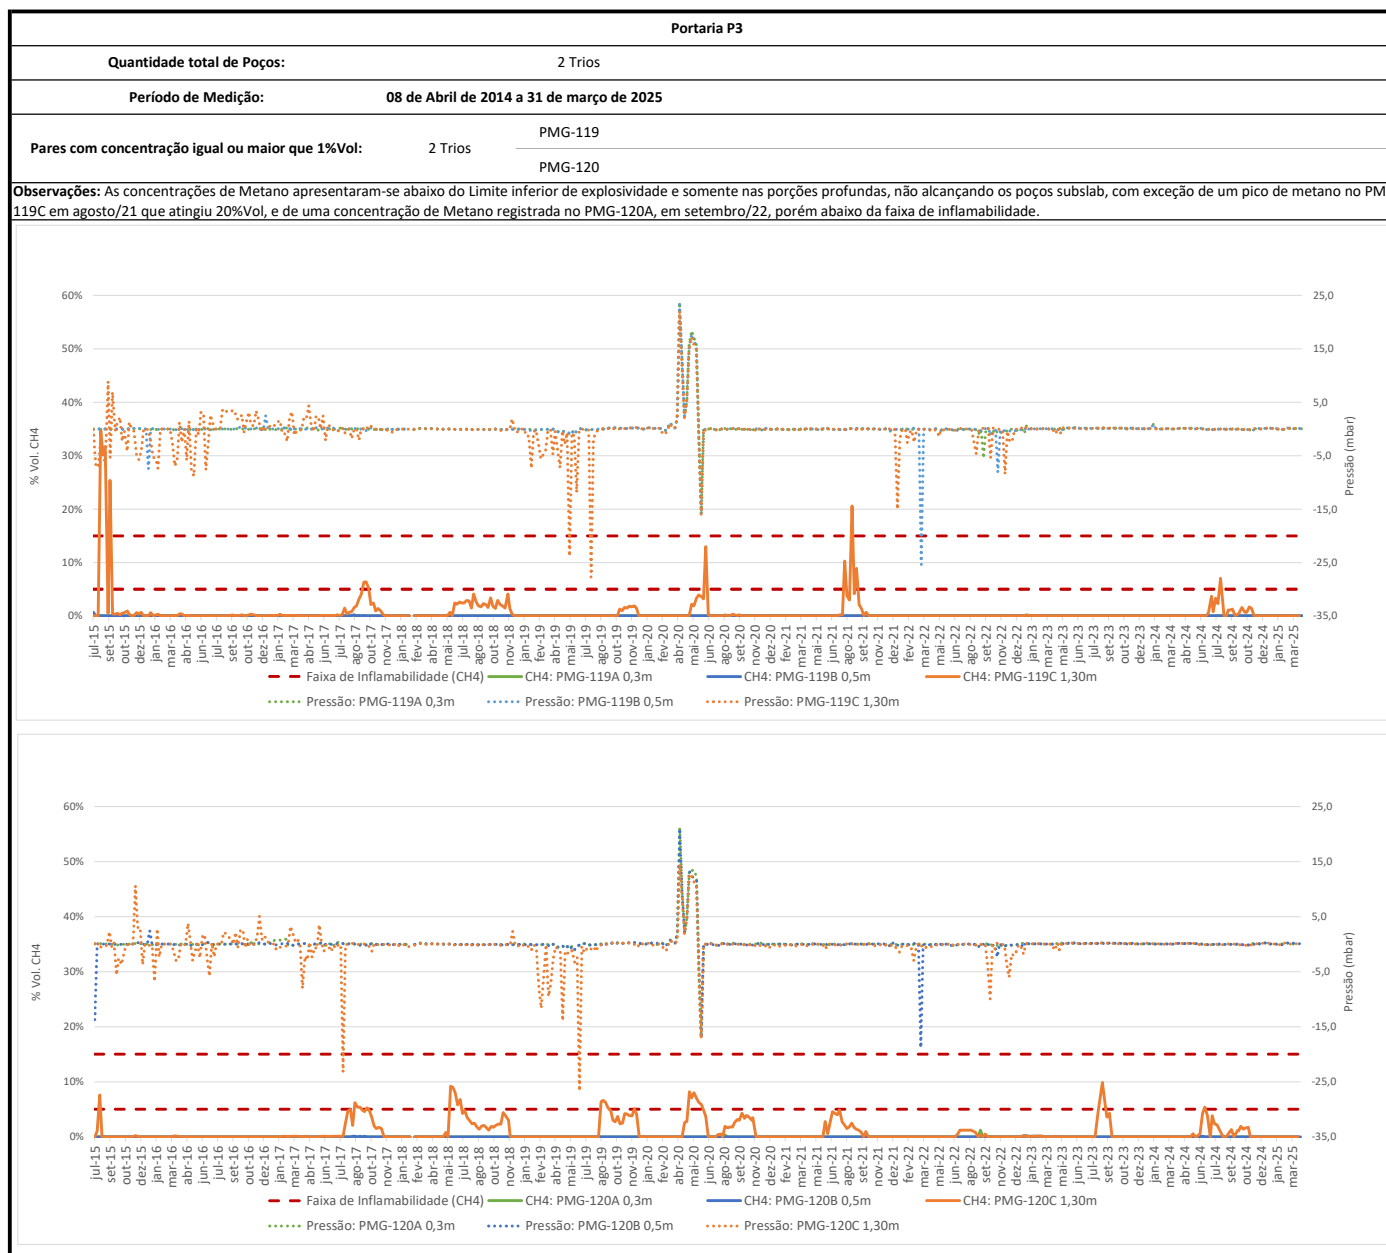

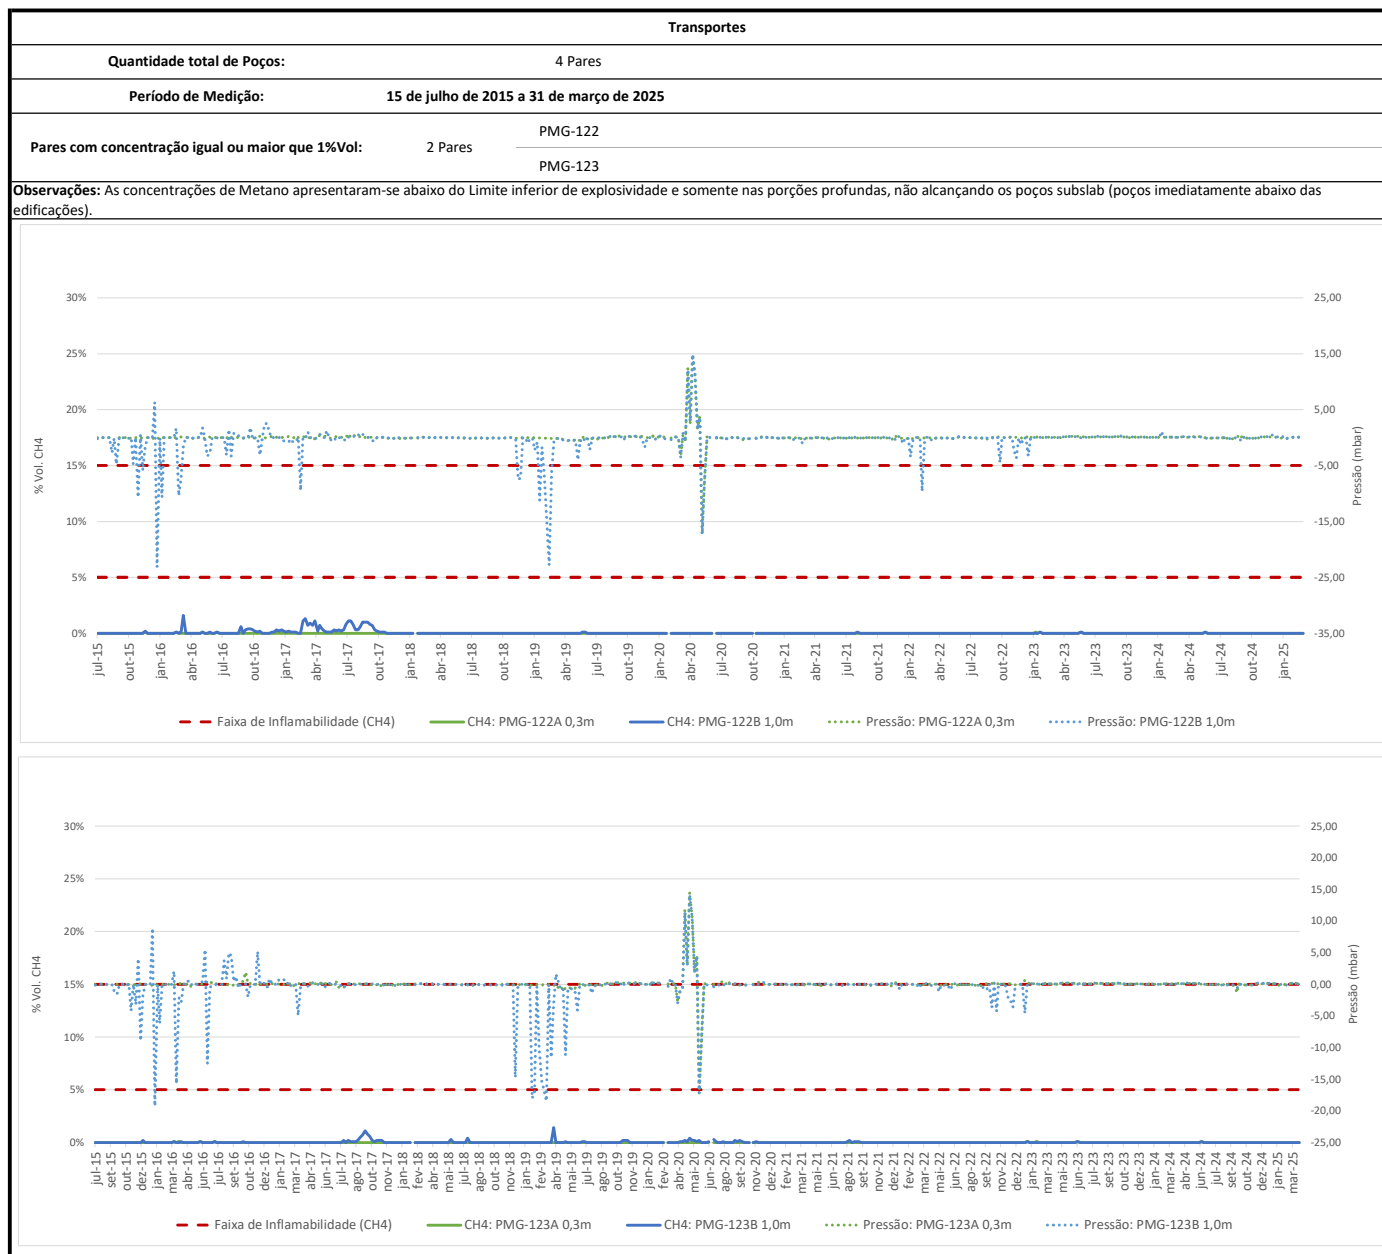

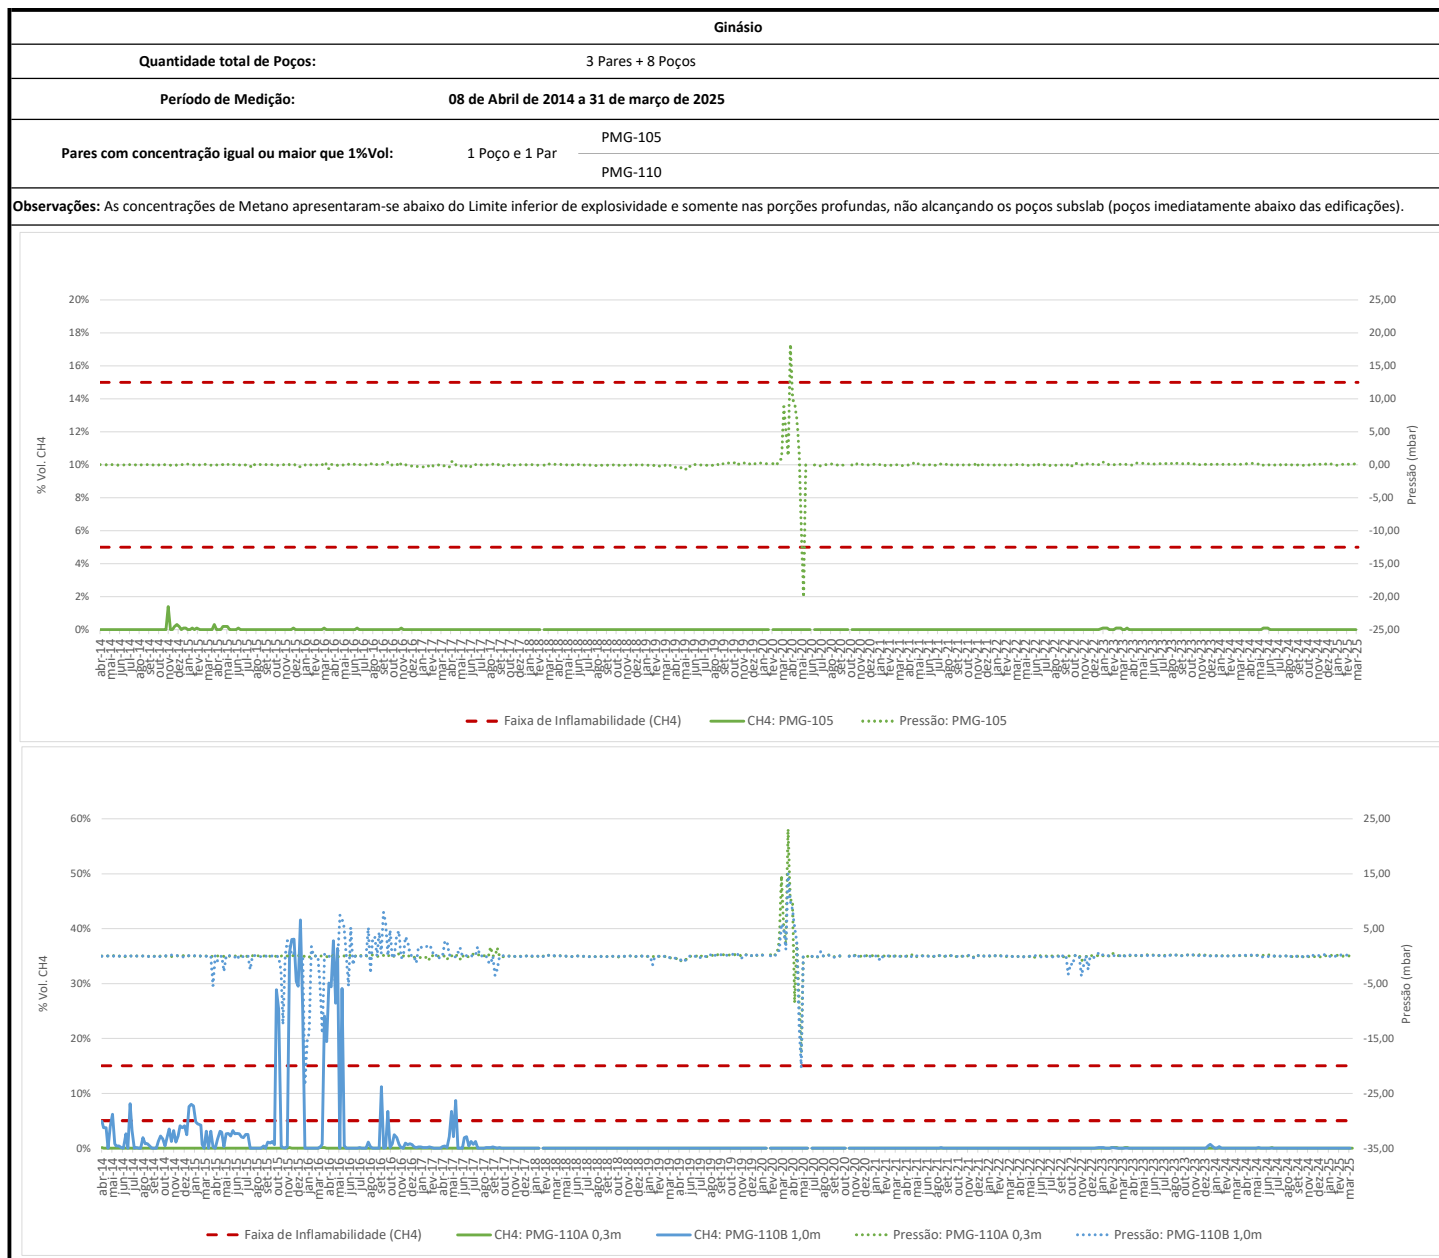











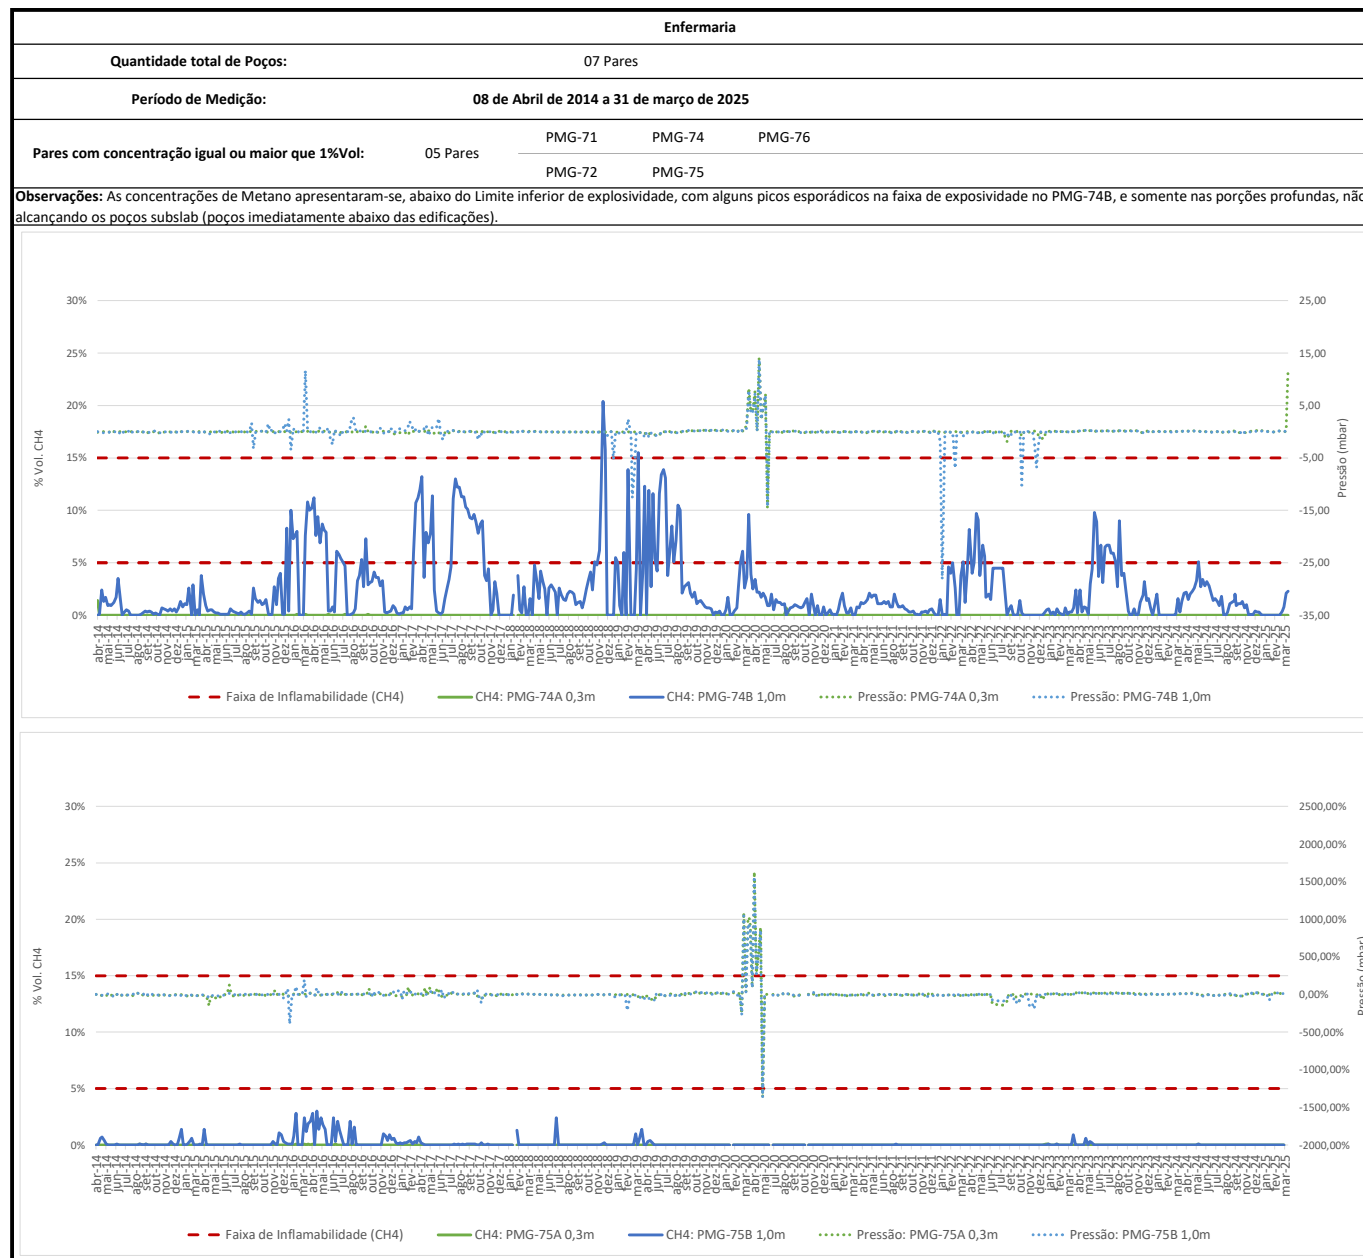




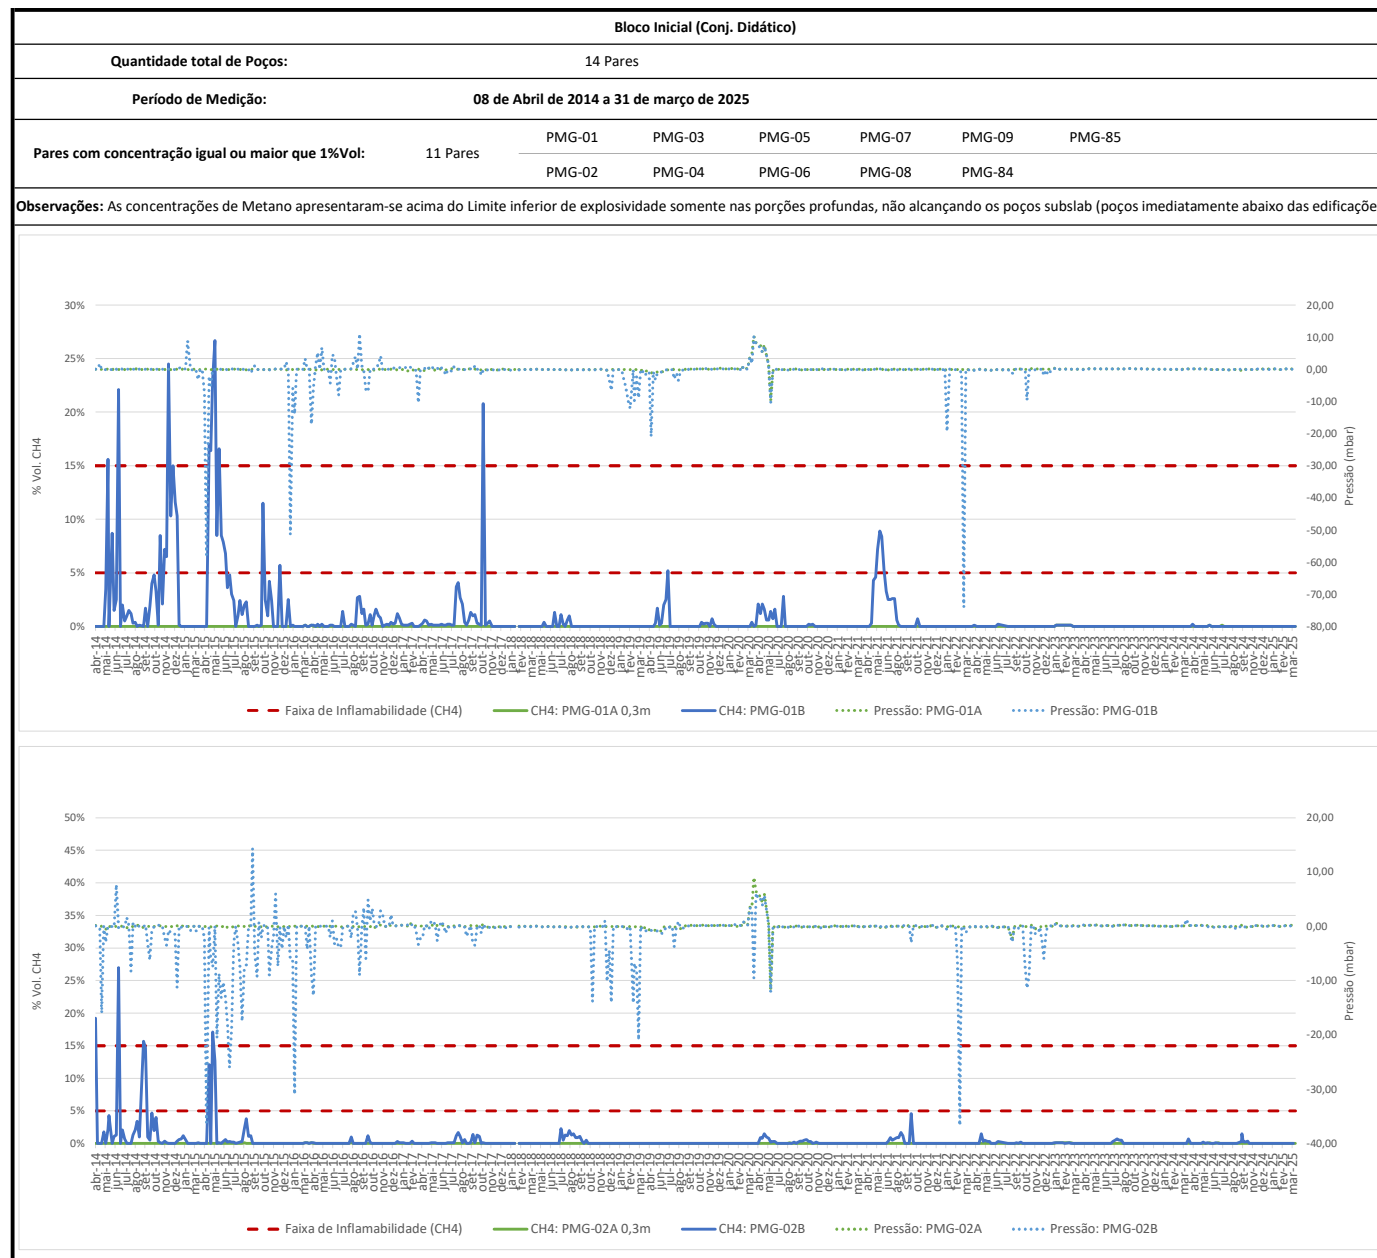








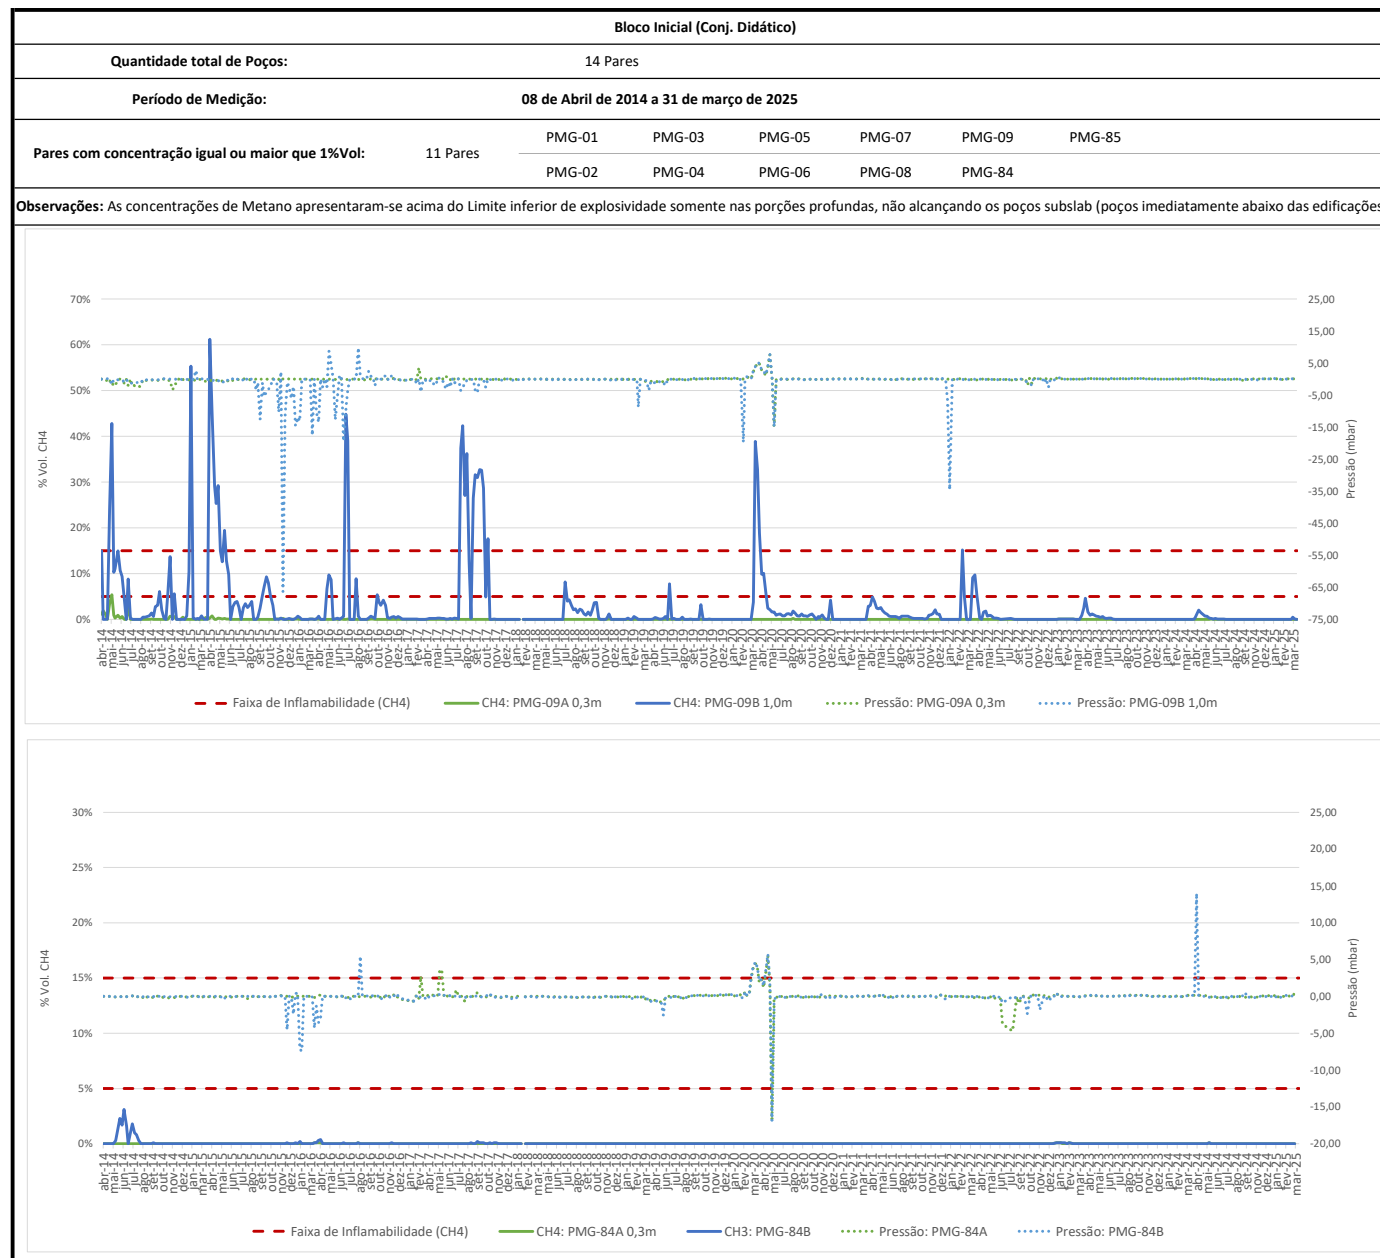





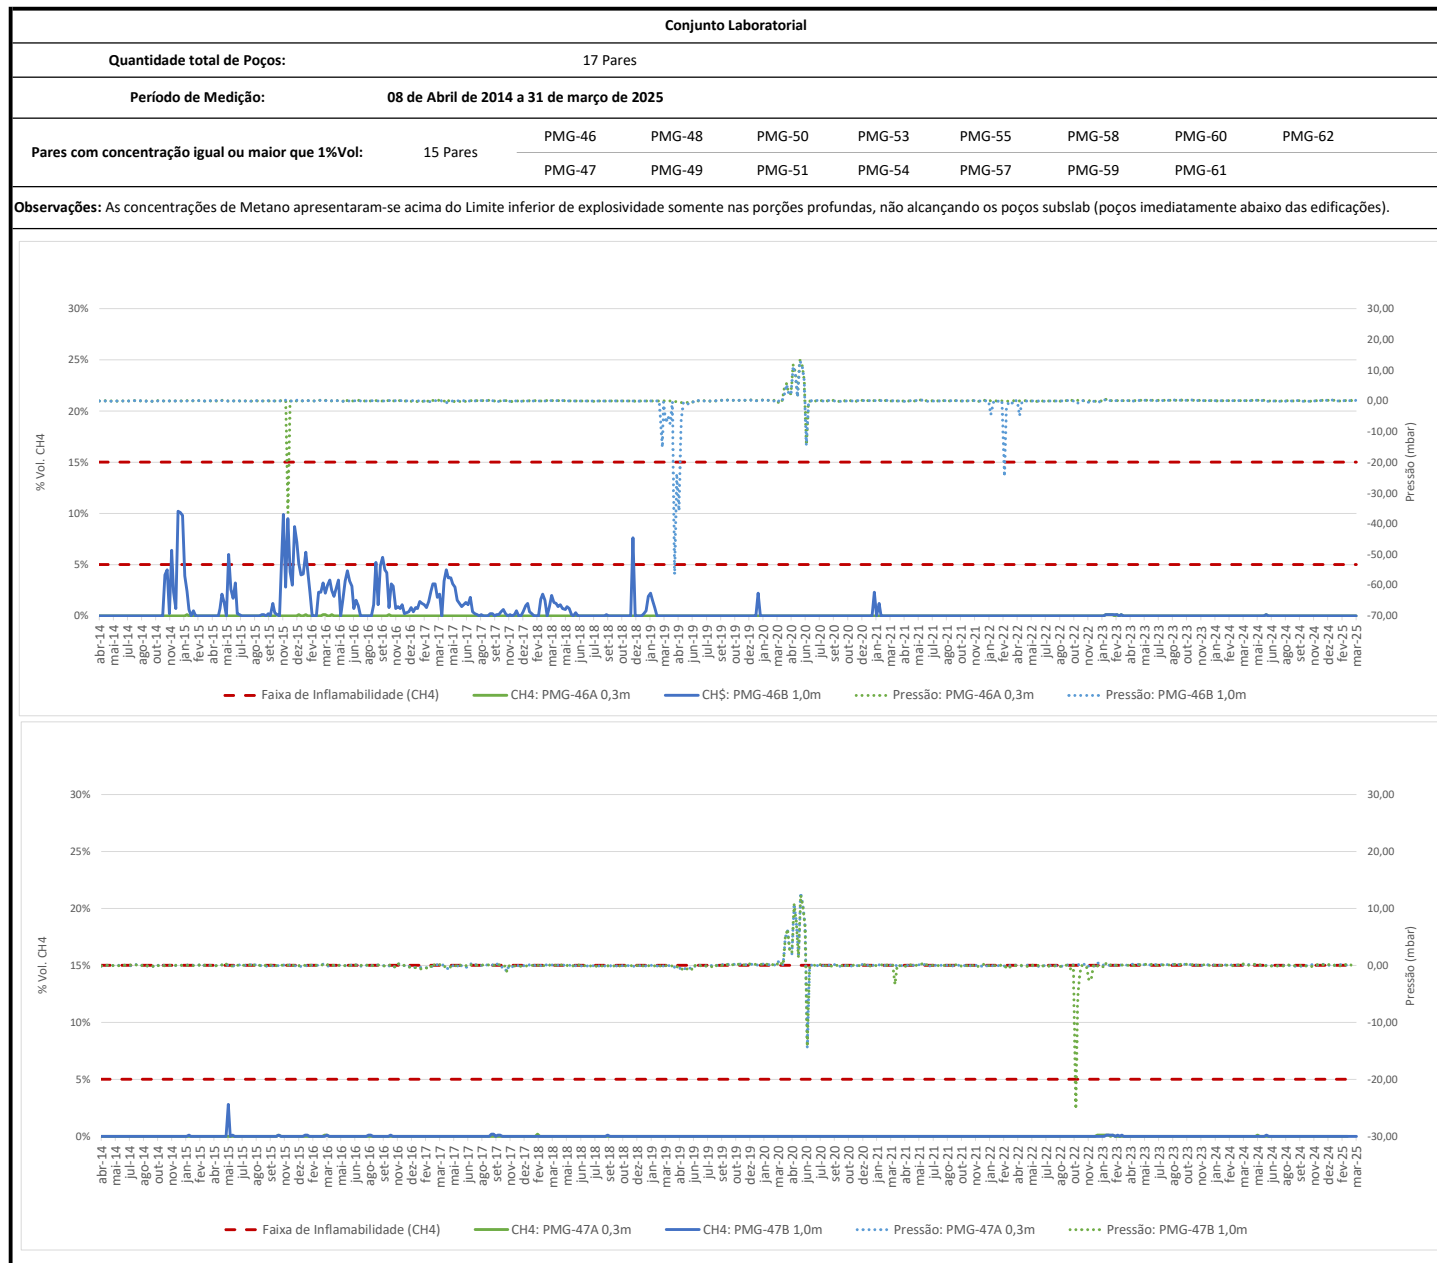






Conjunto Laboratorial									
Quantidade total de Poços:	17 Pares								
Período de Medição:	08 de Abril de 2014 a 31 de março de 2025								
Pares com concentração igual ou maior que 1%Vol:	15 Pares	PMG-46	PMG-48	PMG-50	PMG-53	PMG-55	PMG-58	PMG-60	PMG-62
		PMG-47	PMG-49	PMG-51	PMG-54	PMG-57	PMG-59	PMG-61	


Observações: As concentrações de Metano apresentaram-se acima do Limite inferior de explosividade somente nas porções profundas, não alcançando os poços subslab (poços imediatamente abaixo das edificações).

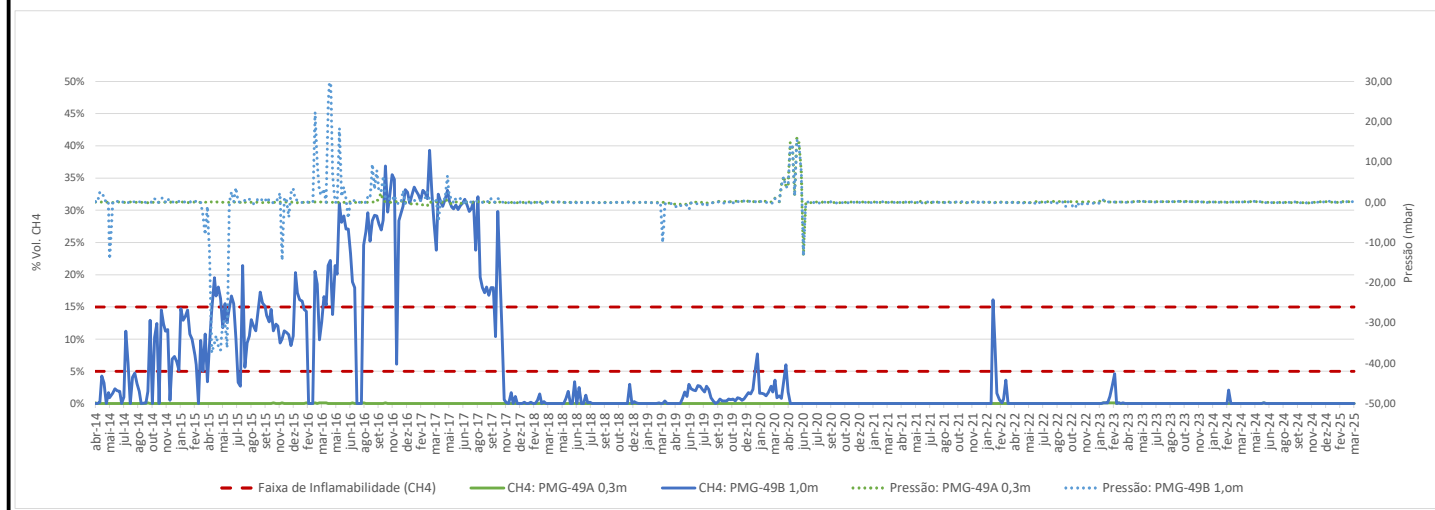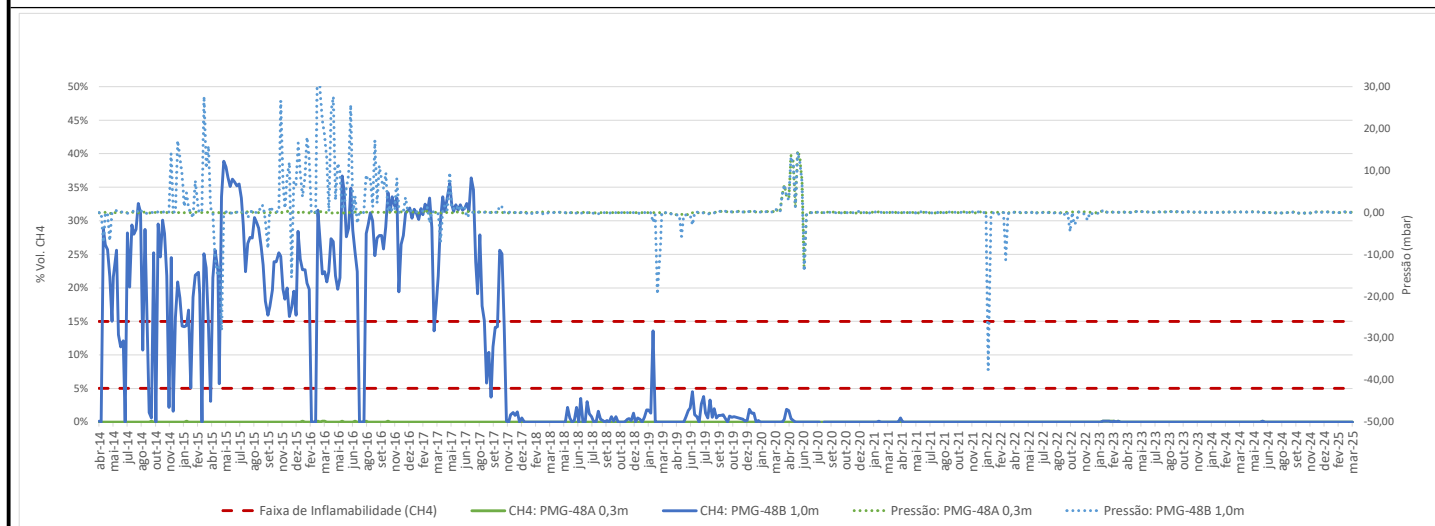


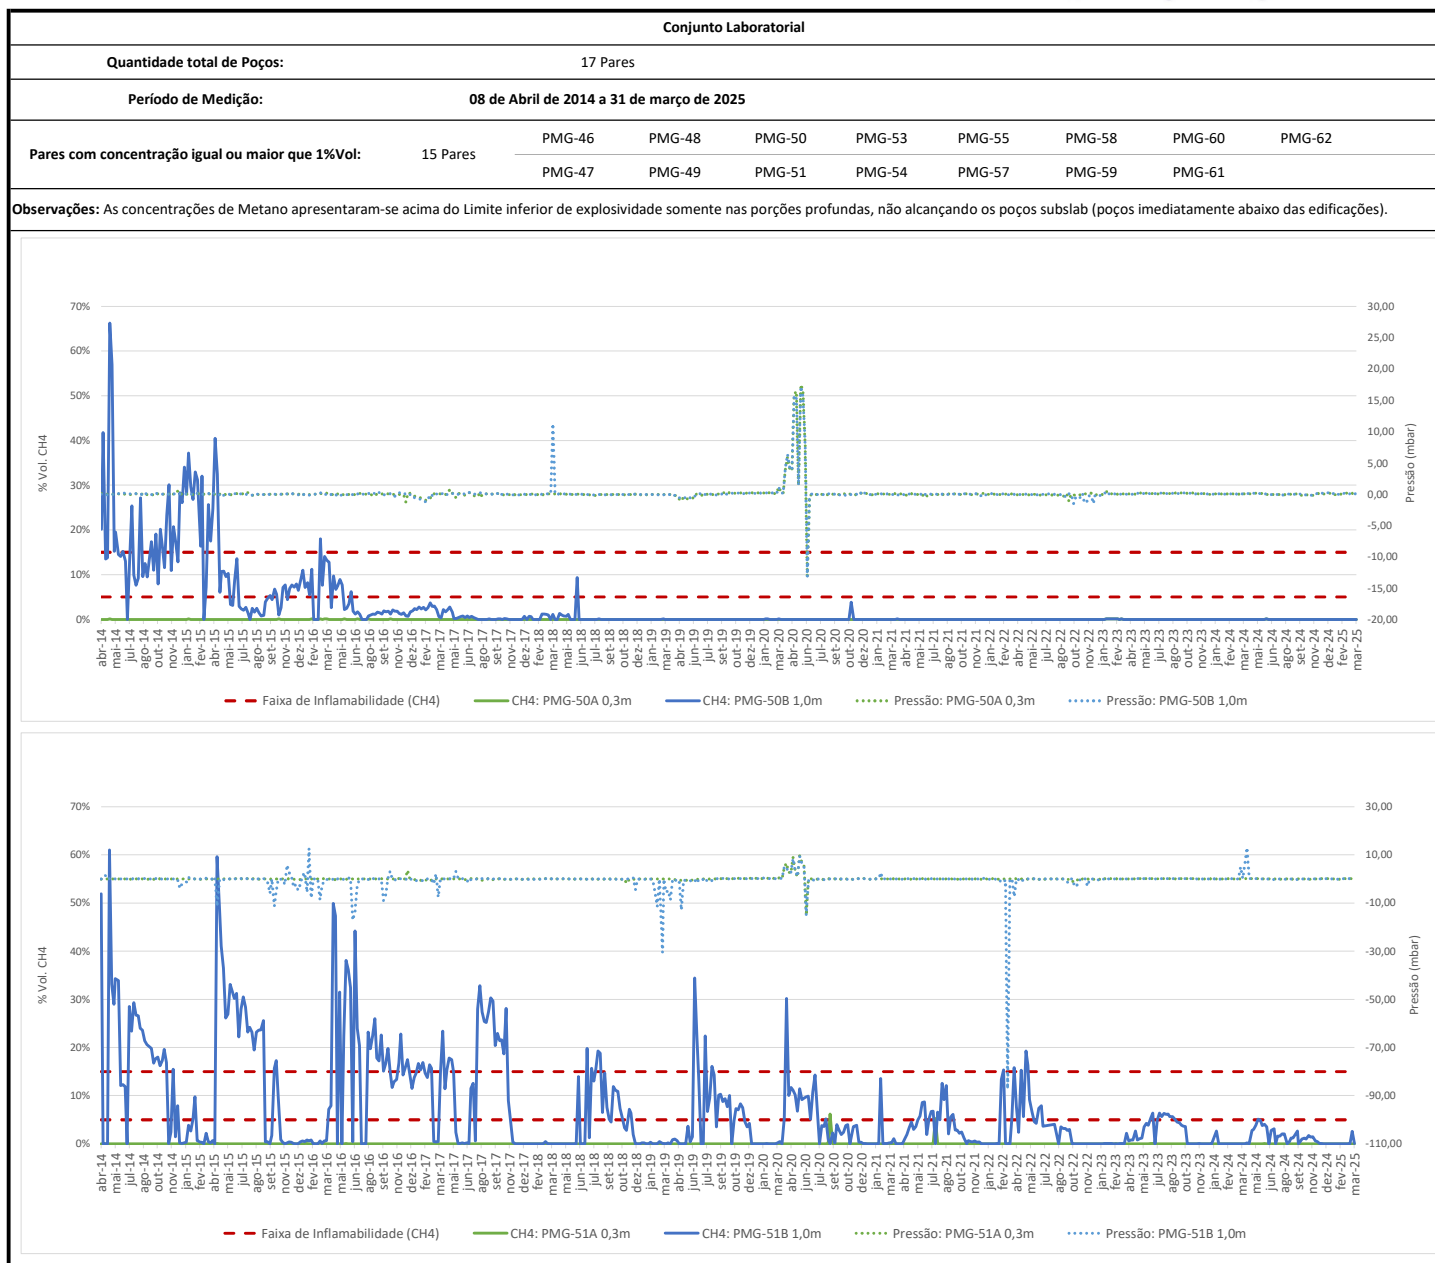


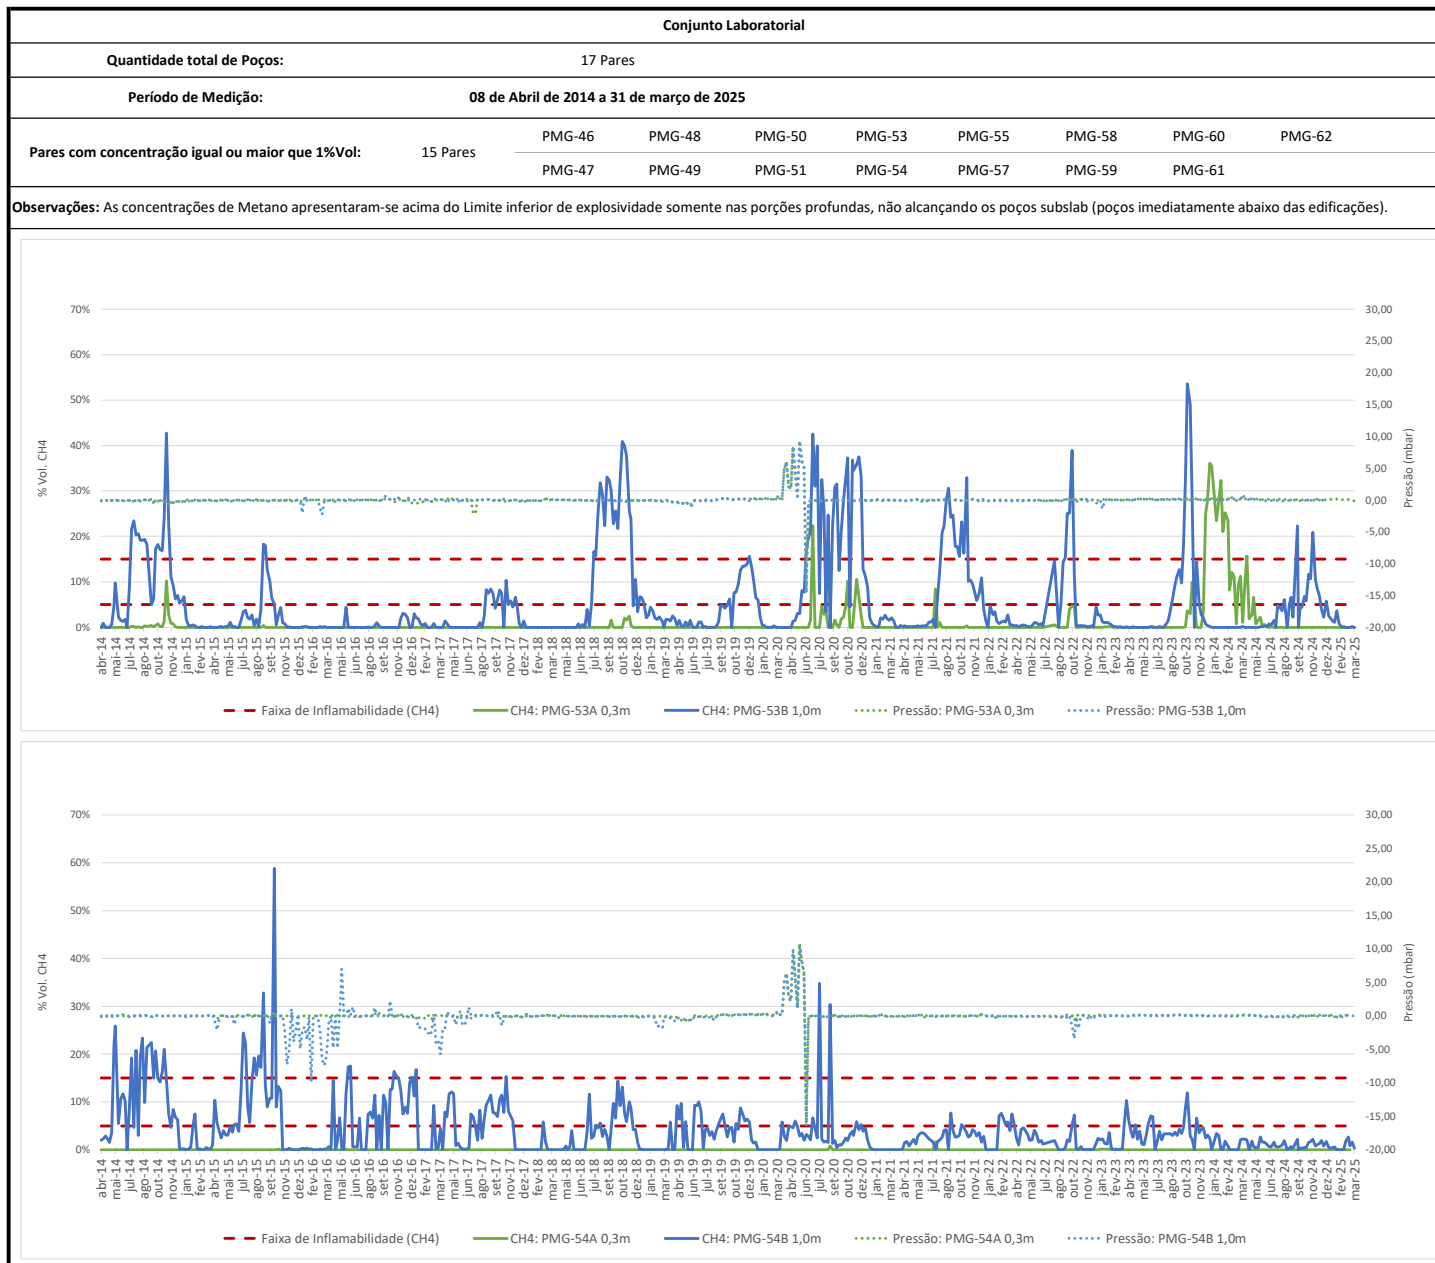


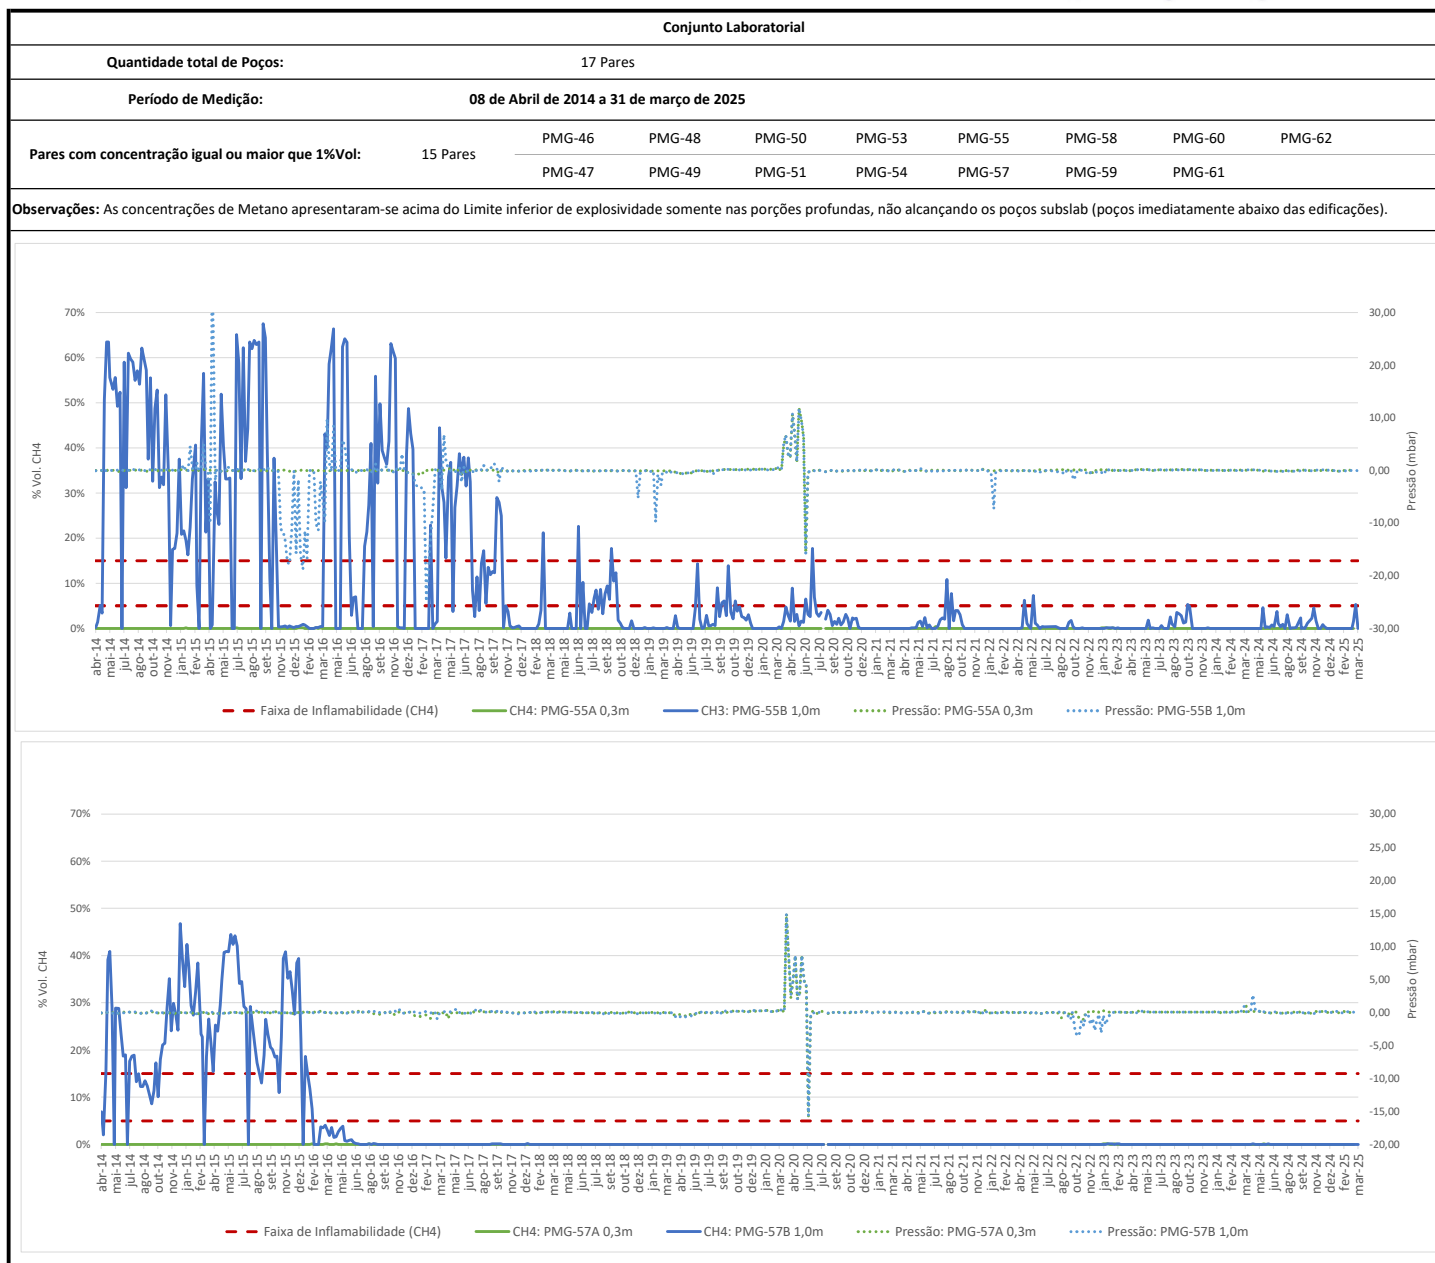


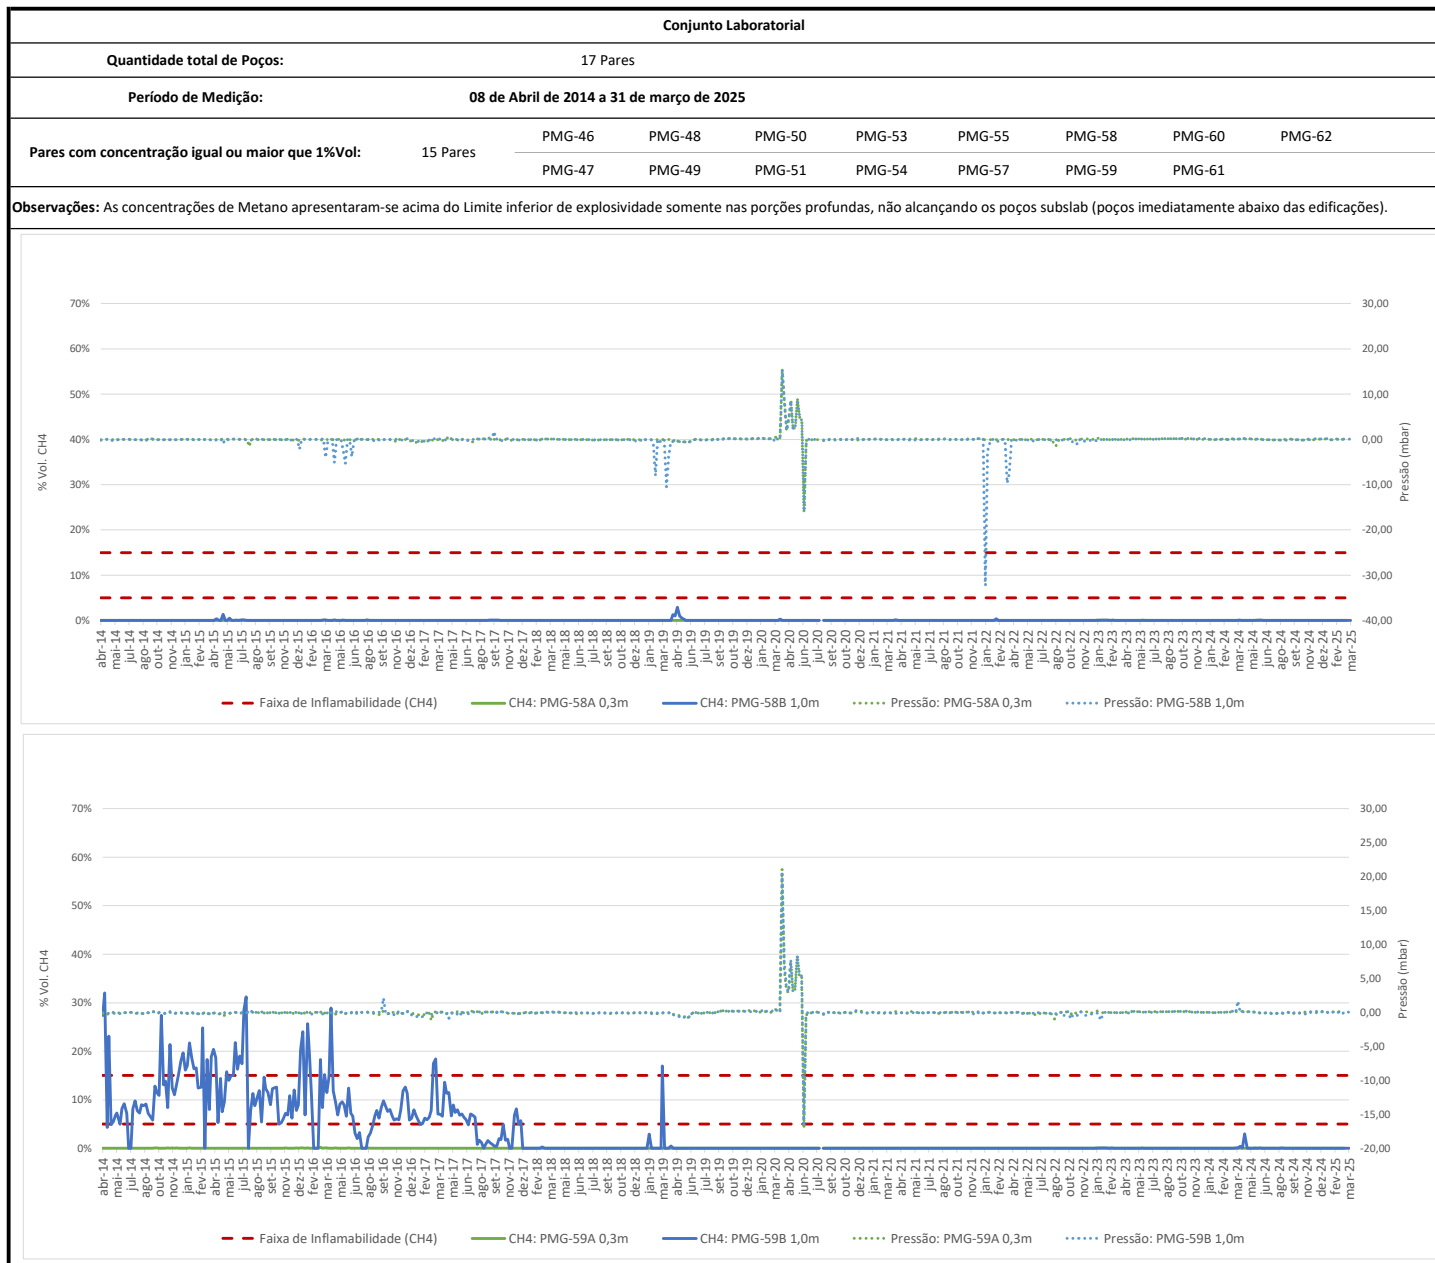

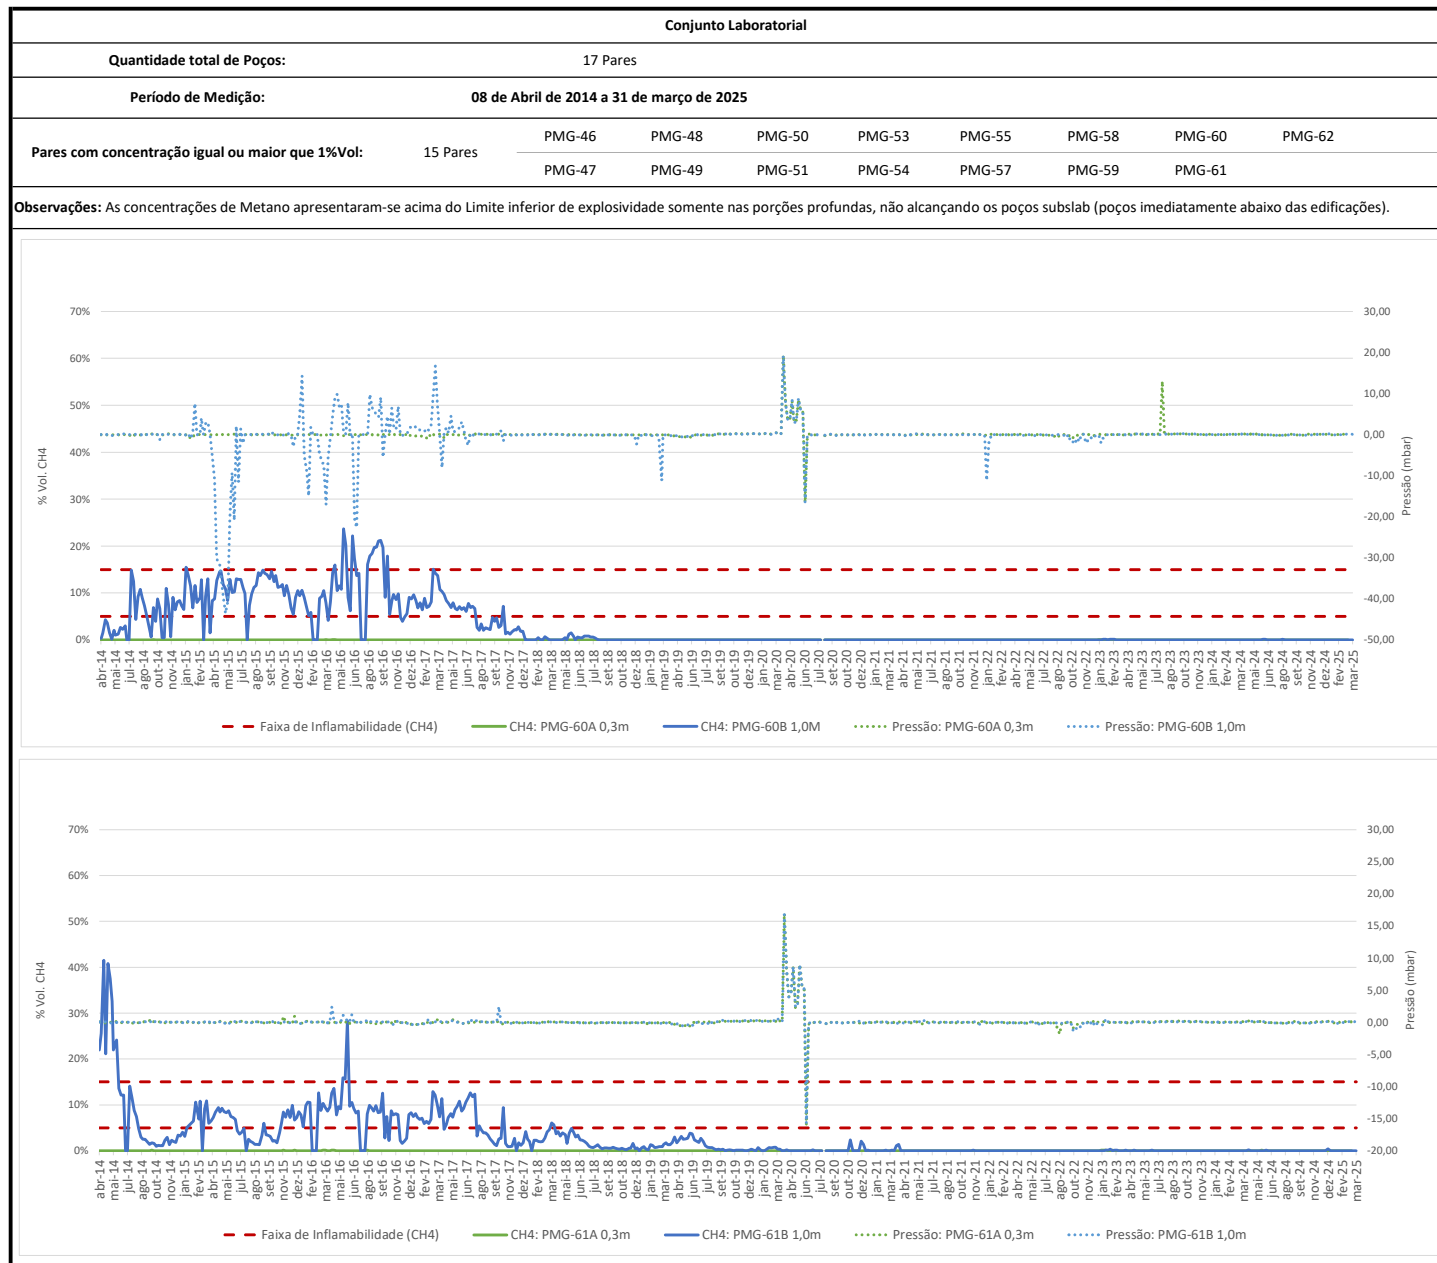


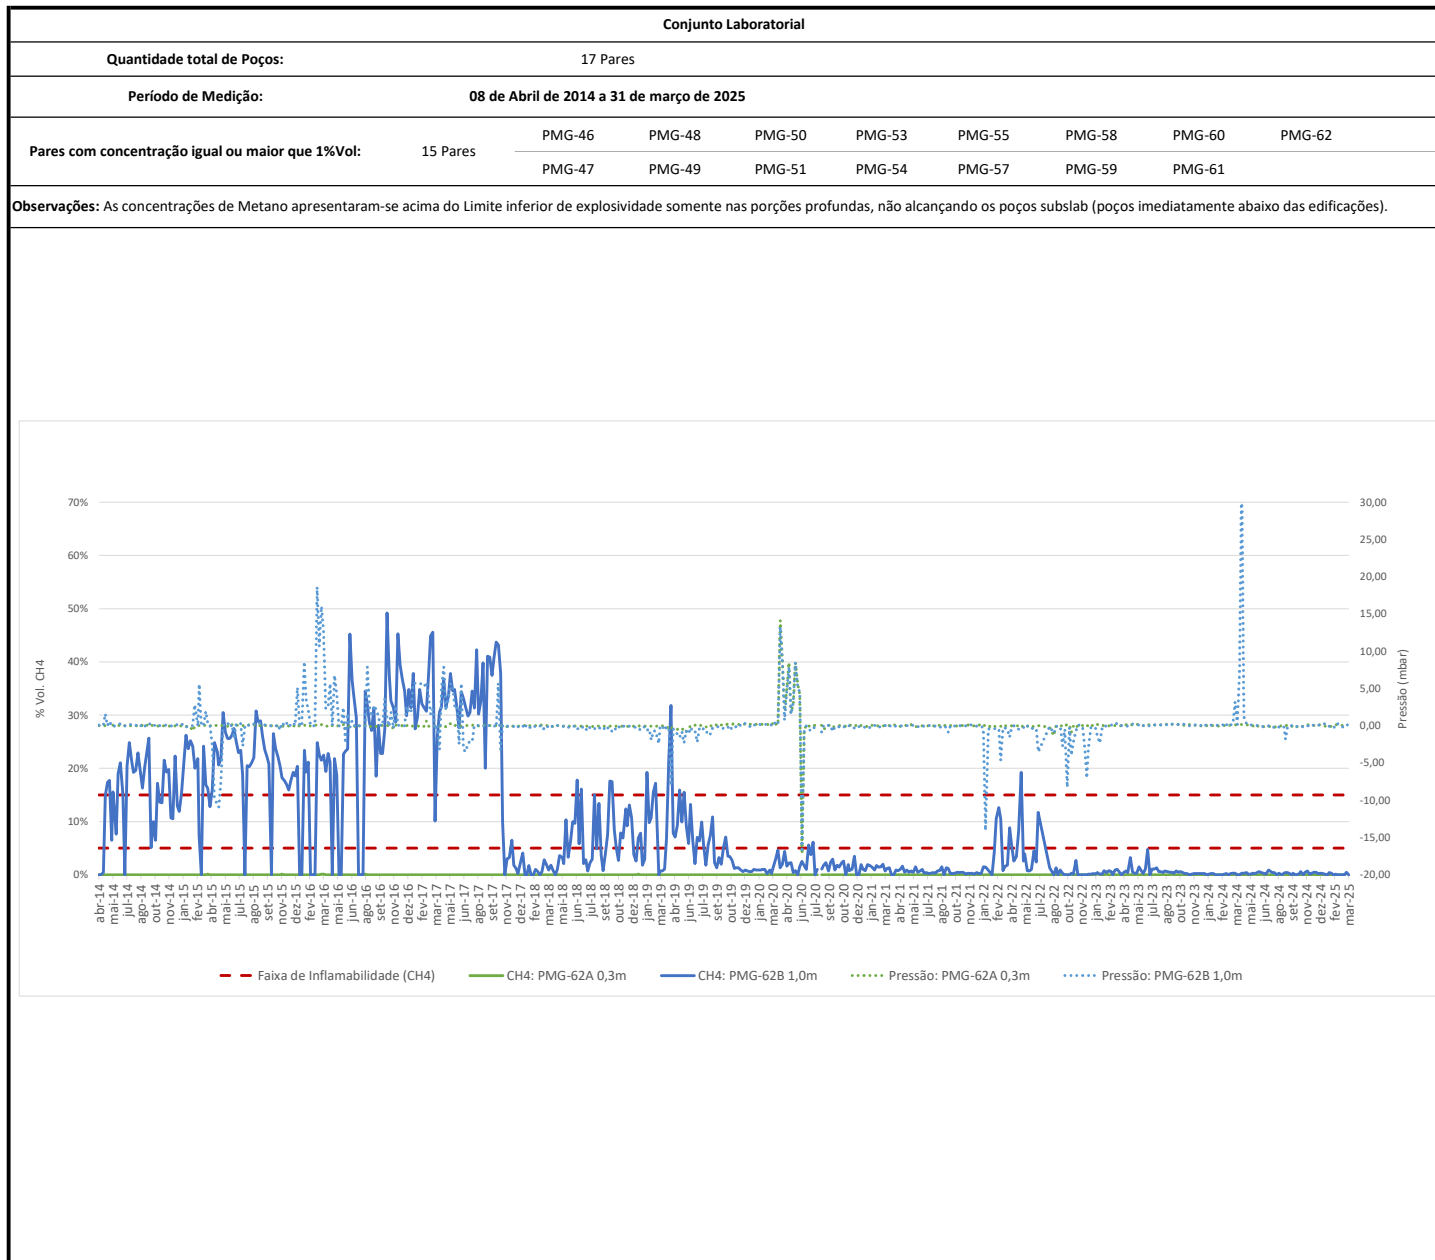


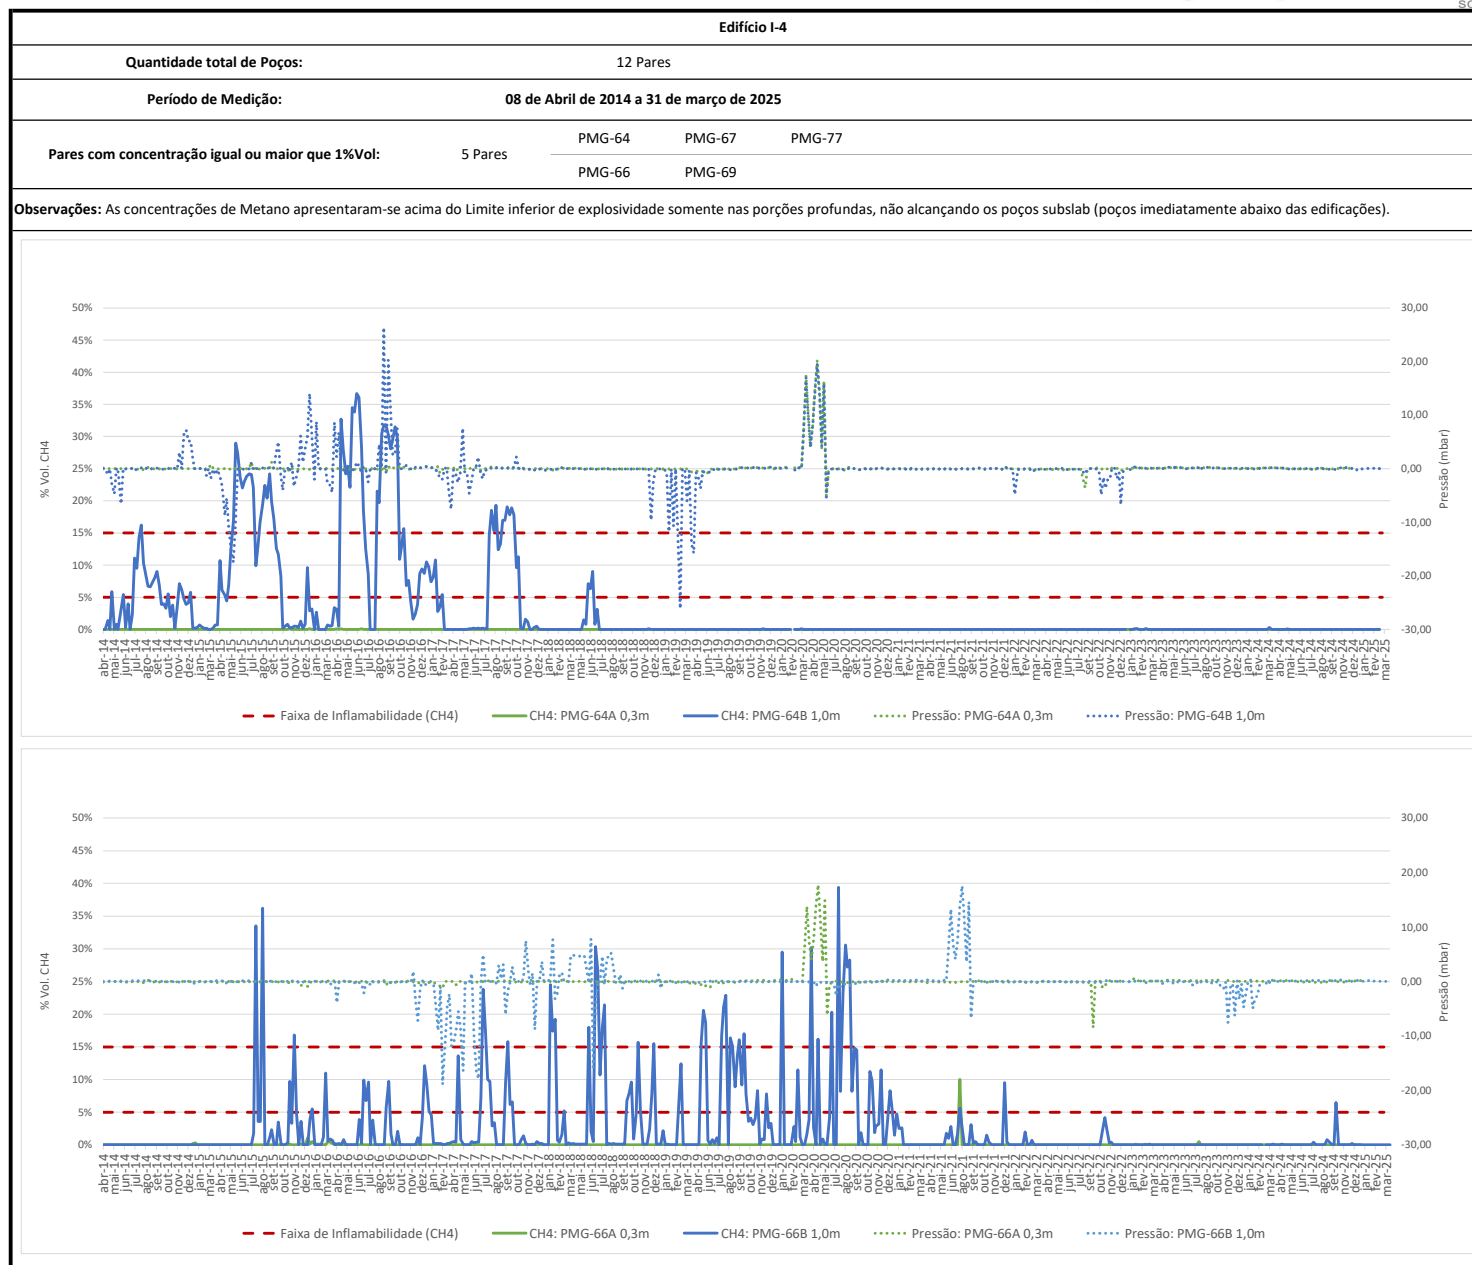

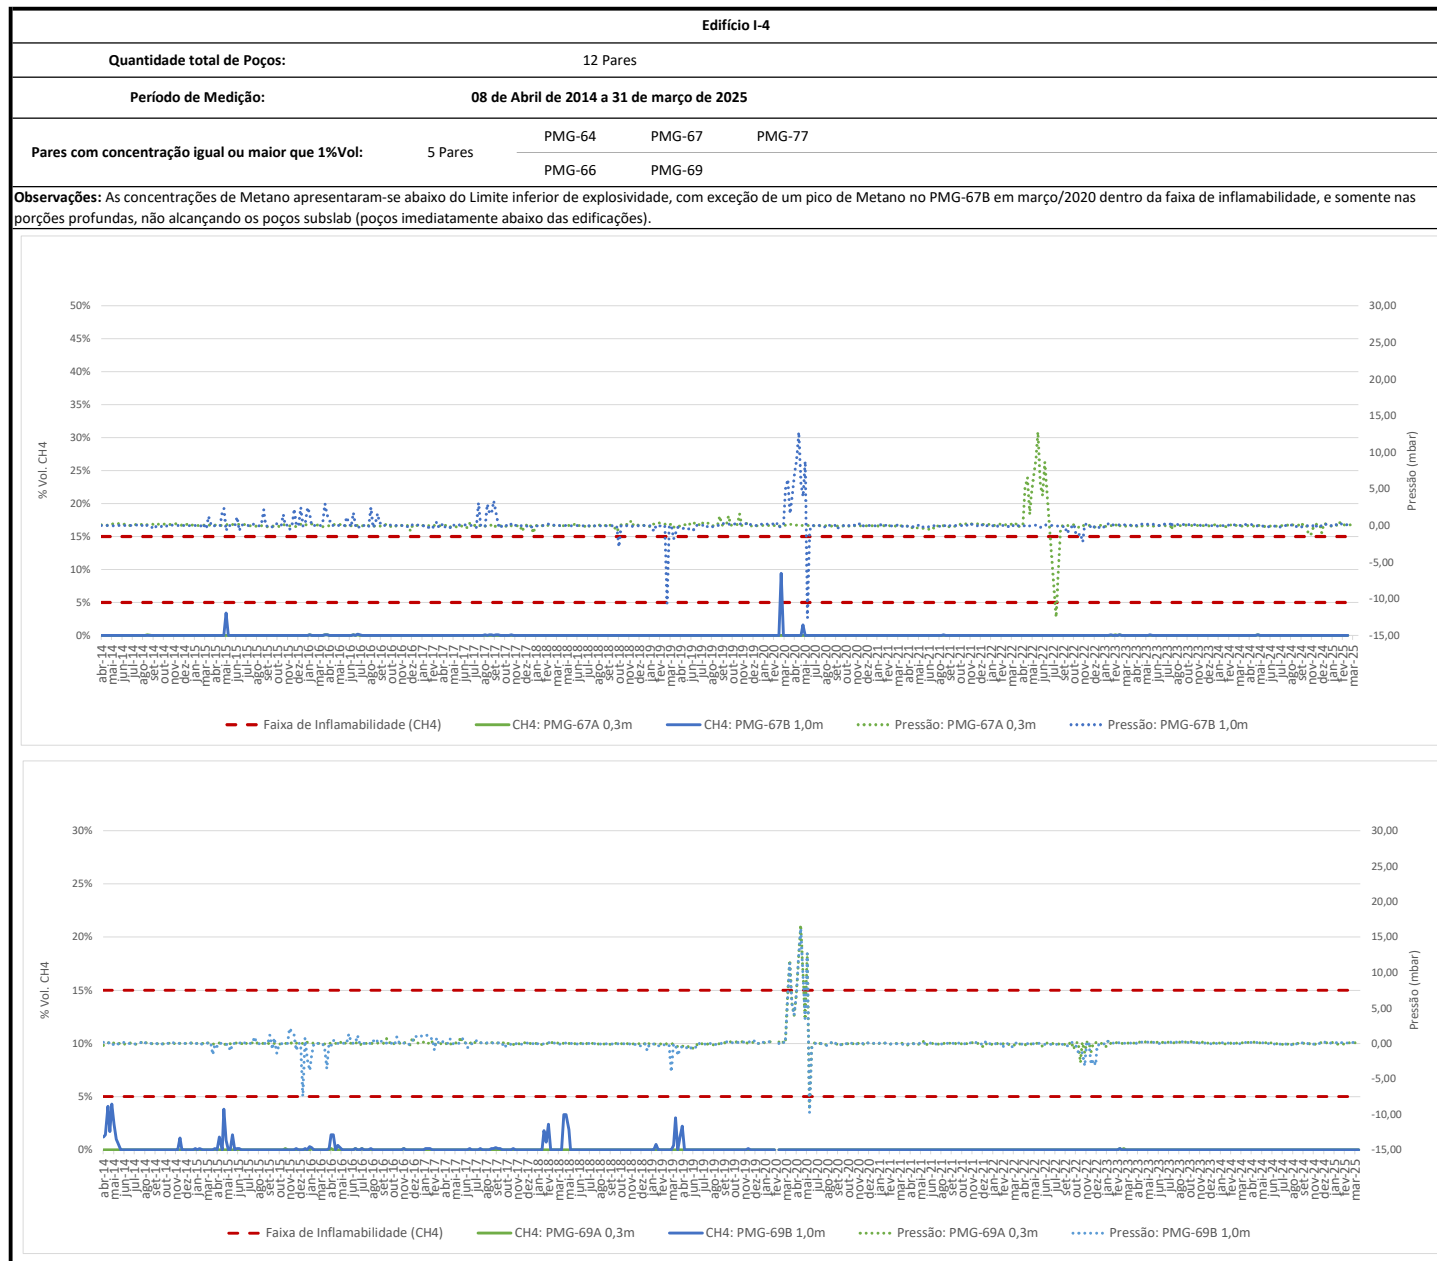



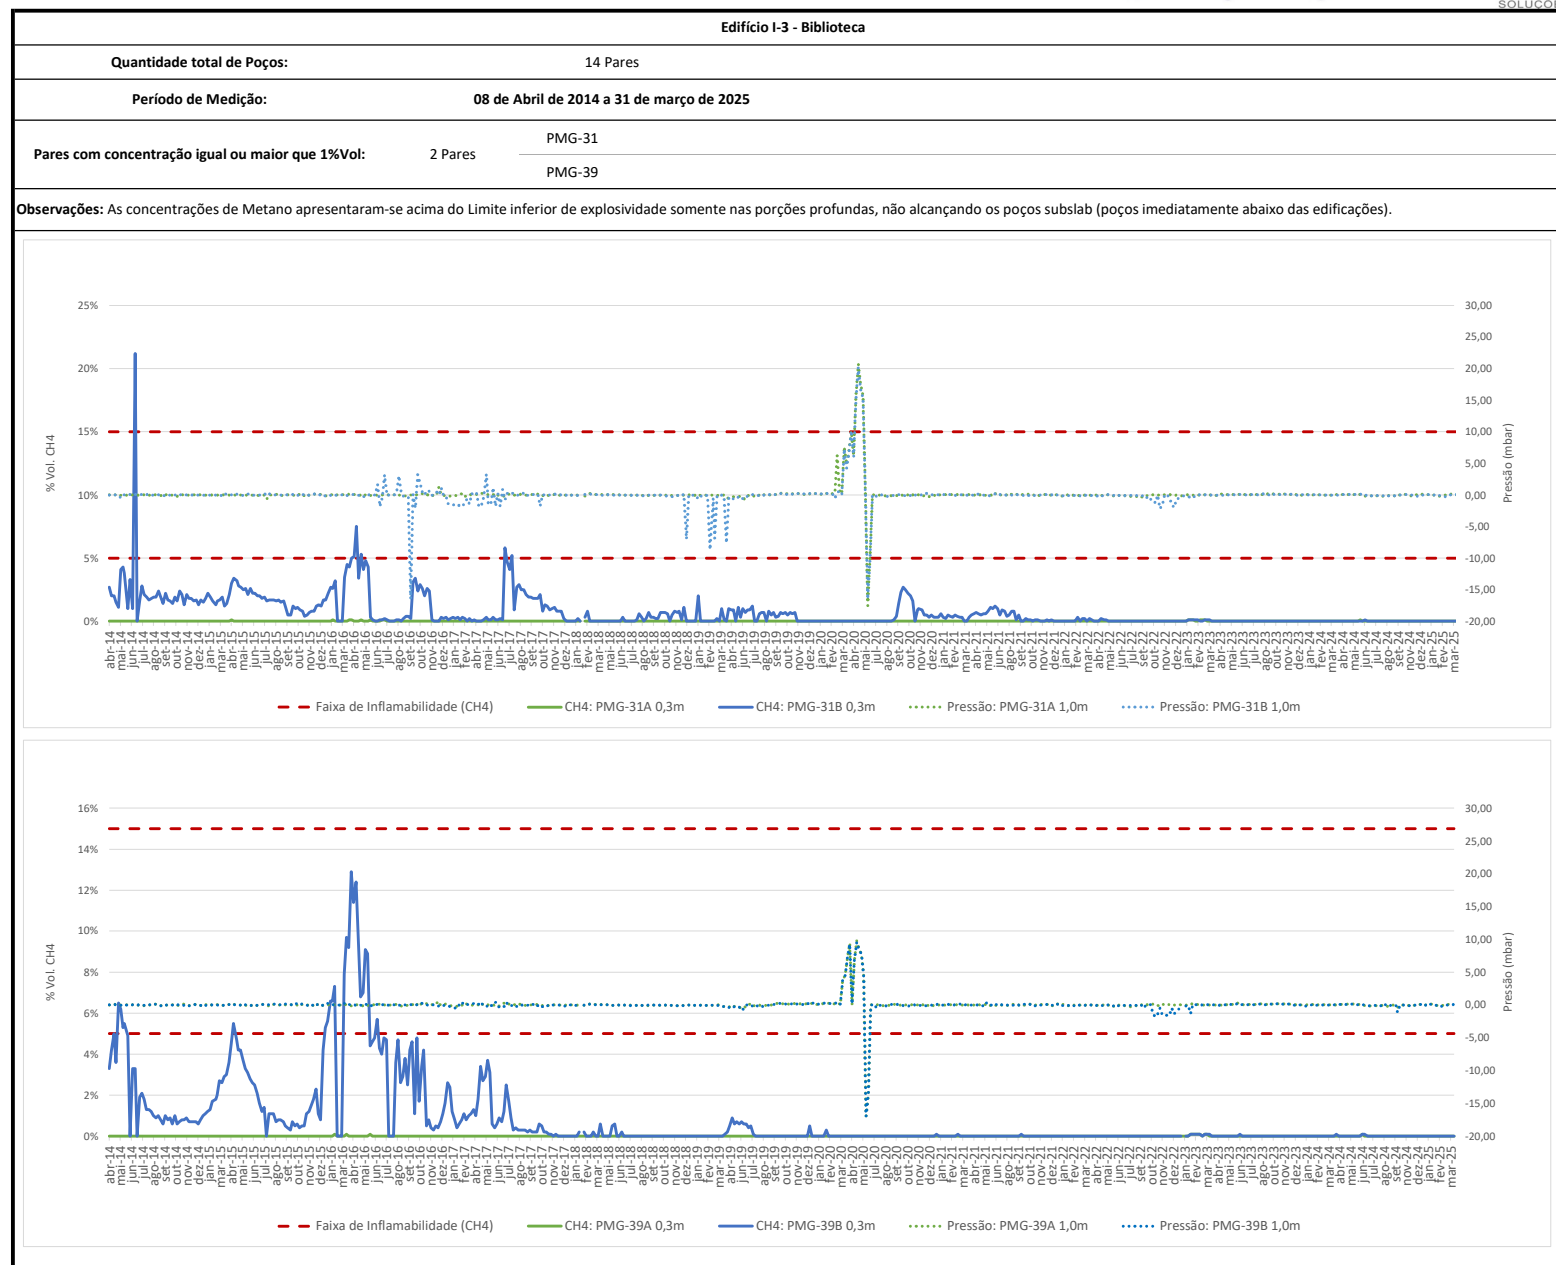

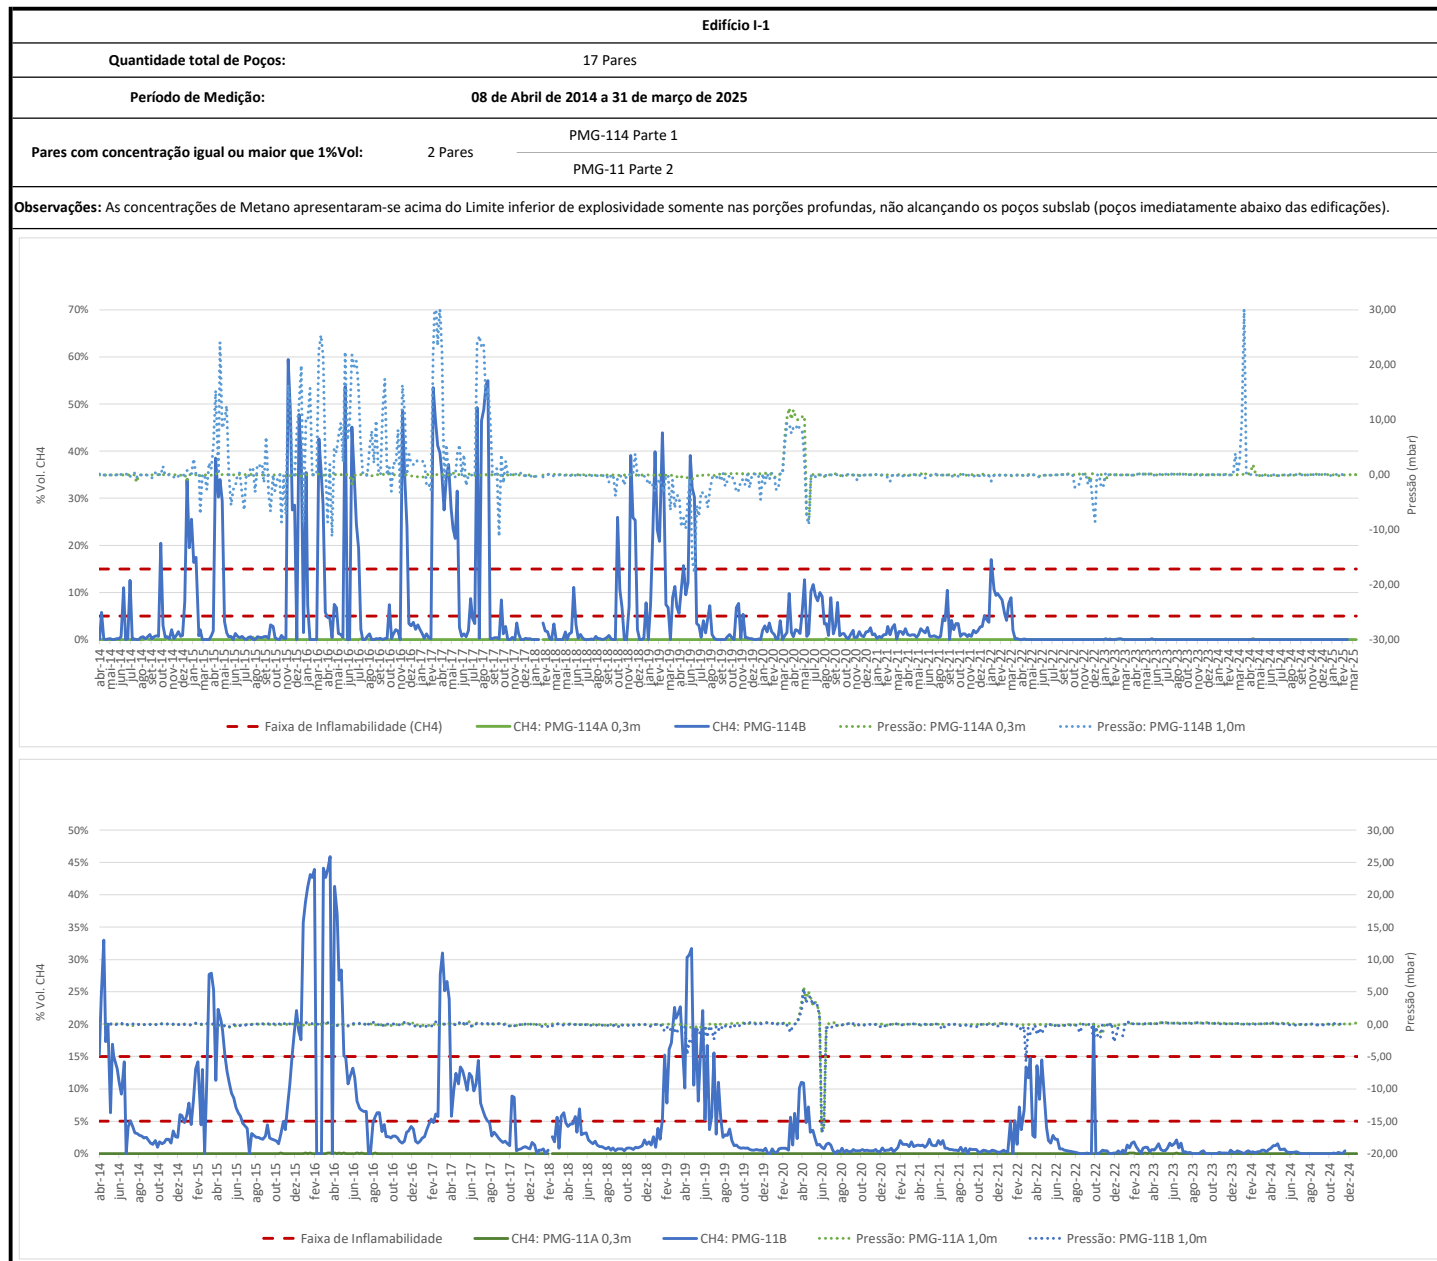



ANEXO 6

TABELAS DE MEDIÇÕES SEMANAIS NOS EXAUSTORES

Identificação do Exaustor	Semana	Operação	Vácuo da celula		PID	%LEL	Pressão	Observação
			(mmHg)	(mBar)	(ppm)	(5%Vol.)	(mBar)	
Exaustor I1	03/01/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,22	
Exaustor I1 (2)	03/01/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,48	
Exaustor IS Auditório	03/01/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,89	
Exaustor Biblioteca	03/01/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,73	
Exaustor Portaria 3	03/01/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,40	
Exaustor Ginásio	03/01/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,11	
Exaustor Enfermaria	03/01/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-5,62	
Exaustor CAT1	03/01/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,86	
Exaustor CAT2	03/01/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,74	
Exaustor Transportes	03/01/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,55	
Exaustor MI (B1)	03/01/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,47	
Exaustor MI (B2)	03/01/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,73	
Exaustor MI (B3)	03/01/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,53	
Exaustor Auditório 1	03/01/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,56	
Exaustor Auditório 2	03/01/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,39	
Exaustor Cantina	03/01/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,91	
Exaustor Corredor	03/01/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,58	
Exaustor Conj. Lab (A1)	03/01/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,41	
Exaustor Conj. Lab (A2)	03/01/2025	sim	-4,00	-2,66	0,00	0,00	-5,19	
Exaustor Conj. Lab (A3)	03/01/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,71	
Exaustor I4	03/01/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,16	
Exaustor Guarda	03/01/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,93	
Exaustor Reserva 1								
Exaustor Reserva 2								
Estão localizados no Edifício I1								
Exaustor I1	10/01/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,69	
Exaustor I1 (2)	10/01/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,81	
Exaustor IS Auditório	10/01/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,91	
Exaustor Biblioteca	10/01/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,75	
Exaustor Portaria 3	10/01/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,76	
Exaustor Ginásio	10/01/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,58	
Exaustor Enfermaria	10/01/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,69	
Exaustor CAT1	10/01/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,34	
Exaustor CAT2	10/01/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,51	
Exaustor Transportes	10/01/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,65	
Exaustor MI (B1)	10/01/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,45	
Exaustor MI (B2)	10/01/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,40	
Exaustor MI (B3)	10/01/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,28	
Exaustor Auditório 1	10/01/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,33	
Exaustor Auditório 2	10/01/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,26	
Exaustor Cantina	10/01/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,93	
Exaustor Corredor	10/01/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,51	
Exaustor Conj. Lab (A1)	10/01/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,94	
Exaustor Conj. Lab (A2)	10/01/2025	sim	-4,00	-2,66	0,00	0,00	-5,69	
Exaustor Conj. Lab (A3)	10/01/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,36	
Exaustor I4	10/01/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,76	
Exaustor Guarda	10/01/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,67	
Exaustor Reserva 1								
Exaustor Reserva 2								
Estão localizados no Edifício I1								
Exaustor I1	17/01/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,14	
Exaustor I1 (2)	17/01/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,07	
Exaustor IS Auditório	17/01/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,03	
Exaustor Biblioteca	17/01/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,92	
Exaustor Portaria 3	17/01/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,05	
Exaustor Ginásio	17/01/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,36	
Exaustor Enfermaria	17/01/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-5,22	
Exaustor CAT1	17/01/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,75	
Exaustor CAT2	17/01/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,01	
Exaustor Transportes	17/01/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,72	
Exaustor MI (B1)	17/01/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,49	
Exaustor MI (B2)	17/01/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,82	
Exaustor MI (B3)	17/01/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,52	
Exaustor Auditório 1	17/01/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,80	
Exaustor Auditório 2	17/01/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,53	
Exaustor Cantina	17/01/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,85	
Exaustor Corredor	17/01/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,24	
Exaustor Conj. Lab (A1)	17/01/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-5,14	
Exaustor Conj. Lab (A2)	17/01/2025	sim	-4,00	-2,66	0,00	0,00	-5,94	
Exaustor Conj. Lab (A3)	17/01/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,12	
Exaustor I4	17/01/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,14	
Exaustor Guarda	17/01/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,22	
Exaustor Reserva 1								
Exaustor Reserva 2								
Estão localizados no Edifício I1								
Exaustor I1	24/01/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,30	
Exaustor I1 (2)	24/01/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,25	
Exaustor IS Auditório	24/01/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,77	
Exaustor Biblioteca	24/01/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,17	
Exaustor Portaria 3	24/01/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,89	
Exaustor Ginásio	24/01/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,42	
Exaustor Enfermaria	24/01/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,87	
Exaustor CAT1	24/01/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,57	
Exaustor CAT2	24/01/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,37	
Exaustor Transportes	24/01/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,36	
Exaustor MI (B1)	24/01/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,82	
Exaustor MI (B2)	24/01/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,61	
Exaustor MI (B3)	24/01/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,12	
Exaustor Auditório 1	24/01/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,25	
Exaustor Auditório 2	24/01/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,37	
Exaustor Cantina	24/01/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,77	
Exaustor Corredor	24/01/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,77	
Exaustor Conj. Lab (A1)	24/01/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,58	
Exaustor Conj. Lab (A2)	24/01/2025	sim	-4,00	-2,66	0,00	0,00	-6,10	
Exaustor Conj. Lab (A3)	24/01/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,78	
Exaustor I4	24/01/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,98	
Exaustor Guarda	24/01/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,11	
Exaustor Reserva 1								
Exaustor Reserva 2								
Estão localizados no Edifício I1								

Identificação do Exaustor	Semana	Operação	Vácuo da célula		PID	%LEL	Pressão	Observação
			(mmHg)	(mBar)				
Exaustor I1	31/01/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,72	
Exaustor I1 (2)	31/01/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,77	
Exaustor I5 Auditório	31/01/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,99	
Exaustor Biblioteca	31/01/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,94	
Exaustor Portaria 3	31/01/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,03	
Exaustor Ginásio	31/01/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,79	
Exaustor Enfermaria	31/01/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-5,07	
Exaustor CAT1	31/01/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,32	
Exaustor CAT2	31/01/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,39	
Exaustor Transportes	31/01/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,77	
Exaustor MI (B1)	31/01/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,76	
Exaustor MI (B2)	31/01/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,99	
Exaustor MI (B3)	31/01/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,37	
Exaustor Auditório 1	31/01/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,51	
Exaustor Auditório 2	31/01/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,44	
Exaustor Cantina	31/01/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,13	
Exaustor Corredor	31/01/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,12	
Exaustor Conj. Lab (A1)	31/01/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-5,31	
Exaustor Conj. Lab (A2)	31/01/2025	sim	-4,00	-2,66	0,00	0,00	-5,31	
Exaustor Conj. Lab (A3)	31/01/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,04	
Exaustor I4	31/01/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,09	
Exaustor Guarda	31/01/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,48	
Exaustor Reserva 1								
Exaustor Reserva 2								
Estão localizados no Edifício I1								
Exaustor I1	07/02/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,94	
Exaustor I1 (2)	07/02/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,30	
Exaustor I5 Auditório	07/02/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,97	
Exaustor Biblioteca	07/02/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,47	
Exaustor Portaria 3	07/02/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,00	
Exaustor Ginásio	07/02/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,81	
Exaustor Enfermaria	07/02/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-5,94	
Exaustor CAT1	07/02/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,77	
Exaustor CAT2	07/02/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,97	
Exaustor Transportes	07/02/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,88	
Exaustor MI (B1)	07/02/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,72	
Exaustor MI (B2)	07/02/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,59	
Exaustor MI (B3)	07/02/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,48	
Exaustor Auditório 1	07/02/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,43	
Exaustor Auditório 2	07/02/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,45	
Exaustor Cantina	07/02/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,98	
Exaustor Corredor	07/02/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,93	
Exaustor Conj. Lab (A1)	07/02/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-5,37	
Exaustor Conj. Lab (A2)	07/02/2025	sim	-4,00	-2,66	0,00	0,00	-6,70	
Exaustor Conj. Lab (A3)	07/02/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,57	
Exaustor I4	07/02/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,97	
Exaustor Guarda	07/02/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,18	
Exaustor Reserva 1								
Exaustor Reserva 2								
Estão localizados no Edifício I1								
Exaustor I1	14/02/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,82	
Exaustor I1 (2)	14/02/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,13	
Exaustor I5 Auditório	14/02/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,61	
Exaustor Biblioteca	14/02/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,28	
Exaustor Portaria 3	14/02/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,24	
Exaustor Ginásio	14/02/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,60	
Exaustor Enfermaria	14/02/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-6,01	
Exaustor CAT1	14/02/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,60	
Exaustor CAT2	14/02/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,35	
Exaustor Transportes	14/02/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,89	
Exaustor MI (B1)	14/02/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,84	
Exaustor MI (B2)	14/02/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,67	
Exaustor MI (B3)	14/02/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,21	
Exaustor Auditório 1	14/02/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,30	
Exaustor Auditório 2	14/02/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,11	
Exaustor Cantina	14/02/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,92	
Exaustor Corredor	14/02/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,35	
Exaustor Conj. Lab (A1)	14/02/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-5,15	
Exaustor Conj. Lab (A2)	14/02/2025	sim	-4,00	-2,66	0,00	0,00	-6,59	
Exaustor Conj. Lab (A3)	14/02/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,20	
Exaustor I4	14/02/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,04	
Exaustor Guarda	14/02/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,94	
Exaustor Reserva 1								
Exaustor Reserva 2								
Estão localizados no Edifício I1								
Exaustor I1	21/02/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,61	
Exaustor I1 (2)	21/02/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,46	
Exaustor I5 Auditório	21/02/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,83	
Exaustor Biblioteca	21/02/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,30	
Exaustor Portaria 3	21/02/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,44	
Exaustor Ginásio	21/02/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,36	
Exaustor Enfermaria	21/02/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-5,58	
Exaustor CAT1	21/02/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,35	
Exaustor CAT2	21/02/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,30	
Exaustor Transportes	21/02/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,73	
Exaustor MI (B1)	21/02/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,68	
Exaustor MI (B2)	21/02/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,16	
Exaustor MI (B3)	21/02/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,38	
Exaustor Auditório 1	21/02/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,51	
Exaustor Auditório 2	21/02/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,42	
Exaustor Cantina	21/02/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,88	
Exaustor Corredor	21/02/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,77	
Exaustor Conj. Lab (A1)	21/02/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-5,20	
Exaustor Conj. Lab (A2)	21/02/2025	sim	-4,00	-2,66	0,00	0,00	-6,99	
Exaustor Conj. Lab (A3)	21/02/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,85	
Exaustor I4	21/02/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,81	
Exaustor Guarda	21/02/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,99	
Exaustor Reserva 1								
Exaustor Reserva 2								
Estão localizados no Edifício I1								



Identificação do Exaustor	Semana	Operação	Vácuo da célula		PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	Pressão (mBar)	Observação
			(mmHg)	(mBar)				
Exaustor I1	28/02/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,56	
Exaustor I1 (2)	28/02/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,25	
Exaustor IS Auditório	28/02/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,70	
Exaustor Biblioteca	28/02/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,56	
Exaustor Portaria 3	28/02/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,56	
Exaustor Ginásio	28/02/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,33	
Exaustor Enfermaria	28/02/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-5,77	
Exaustor CAT1	28/02/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,52	
Exaustor CAT2	28/02/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,88	
Exaustor Transportes	28/02/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,87	
Exaustor MI (B1)	28/02/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,54	
Exaustor MI (B2)	28/02/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,38	
Exaustor MI (B3)	28/02/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,85	
Exaustor Auditório 1	28/02/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,01	
Exaustor Auditório 2	28/02/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,30	
Exaustor Cantina	28/02/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,88	
Exaustor Corredor	28/02/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,10	
Exaustor Conj. Lab (A1)	28/02/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-5,13	
Exaustor Conj. Lab (A2)	28/02/2025	sim	-4,00	-2,66	0,00	0,00	-6,09	
Exaustor Conj. Lab (A3)	28/02/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,60	
Exaustor I4	28/02/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,69	
Exaustor Guarda	28/02/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,71	
Exaustor Reserva 1								
Exaustor Reserva 2								
Exaustor I1	07/03/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,65	
Exaustor I1 (2)	07/03/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,31	
Exaustor IS Auditório	07/03/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,08	
Exaustor Biblioteca	07/03/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,69	
Exaustor Portaria 3	07/03/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,11	
Exaustor Ginásio	07/03/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,45	
Exaustor Enfermaria	07/03/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-5,03	
Exaustor CAT1	07/03/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,47	
Exaustor CAT2	07/03/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,21	
Exaustor Transportes	07/03/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,52	
Exaustor MI (B1)	07/03/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,75	
Exaustor MI (B2)	07/03/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,79	
Exaustor MI (B3)	07/03/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,57	
Exaustor Auditório 1	07/03/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,21	
Exaustor Auditório 2	07/03/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,24	
Exaustor Cantina	07/03/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,81	
Exaustor Corredor	07/03/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,38	
Exaustor Conj. Lab (A1)	07/03/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-5,64	
Exaustor Conj. Lab (A2)	07/03/2025	sim	-4,00	-2,66	0,00	0,00	-5,49	
Exaustor Conj. Lab (A3)	07/03/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,11	
Exaustor I4	07/03/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,09	
Exaustor Guarda	07/03/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,80	
Exaustor Reserva 1								
Exaustor Reserva 2								
Exaustor I1	14/03/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,83	
Exaustor I1 (2)	14/03/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,43	
Exaustor IS Auditório	14/03/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,93	
Exaustor Biblioteca	14/03/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,82	
Exaustor Portaria 3	14/03/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,96	
Exaustor Ginásio	14/03/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,29	
Exaustor Enfermaria	14/03/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-5,12	
Exaustor CAT1	14/03/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,59	
Exaustor CAT2	14/03/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,09	
Exaustor Transportes	14/03/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,76	
Exaustor MI (B1)	14/03/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,89	
Exaustor MI (B2)	14/03/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,72	
Exaustor MI (B3)	14/03/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,43	
Exaustor Auditório 1	14/03/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,31	
Exaustor Auditório 2	14/03/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,14	
Exaustor Cantina	14/03/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,76	
Exaustor Corredor	14/03/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,27	
Exaustor Conj. Lab (A1)	14/03/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-5,56	
Exaustor Conj. Lab (A2)	14/03/2025	sim	-4,00	-2,66	0,00	0,00	-5,46	
Exaustor Conj. Lab (A3)	14/03/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,05	
Exaustor I4	14/03/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,95	
Exaustor Guarda	14/03/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,82	
Exaustor Reserva 1								
Exaustor Reserva 2								
Exaustor I1	21/03/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,51	
Exaustor I1 (2)	21/03/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,75	
Exaustor IS Auditório	21/03/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,82	
Exaustor Biblioteca	21/03/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,19	
Exaustor Portaria 3	21/03/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,92	
Exaustor Ginásio	21/03/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,11	
Exaustor Enfermaria	21/03/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-5,62	
Exaustor CAT1	21/03/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,56	
Exaustor CAT2	21/03/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,35	
Exaustor Transportes	21/03/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,55	
Exaustor MI (B1)	21/03/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,83	
Exaustor MI (B2)	21/03/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,62	
Exaustor MI (B3)	21/03/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,59	
Exaustor Auditório 1	21/03/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,36	
Exaustor Auditório 2	21/03/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,51	
Exaustor Cantina	21/03/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,67	
Exaustor Corredor	21/03/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,25	
Exaustor Conj. Lab (A1)	21/03/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-5,35	
Exaustor Conj. Lab (A2)	21/03/2025	sim	-4,00	-2,66	0,00	0,00	-5,94	
Exaustor Conj. Lab (A3)	21/03/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,24	
Exaustor I4	21/03/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,02	
Exaustor Guarda	21/03/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,81	
Exaustor Reserva 1								
Exaustor Reserva 2								
Exaustor I1	28/03/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,24	
Exaustor I1 (2)	28/03/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,46	
Exaustor IS Auditório	28/03/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,78	
Exaustor Biblioteca	28/03/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,37	
Exaustor Portaria 3	28/03/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,62	



Identificação do Exaustor	Semana	Operação	Vácuo da célula		PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	Pressão (mBar)	Observação
			(mmHg)	(mBar)				
Exaustor Ginásio	28/03/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,93	
Exaustor Enfermaria	28/03/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-5,48	
Exaustor CAT1	28/03/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,71	
Exaustor CAT2	28/03/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,42	
Exaustor Transportes	28/03/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-5,06	
Exaustor MI (B1)	28/03/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,62	
Exaustor MI (B2)	28/03/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,17	
Exaustor MI (B3)	28/03/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,44	
Exaustor Auditório 1	28/03/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,51	
Exaustor Auditório 2	28/03/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,45	
Exaustor Cantina	28/03/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,81	
Exaustor Corredor	28/03/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,06	
Exaustor Conj. Lab (A1)	28/03/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-5,28	
Exaustor Conj. Lab (A2)	28/03/2025	sim	-4,00	-2,66	0,00	0,00	-5,64	
Exaustor Conj. Lab (A3)	28/03/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,16	
Exaustor I4	28/03/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,93	
Exaustor Guarda	28/03/2025	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,48	
Exaustor Reserva 1	Estão localizados no Edifício 11							
Exaustor Reserva 2								



ANEXO 7

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

_____, cujo CPF _____, em conjunto com Felipe Martins Chufi, cujo CPF 326.774.078-92, declaram, sob as penas da lei e de responsabilização administrativa, civil e penal, que todas as informações prestadas à CETESB – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, no Relatório Técnico “Monitoramento de Intrusão de Gases em Ambientes Fechados – USP Leste – Relatório de Evolução 1º Trimestre/2025”, realizado na AI-1 da USP Leste, localizada na Rua Arlindo Béttio, 1.000, Ermelino Matarazzo – São Paulo/SP, de abril de 2025, são verdadeiras e contemplam integralmente as exigências estabelecidas pela CETESB e se encontram em consonância com o que determinam o regulamento da Lei nº 13.577/2009, aprovado pelo Decreto nº 59.263/2013, e os Procedimentos para Proteção da Qualidade do Solo e Gerenciamento de Áreas Contaminadas aprovado em Decisão de Diretoria da CETESB, publicada no Diário Oficial do Estado no dia 10/02/2017.

Declaram, ainda estar cientes de que os documentos e laudos que subsidiam as informações prestadas à CETESB poderão ser requisitados a qualquer momento, durante ou após a implementação do procedimento previsto no documento Procedimentos para Proteção da Qualidade do Solo e Gerenciamento de Áreas Contaminadas, para fins de auditoria.

São Paulo, 17 de abril de 2025.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – CAMPUS LESTE

CNPJ: 63.025.530/0062-26

Nome do Responsável Legal:

RG:

CPF:



ENGESOLVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS INTEGRADAS LTDA

CNPJ 23.559.934/0001-63

Nome do Responsável Técnico: Felipe Martins Chufi

RG: 29.447.243-5

CPF: 326.774.078-92

1 O artigo 69-A da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 (Lei de Crimes Ambientais) estabelece: “Elaborar ou apresentar, no licenciamento, concessão florestal ou qualquer outro procedimento administrativo, estudo, laudo ou relatório ambiental total ou parcialmente falso ou enganoso, inclusive por omissão:

Pena - reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.

§ 1º Se o crime é culposo: Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos.

§ 2º A pena é aumentada de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços), se há dano significativo ao meio ambiente, em decorrência do uso da informação falsa, incompleta ou enganosa”.



ANEXO 8

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

ART de Obra ou Serviço
2620241434975

1. Responsável Técnico

FELIPE MARTINS CHUFI

Título Profissional: Engenheiro Ambiental

Empresa Contratada: ENGESOLVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS INTEGRADAS LTDA

RNP: 2608845975

Registro: 5063256720-SP

Registro: 2031192-SP

2. Dados do Contrato

Contratante: UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

CPF/CNPJ: 63.025.530/0114-91

Endereço: Rua Arlindo Bettio

Nº:

Complemento: Saída do km 17,5 da Rodovia Ayrton Senna

Bairro: Vila Guaraciaba

Cidade: São Paulo

UF: SP

CEP: 03828-000

Contrato: 0000001/2022 - PUSP-CL

Celebrado em: 24/07/2024

Vinculada à Art nº: 28027230221208991

Valor: R\$ 154148,42

Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional:

3. Dados da Obra Serviço

Endereço: Rua Arlindo Bettio

Nº:

Complemento: Saída do km 17,5 da Rodovia Ayrton Senna

Bairro: Vila Guaraciaba

Cidade: São Paulo

UF: SP

CEP: 03828-000

Data de Início: 04/08/2024

Previsão de Término: 03/08/2025

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Ambiental

Código:

4. Atividade Técnica

Execução

		Quantidade	Unidade
1	Execução de serviço técnico de controle ambiental passivo ambiental	1,00000	unidade

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Avaliação de Passivo Ambiental: Operação, Manutenção e Monitoramento de Poços de Gás (CH4), Pontos na Estrutura e de Sistemas de Ventilação de Gases através do PROCESSO Nº 22.1.18.95.7, Contrato Nº. 02/2022 - 2º Termo de aditivo.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

Nenhuma

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

São Paulo 08 de outubro de 2024

Local

data

FELIPE MARTINS CHUFI - CPF: 326.774.078-92

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CPF/CNPJ: 63.025.530/0114-91

9. Informações

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados constantes no rodapé-versão do sistema, certificada pelo Nosso Número.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br
Tel: 0800 017 18 11

E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima



