UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – USP

PREFEITURA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – ÁREA CAPITAL LESTE (PUSP-LESTE)

EVOLUÇÃO DO MONITORAMENTO DE INTRUSÃO DE GASES E DA OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE VENTILAÇÃO

2º TRIMESTRE/2025 (ABRIL A JUNHO)

RUA ARLINDO BÉTTIO, 1.000, ERMELINO MATARAZZO, SÃO PAULO, SP

Contrato nº 0000001/2022 – PUSP – CL
Processo Administrativo: 22.1.18.95.7

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – USP

PREFEITURA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – ÁREA CAPITAL LESTE (PUSP-LESTE)

EVOLUÇÃO DO MONITORAMENTO DE INTRUSÃO DE GASES E DA OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE VENTILAÇÃO

2º TRIMESTRE/2025 (ABRIL A JUNHO)

RUA ARLINDO BÉTTIO, 1.000, ERMELINO MATARAZZO, SÃO PAULO, SP

São Paulo, 28 de julho de 2025

Avenida Paulista, 2064 - 14° Andar I Bela Vista I 01310-200 I São Paulo - SP I 11 2844 4386 engesolve.com.br

RESUMO EXECUTIVO

A ENGESOLVE Soluções Ambientais Ltda. foi contratada pela Prefeitura da Universidade de São Paulo – Área Capital Leste (PUSP-LESTE) para a operação, manutenção dos sistemas de ventilação de gases no solo, bem como o monitoramento de poços de gás e pontos na infraestrutura instalados em edificações da EACH na USP Leste, localizada na Rua Arlindo Béttio, 1.000 – Ermelino Matarazzo, São Paulo/SP, conforme o Processo Administrativo 22.1.18.95.7, Pregão Eletrônico nº 00002/2022 – PUSP – CL e Contrato nº 0000001/2022 – PUSP – CL.

O objetivo da operação dos sistemas de ventilação é impedir o acúmulo de gases sob a laje dos edifícios, aliado ao monitoramento preventivo de intrusão de gases nos ambientes por meio da execução de medições de gases em todos os poços de monitoramentos, pontos de infraestrutura e espaços com pouca circulação de ar.

No 2º trimestre de 2025 foram detectadas concentrações de Metano (acima de 1%Vol CH_4) na porção profunda em 6 dos 289 poços de gases monitorados. Nos demais poços profundos, não foram detectadas concentrações significativas. Para os poços nas porções rasas, não foram detectadas concentrações de metano acima de 1% VolCH_4.

Os resultados das medições realizadas nos pontos de infraestrutura ao longo do trimestre avaliado (ralos e caixa de passagem) em todas as edificações, bem como em ambientes com pouca circulação de ar, não detectaram concentrações de Metano e nem de VOC. Os sistemas de ventilação operaram 24 horas por dia, 30 dias por mês, durante todo o período do trimestre. Estes demonstraram-se eficientes, não permitindo que os gases existentes no solo se acumulassem no tapete de brita ou diretamente sob a laje (poços a 0,30 m), bem como diminuindo eventualmente até mesmo as concentrações no solo abaixo do tapete de brita (poços a 1,00 m), por influência da ventilação.

Diante dos resultados obtidos no monitoramento do 2º trimestre de 2025, e considerando a série histórica de monitoramento ao longo dos 11 anos e 2 meses (abril de 2014 a junho de 2025), verifica-se que não há a intrusão e/ou acúmulo de gases nos ambientes fechados, uma vez que as concentrações de Metano existentes no solo, mesmo com a presença de pressão positiva, não alcançam o tapete de brita (sob a laje) ou, quando alcançam esporadicamente, são arrastadas pelo sistema de ventilação.

A ENGESOLVE recomenda a continuidade da operação dos sistemas de exaustão e a realização dos monitoramentos semanais e quinzenais nos poços de monitoramento e nos pontos de infraestrutura.

EQUIPE TÉCNICA

Integrante	Função	Formação	Tempo de Experiência
Daniel Barel Filho	Operacional	Geólogo	Maior que 25 anos
Felipe Martins Chufi	Operacional	Engenheiro Ambiental	Maior que 15 anos
Carla Verônica Bertolani	Operacional	Geóloga	Maior que 20 anos
Gilson Rodrigues Figueirôa	Operacional	Químico	Maior que 15 anos
Amanda Cristina Garcia	Operacional	Engenheiro Ambiental	Maior que 5 anos
André Sammartano	Operacional	Engenheiro Ambiental	Maior que 5 anos

Avenida Paulista, 2064 - 14° Andar I Bela Vista I 01310-200 I São Paulo - SP I 11 2844 4386 engesolve.com.br

INFORMAÇÕES INICIAIS

Responsável legal
Nome:
RG:
CPF:
Endereço:
Telefone:

Responsável Técnico
Nome: Felipe Martins Chufi
RG: 29.447.243-5
CPF: 326.774.078-92
Endereço: Avenida Paulista, 2.064, 14º Andar, CEP: 01310-928, Bela Vista, São Paulo, SP
Telefone: 11-2844-4386

Contratante
Prefeitura da Universidade de São Paulo – Área Capital Leste (PUSP-LESTE)
CNPJ: 63.025.530/0062-26
Endereço: Rua Arlindo Béttio, 1.000, CEP: 03828-000, Ermelino Matarazzo, São Paulo, SP

Informações do Contrato
Contrato: 00000001/2022 – PUSP - CL
Processo Administrativo: 22.1.00018.95.7
Pregão Eletrônico: 00002/2022 – PUSP - CL
Escopo: Operação, manutenção e monitoramento de poços de gás, pontos na estrutura e de sistemas de ventilação de gases – EACH – USP Leste.

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO E OBJETIVOS 9
1.1. Condições Gerais e Limitações 10
1.2. Estruturação do Relatório 10
2. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 11
2.1. LOCALIZAÇÃO DA ÁREA 11
2.2. PRESENÇA DE GASES 11
2.3. SISTEMA DE VENTILAÇÃO DOS GASES 11
3. DISTRIBUIÇÃO DOS PONTOS DE MONITORAMENTO 13
3.1. POÇOS DE MONITORAMENTO 13
3.2. INFRAESTRUTURA 14
4. METODOLOGIA DO MONITORAMENTO DE GASES 15
4.1. BIOGÁS E O GÁS METANO 16
4.2. PLANO DE AÇÃO 18
5. RESUMO E TENDÊNCIA EM 11 anos e 2 meses DE OPERAÇÃO/MONITORAMENTO (ABRIL DE 2014-A JUNHO DE 2025) 19
6. RESULTADOS OBTIDOS NO 2º TRIMESTRE de 2025 44
6.1. RESULTADOS DO MONITORAMENTO EM POÇOS E NA INFRAESTRUTURA 44
6.2. RESULTADOS OBTIDOS NA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE VENTILAÇÃO 46
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES 51
8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 53

Avenida Paulista, 2064 - 14° Andar I Bela Vista I 01310-200 I São Paulo - SP I 11 2844 4386 engesolve.com.br

FIGURAS

2.1. Localização da Área de Interesse (adaptado de *Google Maps*, 2025)

2.3.1. Conceito do Sistema de Circulação de Gases USP Leste

3.1.1. Localização dos Poços de Monitoramento de Gás e Abrigos de Exaustores

3.2.1. Localização dos Pontos Monitoramento de Gases na Infraestrutura dos Edifícios

4.1.1. Faixa de Inflamabilidade do Gás Metano (CH_4) e a sua Combustão

6.1.1. Resultado da Distribuição das Concentrações de Metano Detectadas >1%Vol

6.1.2. Pluma de Isoconcentração de Metano no Solo no Horizonte B (aproximadamente de 1,0 m – 1,3 m de profundidade) no período de abril a junho de 2025

TABELAS

3.1.1. Distribuição dos Poços de Monitoramento dos Gases nas Edificações

3.2.1. Distribuição dos Pontos de Monitoramento de Infraestrutura nas Edificações

6.1.1. Resultados dos poços com concentração igual ou maior que 1%VolCH_4

6.2.1. Localização dos Exaustores dos Sistemas de Ventilação

6.2.2. Comparativo de Pressão de Sucção de Projeto x Medição no 2º Trimestre/2025

Avenida Paulista, 2064 - 14° Andar I Bela Vista I 01310-200 I São Paulo - SP I 11 2844 4386 engesolve.com.br

ANEXOS

1. Certificados de Calibração dos Equipamentos
2. Plano de Ação
3. Tabelas de Medições Semanais em PMG
4. Tabelas de Medições Quinzenais na Infraestrutura
5. Evolução das concentrações de Metano x Pressão (abril de 2014 a Junho de 2025)
6. Tabelas de Medições Semanais nos Exaustores
7. Declaração de Responsabilidade
8. Anotação de Responsabilidade Técnica – ART

Avenida Paulista, 2064 - 14° Andar I Bela Vista I 01310-200 I São Paulo - SP I 11 2844 4386 engesolve.com.br

1. INTRODUÇÃO E OBJETIVOS

A ENGESOLVE Soluções Ambientais Ltda. foi contratada pela Prefeitura da Universidade de São Paulo - Área Capital Leste (PUSP-LESTE) para a operação, manutenção dos sistemas de ventilação de gases no solo, bem como o monitoramento de poços de gás e pontos na infraestrutura instalados em edificações da EACH na USP Leste, localizada na Rua Arlindo Béttio, 1.000, Ermelino Matarazzo, no município de São Paulo, SP.

A contratação dos serviços ocorreu por meio do Processo Administrativo 22.1.18.95.7, Pregão Eletrônico nº 00002/2022 – PUSP – CL e Contrato nº 0000001/2022 – PUSP – CL, que teve por objetivo prosseguir com o acompanhamento das atividades de operação, manutenção e monitoramento dos poços de gás, pontos na estrutura e de sistemas de ventilação de gases instalados.

O presente relatório técnico possui como objetivo avaliar a evolução dos resultados de monitoramento de gases no subsolo e a operação do sistema de ventilação ao longo do segundo trimestre de 2025 (abril a junho de 2025), além de compará-los com os resultados obtidos desde o início dos trabalhos desenvolvidos na área (março de 2014) para uma análise histórica.

Este monitoramento preventivo da intrusão de gases possibilita a elaboração de um diagnóstico contínuo para avaliação da situação da área e, caso necessário, indica ações subsequentes que garantam um uso seguro do local.

Para tanto, foi seguido o resumido escopo de atividades apresentado a seguir:

- Operação e manutenção dos 22 (vinte e dois) Sistemas de Ventilação;
- Monitoramento periódico dos sistemas e monitoramento de gases e explosividade em pontos de estrutura, poços de monitoramento e na entrada dos sistemas de ventilação;
- Compilação dos resultados das medições e tratamento dos dados;
- Elaboração de relatório técnico contendo a descrição dos trabalhos executados e a interpretação dos resultados obtidos, além das conclusões e recomendações pertinentes.

Os trabalhos de campo foram conduzidos em conformidade com as seguintes referências técnicas, além das demais normas e referências pertinentes:

- ABNT NBR 16.209, de setembro de 2013 – Avaliação de risco a saúde humana para fins de gerenciamento de áreas contaminadas;
- CETESB (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo), 2017 – Decisão de Diretoria Nº 038/2017, de 07 de fevereiro de 2017, que dispõe sobre a aprovação do “Procedimento para a Proteção da Qualidade do Solo e das Águas Subterrâneas”.

Avenida Paulista, 2064 - 14° Andar I Bela Vista I 01310-200 I São Paulo - SP I 11 2844 4386 engesolve.com.br

1.1. Condições Gerais e Limitações

Este relatório é para uso exclusivo do cliente, não podendo ser reproduzido por qualquer meio, ainda que em parte, sem a prévia autorização do cliente. Sua autoria encontra-se protegida nos termos da Lei nº 9.610 de 19/02/98, não sendo permitida sua reprodução parcial ou integral, edição, publicação, divulgação, comercialização, doação, distribuição, cessão ou transferência, no todo ou em parte, sem a prévia e expressa autorização da ENGESOLVE, sob pena de ser compelido o responsável a indenizá-la, mediante composição de perdas e danos, e lucros cessantes, sem prejuízo das sanções cíveis e penais cabíveis.

Este documento foi preparado pela ENGESOLVE em concomitância às normas técnicas recomendáveis e em estrita obediência aos termos do pedido e contrato firmado com o cliente. Em razão disto, a ENGESOLVE isenta-se de qualquer responsabilidade civil e criminal perante o cliente ou terceiros pela utilização deste documento, ainda que parcialmente, fora do escopo para o qual foi preparado.

1.2. Estruturação do Relatório

Com o objetivo de facilitar o entendimento dos dados, informações e resultados gerados através do presente trabalho, este relatório de "Evolução do Monitoramento de Intrusão de Gases e da Operação dos Sistemas de Ventilação" se encontra dividido nos capítulos apresentados a seguir:

- **Capítulo 1**: INTRODUÇÃO E OBJETIVOS dos trabalhos de monitoramento de intrusão dos gases;
- **Capítulo 2**: CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO, localização da área e apresenta o sistema de ventilação dos gases;
- **Capítulo 3**: aborda a DISTRIBUIÇÃO DOS PONTOS DE MONITORAMENTO, localização dos poços de monitoramento e dos pontos de infraestrutura;
- **Capítulo 4**: apresentação METODOLOGIA DO MONITORAMENTO DE GASES e detalhamento do plano de ação;
- **Capítulo 5:** apresentação RESUMO E TENDÊNCIA EM 11 ANOS DE OPERAÇÃO/MONITORAMENTO;
- **Capítulo 6:** apresentação dos resultados da RESULTADOS OBTIDOS NO 1º TRIMESTRE DE 2025;
- **Capítulo 7:** CONSIDERAÇÕES FINAIS com relação aos resultados obtidos, principalmente no que se refere ao monitoramento dos poços de monitoramento de gases e recomendações;
- **Capítulo 9:** REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS utilizadas.

2. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO

2.1. LOCALIZAÇÃO DA ÁREA

A área objeto de estudo pertence à Universidade de São Paulo Campus Área Capital Leste (PUSP-LESTE) e está inserida no município de São Paulo, Subprefeitura Penha, no bairro Ermelino Matarazzo, registrada na Rua Arlindo Béttio, 1.000 (Portaria P2). As coordenadas em UTM Sirgas 2000 do centro da área de estudo são zona 23K, 7402266.51 m S e 346771.93 m E.

O local de estudo (USP Leste) possui aproximadamente 220.000 m² e conta com três portarias principais, a P1 situada na Rodovia Parque (na margem da Rodovia Ayrton Senna), a P2 situada na Rua Arlindo Béttio e a P3 com acesso pela Estação da CPTM USP Leste. A **Figura 2.1.** apresenta a localização da área de interesse.

2.2. PRESENÇA DE GASES

Estudos anteriores realizados no local comprovaram que a ocorrência de gás Metano identificada na Gleba I da USP Leste é proveniente da matéria orgânica advinda das camadas de origem antrópica oriundas da dragagem do Rio Tietê e das camadas naturais pertencentes aos depósitos aluviais quaternários associados ao Rio Tietê.

O monitoramento dos poços de gás com medições realizado em campo indica que o composto de interesse predominante na atmosfera gasosa dos poros do solo na área de estudo é o gás Metano.


Pela ocorrência destes gases, foi projetado e instalado um sistema de ventilação com objetivo de impedir a intrusão de gases dos edifícios presentes no local.

2.3. SISTEMA DE VENTILAÇÃO DOS GASES

Na área de estudo há um sistema de ventilação (circulação de ar) composto por tapetes de brita inseridos logo abaixo da laje dos prédios, que permite a circulação dos gases, os quais são extraídos por meio de compressores ou exaustores.

O processo de circulação funciona da seguinte maneira: os eventuais gases formados a partir da matéria orgânica são drenados pelo tapete de brita instalado sob a laje das edificações e então arrastados em um fluxo contínuo de ar limpo promovido por um exaustor para ventilação forçada, conduzidos a um sistema de dispersão na atmosfera.



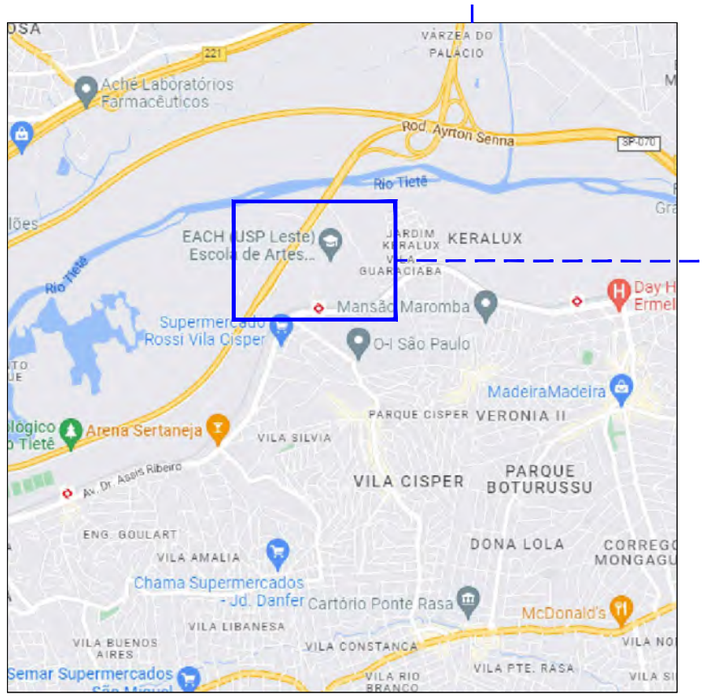



2023, data: 22/05/2023 (Fonte: GOOGLE EARTH).

Escala Gráfica:

0 75 150 225 300m

LEGENDA:

Área de Interesse

CLIENTE:	Universidade de São Paulo - USP Leste
PROJETO:	Evolução do Monitoramento de Intrusão de Gases e da Operação do Sistema de Ventilação
ENDEREÇO:	Rua Arlindo Béttio, 1.000, Ermelino Matarazzo – São Paulo/SP
TÍTULO:	Localização da Área de Interesse (Adaptado de Google Earth, 2024)

RESPONSÁVEL TÉCNICO:	FIGURA Nº:	DATA:
Felipe Chufi	2.1	JUL/2025

FORMATO: A3


Dessa forma, mantendo-se a ventilação do tapete de brita, garante-se que os gases que eventualmente emanem do subsolo não atinjam o edifício pela sua laje.

Previamente e como forma de contingência emergencial, os exaustores foram conectados às tubulações drenantes existentes nos edifícios. Durante os meses de março a julho de 2014, os sistemas de ventilação passaram pela etapa de reajuste às características de cada edificação, para que os exaustores fossem conectados à sua situação definitiva.

A eficiência do sistema de ventilação de gases é monitorada por meio de medições das concentrações de Metano (CH_4), Compostos Orgânicos Voláteis (VOC), Gás Carbônico (CO_2), Monóxido de Carbono (CO), Oxigênio (O_2), Sulfeto de Hidrogênio (H_2S) e pressão em poços de monitoramento em duas profundidades distintas.

A **Figura 2.3.1** ilustra o conceito de funcionamento do sistema de circulação de gases instalado na USP Leste.

Figura 2.3.1 – Conceito do Sistema de Circulação de Gases USP Leste

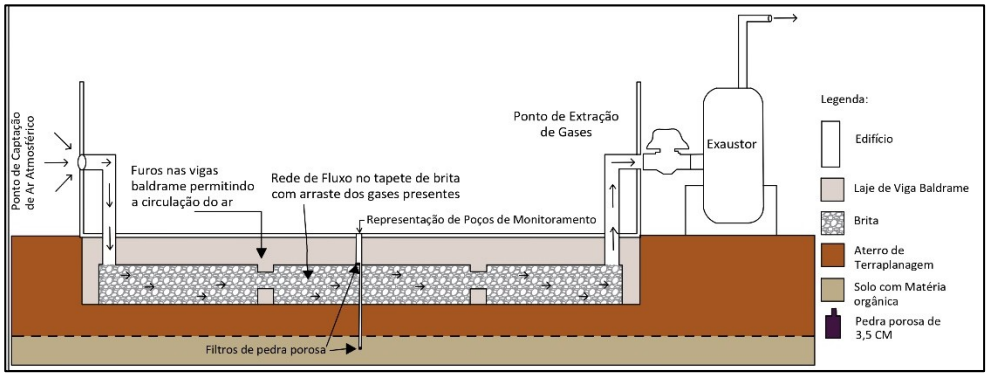

Fonte: Adaptado de Relatório de Instalação de Sistemas (Weber, 2022), Atualizado por Engesolve, 2023.

3. DISTRIBUIÇÃO DOS PONTOS DE MONITORAMENTO

O monitoramento de intrusão de gases/vapores no solo em ambientes fechados é realizado de forma sistemática e programada, com o objetivo de afastar o risco eventual de explosividade nas edificações da USP Leste.

Os pontos de monitoramento se subdividem em Poços de Monitoramento e Infraestrutura.

3.1. POÇOS DE MONITORAMENTO

Atualmente estão instalados na área de estudo 117 (cento e dezessete) conjuntos de poços de monitoramento de gases e 08 (oito) poços de monitoramento de gases, distribuídos nos Edifícios I-1, I-3 (Auditório I-5 e Biblioteca), I-4 (Serviços), Conjunto Laboratorial, Bloco Inicial (Conjunto Didático), Enfermaria, CAT, Incubadora, Ginásio, Guarda Universitária, Portaria P3 e Transportes. Os 03 conjuntos de poços existentes no Edifício Laranjinha foram encerrados com a demolição do prédio.

Entre agosto e novembro de 2013 foram instalados 107 (cento e sete) pares de poços de monitoramento de gases, com duas profundidades distintas, e 08 (oito) poços de monitoramento de gases rasos, sendo intitulados PMG-00 **A** (~0,30 m – sob as lajes/no tapete de brita) e PMG-00 **B** (~1,00 m – no solo).

Em março de 2014, os poços A e B encontravam-se conectados em uma mesma mangueira. No início do mês de abril de 2014, foram inseridas válvulas de individualização dos poços, as quais os mantém fechados, sendo abertos somente no momento da medição após a conexão da mangueira do equipamento, o que permite a leitura da pressão e das concentrações de uma profundidade sem a interferência da outra, ou da atmosfera.

Em julho de 2015, foram instalados mais 09 (nove) conjuntos de poços de monitoramento nos edifícios da Guarda Universitária, Portaria P3 e Transportes. O monitoramento nesses poços se iniciou em Agosto de 2015.

Nos edifícios Guarda Universitária e Transportes, na porção rasa foi instalado o poço de monitoramento sob a laje tipo Vapor Pin (**A**) e na porção profunda, com o mesmo perfil construtivo dos já existentes (**B**). No edifício Portaria P3, foi detectada uma segunda laje sob o piso, sendo assim, os poços de monitoramento neste edifício foram instalados em três profundidades: Sob a primeira laje – **A** (~0,30 m), sob a segunda laje, no tapete de brita – **B** (~0,50 m) e no solo – **C** (~1,30 m).

Entre junho de 2019 e junho de 2020, o sistema de ventilação no edifício da Guarda Universitária foi desligado e o monitoramento interrompido devido a uma reforma ocorrida entre Julho a novembro de2019. Em dezembro de 2019, 07 (sete) novos pares de poços de

monitoramento foram instalados, com o mesmo tipo de construção de 2015, bem como foram instaladas novas tubulações do sistema de ventilação.

Em outubro de 2021, foram instalados 34 (trinta e quatro) conjuntos de poços de monitoramento de gases, com profundidades distintas sendo PMG-00 B e C (~0,50 m e ~1,20m) e 11 (onze) poços de monitoramento de gases rasos, sendo PMG-00 A (~0,30 m). Ainda neste período foram reinstalados 07 (sete) poços A sob a laje na Guarda Universitária, totalizando em 52 os poços instalados neste período.

A **Tabela 3.1.1** demonstra o quantitativo de poços distribuídos nos edifícios, totalizando 289 poços de monitoramento em solo/laje. A **Figura 3.1.1** ilustra a localização destes poços de monitoramento.

3.2. INFRAESTRUTURA

Além dos poços de monitoramento, foi realizado o levantamento dos ralos, tomadas e grelhas existentes nos edifícios, para incluí-los nas medições e avaliar a intrusão dos gases nas construções. Foi definido o monitoramento em ralos e caixas de passagem numerados e cadastrados em cada prédio.

Em junho de 2021, foram incluídos sete pontos de infraestrutura na Guarda Universitária, retomando o monitoramento da infraestrutura, a qual estava interrompida desde a reforma do prédio de 2020.

Durante a construção dos edifícios, a presença de gás foi detectada e, por isso, como forma de prevenção, o sistema elétrico foi instalado em tubulações aéreas, chegando às salas via canaletas, fazendo com que as tomadas das edificações não possuam contato direto com o solo.

Foram definidos também espaços que possuem pouca circulação de ar para serem monitorados, a partir de vistoria em toda a área de estudo.

Em março de 2023 foi realizado o levantamento detalhado e atualização de todos os pontos de infraestrutura, na ocasião foi verificado que o ponto 177 se encontrava identificado erroneamente como 171, o ponto 176 identificado como 177 e o ponto 171 (posicionado dentro do box) se encontrava sem identificação. Os pontos identificados foram remarcados corretamente, o **Anexo 7** apresenta Relatório Fotográfico referente ao levantamento e atualização.

A **Tabela 3.2.1.** e a **Figura 3.2.1.** apresentam respectivamente a distribuição e a localização dos pontos de infraestrutura distribuídos nos edifícios (totalizando 180 pontos de medição na infraestrutura), respectivamente.

Tabela 3.1.1 – Distribuição dos Poços de Monitoramento dos Gases nas Edificações

Relação de Poços x Edificações

Edifício I-1 Parte 1			37 POÇOS
Poços			
PMG-16	A		
PMG-16	B		
PMG-17	A		
PMG-17	B		
PMG-18	A		
PMG-18	B		
PMG-20	A		
PMG-20	B		
PMG-22	A		
PMG-22	B		
PMG-23	A		
PMG-23	B		
PMG-113	A		
PMG-113	B		
PMG-114	A		
PMG-114	B		
PMG-115	A		
PMG-115	B		
PMG-135	A		
PMG-135	B		
PMG-136	B		

Edifício I-1 Parte 2			47 POÇOS
Poços			
PMG-14	A		
PMG-14	B		
PMG-21	A		
PMG-21	B		
PMG-15	A		
PMG-15	B		
PMG-13	A		
PMG-13	B		
PMG-19	A		
PMG-19	B		
PMG-11	A		
PMG-11	B		
PMG-12	A		
PMG-12	B		
PMG-24	A		
PMG-24	B		

Edifício I-3 Auditórios (I-5)			47 POÇOS
Poços			
PMG-25	A		
PMG-25	B		
PMG-26	A		
PMG-26	B		
PMG-27	A		
PMG-27	B		
PMG-28	A		
PMG-28	B		
PMG-29	A		
PMG-29	B		
PMG-44	A		
PMG-44	B		
PMG-45	A		
PMG-45	B		
PMG-132	A		
PMG-132	B		
PMG-133	A		
PMG-133	B		
PMG-134	B		

Edifício I-3 Biblioteca			47 POÇOS
Poços			
PMG-30	A		
PMG-30	B		
PMG-31	A		
PMG-31	B		
PMG-32	A		
PMG-32	B		
PMG-33	A		
PMG-33	B		
PMG-34	A		
PMG-34	B		
PMG-35	A		
PMG-35	B		
PMG-36	A		
PMG-36	B		
PMG-37	A		
PMG-37	B		
PMG-38	A		
PMG-38	B		
PMG-39	A		
PMG-39	B		
PMG-40	A		
PMG-40	B		
PMG-41	A		
PMG-41	B		
PMG-42	A		
PMG-42	B		
PMG-43	A		
PMG-43	B		

Conjunto Laboratorial			41 POÇOS
Poços			
PMG-46	A		
PMG-46	B		
PMG-47	A		
PMG-47	B		
PMG-48	A		
PMG-48	B		
PMG-49	A		
PMG-49	B		
PMG-50	A		
PMG-50	B		
PMG-51	A		
PMG-51	B		
PMG-52	A		
PMG-52	B		
PMG-53	A		
PMG-53	B		
PMG-54	A		
PMG-54	B		
PMG-55	A		
PMG-55	B		
PMG-56	A		
PMG-56	B		
PMG-57	A		
PMG-57	B		
PMG-58	A		
PMG-58	B		
PMG-59	A		
PMG-59	B		
PMG-60	A		
PMG-60	B		
PMG-61	A		
PMG-61	B		
PMG-62	A		
PMG-62	B		
PMG-137	B		
PMG-138	B		
PMG-139	A		
PMG-139	B		
PMG-140	A		
PMG-140	B		
PMG-141	B		

Enfermaria			16 POÇOS
Poços			
PMG-70	A		
PMG-70	B		
PMG-71	A		
PMG-71	B		
PMG-72	A		
PMG-72	B		
PMG-73	A		
PMG-73	B		
PMG-74	A		
PMG-74	B		
PMG-75	A		
PMG-75	B		
PMG-76	A		
PMG-76	B		
PMG-165	A		
PMG-165	B		

Bloco Inicial (Conjunto Didático)			35 POÇOS
Poços			
PMG-01	A		
PMG-01	B		
PMG-02	A		
PMG-02	B		
PMG-03	A		
PMG-03	B		
PMG-04	A		
PMG-04	B		
PMG-05	A		
PMG-05	B		
PMG-06	A		
PMG-06	B		
PMG-07	A		
PMG-07	B		
PMG-08	A		
PMG-08	B		
PMG-09	A		
PMG-09	B		
PMG-10	A		
PMG-10	B		
PMG-84	A		
PMG-84	B		
PMG-85	A		
PMG-85	B		
PMG-86	A		
PMG-86	B		
PMG-87	A		
PMG-87	B		
PMG-152	A		
PMG-152	B		
PMG-153	B		
PMG-154	B		
PMG-155	B		
PMG-156	B		
PMG-157	B		

CAT			18 POÇOS
Poços			
PMG-82	A		
PMG-82	B		
PMG-83	A		
PMG-83	B		
PMG-94	A		
PMG-94	B		
PMG-95	A		
PMG-95	B		
PMG-96	A		
PMG-96	B		
PMG-97	A		
PMG-97	B		
PMG-98	A		
PMG-98	B		
PMG-160	A		
PMG-160	B		
PMG-161	A		
PMG-161	B		

Edifício I-4			32 POÇOS
Poços			
PMG-63	A		
PMG-63	B		
PMG-64	A		
PMG-64	B		
PMG-65	A		
PMG-65	B		
PMG-66	A		
PMG-66	B		
PMG-67	A		
PMG-67	B		
PMG-68	A		
PMG-68	B		
PMG-69	A		
PMG-69	B		
PMG-77	A		
PMG-77	B		
PMG-78	A		
PMG-78	B		
PMG-79	A		
PMG-79	B		
PMG-80	A		
PMG-80	B		
PMG-81	A		
PMG-81	B		
PMG-144	B		
PMG-145	B		
PMG-146	B		
PMG-147	B		
PMG-148	B		
PMG-149	B		
PMG-150	B		
PMG-151	B		

Incubadora			12 POÇOS
Poços			
PMG-88	A		
PMG-88	B		
PMG-89	A		
PMG-89	B		
PMG-90	A		
PMG-90	B		
PMG-91	A		
PMG-91	B		
PMG-92	A		
PMG-92	B		
PMG-93	A		
PMG-93	B		


Ginásio Poliesportivo			18 POÇOS
Poços			
PMG-102			
PMG-103			
PMG-104			
PMG-105			
PMG-106			
PMG-107			
PMG-108			
PMG-109	A		
PMG-109	B		
PMG-110	A		
PMG-110	B		
PMG-111	A		
PMG-111	B		
PMG-112			
PMG-162	A		
PMG-162	B		
PMG-166	A		
PMG-166	B		

Portaria P3			09 poços
Poços			
PMG-119	A		
PMG-119	B		
PMG-119	C		
PMG-120	A		
PMG-120	B		
PMG-120	C		
PMG-163	C		
PMG-164	B		
PMG-164	C		

Transportes			10 poços
Poços			
PMG-121	A		
PMG-121	B		
PMG-122	A		
PMG-122	B		
PMG-123	A		
PMG-123	B		
PMG-124	A		
PMG-124	B		

Guarda Universitária			14 POÇOS
Poços			
PMG-158	B		
PMG-159	B		
PMG-125	A		
PMG-125	B		
PMG-126	A		
PMG-126	B		
PMG-127	A		
PMG-127	B		
PMG-128	A		
PMG-128	B		
PMG-129	A		
PMG-129	B		
PMG-130	A		
PMG-130	B		
PMG-131	A		
PMG-131	B		

Fonte: Dados de Campo, Engesolve, 2024.

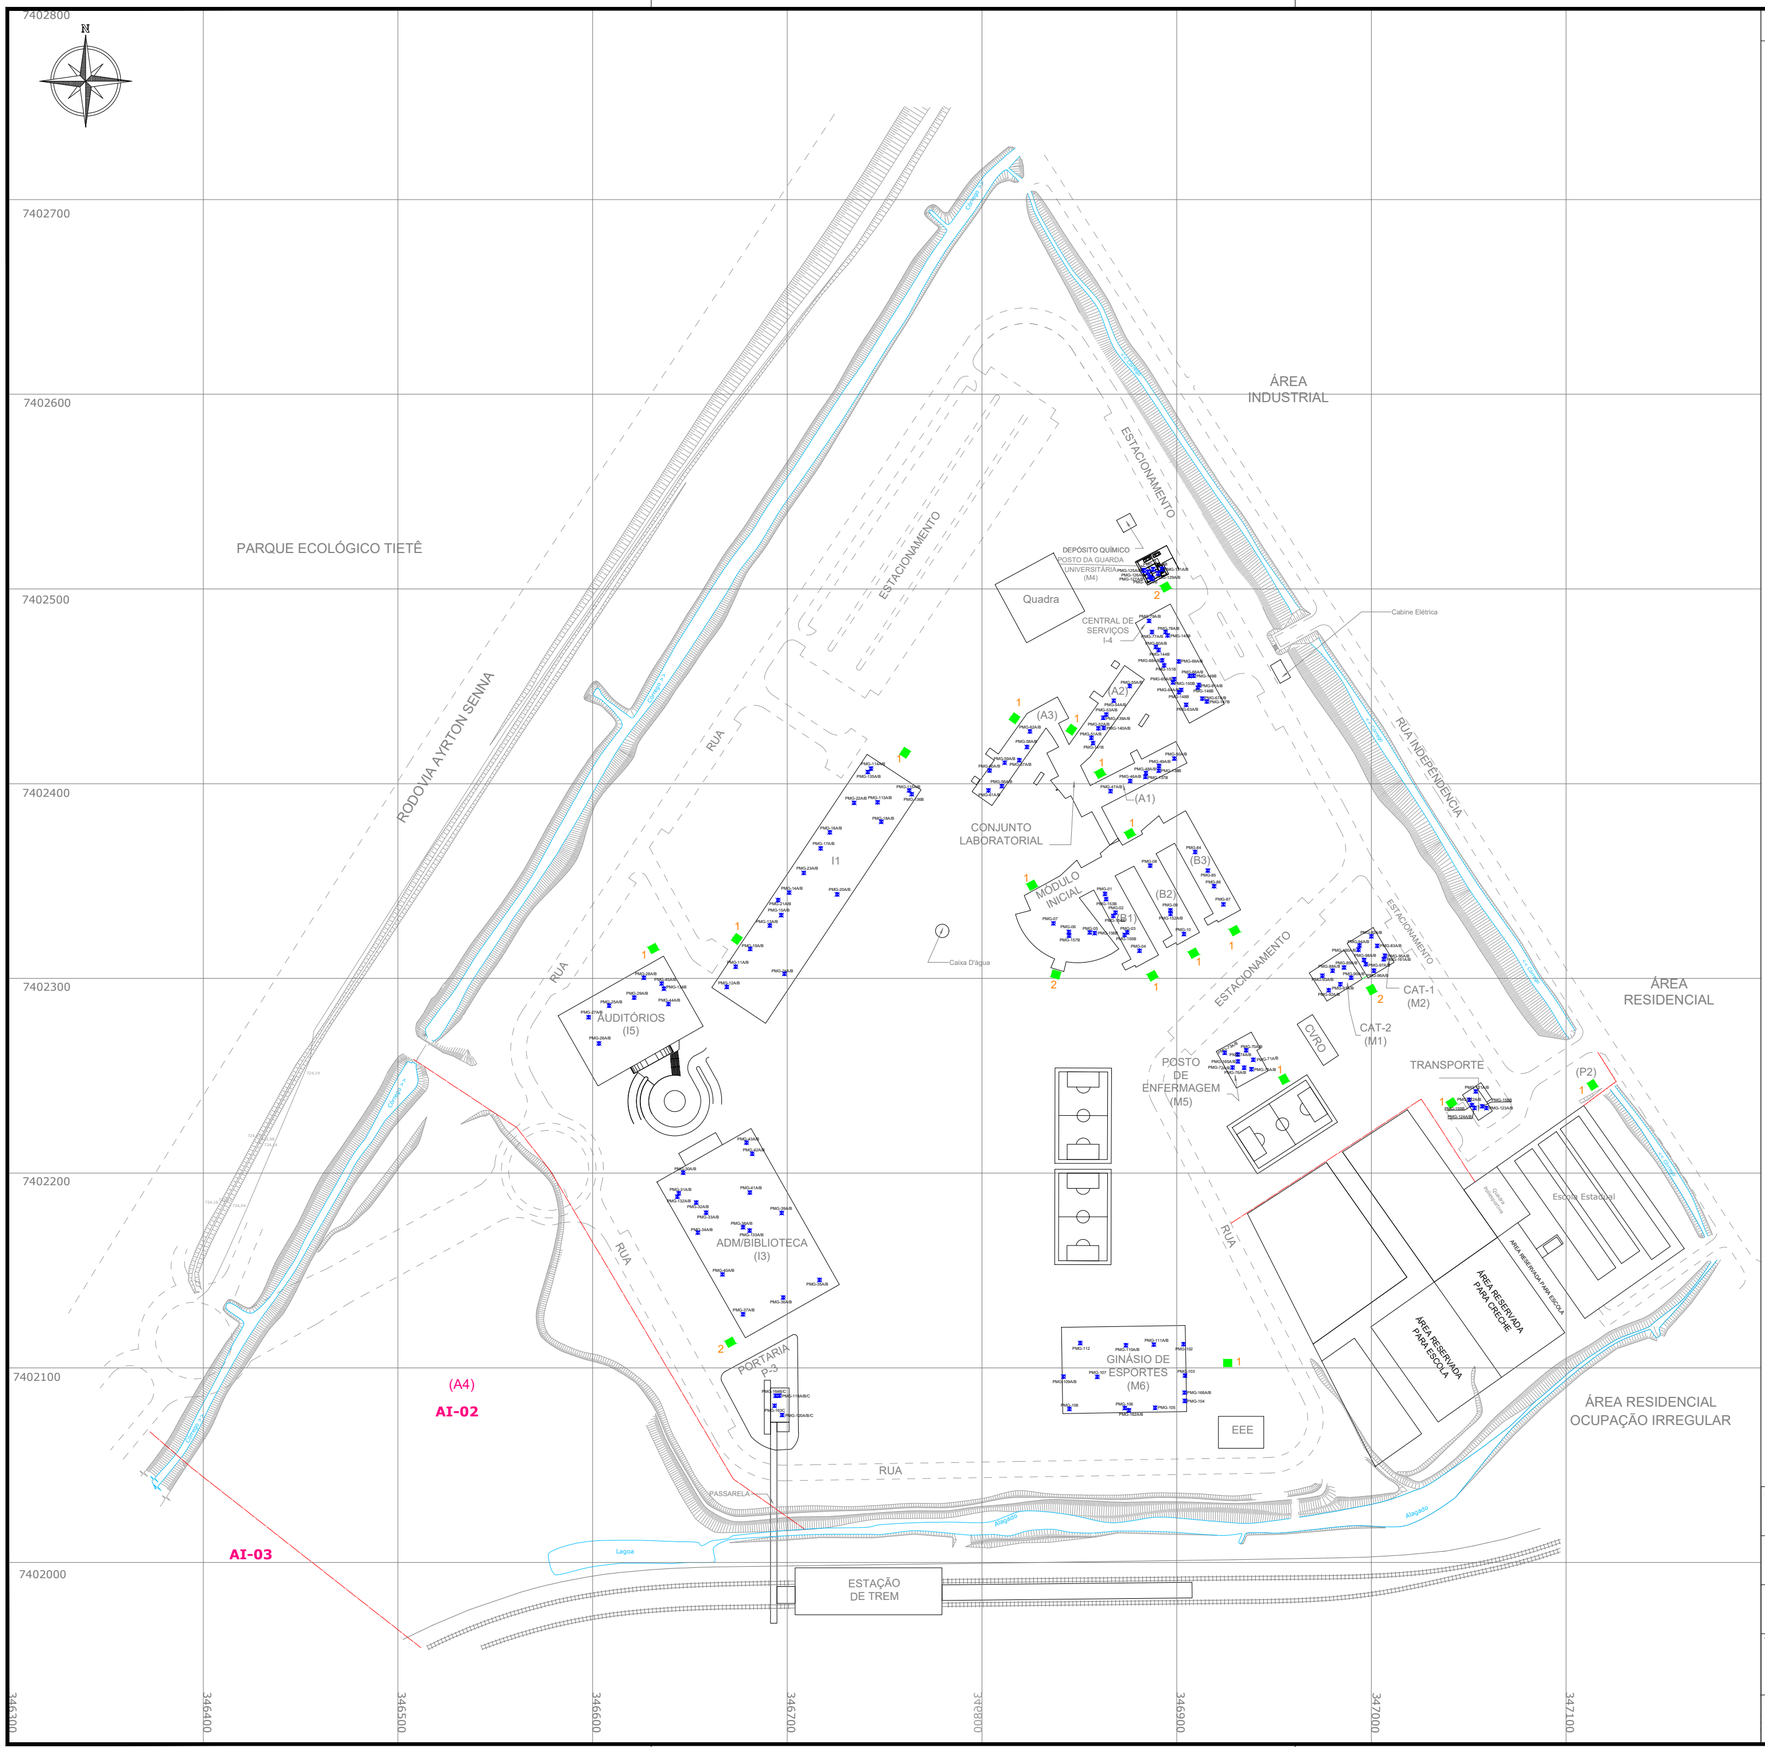

LEGENDA:

- Taludes
- Poço de monitoramento de gás
- Abrigo para equipamento
- X — Quantidades de exaustores nos abrigos
- Cerca de divisa
- Guia e Estacionamento
- Edificações

Escala Gráfica:

0 — 31,5 — 63 — 94,5 — 126m

CLIENTE: Universidade de São Paulo - USP Leste	EngeSolve SOLUÇÕES AMBIENTAIS INTEGRADAS
PROJETO: Evolução do Monitoramento de Intrusão de Gases e da Operação do Sistema de Ventilação	
ENDEREÇO: Rua Arlindo Béttio, 1.000, Ermelino Matarazzo – São Paulo/SP	
TÍTULO: Localização dos Poços de Monitoramento de Gás e Abrigos de Exaustores	
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Felipe Chufi	FIGURA Nº: 3.1.1
DATA: JUL/2025	

FORMATO: A2

Tabela 3.2.1 –Distribuição dos Pontos de Monitoramento de Infraestrutura nas Edificações

Relação de Pontos da Infraestrutura x Edificações

Pontos		
Edifício I-1 Parte 1	Ralos	12
		17
		16
		14
		15
		18
		19
		20
		13
		25
		22
		21
		32
		30
		31
		28
		26
		24
		27
		23
Edifício I-1 Parte 2	Ralos	01
		05
		04
		03
		09
		08
		07
		06
		02

Pontos		
Edifício I-3 Auditórios	Ralos	160
		159
		162
		165
		164
		176
		177
		174
		171
Edifício I-3 Biblioteca	Ralos	148
		149
		150
		147
		139
		140
		141
		151
		145
		144
		143
		142
		146

Pontos		
Edifício I-4	Ralos	95
		97
		99
		106
		96
		104
		307
		122
		111
		117
		100
		101
		105
		91
		102
		88
		108
		107
		94
		92
		90
		89
		87
		123
		121
		120
		119
		114
		113
		112
		109
		110

Pontos		
Conjunto Laboratorial	Ralos	34
		36
		53
		69
		70
		71
		67
		66
		64
		65
		63
		62
		56
		60
		58
		55
		54
		57
		42
		44
		43
		41
		38
		32
		61
		37
		45
		46
		40
		47
		48
		49
		50

Pontos		
Bloco Inicial	Ralos	74
		75
		76
		77
		78
		79
		80
		81
		82
		83
		84
		85
		86
Enfermaria	Ralos	124
		125
		126
		127
CAT	Ralos	136
		137
		138
P3	Ralos	187
		186
Incubadora	Ralos	132
		133
		134
		135
Guarda Universitaria	Ralos	188
		189
		190
		191
		192
		193
		194

Pontos				
Caixas de Passagem	Enfermaria	53	Biblioteca	59
	Enfermaria	55	Biblioteca	57
	Laboratórios	40	Biblioteca	60
	Laboratórios	38	Biblioteca	67
	Laboratórios	24	Biblioteca	58
	Laboratórios	15	Auditório	72
	Laboratórios	13	Auditório	73
	Laboratórios	28	Auditório	74
	Laboratórios	33		
	Laboratórios	37		
	Laboratórios	16		
	Laboratórios	18		
	Laboratórios	21		
	Laboratórios	29		

Pontos		
Espaços com pouca circulação de ar	1	Depósito Auditório Vermelho
	2	Depósito Auditório Verde
	3	Depósito Edifício I-3
	4	Depósito Enfermaria
	5	Arquivo Enfermaria
	6	Caixa de inspeção da Caixa d'água
	7	Depósito interior Almoxarifado
	8	Depósito exterior Almoxarifado
	9	Casa de Máquinas (Hidrante)

Fonte: Dados de Campo, Engesolve, 2024.



LEGENDA:

- Taludes
- Cerca de divisa
- Guia e Estacionamento
- Edificações
- Ralos
- Caixas de passagem
- Espaço com pouca ventilação
- Abrigo para equipamento
- X — Quantidades de exaustores nos abrigos

Escala Gráfica:

0 31,5 63 94,5 126m

CLIENTE: Universidade de São Paulo - USP Leste	EngeSolve SOLUÇÕES AMBIENTAIS INTEGRADAS
PROJETO: Evolução do Monitoramento de Intrusão de Gases e da Operação do Sistema de Ventilação	
ENDEREÇO: Rua Arlindo Béttio, 1.000, Ermelino Matarazzo – São Paulo/SP	
TÍTULO: Localização dos Pontos de Monitoramento de Gases na Infraestrutura dos Edifícios	
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Felipe Chufi	FIGURA Nº: 3.2.1
DATA: JUL/2025	

FORMATO: A2

4. METODOLOGIA DO MONITORAMENTO DE GASES

O monitoramento de intrusão de vapores/gases do solo em ambientes fechados e espaços com pouca circulação de ar do pavimento térreo, ou seja, que tem contato direto com o solo, é realizado de forma sistemática e programada, visando afastar o risco eventual de explosividade nas edificações da USP Leste.

As leituras são realizadas em poços de monitoramento situados sob a laje (no tapete de brita – 0,30 m) e no solo (à profundidade aproximada de 0,50 m e 1,30 m), bem como em ralos e caixas de passagem distribuídos e numerados nas edificações (conforme descrito nos itens **3.1** e **3.2**).

A sistemática adotada segue abaixo especificada:

- **Poços de Monitoramento:** medições semanais com o equipamento GEM 5000 para avaliação da concentração de Metano (CH_4%vol), CO_2 (%vol), CO (ppm), H_2S (ppm), O_2 (%vol), e nível de pressão (bar), explosividade (%LEL) e presença de outros VOCs (Compostos Orgânicos Voláteis) com o equipamento BW Gas Alert Micro 5 (BW), totalizando 289 poços de monitoramento em solo/laje;

- **Infraestrutura:** medições quinzenais, com equipamento Gas Alert Micro 5 (BW), para medição do nível de explosividade (%LEL) que a possível presença de Metano e/ou outros voláteis podem conferir ao ambiente, totalizando 180 pontos de medição na infraestrutura; e

- **Exaustores:** monitoramento sistemático nos exaustores de cada sistema de ventilação dos edifícios, realizando-se medições semanais de Metano e pressão com o equipamento GEM 5000 e VOCs com o equipamento Gas Alert Micro 5 (BW), bem como leitura da pressão na célula de vácuo, totalizando 22 pontos de medição em exaustores.

O monitoramento é realizado por técnicos de campo da ENGESOLVE, treinados, capacitados, e supervisionados por Geólogo e Engenheiro Ambiental. As leituras são realizadas por meio de equipamentos calibrados e certificados da marca *Industrial Scientific*, modelo *Gas Alert Micro 5*, Modelo BW, e da marca *Landtec*, modelo GEM 5000. O **Anexo 1** apresenta os certificados de calibração dos equipamentos utilizados.

Os equipamentos Gas Alert Micro 5 (BW) são instrumentos portáteis utilizados em avaliações de passivos para detectar compostos voláteis e incluem até cinco sensores simultâneos. As unidades utilizadas neste projeto estão configuradas com um sensor PID 10,6eV para medição de VOC em ppm e de um sensor catalítico para medição de LEL (*Low Explosivity Level* ou Limite Inferior de Inflamabilidade – LII) em porcentagem.

O BW tem calibração com validade de até 2 anos, mas as unidades utilizadas na USP são calibradas trimestralmente visando a garantia dos dados, considerando a presença frequente de Metano (Equipamento USP Nº de Série: SK317-003329 e/ou SK317-003332).

O equipamento GEM 5000 é um equipamento portátil especificamente utilizado para monitoramento da migração de gases, como por exemplo em aterros. Ele é composto de uma célula infravermelha de comprimento de onda duplo com canal de referência para leitura de Metano (CH_4) em % volume, Dióxido Carbônico (CO_2) em % volume, de uma célula eletroquímica para medição de Sulfeto de Hidrogênio (H_2S), Monóxido de Carbono (CO) em partes por milhão (ppm), Oxigênio (O_2) em %Vol e transdutor para medição de BAL (pressão diferencial) e Nível de Pressão (mbar).

O GEM 5000 tem calibração anual, porém a unidade utilizada na USP é calibrada semestralmente para garantia da qualidade dos dados, considerando a presença frequente de Metano. Além disso, diariamente é realizada verificação com ar ambiente antes do início das medições (Equipamento USP Nº de Série: G500491).

4.1. BIOGÁS E O GÁS METANO

Inicialmente, o termo Biogás estava associado aos diversos nomes atribuídos a ele, como: gás dos pântanos, gás de aterro, gás de digestor e gás de fermentação, entre outros e atualmente, o termo refere-se, de forma geral, aquele gás formado a partir da degradação anaeróbia (ausência de oxigênio gasoso) da matéria orgânica, através da ação de determinadas espécies de bactérias. Durante a digestão anaeróbia, a energia química presente na composição é largamente conservada, principalmente, como Metano (Adaptado, CETESB, 2021).

Junto ao Metano (CH_4), estão presentes outros gases que fazem parte do meio ambiente natural, sendo gerados a partir da degradação bacteriana de matéria orgânica, neste caso, sedimentos advindos da dragagem do Rio Tietê e sedimentos quaternários naturalmente depositados na bacia de inundação do Rio Tietê, área sobre a qual a USP Leste foi implantada, gerando o biogás. A transformação da matéria orgânica é realizada pelo metabolismo bacteriano, tendo participação de fungos e outros microrganismos. As interações entre os diversos grupos de bactérias participantes da decomposição anaeróbia têm múltiplas variáveis, que vão desde a composição dos resíduos e presença de substratos, até variáveis como temperatura, teor de água e pH do meio. Em um ambiente anaeróbio é gerada uma mistura de gases, como:

- Metano (CH_4): 50% - 70% do volume de gás produzido;
- Dióxido de Carbono (gás Carbônico, CO_2): 25% - 50% do volume de gás produzido;
- E traços de outros gases como:
    - Hidrogênio (H_2): 0% - 1% do volume;
    - Gás Sulfídrico ou Sulfeto de Hidrogênio (H_2S): 0% - 3% do volume;
    - Oxigênio (O_2): 0% - 2% do volume;
    - Amoníaco (NH_3): 0% - 1% do volume; e
    - Nitrogênio (N_2): 0% - 7% do volume (CETESB, 2021).


Ao longo dos mais de 11 anos e 2 meses de monitoramento da área de estudo, foi possível observar a presença de outros gases, como Sulfeto de Hidrogênio (H_2S) e Monóxido de Carbono (CO). Constata-se esta possibilidade devido a produção de biogás, na qual as bactérias produzem estes compostos simultaneamente. Contudo, durante a digestão anaeróbica, eles são produzidos em diferentes proporções, onde o Metano é sempre maior do que H_2S e CO.

O gás Metano (CAS nº 74-82-8) é um gás inflamável comumente encontrado em material orgânico devido à presença de bactérias decompositoras. Ele apresenta faixa de inflamabilidade entre 5% e 15% em volume, isto é, concentrações do gás/vapor que em contato com o ar forma uma mistura inflamável (mistura ideal) na presença de uma fonte de ignição. As concentrações abaixo ou acima dessa faixa não propagam chama, uma vez que a quantidade de gás/vapor é muito pequena (mistura pobre) ou muito elevada (mistura rica) para queimar ou explodir, conforme descrito no manual de produtos químicos (CETESB, 2016).

Para que ocorra a inflamabilidade seria necessária a concentração do gás, em sua mistura ideal com oxigênio em um ambiente confinado, e um meio de ignição. Observou-se em uma vistoria que, em geral, o perfil construtivo das edificações apresenta ventilação fixa, o que dificulta o acúmulo do gás nesses ambientes.

A **Figura 4.1.1.** ilustra a faixa de inflamabilidade de gás Metano, bem como a faixa de medição do equipamento utilizado e o esquema de combustão.

Figura 4.1.1. – Faixa de Inflamabilidade do Gás Metano (CH_4) e sua Combustão

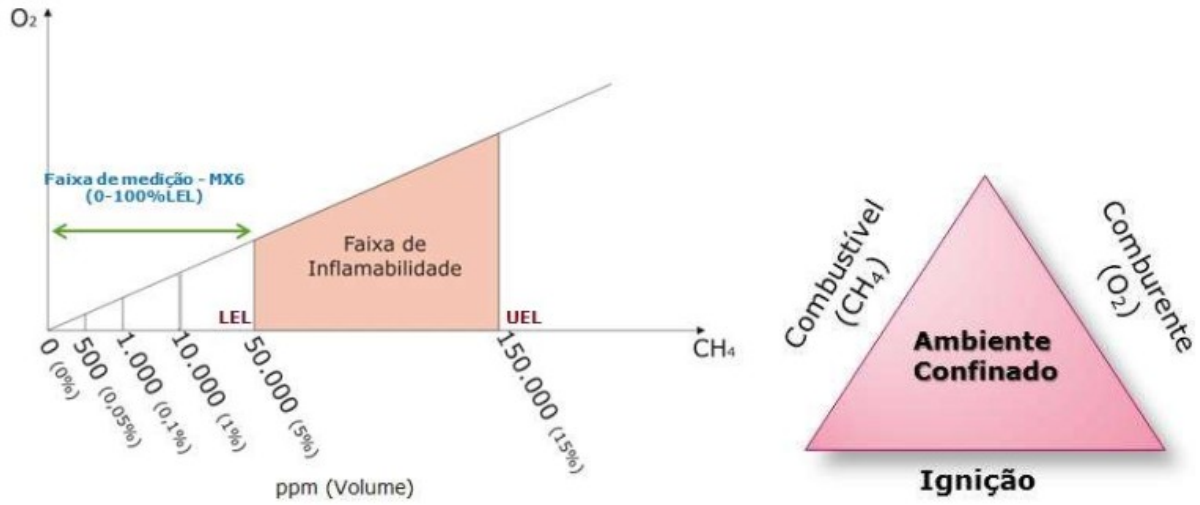

Fonte: Relatório Weber, 2022.

O Sulfeto de Hidrogênio é um gás tóxico, denso e inflamável, com odor de “ovo podre”, já o Monóxido de Carbono é um gás tóxico e inflamável, porém inodoro. Ambos podem ser prejudiciais à saúde quando inalados em ambientes confinados, a depender das concentrações e do tempo de exposição: para o H_2S é necessário concentrações acima de 8,0 ppm por 48 horas e para o CO acima de 39,0 ppm por 48 horas (Manual de Produtos Químicos, CETESB 2016).

Para existir o risco de inflamabilidade, o H_2S e o CO precisam das mesmas características que o Metano, combinando o espaço confinado, fonte de ignição e concentrações dentro da faixa de 4,3 a 45,0%vol ou 43.000 a 450.000 ppm de H_2S; e 12,0 a 75,0%vol ou 120.000 a 750.000 ppm de CO (CETESB, 2016).

4.2. PLANO DE AÇÃO

Um plano de ação foi estabelecido para garantia da segurança durante a realização dos trabalhos de monitoramento e ventilação dos gases. Sua última atualização foi realizada em setembro de 2022. O plano completo pode ser visualizado no **Anexo 2**, e a seguir são apresentadas as principais ações relacionadas às concentrações de Metano obtidas:

Sistema Inoperante: Verificar possíveis falhas, solucioná-las e retomar a operação, além de monitorar os poços de monitoramento sob influência do sistema até o reinício da operação;

Ponto de Alerta (PMG-B com concentração de Metano acima de 5%vol): Acompanhar o monitoramento dos poços de profundidade rasa (PMG-A) para verificar se há movimentação do gás no tapete de brita;

Ponto Crítico (PMG-A com concentração de Metano entre 5% e 15%vol): Ajustar o sistema de ventilação, direcionando o fluxo para o ponto em questão e monitorar a redução da concentração, além de monitorar a infraestrutura para garantir a não intrusão dos vapores do edifício afetado, até que as concentrações no ponto estejam inferiores a 5%;

Ponto Extremamente Crítico (PMG-A com concentração de Metano acima de 15%vol): Ajustar o sistema de ventilação, direcionando o fluxo para o ponto em questão, aumentar a pressão e monitorar a redução da concentração, além de monitorar a infraestrutura para garantir a não intrusão dos vapores do edifício afetado, até que as concentrações no ponto estejam inferiores a 5%;

Pontos de Infraestrutura em ambientes internos com concentração acima de 20%LEL (ou 1%volCH4): Ventilar o ambiente, remover as pessoas do local, eliminar possíveis fontes de ignição, identificar os pontos de entrada de gás e selar;

Entrada dos Exaustores com concentração acima de 20%LEL (ou 1%volCH4): Aumentar a frequência do compressor, a fim de elevar o vácuo e o fluxo, aumentando assim a diluição do Metano na corrente de ar.

Avenida Paulista, 2064 - 14° Andar I Bela Vista I 01310-200 I São Paulo - SP I 11 2844 4386 engesolve.com.br

5. RESUMO E TENDÊNCIA EM 11 ANOS E 2 MESES DE OPERAÇÃO/MONITORAMENTO (ABRIL DE 2014-A JUNHO DE 2025)

O monitoramento de gases no solo e sob a laje das edificações na USP Leste teve início em março de 2014 e se mantém ativo até o presente momento, com previsão de continuidade para os próximos anos.

Avaliando os dados obtidos ao longo destes 11 anos e 2 meses de monitoramento (até o mês de junho de 2025), foi possível estabelecer uma linha de tendência da presença de Metano no solo, além de indicar a efetividade do sistema de ventilação em promover o afastamento das concentrações de Metano sob a laje dos edifícios.

As medições realizadas no período entre abril e junho, indicaram que as concentrações de Metano acima de 1%Vol. estão localizadas frequentemente em pontos específicos (em até 13 dos 289 poços monitorados), não abrangendo toda a extensão dos edifícios. Também se observa que, em sua maioria, essas concentrações estão localizadas apenas nas porções profundas (cerca de 1,00 m, com valores variáveis entre 1,10 e 33,0%VolCH_4). No ano de 2014 ,apenas em dois pontos foram verificadas concentrações de Metano acima de 5%VolCH_4, na profundidade imediatamente abaixo das edificações (*sub-slabs* 0,3m).

Os sistemas de ventilação foram ligados da forma como existiam em março de 2014. Neste mês, havia 08 poços com concentração de Metano na porção rasa. Em abril/2014, este número caiu para 04. Em maio de 2014, havia apenas 01 e, em junho/2014, ao final da instalação/readequação dos sistemas de ventilação, não havia nenhum poço com concentração de Metano na porção rasa.

Em março de 2014, os poços A e B encontravam-se conectados em uma mesma mangueira. No início do mês de abril de 2014, foram inseridas válvulas de individualização dos poços. Nos meses e anos seguintes, as concentrações na porção rasa se mantiveram nulas. Quando eventualmente aparecem, o sistema de ventilação é redirecionado, rapidamente extinguindo a concentração existente.

Ao longo de março de 2014 a dezembro de 2021, as medições de VOC, H_2S e CO nos poços de monitoramento não detectaram concentrações significativas (abaixo de 100 ppm) em nenhum dos pontos monitorados. Tratando-se da pressão, observou-se pressões tanto negativas quanto positivas em alguns poços de monitoramento, indicando a movimentação promovida pelo sistema, além da movimentação natural do nível d'água da região.

Além das medições dos poços de monitoramento, também foram realizadas medições em ralos, caixas de passagem e espaços com pouca circulação de ar, onde não foi detectada nenhuma indicação de inflamabilidade, demonstrando que, mesmo com eventuais pressões positivas, não ocorreu intrusão de gases nos ambientes estudados. Em alguns pontos (principalmente na caixa 55 da Enfermaria) foram verificadas concentrações eventuais de VOC, ligadas ao uso de produtos de limpeza.

As linhas de tendência obtidas para o gás Metano nos 11 anos de monitoramento demonstraram que, em alguns poços, as concentrações variam de acordo com o período do ano, enquanto em outros, as concentrações mantêm-se sempre presentes.

De forma geral, nos períodos de julho a novembro de 2021, as condições climáticas regionais reportam períodos de seca, corroborando o rebaixamento do nível d'água subterrânea local. Assim, nota-se que o Metano gerado na área encontra mais poros vazios na zona não saturada do solo, conseguindo permear com mais facilidade por este meio. Diferente do que ocorre no período de chuvas, onde o nível d'água se eleva e o Metano encontra-se dissolvido junto à água nos poros da zona saturada.

Ainda durante os 11 anos de monitoramento e operação dos sistemas, diversas ações de manutenção preventiva e corretiva foram realizadas. Entre elas, a adequação da pressão de sucção imposta na célula de vácuo, a qual inicialmente era variável em cada edificação, chegando até -40mmHg, e foram gradativamente ajustadas entre setembro e novembro de 2015, até -2,0 mmHg, se aproximando da pressão prevista em projeto.

Periodicamente é realizada a manutenção preventiva nos sistemas e, quando necessário, também ocorrem ações corretivas, além da manutenção das tubulações, desenvolvida preferencialmente no último trimestre.

No último trimestre de 2016, dois pontos de captação de ar do Edifício Módulo Inicial foram reposicionados para fora da área da lanchonete. No último trimestre de 2017 foi realizado um levantamento para manutenção nas tubulações de entrada e saída dos sistemas em todos os prédios, onde fez-se necessário o ajuste nas tubulações do Bloco I, II e III do Conjunto Básico e em uma tubulação no prédio da biblioteca.

No último trimestre de 2018 foram realizados testes de estanqueidade nas tubulações de saída dos sistemas, por meio de fechamento de válvulas e aumento da pressão, com verificação dos pontos de vazamento. Os testes indicaram que as tubulações permaneciam intactas, com exceção de uma parte da tubulação do módulo inicial (B2), que foi substituída. No último trimestre de 2019 foi realizada a manutenção da tubulação quebrada na saída do sistema do Edifício I-1 parte 2. Em 2020, foram realizadas duas manutenções preventivas nos meses de fevereiro e novembro, não havendo necessidade de ações corretivas.

Observou-se também que ao longo dos 11 anos de monitoramento, em poços com histórico de concentrações de Metano, houve a presença de outros gases, sendo eles: H_2S (Sulfeto de Hidrogênio), e CO (Monóxido de Carbono). O H_2S é um gás tóxico, denso e inflamável, com odor de "ovo podre". O CO também é tóxico e inflamável, porém leve e inodoro. Ambos podem ser prejudiciais à saúde quando inalados em ambientes confinados, a depender das concentrações e do tempo de exposição: para o H_2S é necessário concentrações acima de 8,0 ppm por 48 horas e para o CO, acima de 39,0 ppm por 48 horas (Manual de Produtos Químicos, CETESB, 2016).

O H_2S e o CO estão presentes junto ao Metano (CH_4), pois ambos fazem parte do meio ambiente natural, sendo gerados a partir da degradação bacteriana da matéria orgânica, neste caso,

advinda da dragagem do Rio Tietê. A transformação da matéria orgânica é realizada pelo metabolismo bacteriano, tendo participação de fungos e outros microorganismos. As interações entre os diversos grupos de bactérias participantes da decomposição anaeróbia têm múltiplas variáveis, que vão desde a composição dos resíduos e presença de substratos até variáveis externas como temperatura, teor de água e pH do meio. Em um ambiente anaeróbio, é gerada uma mistura de gases como Metano (CH_4), Gás Carbônico (CO_2), e em menor quantidade, Hidrogênio (H_2), Nitrogênio (N_2), Sulfeto de Hidrogênio (H_2S), Monóxido de Carbono (CO), Amônia (NH_3) e oxigênio (O_2) (Adaptado, CETESB, 2021).

Para existir risco de inflamabilidade, o CH_4, o H_2S e o CO precisam das mesmas características: espaço confinado, fonte de ignição e concentrações dentro da faixa de 5,0 a 15,0% de VolCH_4; 4,3 a 45% ou 43.000 a 450.000 ppm de H_2S; e 12,0 a 75,0% ou 120.000 a 750.000 ppm de CO (Manual de Produtos Químicos, CETESB, 2016).

Os gráficos gerados a partir do monitoramento histórico da área indicam que a produção de Metano é maior do que a de H_2S e CO, sendo eles independentes uns dos outros e sem quaisquer correlações, pois as bactérias decompõem a matéria orgânica gerando estes compostos simultaneamente, porém em diferentes proporções. Nota-se que todas as concentrações de H_2S e CO encontradas ao longo dos 11 anos de monitoramento, estiveram abaixo do limite de inflamabilidade, apresentando um pico máximo de 12,0 ppm e 7,0 ppm respectivamente, apenas no mês de abril de 2014, sendo que posteriormente a isso, ambos permaneceram em uma média abaixo de 3,5 ppm.

No ano de 2021 e 2022, o monitoramento ocorreu de forma efetiva, de acordo com a sistemática programada nos poços de monitoramento e nos pontos da infraestrutura.

No primeiro trimestre de 2023, as concentrações variaram de forma constante. No 3º trimestre de 2023 foi observada concentração atípica no ponto 66A (0,50%VolCH_4), no dia 09 de agosto de 2023, sendo então colocado em prática o Plano de ação, cujo consiste na medição diária do ponto, entretanto, as medições demonstraram que a concentração foi *outline,* visto que em nenhuma das demais medições apresentaram quaisquer concentrações, mantendo-se nulas.


No 4º trimestre de 2023, foi observada concentração atípica nos pontos PMG-53A (pico de 36,10%VolCH_4 em 09 de outubro de 2023) e no PMG-139A (pico de 7,90%VolCH_4 em 09 de outubro de 2023), sendo então colocado em prática o Plano de ação. Foi realizada a medição diária do ponto. As medições demonstraram que a concentração em ambos os pontos até meados de outubro, voltando a se apresentar nulas após esse período.

No 1º, 2º, 3º e 4º trimestre de 2024, as concentrações não apresentaram concentrações atípicas. A seguir, descrevem-se as observações em cada edifício, ao longo dos 11 anos de monitoramento, para as concentrações de Metano, H_2S e CO.

EDIFÍCIO I-1:

- Análise de Metano no período de Abril de 2014 a Junho de 2025

Poços existentes: 17 pares (09 na parte 1 e 08 na Parte 2)
Poços que apresentaram concentração >1%: (Nenhum)
Detecção (>1%) sob a laje: Nenhuma

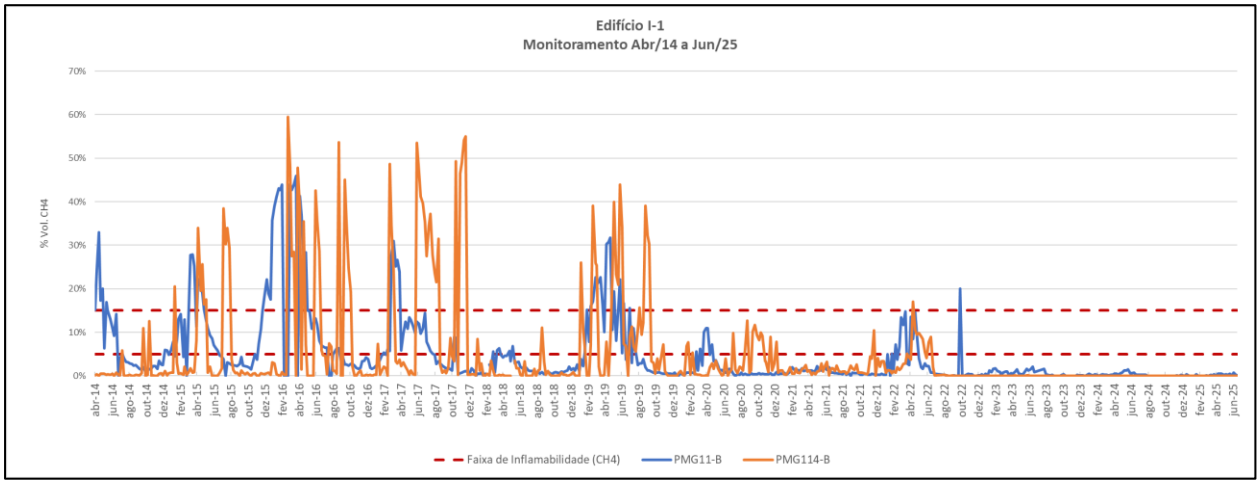

De abril de 2014 a dezembro de 2022 não foram detectadas concentrações de Metano sob a laje do edifício. Percebe-se que, com o início da operação do sistema de ventilação (Jul/2014), houve uma diminuição imediata das concentrações de Metano na porção profunda, porém estas mantiveram-se presentes e variando durante os anos de monitoramento nos poços PMG-11B e PMG 114B. É possível notar que no mês de fevereiro/2018 houve uma redução bem perceptível das concentrações nos dois poços em questão, porém voltaram a se elevar em 2019.

No ano de 2020, nota-se que houve uma diminuição das concentrações, que permaneceram dentro da faixa de inflamabilidade no início do ano, atingindo no máximo 13,0%VolCH_4. Em março, o PMG-11B apresentou concentrações abaixo de 5%, e o mesmo aconteceu com o PMG-114B em outubro do mesmo ano, aonde ambos chegaram próximos a concentrações nulas. Este cenário de concentrações abaixo de 5% se manteve durante o ano de 2021, com exceção do mês de agosto e dezembro, onde as concentrações estiveram dentro da faixa de inflamabilidade, atingindo valor máximo de 14,50%VolCH_4 no PMG-114B.


No ano de 2022, ambos os poços seguem variando, ora com concentrações abaixo de 5%, ora com concentrações dentro da faixa de inflamabilidade. No primeiro trimestre de 2023, as concentrações do PMG-114B se encontravam abaixo de 5% apresentando valores entre nulo e 0,1%. No PMG-11B, as concentrações variaram de 0,06% a 1,80%, sendo o valor de pico obtido em 7 de fevereiro, no entanto os valores se mantiveram abaixo de 5%.


No segundo trimestre de 2024, apenas o PMG-11B apresentou concentração acima de 1,0%VolCH_4, variando entre 1,20% e 2,10%, sendo o valor de pico obtido em 20 de junho de 2024, no entanto os valores se mantiveram abaixo de 5%. No terceiro trimestre, o PMG-11B apresentou concentração acima de 1%VolCH_4, no entanto abaixo de 5%. No 4º trimestre de 2023 e 1º trimestre de 2024, nenhum dos poços apresentou concentração acima de 1%VolCH_4.

No 2º trimestre de 2024 o PM-11B voltou a apresentar concentrações acima de 1%VolCH_4 no mês de maio, no entanto essas concentrações estiveram abaixo de 5%.

No 3º trimestre de 2024, o PMG-11B apresentou concentrações abaixo do 1%VolCH4 em todos os meses, no entanto, constatou-se concentração acima de 1%VolCH4 no PMG-22B, que ainda não havia apresentado concentrações, todavia, as concentrações não se repetiram, sendo identificada somente em 26 de setembro de 2024. No 4º trimestre de 2024, todos os poços estiveram abaixo de 1%VolCH4. No 1º e 2º trimestre de 2025, todos os poços estiveram abaixo de 1%VolCH_4.

- <u>Análise de H_2S e CO no período de Abril de 2014 a Junho de 2025</u>

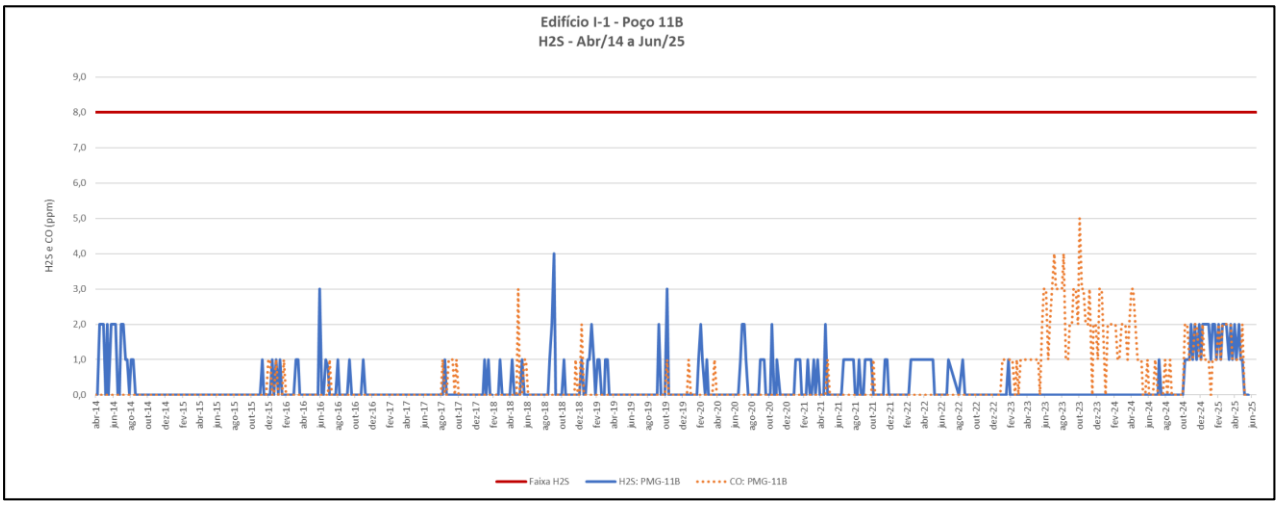

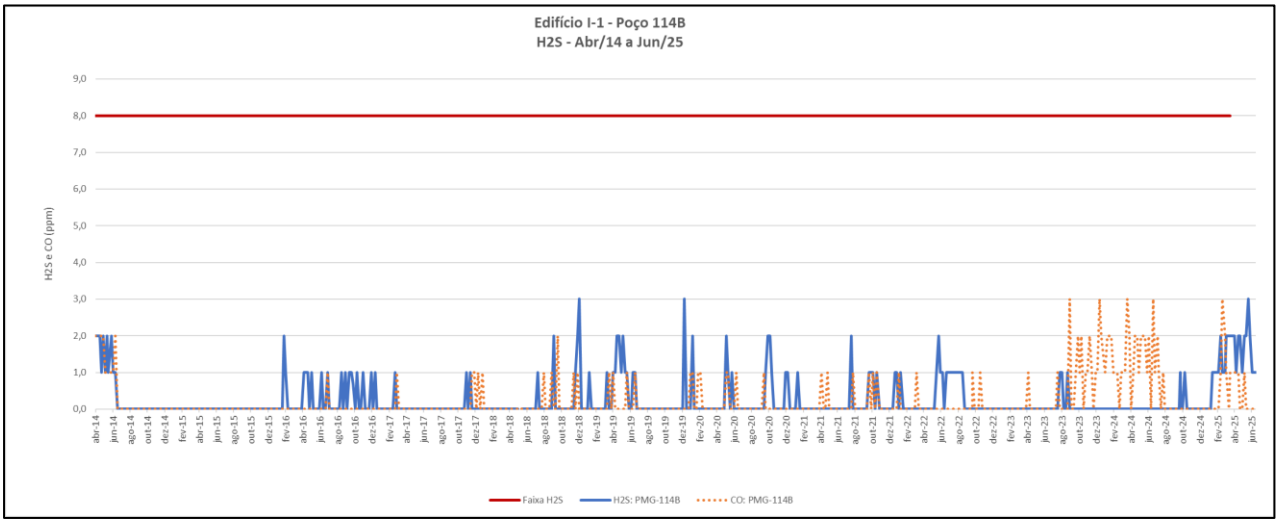


Os gráficos de H_2S e CO demonstram que houve uma variação entre 1,0 e 4,0 ppm para H_2S e entre 10 e 5,0 ppm para CO durante os 11 anos de monitoramento, estando ambos abaixo do índice de inflamabilidade. Essas concentrações indicam que há a produção destes compostos devido à degradação da matéria orgânica, porém a proporção é muito menor quando comparado ao CH_4.

EDIFÍCIO I-3 BIBLIOTECA E I-5 AUDITÓRIO:

- Análise de Metano no período de Abril de 2014 a Junho de 2025

Poços existentes: 21 pares (14 na Biblioteca e 07 no Auditório)
Poços que apresentaram concentração >1%: Nenhuma
Detecção (>1%) sob a laje: Nenhuma

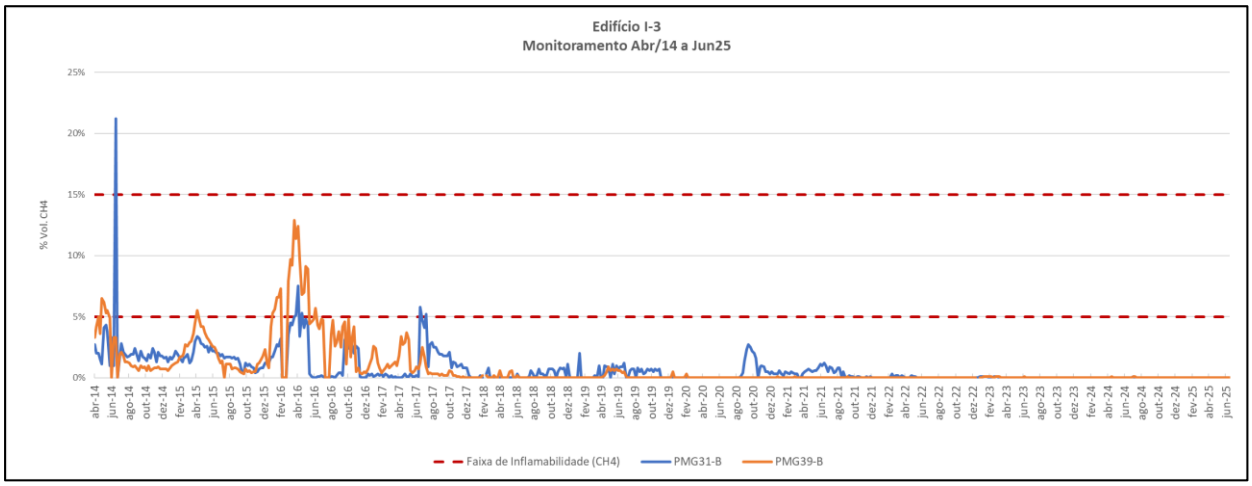

Durante os 11 anos de monitoramento não foram detectadas concentrações de Metano sob a laje do edifício. Nota-se que com o início da operação do sistema de ventilação em julho/2014, houve uma diminuição imediata das concentrações de Metano da porção profunda. Contudo, apesar da diminuição, elas se mantiveram presentes e variando durante todos estes anos nos poços PMG-31B e PMG-39B.

No ano de 2016 houve um aumento significativo das concentrações, porém, em 2017 observa-se que as concentrações começaram a diminuir, permanecendo abaixo dos 5%VolCH_4, sendo que no ano de 2022 foram quase nulas.

No primeiro trimestre de 2023, as concentrações de ambos os poços PMG-31B e PMG-39B se mantiveram entre nulo e 0,1%. Nos segundos, terceiro e quarto trimestre de 2023, nenhum poço apresentou concentrações acima de 1%VolCH_4.

No ano de 2024, nenhum poço apresentou concentrações acima de 1%VolCH_4. Da mesma forma, no 1º e 2º trimestre de 2025, nenhum poço apresentou concentrações acima de 1%VolCH_4.


EDIFÍCIO I-4:

- Análise de Metano no período de Abril de 2014 a Junho de 2025

Poços existentes: 12 pares

Poços que apresentaram concentração >1%: Nenhuma

Detecção (>1%) sob a laje: Nenhuma

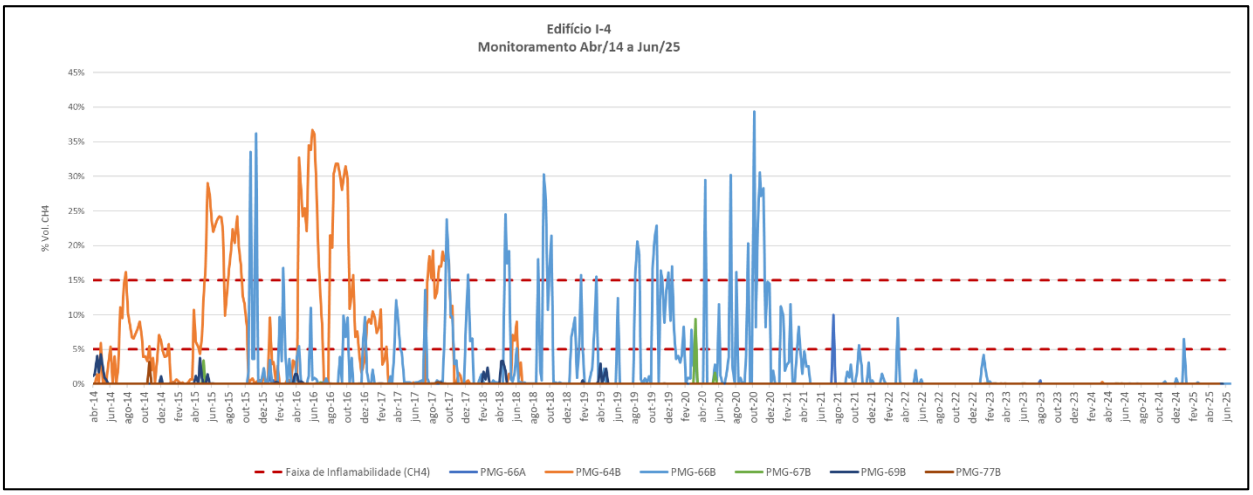

Em Janeiro de 2016, foi detectada concentração de Metano sob a laje do edifício, no poço de monitoramento PMG-66A, sob a concentração de 1,1%. Na porção profunda observa-se a persistência de concentrações de Metano no PMG-66B, mesmo após o início da operação do sistema de ventilação (julho/2014).

Em outros três poços também foram detectados concentrações de Metano no solo, porém sem continuidade ou com valores fora da faixa de inflamabilidade, sendo eles: PMG-64B (de abril/14 até julho/18), PMG-67B (1x em maio/15), PMG-69B (eventualmente, sempre próximo ao mês de abril de cada ano e abaixo de 5%).

O PMG-77B havia apresentado concentração de Metano abaixo de 5%, somente uma vez, em outubro de 2014. Porém, em março de 2020, voltou a demonstrar concentrações do referido gás, desta vez com concentração de 10,0% VolCH_4, tendo logo depois se estabilizado com concentrações nulas.

No ano de 2021, o PMG-66A atingiu concentração de 10,0% VolCH_4, pontualmente em julho. Nos demais meses as concentrações do poço citado apresentaram-se abaixo de 5%, e nos demais poços obteve-se concentrações nulas. Em 2022, todos os poços apresentaram concentrações nulas.


No primeiro trimestre de 2023 as concentrações dos poços se encontravam nulas. No entanto, foram identificadas concentrações de 1% nos poços PMG-146B, PMG-147B, PMG-148B, PMG-149B, PMG-150B e PM-151B. O poço PMG-150B apresentou medição anômala, acima de 5% em apenas um dia.

No segundo trimestre de 2023, apenas o poço PMG-150B apresentou concentrações acima de 1%VolCH$_4$, sendo observado de forma anômala, concentração acima de 5%VolCH$_4$ durante um dia (31 de maio de 2023). No terceiro trimestre de 2023, apenas o poço 66B apresentou concentrações acima de 1%VolCH$_4$, e em apenas uma medição acima de 5%VolCH$_4$ dentro da faixa de inflamabilidade. Apesar de ter apresentado concentração de forma atípica, o PM 66A apresentou concentração de 0,50%VolCH$_4$, cuja concentração foi monitorada, e foi considerada *outline* por não apresentar concentração nas demais medições. Os demais pontos se mantiveram com concentrações nulas ou abaixo de 1%VolCH$_4$.

No 4º trimestre de 2023 e 1º trimestre de 2024, todos os pontos se mantiveram com concentrações nulas ou abaixo de 1%VolCH$_4$. No 2º trimestre de 2024, foram identificadas concentrações acima de 1%VolCH$_4$ nas porções profundas do PMG-66B e PMG-147B no mês de maio, no entanto, abaixo da faixa de inflamabilidade (5%VolCH$_4$). No 3º trimestre de 2024, foi identificada concentração acima de 1%VolCH4 nas porções profundas do PMG-66B, no entanto, abaixo da faixa de inflamabilidade. No 4º trimestre de 2024, não foram identificadas concentrações acima de 1%VolCH4.

No 1º e 2º trimestre de 2025, foi identificada concentração acima de 1%VolCH$_4$ no poço PMG-150B, no entanto, abaixo da faixa de inflamabilidade.

- Análise de H_2S e CO no período de Agosto de 2022 a Março de 2025

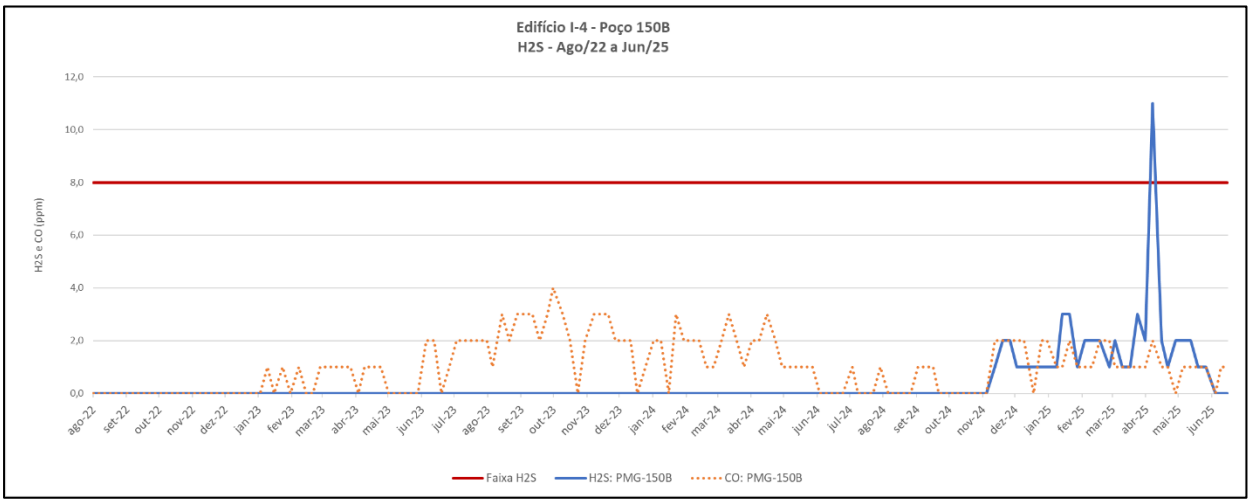

Os gráficos de H_2S e CO demonstrou uma variação entre 1,0 e 5,0 ppm para o H_2S e entre 1,0 e 5,0 para o CO no PMG-66B, ambos abaixo do índice de inflamabilidade. No PMG-150B, anteriormente os valores se apresentavam nulos, a partir de janeiro de 2023 os valores variaram de 0 a 4,0 ppm. Essas concentrações indicam que há a produção destes compostos devido a degradação da matéria orgânica, porém a proporção é muito menor quando comparado ao CH_4.


CONJUNTO LABORATORIAL:


- Análise de Metano no período de Abril de 2014 a Junho de 2025


Poços existentes: 17 pares

Poços que apresentaram concentração >1%: 12 A1; (PMG-51B)

Detecção (>1%) sob a laje: Nenhuma

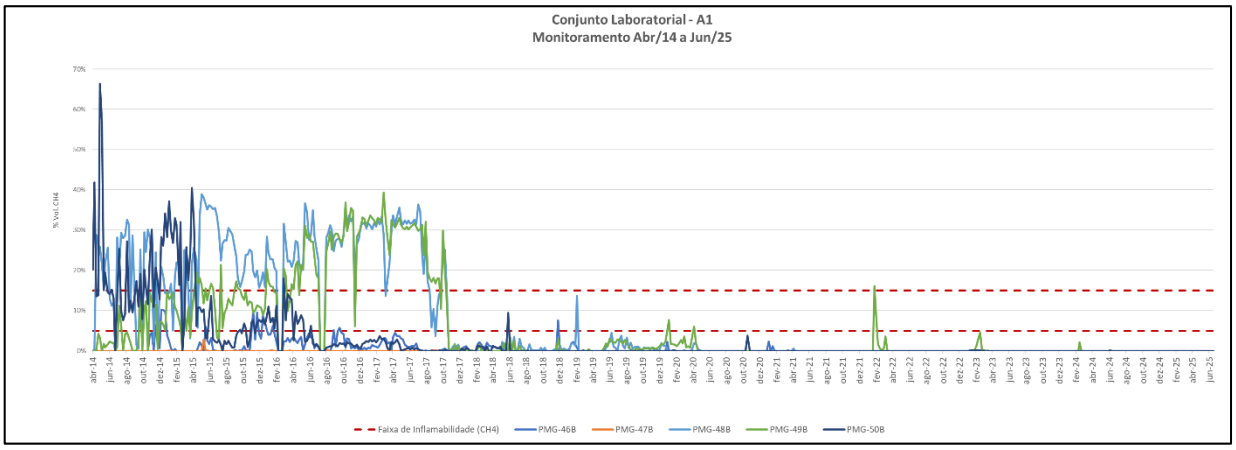

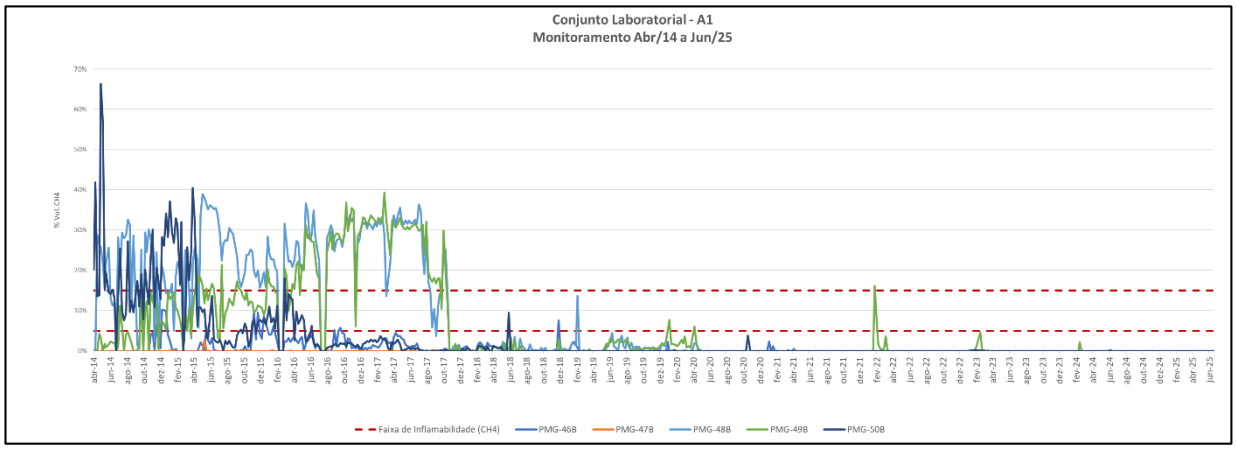

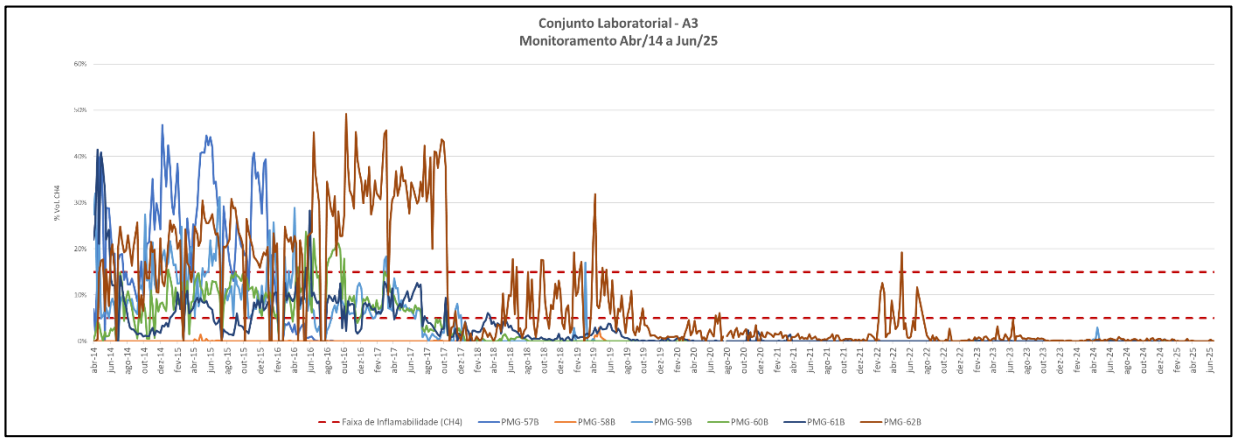

De forma geral, nota-se que os poços dos conjuntos laboratoriais A1 e A3 apresentaram concentrações acima da faixa de inflamabilidade de 2014 a 2017, passando a ficar abaixo de 5% desde então, com exceção do PMG-62B, que em 2019 apresentou concentrações de 5,0 a 30,0% VolCH_4.

No ano de 2021, observa-se que o conjunto laboratorial A2 apresentou um aumento em suas concentrações, passando a demonstrar valores acima da faixa de inflamabilidade nos poços PMG-51B, PMG-53A/B, PMG-54B e PMG-55B de até 32,90 % VolCH_4. Os poços PMG-46B, PMG-52B, PMG-61B e PMG-62B, durante todo referido ano demonstraram concentrações abaixo de 5%, chegando próximo a concentrações nulas.

Em 2022 nota-se um aumento nas concentrações dos três conjuntos laboratoriais (A1, A2 e A3), apresentando concentrações acima da faixa de inflamabilidade nos poços PMG-49B, PMG-51B, PMG-53-B, PMG-54B, PMG-55B e PMG-62B. No último trimestre os valores se mantiveram abaixo dos níveis de inflamabilidade.

Detectou-se concentração de Metano sob a laje do edifício Conjunto Laboratorial A2, no poço PMG-53A, em concentrações variáveis de 1,0 a 39,6% VolCH_4, em períodos pontuais. Este mesmo poço também apresentou concentrações nulas ou abaixo de 1% em outros períodos. Na porção profunda (PMG-53B) nota-se a persistência das concentrações, mesmo após o início da operação do sistema de ventilação (julho/2014), em valores variados, muitas vezes acima da faixa de inflamabilidade. No último trimestre de 2022, os valores se apresentaram abaixo do limite da faixa de inflamabilidade.

Nos meses de novembro de 2014, outubro de 2018 e junho a dezembro de 2021, foram detectadas concentrações de Metano acima de 1% no PMG-53A. Durante tal período os pontos de infraestrutura foram medidos com maior frequência e não foram detectadas concentrações de Metano na infraestrutura, indicando que a via de intrusão de vapores não se completou.

Observando os gráficos específicos das duas profundidades do conjunto monitorado (PMG-53 A e B) durante a linha do tempo de 2014 a 2021, percebe-se que tal situação é comum a este poço nesta época do ano, tendendo à diminuição das concentrações nos meses seguintes.

Também é possível notar que quando as concentrações na porção profunda (PMG-53B) superam valores a cerca de 25% VolCH_4 (junho a novembro/2014, julho a novembro/2018, junho a dezembro/2021), são detectadas concentrações na porção rasa (PMG-53A) iguais ou superiores a 1% VolCH_4. Nos mesmos meses citados, nos anos de 2015, 2016, 2017 e 2019, houve aumento nas concentrações da porção profunda, porém em valores menores que 20% VolCH_4, e então na porção rasa verificou-se pequena influência destas concentrações, demonstrando valores sempre abaixo de 1% VolCH_4.

Nos anos de 2020 a 2021, o sistema de ventilação que opera para a área do A2 foi ajustado e teve sua pressão aumentada, variando de -2,0 a 20,0 mmHg, conforme o aumento das concentrações no poço PMG-53B, diminuindo assim a interferência na porção rasa (PMG-53A). Nos dois primeiros trimestres de 2022, as concentrações de Metano no PMG-53B se estiveram acima do limite da faixa de inflamabilidade de 10% de VolCH_4 e as concentrações no PMG-53A abaixo da faixa de inflamabilidade de 5%.

No primeiro trimestre de 2023, nota-se estabilidade dos valores de CH_4, se mantendo abaixo do nível de inflamabilidade de 5% para a porção rasa (PMG-53A), na porção mais profunda verificaram-se níveis acima do 1% VolCH_4, no entanto ainda abaixo da faixa de inflamabilidade.

No segundo trimestre de 2023, o PMG-53 apresentou concentrações abaixo de 1%VolCH_4 e, portanto, abaixo da faixa de inflamabilidade tanto da faixa rasa quanto a profunda.

No terceiro trimestre de 2023, o PMG-53 apresentou concentrações dentro da faixa de inflamabilidade no mês de agosto e setembro acima da faixa de inflamabilidade, no mês de julho, no entanto, os valores se encontravam abaixo de 5%VolCH_4. No fim do trimestre, as concentrações ultrapassaram a faixa de inflamabilidade (>15%VolCH_4) e acionado o plano de ação, como se tratava de medição no último dia do trimestre, as ações serão tomadas no próximo trimestre.

Detectou-se concentração de Metano sob a laje do edifício Conjunto Laboratorial A2, na porção profunda do poço PMG-54, em concentrações variáveis de 1,0 a 58,8% VolCH_4, em períodos pontuais. Este mesmo poço também apresentou concentrações nulas ou abaixo de 1% em outros períodos. Nota-se a persistência das concentrações, mesmo após o início da operação do sistema de ventilação (julho/2014), em valores variados, muitas vezes acima da faixa de inflamabilidade. Os valores identificados na porção profunda (PMG-54B) estiveram acima da faixa de inflamabilidade até o ano de 2020, quando os níveis de mantiveram dentro e abaixo da mesma.

No último trimestre de 2022, os valores se apresentaram abaixo do limite da faixa de inflamabilidade. O primeiro semestre de 2023, apresentaram concentrações acima de 1% VolCH_4 e acima de 5% VolCH_4, ou seja, acima da faixa de inflamabilidade por alguns períodos. A porção rasa do PMG-54 não apresentou concentrações acima de 1% VolCH_4 durante todo o período de avaliação.

No segundo trimestre de 2023, o PMG-54 apresentou concentrações acima de 5%VolCH_4 (dentro da faixa de inflamabilidade), sendo obtido o valor de pico de concentração de 7,10%VolCH_4 em 14 de junho de 2023. A porção rasa não apresentou concentrações. No terceiro trimestre, o PMG-54A/B apresentou concentrações abaixo da concentração de 5%VolCH_4.

Durante o segundo trimestre de 2023, o PMG-139 não apresentou concentrações acima de 1%VolCH_4. Os PMG-51B, PMG-62B, PMG-140 B e PMG-141B apesar de apresentarem concentrações acima de 1%Vol CH_4, os valores se mantiveram abaixo de 5%VolCH_4 e, portanto, abaixo da faixa de Inflamabilidade.

No terceiro trimestre de 2023, o PMG-139B apresentou concentrações dentro e acima da faixa de inflamabilidade, bem como o PMG-140B. O PMG-141B apresentou apenas uma medição dentro da faixa de inflamabilidade.

No quarto trimestre de 2023, os poços PMG-51, PMG-54, PMG-55, PMG-140 e PMG-141 apresentaram concentrações acima de 5%VolCH_4 (dentro da faixa de inflamabilidade) nas porções profundas, com concentração de pico de 70%VolCH_4 em 18 de outubro de 2023 no PMG-139B. Os poços PMG-53 e PMG-139 apresentaram concentrações nas porções rasas e profundas (horizontes A e B), estas indicaram a necessidade de empregar o plano de ação, que consiste na medição desses poços em variados períodos do dia durante os 20 dias, e em meados de outubro as concentrações apresentaram-se nulas.

No 1º trimestre de 2024, os poços PMG-49, PMG-51 e PMG-54 apresentaram concentrações acima de 1%VolCH_4, porém abaixo da faixa de inflamabilidade nas porções mais profundas, no entanto, apenas o PMG-54 apresentou concentrações acima de 1%VolCH_4 no mês de março/24.


No 2º trimestre de 2024, foram identificadas concentrações acima de 1%VolCH_4 dos poços PMG-51B, PMG-54B, PMG-55B, PMG-59B, PMG-139B, PMG-140B e PMG-141B. Dentre as concentrações identificadas, os poços PMG-51B e PMG-141B apresentaram concentrações dentro da faixa de inflamabilidade (entre 5%VolCH_4 e 15%VolCH_4) no mês de maio.

No 3º trimestre de 2024, foram identificadas concentrações acima de 1%VolCH_4 nos poços PMG-51B, PMG-53B, PMG-54B, PMG-55B, PMG-139B, PMG-140B e PMG-PMG-141B. Dentre os poços que apresentara concentrações, o PMG-53, PMG-139B e PMG-140B apresentaram concentrações dentro da faixa de inflamabilidade (entre 5%VolCH_4 e 15%VolCH_4) em todo o semestre.

No 4º trimestre, foram identificadas concentrações acima de 1%VolCH_4 nos poços PMG-51B, PMG-53B, PMG-54B, PMG-55B, PMG-139B, PMG-140B e PMG-PMG-141B, sendo que os poços PM-53B, PMG-139B e PMG-140B apresentaram concentrações dentro da faixa de inflamabilidade no trimestre atual.

No 1º trimestre de 2025, foram identificadas concentrações acima de 1%VolCH_4 nos poços PMG-51B, PMG-53B, PMG-54B, PMG-55B, PMG-139B, e PMG-140B, sendo que o poço, PMG-139B apresenta concentrações dentro da faixa de inflamabilidade no trimestre atual. No 2º trimestre de 2025, somente o PMG-51B apresentou concentrações no mês de abril, abaixo da faixa de inflamabilidade.

➢ <u>Análise de H_2S e CO no período de Abril de 2014 a Março de 2025</u>

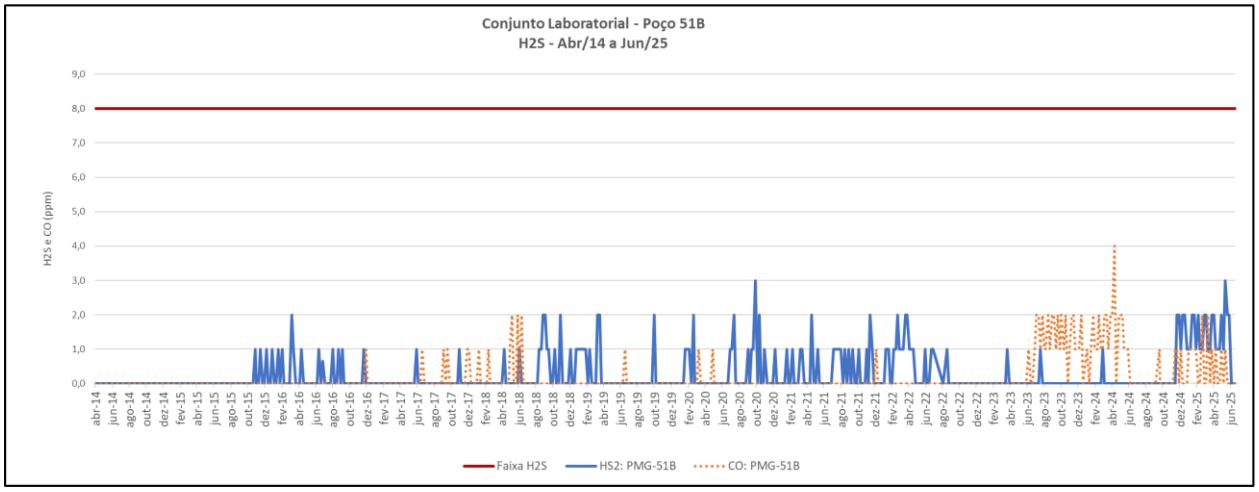

Os gráficos de H_2S e CO demonstram que houve uma variação para H_2S e CO, ambos abaixo do índice de inflamabilidade. Essas concentrações indicam que há a produção destes compostos devido a degradação da matéria orgânica, porém a proporção é muito menor quando comparado ao CH_4.


BLOCO INICIAL:

- Análise de Metano no período de Abril de 2014 a Junho de 2025

Poços existentes: 14 pares

Poços que apresentaram concentração >1%: 1 (PMG-05)

Detecção (>1%) sob a laje: Nenhuma

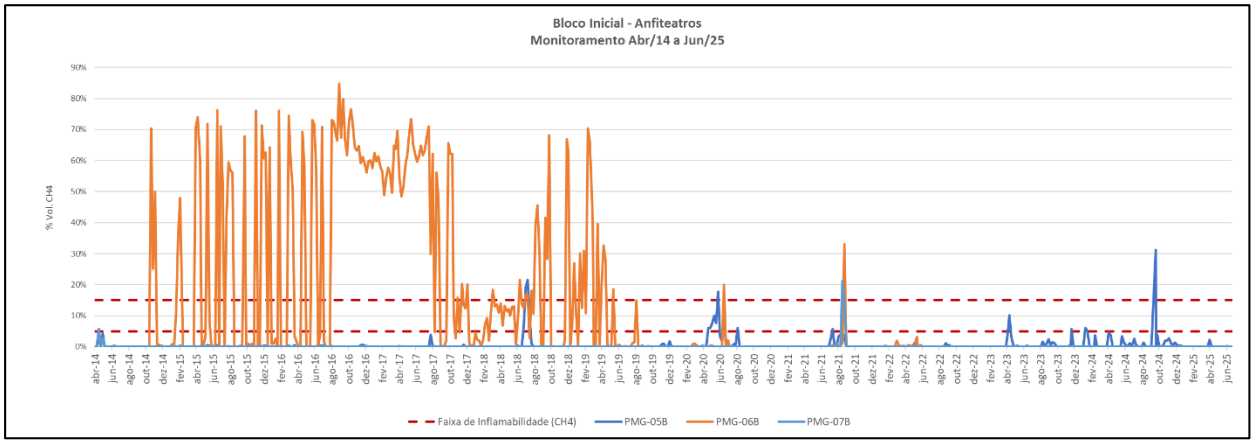


No Bloco dos Anfiteatros, o PMG-06B apresentou persistência das concentrações de Metano durante os anos de monitoramento, alcançando valores de 15 até 80% VolCH_4. Os poços PMG-05B e PMG-07B demonstraram concentrações eventuais de Metano no solo, porém sem persistência. Em 2022 somente o PMG-05B e o PMG-06B apresentaram concentrações de Metano, sendo estas inferiores a 5%, no último semestre se apresentando nulos.

No primeiro trimestre de 2023, as concentrações de todos os poços se mantiveram abaixo do nível de inflamabilidade, e não apresentaram valores acima de 1% VolCH_4. No segundo trimestre de 2023, somente o PMG-05B e apresentou concentração dentro da faixa de inflamabilidade em apenas uma das medições (17 de abril de 2023, considerado anômalo) as demais medições se mantiveram abaixo de 5%VolCH_4. No terceiro trimestre, o PMG-05 apresentou concentrações abaixo de 5%VolCH_4. No quarto trimestre de 2023, o PMG-05 apresentou concentrações dentro da faixa de inflamabilidade, no entanto considerado *outline,* já que a concentração não se repetiu.


No 1º trimestre de 2024, o PMG-05 apresentou concentrações dentro da faixa de inflamabilidade (maior que 5%VolCH_4 e menor que 15%VolCH_4) para as poções mais profundas. No entanto, foram identificados em apenas dois dias, e acima de 1%VolCH_4 em outro dia, após esses, não foram identificados acima dessa concentração. No 2º e 3º trimestre de 2024, o PMG-05 apresentou concentrações acima de 1%VolCH_4, no entanto, abaixo da faixa de inflamabilidade, além de identificado o PMG-156B, não identificado anteriormente.

No 4º trimestre de 2024, foram identificadas concentrações acima de 1%VolCH_4 nos poços PMG-05B e PMG-08B, no entanto, abaixo da faixa de inflamabilidade. No 1º trimestre de 2025, não foram identificadas concentrações acima de 1%VolCH_4. No 2º trimestre de 2025 o PMG-05B foi identificado somente em abril de 2025, abaixo da faixa de inflamabilidade.

No Bloco B1, os PMG-01B e PMG-02B apresentaram persistência das concentrações de Metano durante os anos monitorados, alcançando valores maiores de 15% até o ano de 2015 e, a partir de 2016, demonstrando valores menores, abaixo de 5%. O PMG-01B em 2021 apresentou concentrações dentro da faixa de inflamabilidade, atingindo valores de até 8,9% VolCH_4.

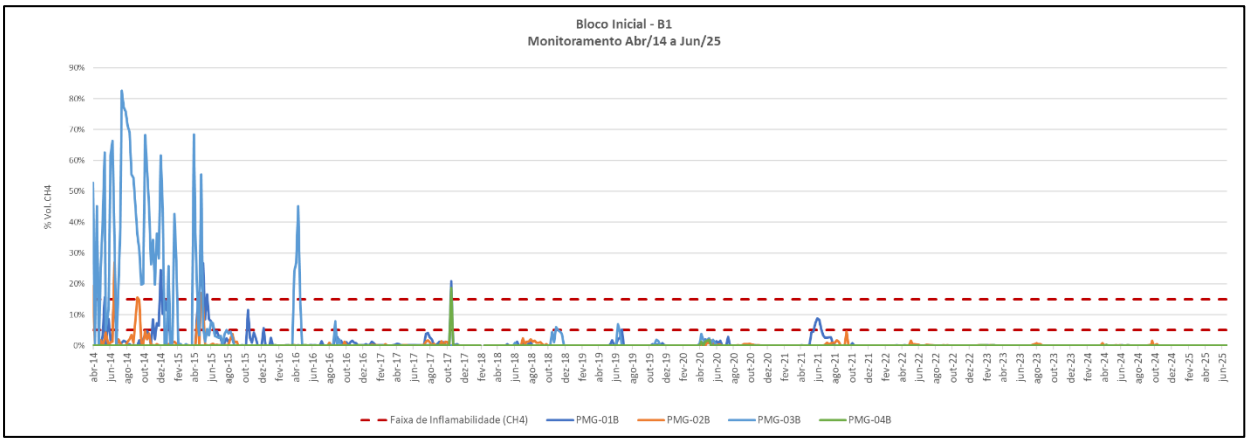


O PMG-03B demonstra comportamento semelhante, alcançando valores de até 80% em 2014 e decaindo para 5% em novembro de 2018. Em 2021, o PMG-03B apresentou somente concentrações esporádicas abaixo de 1%. No PMG-04B detectou-se concentração de Metano no solo, porém sem continuidade (uma vez em outubro de 2017). Em 2022 somente o PMG-02B apresentou concentrações, sendo estas abaixo de 5%, no último trimestre apresentaram concentrações nulas. Em 2023 e 1º trimestre de 2024, as concentrações no Bloco B1 se encontravam nulas. No 3º trimestre de 2024, o PMG-02 voltou a apresentar concentrações, no entanto, abaixo de 1%VolCH_4. No 4º trimestre de 2024, não foram identificadas concentrações acima de 1%VolCH_4 dos poços. No 1º trimestre de 2025, não foram identificadas concentrações acima de 1%VolCH_4 dos poços.

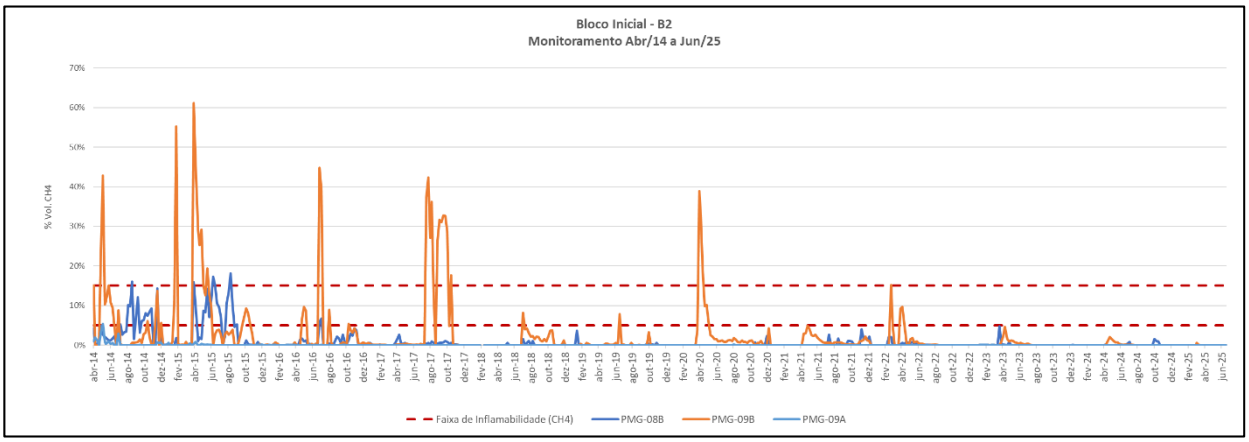


No Bloco B2, foram identificadas concentrações de metano acima do nível de inflamabilidade (15% VolCH_4) no período de abril de 2014 a março de 2022. Em maio de 2022, as concentrações se mantiveram abaixo da faixa de inflamabilidade em todos os poços de monitoramento. No primeiro trimestre de 2023, as concentrações do Bloco B2 se apresentaram nulas, exceto pelo

ponto PMG-08B que apresentou concentração acima de 1% VolCH$_4$ em apenas uma medição realizada no mês de março. No segundo trimestre, somente o PMG-09B apresentou concentração acima de 1%VolCH$_4$, no entanto abaixo da faixa de inflamabilidade. No 4º trimestre de 2023 e 1º trimestre de 2024 não foram apresentadas concentrações acima de 1% VolCH$_4$. No 2º trimestre de 2024, o PMG-09B voltou a apresentar a concentrações acima de 1%VolCH$_4$. No 4º trimestre de 2024, não foi identificada concentração acima de 1%VolCH$_4$. No 1º trimestre de 2025, não foi identificada concentração acima de 1%VolCH$_4$.

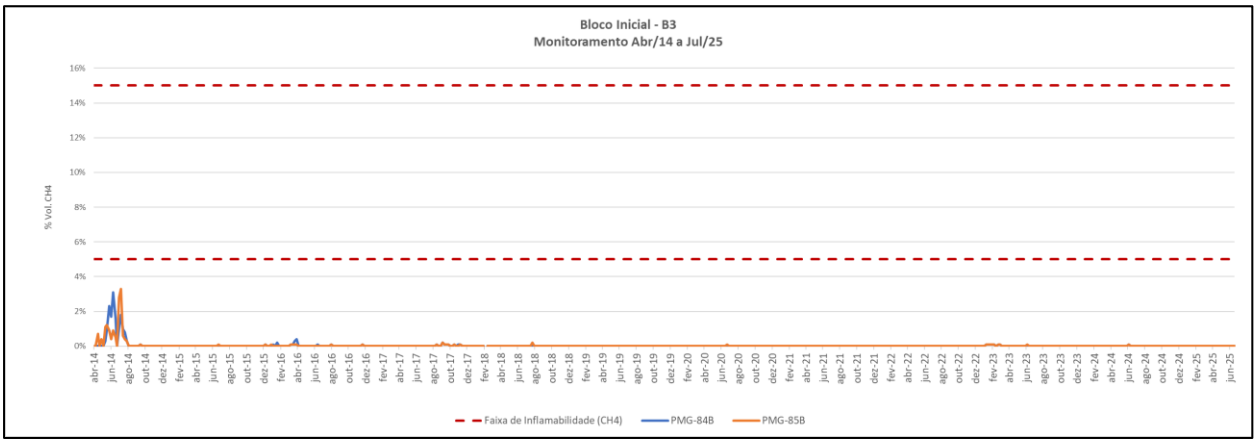

No Bloco B3, os PMG-84B e PMG-85B apresentaram concentrações de Metano no período de abril a outubro de 2014. Posteriormente a isso, as concentrações se mantiveram nulas ou abaixo de 1%. No 2º trimestre de 2024, o PMG-87B apresentou concentrações acima de 1%VolCH$_4$ somente no mês de maio, essas concentrações não atingiram a faixa de inflamabilidade. No 3ºe 4º trimestre de 2024, o Bloco B3 apresentou concentrações nulas ou abaixo de 1%VolCH$_4$. No 1º trimestre de 2025, não foi identificada concentração acima de 1%VolCH$_4$.

- <u>Análise de H_2S e CO no período de Abril de 2014 a Junho de 2025</u>

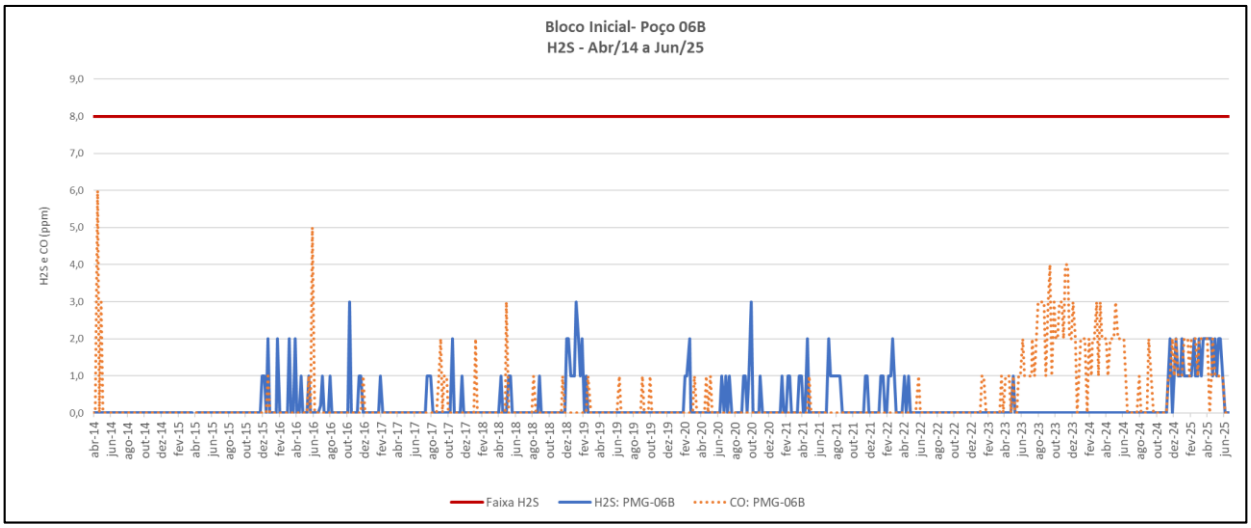

O gráfico de H_2S e CO demonstra que houve uma variação entre 1,0 e 3,0 ppm para H_2S e 1,0 e 6,0 para CO, ambos abaixo do índice de inflamabilidade. Essas concentrações indicam que há a produção destes compostos devido a degradação da matéria orgânica, porém a proporção é muito menor quando comparado ao CH_4. No último semestre de 2022, as concentrações se apresentaram nulas. No primeiro trimestre de 2023, as concentrações de CO apresentaram variações de concentração de 0 a 1,0 ppm. No terceiro trimestre de 2023, as concentrações de CO apresentaram pico de 4,0 ppm, enquanto as medições de H2S estiveram nulas. No quarto trimestre de 2023, as concentrações de H2S estiveram nulas, e as concentrações de CO apresentaram pico de 5,0 ppm.

O 1º, 2º e 3º trimestre de 2024, as concentrações de H2S estiveram nulas, e as concentrações de CO apresentaram concentrações de pico 3,0 ppm.

Avenida Paulista, 2064 - 14° Andar I Bela Vista I 01310-200 I São Paulo - SP I 11 2844 4386 engesolve.com.br


ENFERMARIA:

- Análise de Metano no período de Abril de 2014 a Março de 2025

Poços existentes: 07 pares

Poços que apresentaram concentração >1%: 02 (PMG-74B e PMG-165B

Detecção (>1%) sob a laje: Nenhuma

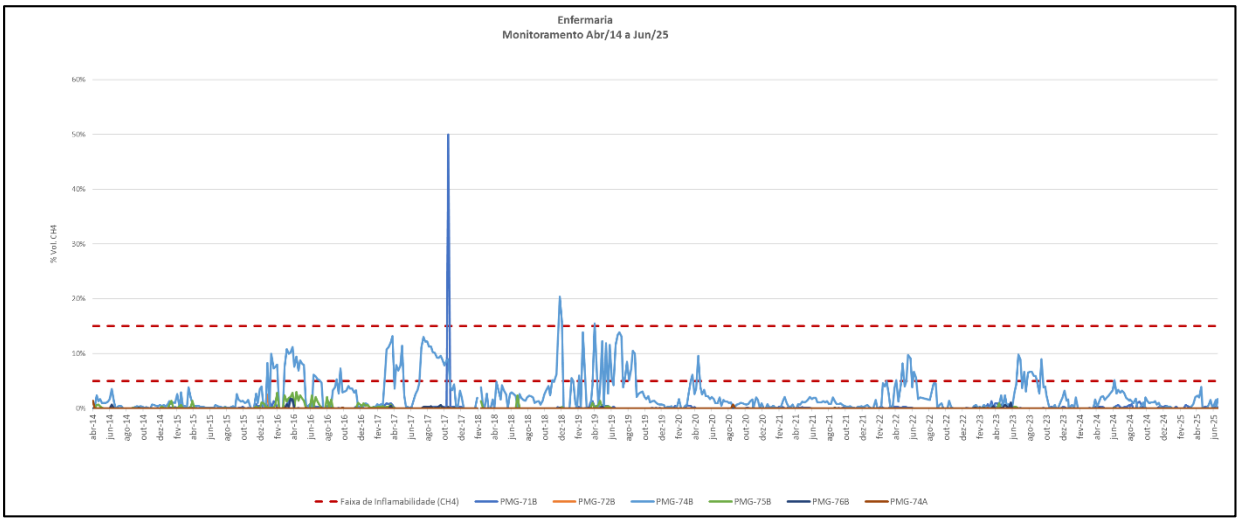

Durante os 11 anos e 2 meses de monitoramento foi detectada somente uma vez a concentração de Metano sob a laje do edifício, no poço PMG-74A, com concentração de 1,4% em abril de 2014. Nos poços da porção profunda observa-se a persistência das concentrações, principalmente no PMG-74B, mesmo após o início da operação do sistema de ventilação (julho/2014), prevalecendo até o monitoramento atual (2023).

Em outros quatro poços também foram detectados concentrações de Metano no solo, porém sem continuidade ou com valores abaixo da faixa de inflamabilidade, sendo eles: PMG-71B (de 1,1 a 1,6% entre janeiro e agosto de 16 e 50% 1 vez em outubro/17); PMG-72B (2,5% em janeiro de 16); PMG-75B (valores eventuais entre 1,0 e 3,0 %) e PMG-76B (cerca de 1% entre mar e abril de 16). Em 2022, os valores permaneceram nulos ou abaixo de 1%, exceto o PMG-74B que apresentou valores nulos apenas em dezembro de 2022.

No primeiro trimestre de 2023, os valores permaneceram nulos ou abaixo de 1%, exceto pelo PMG-71B, que apresentou valores acima de 1% VolCH_4 em uma medição, no entanto abaixo da faixa de inflamabilidade de 5% VolCH_4 no mês de março de 2023.

No segundo trimestre de 2023, o PMG-74B apresentou concentrações acima de 5%VolCH_4, sendo a concentração mais alta de 9,80%VolCH_4. O PMG-76B apresentou concentração acima de 1%VolCH_4 durante apenas uma das medições, considerado anômalo.

No terceiro trimestre de 2023, o PMG-74B e PMG-165B apresentaram concentrações acima de 5%VolCH4, dentro da faixa de inflamabilidade. No quarto trimestre, somente o PMG-74B apresentou concentrações acima de 1%, porém abaixo da faixa de inflamabilidade (5%VolCH_4).

O 1º trimestre de 2024, o PMG-74B apresentou concentrações acima de 1%VolCH_4, no entanto, abaixo da faixa de inflamabilidade. No 2º trimestre de 2024, o PMG-74B e o PMG-165B apresentaram concentrações acima de 1%VolCH_4, sendo apresentadas concentrações dentro da faixa de inflamabilidade no mês de maio.

No 3º trimestre de 2024, foram identificadas concentrações acima de 1%VolCH4 no PMG-71B, PMG-74 e PMG-165B, sendo que apenas o PMG-165B foi identificado dentro da faixa de inflamabilidade.


No 4º trimestre de 2024, foram identificadas concentrações acima de 1%VolCH4 no PMG-74B e PMG-165B, sendo ambos identificados fora da faixa de inflamabilidade. No 1º trimestre de 2025, foram identificadas concentrações acima de 1%VolCH4 no PMG-74B, sendo identificado fora da faixa de inflamabilidade.

No 2º trimestre de 2025, foram identificadas concentrações de PMG-74B e PMG-165B, sendo que o PMG-74B foi identificada durante o trimestre e o PMG-165B foi identificado dentro da faixa de inflamabilidade.

CAT-1 E INCUBADORA (CAT-2):

- Análise de Metano no período de Abril de 2014 a Junho de 2025

Poços existentes: 13 pares (07 no CAT-1 e 06 no CAT-2)
Poços que apresentaram concentração >1%: Nenhuma
Detecção (>1%) sob a laje: Nenhuma

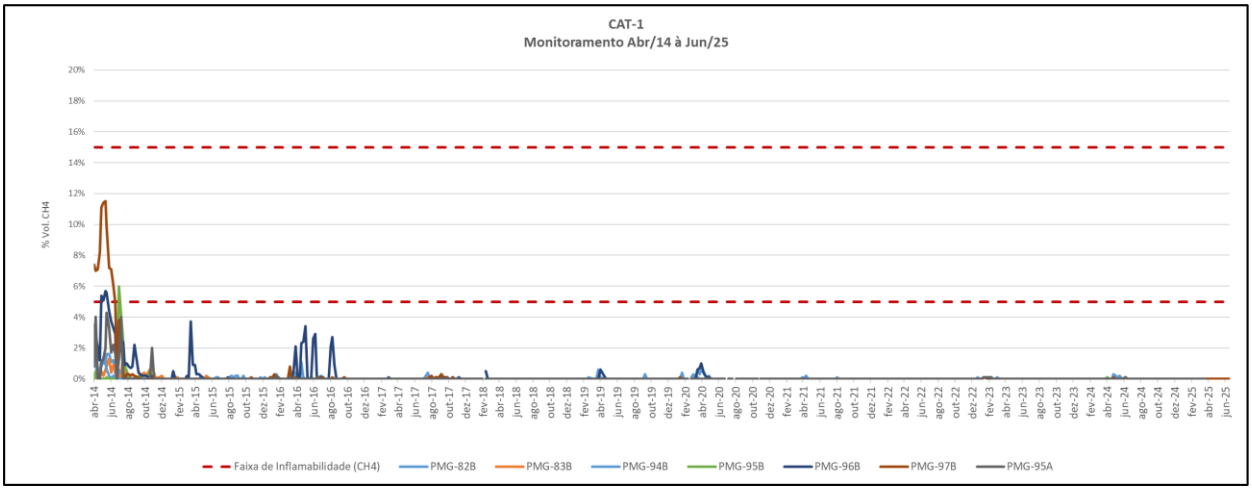

Ao longo de 11 anos e 2 meses de monitoramento foi detectada concentração de Metano sob a laje do edifício Enfermaria apenas no PMG-95A, com concentrações variáveis entre 1,0 e 4,0% VolCH_4, que perduraram de abril a novembro de 2014. Posteriormente, as leituras neste ponto permaneceram nulas ou abaixo de 1%.

Nos poços da porção profunda nota-se a redução das concentrações em todos os poços, após o início da operação do sistema de ventilação em julho de 2014, sendo que após isso estas se mantiveram abaixo de 5% de CH_4 ou nulas.

No primeiro trimestre de 2023, as concentrações em todos os poços se apresentaram nulas ou abaixo de 1% VolCH_4.

No segundo, terceiro e quarto trimestre de 2023, as concentrações em todos os poços se mantiveram nulas ou abaixo de 1% VolCH_4. O ano de 2024, as concentrações estiveram abaixo de 1%VolCH_4 ou nulas.

No 1º e 2º trimestre de 2025, as concentrações estiveram abaixo de 1%VolCH_4 ou nulas.


GINÁSIO:

- Análise de Metano no período de Abril de 2014 a Março de 2025

Poços existentes: 3 pares + 08 poços

Poços que apresentaram concentração >1%: (PMG-162B)

Detecção (>1%) sob a laje: Nenhuma

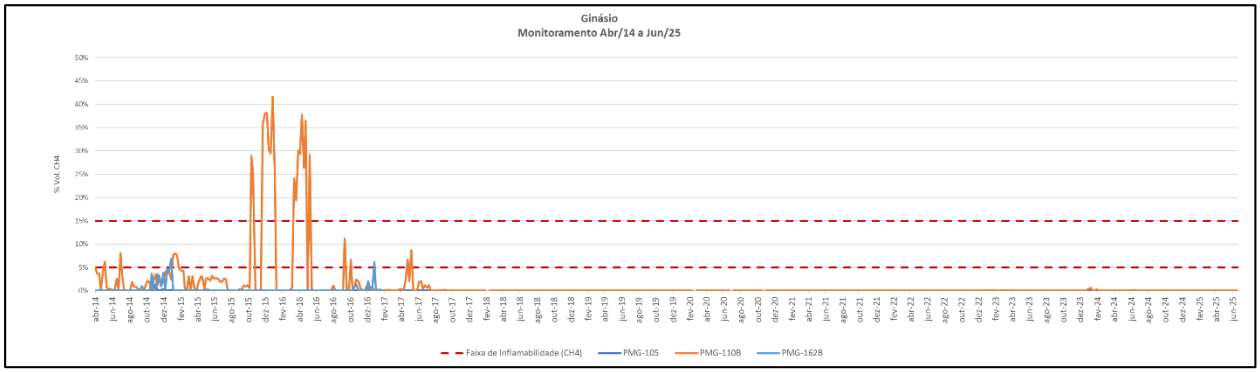

Ao longo dos anos de monitoramento não foram detectadas concentrações de Metano sob a laje do edifício. Percebe-se que com o início da operação do sistema de ventilação (setembro de 15) houve um aumento inicial das concentrações no PMG-110B, mas que a partir de julho de 2017 os valores das concentrações foram reduzidos para abaixo de 1% ou nulos, permanecendo dessa forma até então.

O PMG-162B, porção rasa do poço de monitoramento apresentou concentrações de nulas a inferior a 1% VolCH_4 até janeiro de 2023. Após esse período as concentrações variam acima de 1% até o valor nulo, no entanto abaixo do nível de inflamabilidade de 5% VolCH_4.

No segundo trimestre de 2023, o PMG-162 apresentou concentração acima de 1%VolCH_4 durante o mês de abril de 2023, e acima de 5%VolCH_4 em maio de 2023, durante o mês de junho de 2023, os valores voltaram a se apresentar nulos ou abaixo de 1%.

No terceiro e quarto trimestre de 2023, os valores de todos os poços apresentaram valores nulos. No ano de 2024, os valores se apresentaram nulos ou abaixo de 1%.

No 1º trimestre de 2025, os valores se apresentaram nulos ou abaixo de 1%. No 2º trimestre de 2025, foi identificado dentro da faixa de inflamabilidade o PMG-162B.

GUARDA UNIVERSITÁRIA:

- Análise de Metano no período de Abril de 2014 a Junho de 2025

Poços existentes: 3 pares
Poços que apresentaram concentração >1%: Nenhum
Detecção (>1%) sob a laje: Nenhuma

O sistema de ventilação foi iniciado em julho de 2014 e os poços de monitoramento da guarda universitária foram instalados em julho de 2015. Nenhum par apresentou concentrações significativas de Metano (>1%VolCH_4) durante todo o período de monitoramento.

O sistema de ventilação no edifício da guarda universitária foi desligado e o monitoramento foi interrompido em maio de 2019 devido à reforma do prédio. Em junho de 2020 a obra foi finalizada e constatou-se que os poços instalados na área foram tamponados, portanto, foi realizada a reinstalação destes pontos. O monitoramento foi retomado e as concentrações se mantiveram nulas.

Em 2021 foi possível observar pontualmente no mês de outubro, concentrações de até 1,30% de Metano no PMG-126B. Contudo, nos demais poços foram verificados valores abaixo de 1% ou nulos.

Em 2022 e 2023, todos os poços se mantiveram nulos. No ano de 2024, os poços estiveram nulos ou abaixo de 1%.

No 1º e 2º trimestre de 2025, os valores se apresentaram nulos ou abaixo de 1%.


PORTARIA P3:

- Análise de Metano no período de Abril de 2014 a Março de 2025

Poços existentes: 2 Trios

Poços que apresentaram concentração >1%: (Nenhuma)

Detecção (>1%) sob a laje: Nenhuma

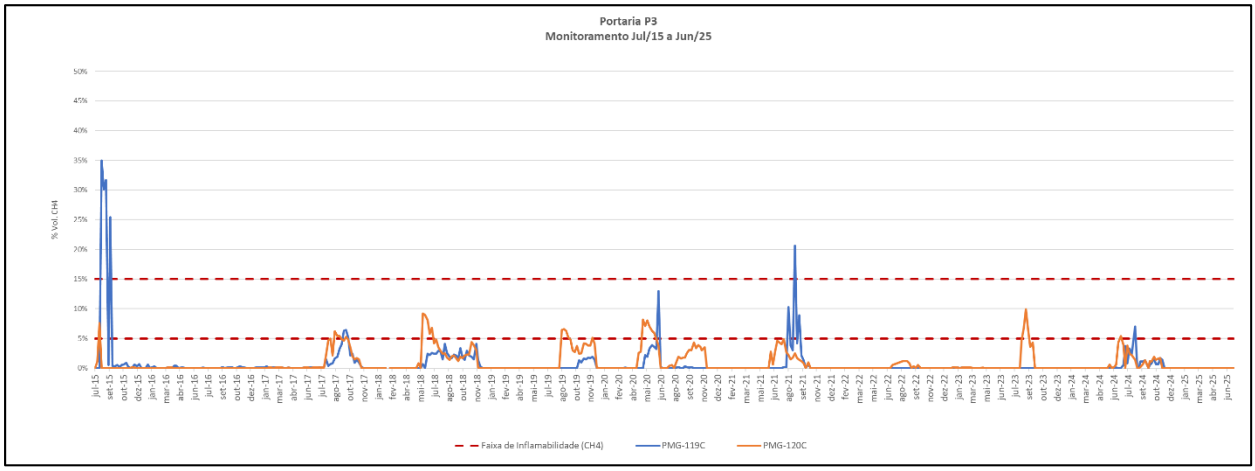

Na Portaria P3, foi detectada uma segunda laje sob o piso. Sendo assim, os poços de monitoramento neste edifício foram instalados em três profundidades: A (sob a primeira laje ~0,30m); B (sob a segunda laje, no tapete de brita ~1,00m); e C (no solo ~1,30m). Neste edifício o sistema de ventilação foi iniciado em junho de 2014 e os poços de monitoramento instalados em julho de 2015.

Ao longo dos monitoramentos, entre agosto de 2015 e dezembro de 2020, não foram detectadas concentrações de Metano sob as lajes do edifício (0,30 a 0,50m). Nota-se que os meses seguintes à instalação dos poços de monitoramento (agosto e setembro de 2015) foram detectadas as concentrações mais elevadas nos poços profundos e, posteriormente estas concentrações mantiveram-se nulas ou abaixo de 1%VolCH_4.

Nos anos de 2020 e 2021, os poços PMG-119C e PMG-120C apresentaram concentrações de até 20,60%Vol CH_4. É possível observar que o aumento das concentrações sempre acontece no segundo semestre do ano.

Em 2022, as concentrações de Metano no PMG-119C se mantiveram nulas e a do PMG-120C esteve inferior a 5% VolCH_4, apresentando valor nulo ao fim do trimestre. Em 2023, as concentrações de metano se mantiveram nulas ou em valor inferior a 1% VolCH_4 em ambos os poços de monitoramento de gás.

No segundo trimestre de 2023, as concentrações se mantiveram nulos ou em valor inferior a 1%VolCH_4. No terceiro trimestre, o poço PMG-120C apresentaram concentrações dentro da faixa de inflamabilidade, atingindo o valor de até 9,90%VolCH_4.

No 4º trimestre de 2022, e 1º trimestre de 2024, todas as concentrações se mantiveram nulas ou abaixo de 1%VolCH_4. No 2º trimestre de 2024, o PMG-120C apresentou concentrações acima de 1%VolCH4, no entanto abaixo da faixa de inflamabilidade.

No 3º trimestre de 2024, o PMG-119C e PMG-120C foram identificados acima de 1%VolCH4 nos 3 meses, no entanto, o PMG-120C esteve dentro da faixa de inflamabilidade em julho e o PMG-119C em agosto.

No 4º trimestre de 2024, o PMG-119C e PMG-120C foram identificados acima de 1%VolCH4 somente em outubro e novembro de 2024, fora da faixa de inflamabilidade.

No 1º e 2º trimestre de 2025, os valores se apresentaram nulos ou abaixo de 1%.

Avenida Paulista, 2064 - 14° Andar I Bela Vista I 01310-200 I São Paulo - SP I 11 2844 4386 engesolve.com.br


TRANSPORTES:

- Análise de Metano no período de Abril de 2014 a Junho de 2025

Poços existentes: 4 Pares

Poços que apresentaram concentração >1%: Nenhuma

Detecção (>1%) sob a laje: Nenhuma

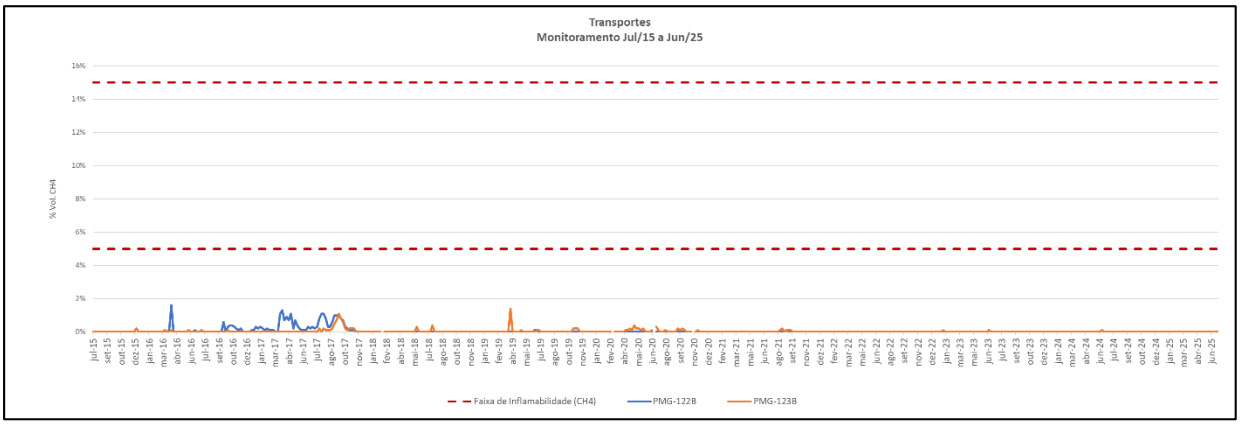

Neste edifício o sistema de ventilação foi iniciado em junho de 2014 e os poços de monitoramento instalados em julho de2015.

Ao longo do monitoramento até o presente momento, não foram detectadas concentrações de Metano sob a laje do edifício. Eventualmente, na porção profunda, ocorrem detecções de metano variando entre 1,1 e 1,6%VolCH_4. Desde o final de 2021 as concentrações encontram-se nulas.

Em 2023, as concentrações foram identificadas nulas ou abaixo de 1% VolCH_4. Ocorrendo o mesmo no ano de 2024.

No 1º e 2º trimestre de 2025, os valores se apresentaram nulos ou abaixo de 1% VolCH_4.

6. RESULTADOS OBTIDOS NO 2º TRIMESTRE DE 2025

As medições no 2º trimestre de 2025 (abril a junho de 2025) ocorreram de forma efetiva nos poços de monitoramento e infraestrutura. Os sistemas de ventilação operaram normalmente.

Durante o 2º trimestre de 2025, não houve interrupções das medições, salvo intercorrências com problemas do equipamento durante 2 dias e salas com restrição de acesso. Ainda se salienta que a operação dos sistemas de ventilação se manteve inalterada, operando por todo o período 24 horas por dia, 30 dias por mês.

Durante este trimestre, foram utilizados para medição dos gases os equipamentos BW nº de série SK317-003329, BW nº de série SK317-003332 e o GEM 5000 nº de série G500491.

A seguir são apresentados os dados compilados de monitoramento (**Item 6.1**) e de operação dos sistemas (**Item 6.2**).

6.1. RESULTADOS DO MONITORAMENTO EM POÇOS E NA INFRAESTRUTURA

As medições realizadas nos poços de monitoramento indicaram que as concentrações de Metano acima de 1%Vol estão localizadas em pontos específicos da área de estudo e não abrangem toda a extensão dos edifícios, além de estarem localizadas nas porções mais profundas (cerca de 1,0m).

Os poços nas porções profundas que demonstraram concentrações acima de 1%VolCH_4 neste trimestre foram: PMG-05B, PMG-51B, PMG-74B, PMG-150B, PMG-162B e PMG-165B.

Não foram detectadas concentração nos poços nas porções rasas.

Os demais poços rasos e profundos não demonstraram concentrações significativas (>1%Vol) de Metano.

Quanto às medições de H_2S e CO nos poços de monitoramento, foram obtidas concentrações de 3,0 e 18,0, respectivamente. Essas concentrações indicam que há a produção destes compostos devido a degradação da matéria orgânica. Para VOC, não foram constatadas concentrações no trimestre em questão.

Sobre as medidas de pressão, os valores entre -0,2 a 0,2 mBar são considerados como faixa de variação do equipamento. Sendo assim, foi observada pressão em alguns poços de monitoramento, positiva de até 0,86 e negativa de até –4,37 mBar. Essa variação de pressão pode relacionar-se com a operação dos sistemas e/ou com a variação do nível d'água local.

As medições na infraestrutura, que contemplaram ralos e caixas de passagem em todas as edificações, bem como os ambientes com pouca circulação de ar, detectaram concentrações nulas de Metano e de VOC, o que indica que, apesar das duas ocorrências de concentração de

Metano em poços sob a laje, não houve a intrusão dos gases nos edifícios ou em ambientes fechados.

Os **Anexos 3** e **4** apresentam as planilhas de monitoramento semanal dos poços e quinzenal dos pontos de infraestrutura.

Visando facilitar a observação dos resultados obtidos, foram destacados na **Tabela 6.1.1** e na **Figura 6.1.1.** os poços que apresentaram concentração de Metano ao menos uma vez acima de 1%Vol durante o trimestre analisado, a fim de avaliar a distribuição dos poços com concentrações próximas ou na faixa de inflamabilidade de Metano.

A **Figura 6.1.2.** apresenta as plumas de isoconcentrações de Metano do 2º trimestre de 2025.


Os gráficos de concentrações a seguir exibem a variação da concentração semanal de Metano nos poços de monitoramento que demonstraram ao menos uma vez a presença de Metano acima de 1%Vol, a fim de acompanhar a concentração recorrente de Metano nos Poços, mesmo que abaixo da faixa de inflamabilidade.


O **Anexo 5** apresenta a evolução das concentrações e pressões obtidas desde o início do monitoramento em abril de 14 até junho de 25.


Tabela 6.1.1 –Resultados dos poços com concentração igual ou maior que 1%VolCH4 (Abril à Junho/2025)

Distribuição dos Gases nos Edifícios (2º Trimestre/2025)														
EDIFÍCIOS	**Total de Poços**	**abr/25**				**mai/25**				**jun/25**				
		Poços ≥ 1%VolCH₄		**Posição**	**≥ Faixa 5-15%**	**Poços ≥ 1%VolCH₄**		**Posição**	**≥ Faixa 5-15%**	**Poços ≥ 1%VolCH₄**		**Posição**	**≥ Faixa 5-15%**	
Edifício I-1	17 Pares	Nenhum				Nenhum				Nenhum				
Edifício I-3 e I-5	21 Pares	Nenhum				Nenhum				Nenhum				
Edifício I-4	12 Pares	Nenhum				Nenhum				1	PMG-150B	Profundo (1,00 m)	Não	
Conjunto Laboratorial	17 Pares	**1**	PMG-51B	Profundo (1,00 m)	Não	Nenhum				Nenhum				
			-	-	-									
			-	-	-									
			-	-	-									
			-	-	-									
			-	-	-									
			-	-	-									
			-	-	-									
			-	-	-									
Bloco Inicial	14 Pares	1	PMG-05B	Profundo (1,00 m)	Não	Nenhum				Nenhum				
Enfermaria	7 Pares	1	PMG-74B	Profundo (1,00 m)	Não	1	PMG-74B	Profundo (1,00 m)	Não	**1**	PMG-74B	Profundo (1,00 m)	Não	
											PMG-165B	Profundo (1,00 m)	**SIM**	
											-	-	-	
CAT	7 Pares	Nenhum				Nenhum				Nenhum				
Incubadora	6 Pares	Nenhum				Nenhum				Nenhum				
Ginásio	11 Pares	1	PMG-162B	Profundo (1,00 m)	Não	1	PMG-162B	Profundo (1,00 m)	**SIM**	Nenhum				
Guarda Universitária	7 Pares	Nenhum				Nenhum				Nenhum				
Portaria P3	2 Trios	Nenhum				Nenhum				Nenhum				
Transportes	4 Pares	Nenhum				Nenhum				Nenhum				

Fonte: Dados de Campo, Engesolve, 2024.

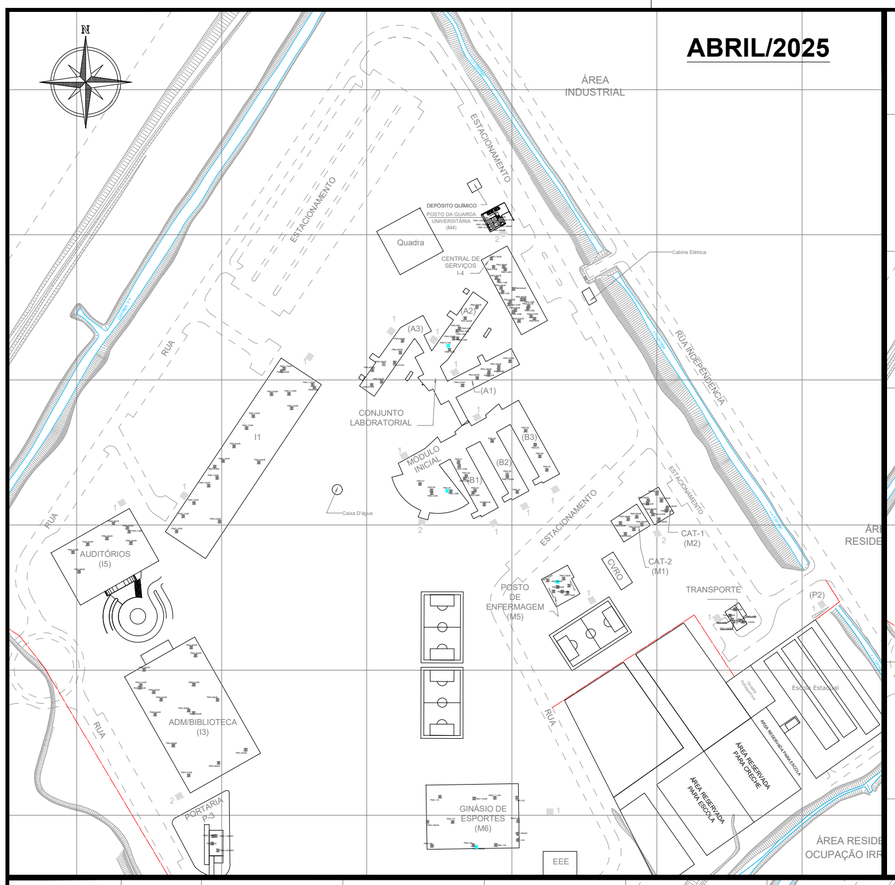

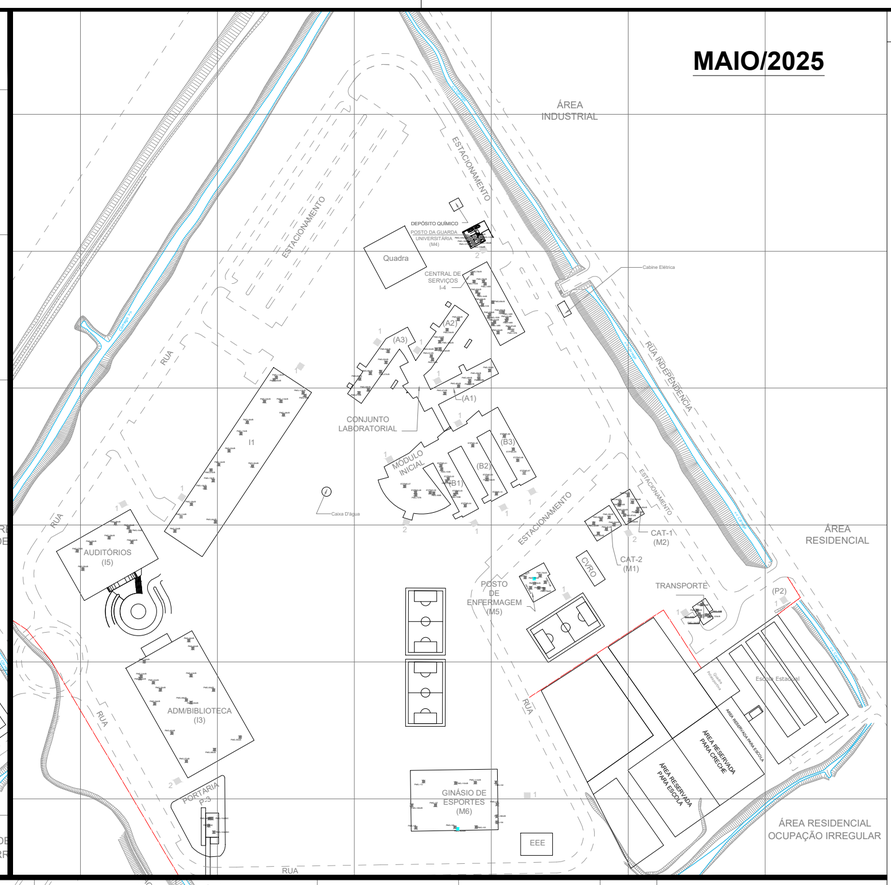

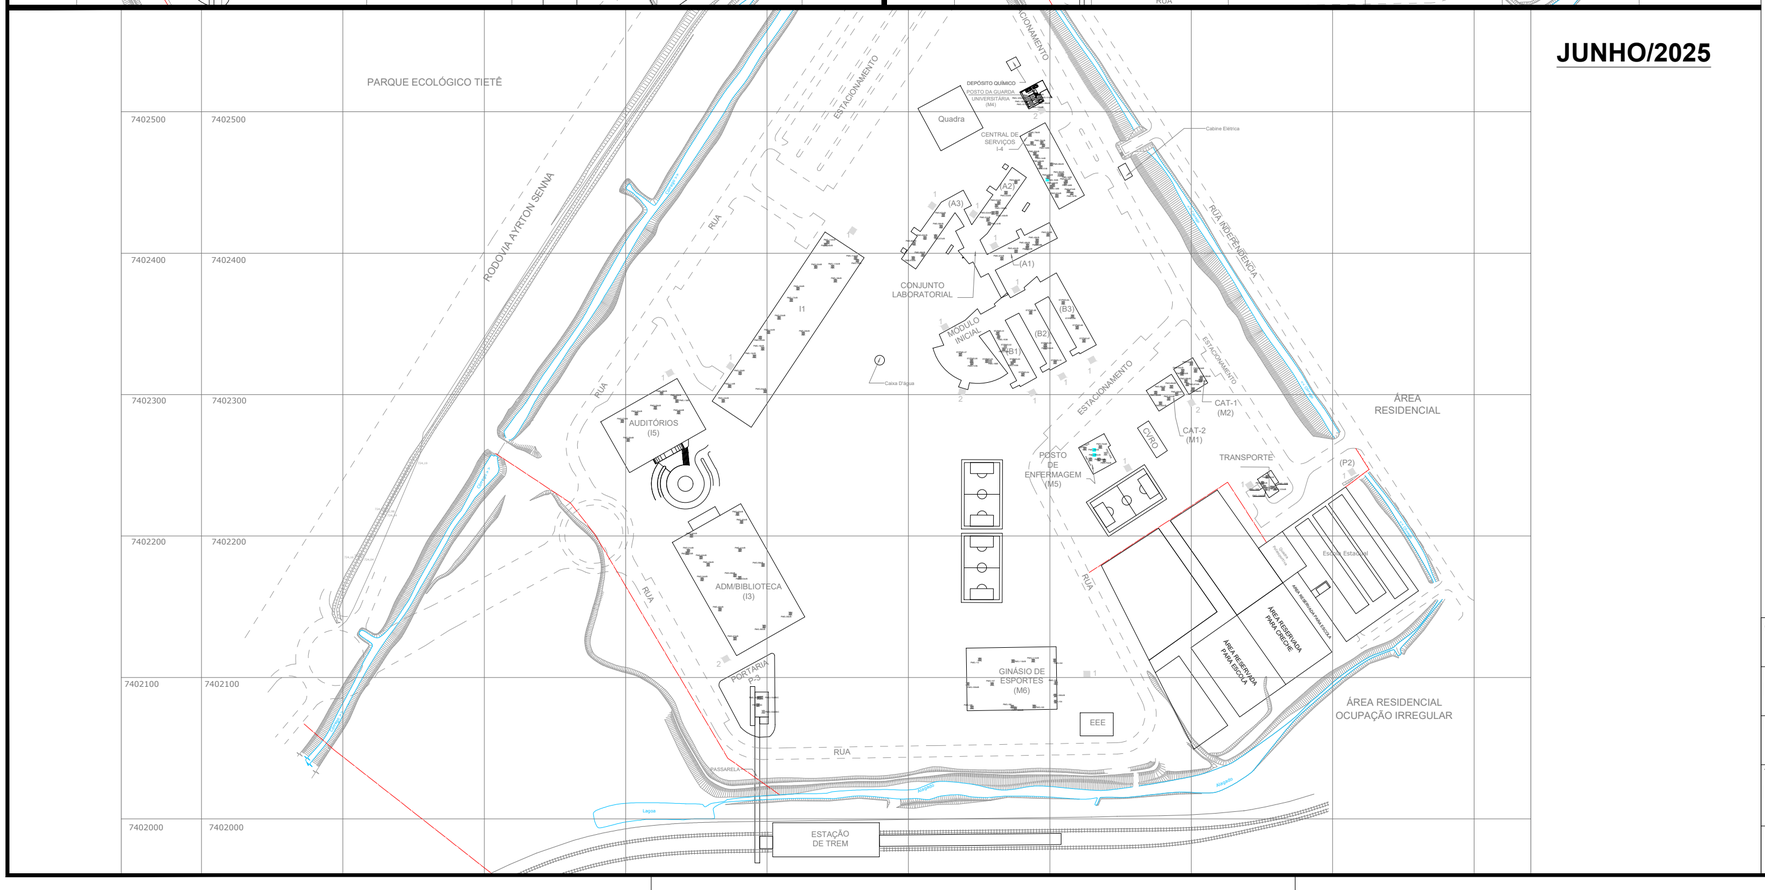

LEGENDA:

- Taludes
- Abrigo para equipamento
- Quantidades de exaustores nos abrigos
- Cerca de divisa
- Guia e Estacionamento
- Edificações
- Poço de monitoramento de gás
- Poço com concentração de CH4 >1% na porção rasa (subslab – 0,30 m)
- Poço com concentração de CH4 > 1% na porção profunda (1,00 m)

Escala Gráfica:

0 31,5 63 94,5 126m

CLIENTE:
Universidade de São Paulo - USP Leste

PROJETO:
Evolução do Monitoramento de Intrusão de Gases e da Operação do Sistema de Ventilação

EngeSolve
SOLUÇÕES AMBIENTAIS INTEGRADAS


ENDEREÇO:
Rua Arlindo Béttio, 1.000, Ermelino Matarazzo – São Paulo/SP

TÍTULO:
Resultado da Distribuição das Concentrações de Metano Detectadas >1%Vol (Abril à Junho/2025)


RESPONSÁVEL TÉCNICO:	FIGURA Nº:	DATA:
Felipe Chufi	6.1.1	JUL/2025

FORMATO: A2


ABRIL/2025

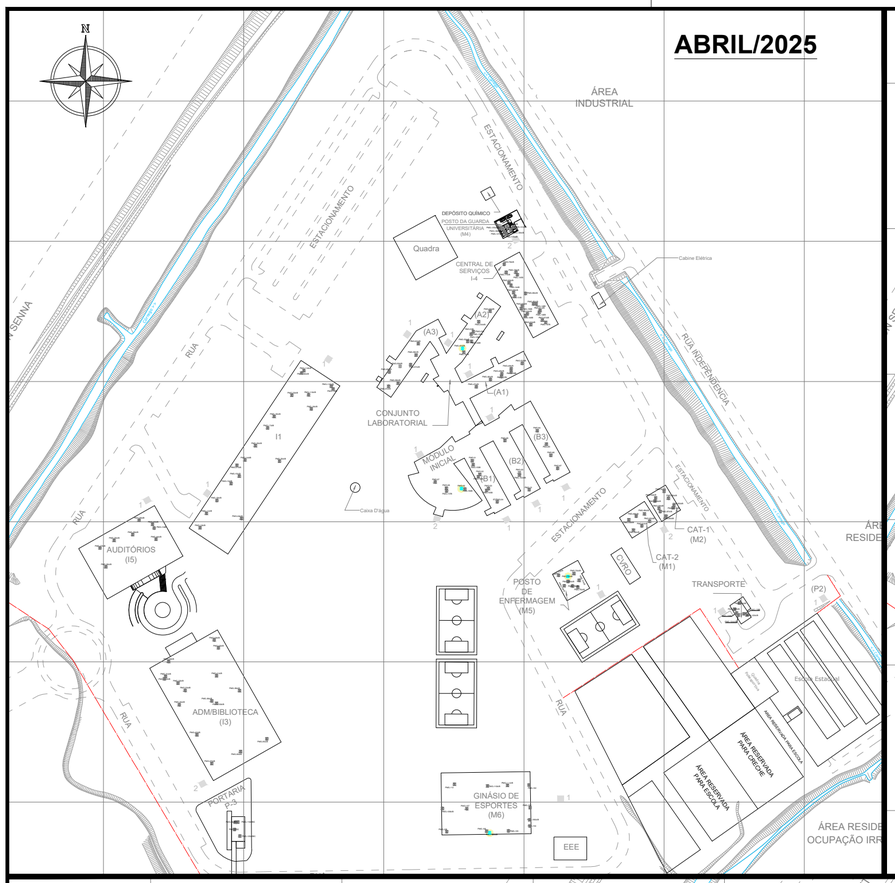

MAIO/2025

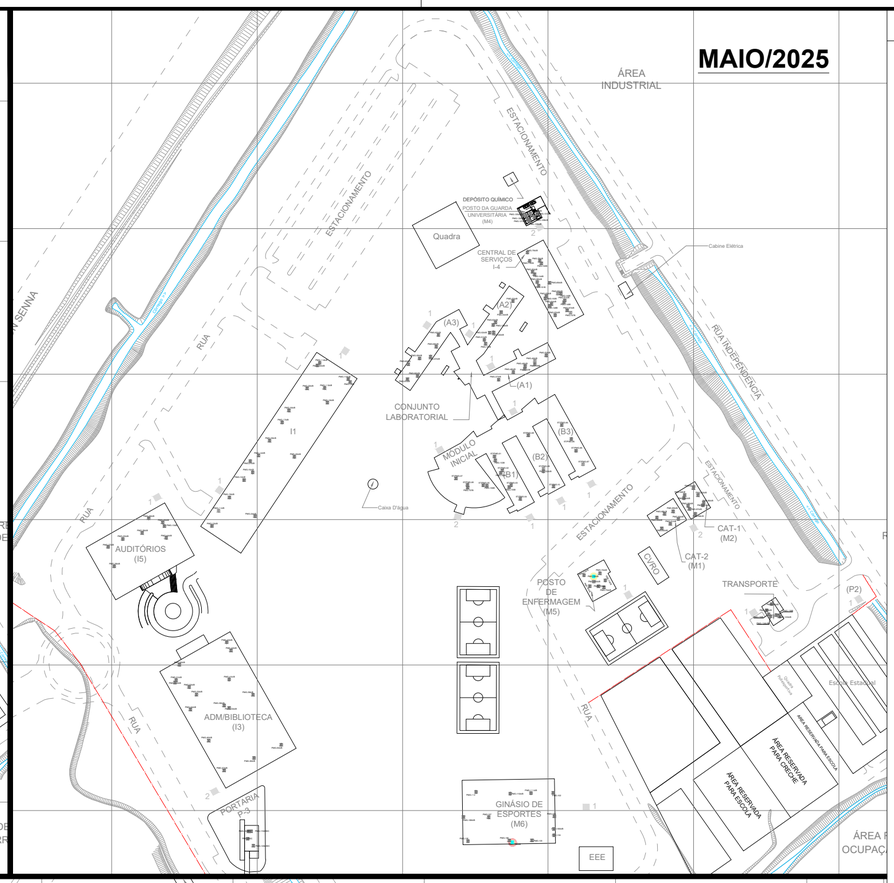

JUNHO/2025

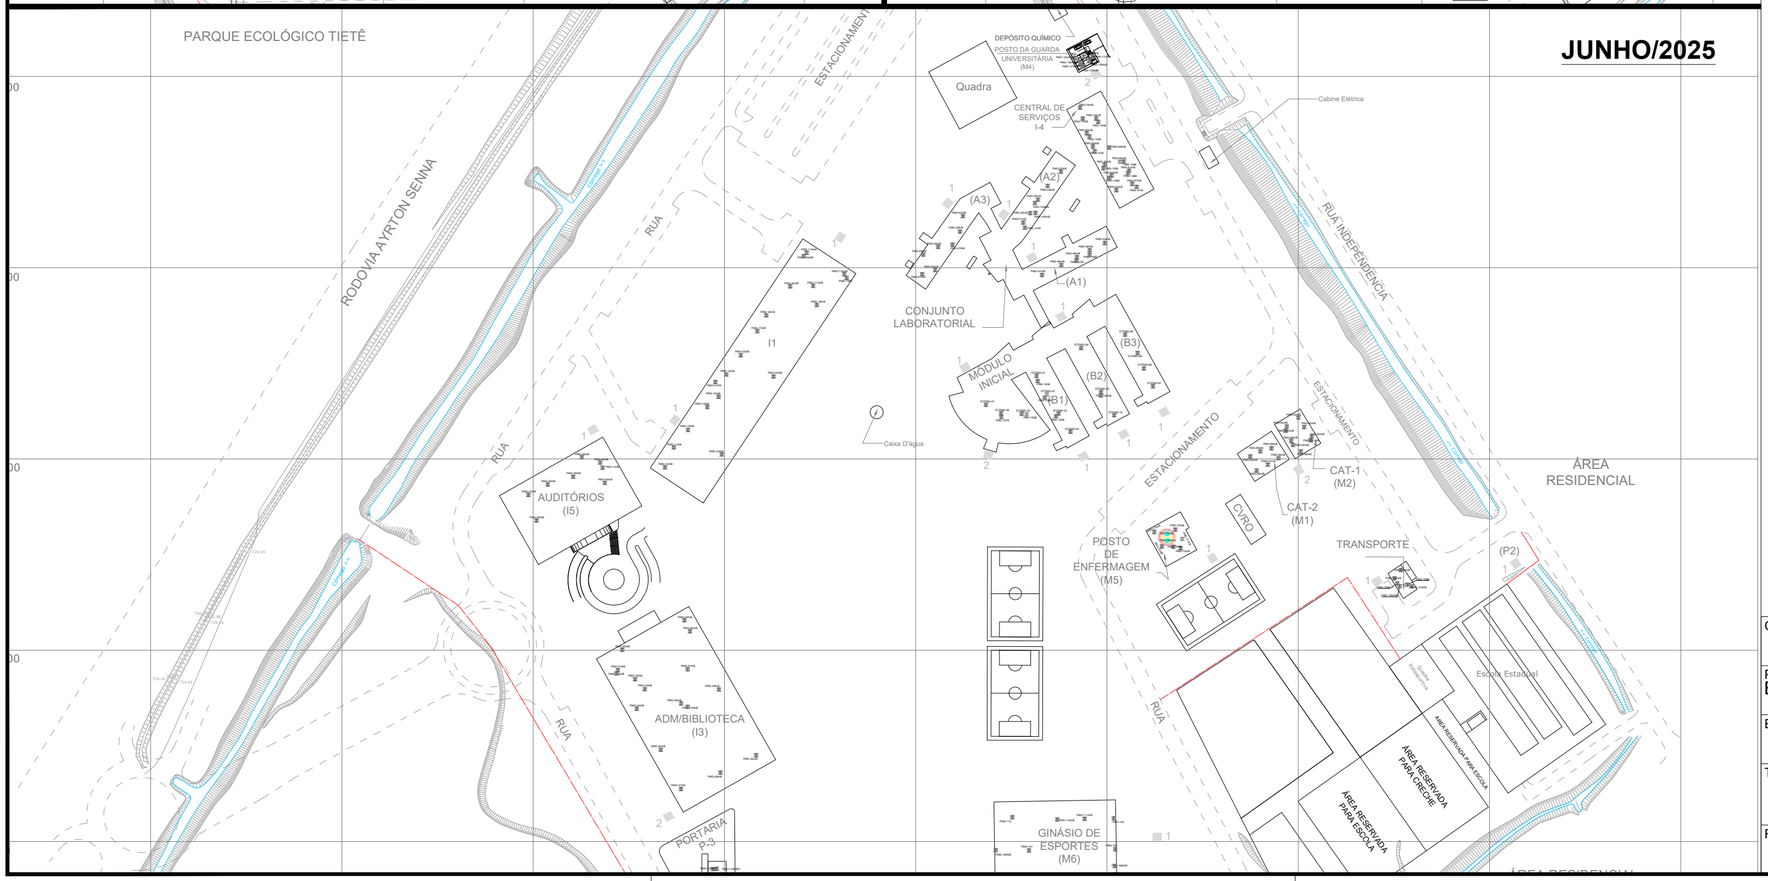

LEGENDA:

- Taludes
- Abrigo para equipamento
- Quantidades de exaustores nos abrigos
- Cerca de divisa
- Guia e Estacionamento
- Edificações
- Poço de monitoramento de gás
- Poço com concentração de CH4 > 1% na porção profunda (1,00 m)

Escala de cores de Isoconcentração de Metano (%Vol.CH4)

- > 50,0
- 15,0 - 50,0
- 5,0 - 15,0
- 1,0 - 4,9
- 0,0 - 0,9

Escala Gráfica:

0 31,5 63 94,5 126m

CLIENTE:
Universidade de São Paulo - USP Leste

PROJETO:
Evolução do Monitoramento de Intrusão de Gases e da Operação do Sistema de Ventilação

EngeSolve
SOLUÇÕES AMBIENTAIS INTEGRADAS

ENDEREÇO:
Rua Arlindo Béttio, 1.000, Ermelino Matarazzo – São Paulo/SP

TÍTULO:
Pluma de Isoconcentração de Metano no Solo no Horizonte B (1 metro de Profundidade) no período de Abril à Junho de 2025

RESPONSÁVEL TÉCNICO:	FIGURA Nº:	DATA:
Felipe Chufi	6.1.2	JUL/2025

FORMATO: A2

6.2. RESULTADOS OBTIDOS NA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE VENTILAÇÃO

A avaliação da eficiência dos sistemas de ventilação (circulação de ar nos tapetes de brita, logo abaixo da laje das edificações) é realizada pela análise dos resultados de monitoramento das concentrações de Metano e da variação de pressão nos poços de monitoramento nas duas profundidades distintas, bem como pela operação ininterrupta dos sistemas (24h por dia, 30 dias por mês).

O sistema de ventilação é individual e específico para cada edificação. De forma geral, ele é composto por elementos de subsuperfície (colchão de brita, pontos de captação de ar atmosférico e de extração de gases e/ou tubulação geomecânica), por elementos de superfície (tubulação de interconexão dos pontos de extração de gases) e por exaustores (montados com compressor, célula de vácuo e painel elétrico).

No total, há 24 exaustores para realização de ventilação forçada, sendo que estão em utilização 22 unidades e 02 são adicionais, servindo como reservas para serem utilizadas em caso de necessidade de substituição de equipamentos quando algum exaustor precisar ser encaminhado para manutenção corretiva.

Os exaustores estão distribuídos em 18 abrigos, pois em alguns abrigos foi possível posicionar dois exaustores, enquanto em outros, somente um. A distribuição dos exaustores e abrigos está apresentada na **Tabela 6.2.1.**

Os sistemas se mostram eficientes no seu propósito de promover a circulação do ar no tapete de brita, evitando o acúmulo e confinamento de gases sob a laje dos edifícios. Essa eficiência se confirma pela ausência de Metano nos poços instalados no tapete de brita. Além disso, também é possível observar na análise histórica do monitoramento que houve uma diminuição das concentrações de Metano até mesmo nos poços de monitoramento instalados na profundidade do solo.

Observa-se que os sistemas de extração instalados com a metodologia de furos na laje (ex. Módulo Inicial) têm atuação diferente daquela que manteve a ventilação via dutos enterrados, como no Conjunto Laboratorial. Ambos os tipos de sistema são eficientes e capazes de eliminar as concentrações no tapete de brita logo abaixo da laje, porém os dados indicam que o primeiro é capaz de diminuir as concentrações também em solo, logo após a camada de brita.

Em fevereiro de 2016 iniciou-se o monitoramento sistemático nos exaustores de cada sistema de ventilação dos edifícios, realizando-se medições semanais de Metano e pressão com o equipamento GEM 5000 e VOCs com o equipamento BW, bem como a leitura de pressão na célula de vácuo.

No trimestre englobado por esse relatório (abril a junho de 2025), os exaustores operaram com pressão na célula de vácuo de -2,0 mmHg (-2,66mBar) com variação do equipamento entre -0,2 e 0,2 mBar.

Tabela 6.2.1 – Localização dos Exaustores dos Sistemas de Ventilação

Identificação do Exaustor	Edifício ao qual está conectado	Identificação do Abrigo
Exaustor I-1 (1)	Edifício I-1 Parte 1	Abrigo I-1 (1)
Exaustor I-1 (2)	Edifício I-1 Parte 2	Abrigo I-1 (2)
Exaustor I-5 Auditórios	Edifício I-5 Auditórios	Abrigo I-5 Auditórios
Exaustor Biblioteca	Edifício I-3 Biblioteca	Abrigo I-3 Biblioteca
Exaustor Portaria 3	Portaria P3	Abrigo I-3 Biblioteca
Exaustor Ginásio	Ginásio	Abrigo Ginásio
Exaustor Enfermaria	Enfermaria	Abrigo Enfermaria
Exaustor CAT 1	CAT 1	Abrigo Incubadora
Exaustor CAT 2	Incubadora (CAT 2)	Abrigo Incubadora
Exaustor Transportes	Transportes	Abrigo Transportes
Exaustor MI (B1)	Módulo Inicial - Bloco 1	Abrigo Módulo Inicial (B1)
Exaustor MI (B2)	Módulo Inicial - Bloco 2	Abrigo Módulo Inicial (B2)
Exaustor MI (B3)	Módulo Inicial - Bloco 3	Abrigo Módulo Inicial (B3)
Exaustor Auditório 1	Módulo Inicial - Auditórios 1	Abrigo Auditórios
Exaustor Auditório 2	Módulo Inicial - Auditórios 2	Abrigo Auditórios
Exaustor Cantina	Módulo Inicial - Cantina	Abrigo Cantina
Exaustor Corredor	Módulo Inicial - Corredor	Abrigo Módulo Inicial (Corredor)
Exaustor Conj. Lab. (A1)	Conjunto Laboratorial Edifício A1	Abrigo Conjunto Laboratorial (A1)
Exaustor Conj. Lab. (A2)	Conjunto Laboratorial Edifício A2	Abrigo Conjunto Laboratorial (A2)
Exaustor Conj. Lab. (A3)	Conjunto Laboratorial Edifício A3	Abrigo Conjunto Laboratorial (A3)
Exaustor I-4	Edifício I-4	Abrigo I-4
Exaustor Guarda	Guarda Universitária	Abrigo I-5
Exaustor Reserva 1	Reserva 1 (sala E-02 Edifício I-1)	
Exaustor Reserva 2	Reserva 2 (sala E-02 Edifício I-1)	

Fonte: Dados de Campo, Engesolve, 2024.

Na entrada de cada exaustor não foram detectadas concentrações para VOC e nem para Metano. O vácuo é variável para cada edifício e, eventualmente há picos de pressão negativa. Quando os picos são observados, realiza-se a drenagem da tubulação nos pontos de inspeção e em sua extensão, retirando-se a água acumulada e voltando a pressão média.

Sobre a pressão de sucção de operação do sistema, a pressão medida na entrada do exaustor, quando comparada aos modelos matemáticos de projeto, devem atender à necessidade estabelecida, considerando as perdas de carga no sistema. Ao longo do monitoramento do 2º trimestre de 2025, tais pressões se mantiveram em valores superiores aos de projeto, demonstrando que o arraste previsto ocorreu. A **Tabela 6.2.2.** apresenta este comparativo.

Nos gráficos a seguir demonstra-se a variação da pressão na célula de vácuo em comparação com a entrada nos exaustores. O **Anexo 6** apresenta as planilhas de monitoramento semanal de cada exaustor.

Cabe mencionar que entre o término do processo licitatório da antiga empresa que operava na USP Leste e o início da operação pela ENGESOLVE, houve um período em que as medições dos poços de monitoramento e pontos de infraestrutura tiveram suas frequências alteradas, com um maior espaçamento em determinadas medições e priorização em outras, mas a operação dos sistemas de ventilação se manteve inalterada por todo o período (24 horas por dia, 30 dias por mês).

A limpeza dos abrigos é realizada a cada 3 ou 4 meses, devido ao acúmulo de pó, grama advinda da capinagem e aranhas.


Tabela 6.2.2. – Comparativo de pressão de sucção de projeto x medição no 2º trimestre/2025


Detalhes de Projeto dos Sistemas (obtidos por meio de simulações - IPT)							Dados Obtidos entre Abril e Junho de 2025									
SISTEMA		**Pressão de Sucção**	**Vazão total de exaustão**	**Velocidade principal de escoamento do ar no tapete de brita**	**Taxa de renovação do ar no tapete de brita**	**Exaustor (Capacidade de Aplicação de Pressão)**	**Identificação do Exaustor**	**Pressão Mínima** obtida na entrada do exaustor neste período				**Pressão Máxima** obtida na entrada do exaustor neste período			
Edifício I-1		153Pa nos pontos de extração	34,8 m³/h	≥10^{-4}m/s	0,15 renov/h ou 3,7 renov/dia	194,8Pa (153 Pa Rede fluxo + 41,8 Pa Perdas Carga)	Exaustor I-1 (1)	-1,64	mBar	**-164,0**	Pa	-3,18	mBar	**-318,0**	Pa
							Exaustor I-1 (2)	-4,2	mBar	**-420,0**	Pa	-4,76	mBar	**-476,0**	Pa
Biblioteca I-3		153Pa nos pontos de extração	15,5 m³/h	≥10^{-3}m/s	0,05 renov/h ou 1,3 renov/dia	154,9Pa (153 Pa Rede fluxo + 1,9 Pa Perdas Carga)	Exaustor Biblioteca	-1,82	mBar	**-182,0**	Pa	-2,38	mBar	**-238,0**	Pa
Auditórios I-5		-	-	-	-	-	Exaustor I-5 Auditórios	-1,54	mBar	**-154,0**	Pa	-2,23	mBar	**-223,0**	Pa
Portaria P3		63Pa nos pontos de extração	3,2 m³/h	≥10^{-5}m/s	1,5 renov/h ou 36 renov/dia	67,4Pa (63 Pa Rede fluxo + 4,5 Pa Perdas Carga)	Exaustor Portaria P3	-3,23	mBar	**-323,0**	Pa	-4,15	mBar	**-415,0**	Pa
Ginásio de Esportes		43,1Pa no ponto de aplicação e 13Pa na extremidade oposta	12,6 m³/h	≥10^{-4}m/s	0,1 renov/h ou 2,4 renov/dia	59,4Pa (43,1 Pa Rede fluxo + 16,3 Pa Perdas Carga)	Exaustor Ginásio	-1,72	mBar	**-172,0**	Pa	-2,35	mBar	**-235,0**	Pa
Enfermaria		38Pa nos pontos de extração	46,3 m³/h	≥10^{-4}m/s	3,6 renov/h ou 86,4 renov/dia	44Pa (38 Pa Rede fluxo + 6 Pa Perdas Carga)	Exaustor Enfermaria	-2,46	mBar	**-246,0**	Pa	-5,58	mBar	**-558,0**	Pa
CAT 1		27Pa nos pontos de extração de ar atmosférico	12,6 m³/h	≥10^{-5}m/s	0,7 renov/h ou 16,8 renov/dia	117Pa (27 Pa Rede fluxo + 87 Pa Perdas Carga)	Exaustor CAT 1	-2,3	mBar	**-230,0**	Pa	-3,06	mBar	**-306,0**	Pa
CAT 2 (Incubadora)		11Pa nos pontos de extração de ar atmosférico	4,0 m³/h Tubo 1 8,0 m³/h Tubo 2 4,5 m³/h Tubo 3	≥10^{-5}m/s	1,3 renov/h ou 31,2 renov/dia	46,3Pa (13,5 Pa Rede fluxo + 30,5 Pa Perdas Carga)	Exaustor CAT 2	-1,85	mBar	**-185,0**	Pa	-3,5	mBar	**-350,0**	Pa
Transportes		-	-	-	-	-	Exaustor Transportes	-3,65	mBar	**-365,0**	Pa	-5,15	mBar	**-515,0**	Pa
Módulo Inicial	**Blocos Padrões**	16,5Pa no ponto de aplicação e 2 Pa no ponto mais distante do exaustor	49,5 m³/h	?	?	16,5 Pa	Exaustor MI (B1)	-2,55	mBar	**-255,0**	Pa	-3,88	mBar	**-388,0**	Pa
							Exaustor MI (B2)	-2,04	mBar	**-204,0**	Pa	-3,43	mBar	**-343,0**	Pa
							Exaustor MI (B3)	-3,36	mBar	**-336,0**	Pa	-4,46	mBar	**-446,0**	Pa
	Auditórios	49Pa e 97Pa nos pontos de aplicação (esquerdo e direito, respectivamente) e 2Pa no ponto mais distante do exaustor	73 m³/h	?	?	97Pa	Exaustor Auditório 1	-2,46	mBar	**-246,0**	Pa	-4,88	mBar	**-488,0**	Pa
							Exaustor Auditório 2	-1,78	mBar	**-178,0**	Pa	-2,57	mBar	**-257,0**	Pa
	Corredor de Serviços	162 Pa no ponto de aplicação e 2 Pa no ponto mais distante do exaustor	122 m³/h	?	?	162 Pa	Exaustor Cantina	-2,47	mBar	**-247,0**	Pa	-3,79	mBar	**-379,0**	Pa
							Exaustor Corredor	-2,09	mBar	**-209,0**	Pa	-3,48	mBar	**-348,0**	Pa
Conjunto Laboratorial		-	3,2 m²/h	?	0,5 renov/h ou 12 renov/dia	?	Exaustor Conj. Lab. (A1)	-4,28	mBar	**-428,0**	Pa	-5,68	mBar	**-568,0**	Pa
							Exaustor Conj. Lab. (A2)	-4,57	mBar	**-457,0**	Pa	-5,98	mBar	**-598,0**	Pa
							Exaustor Conj. Lab. (A3)	-3,29	mBar	**-329,0**	Pa	-4,96	mBar	**-496,0**	Pa
Edifício I-4		23,7Pa no ponto de aplicação e 13 Pa na extremidade oposta	10,7 m³/h	≥10^{-4}m/s	0,2 renov/h ou 4,8 renov/dia	34,6Pa (23,7 Pa Rede fluxo + 10,9 Pa Perdas carga)	Exaustor I-4	-2,27	mBar	**-227,0**	Pa	-3,03	mBar	**-303,0**	Pa
Posto Guarda Universitária		-	-	-	-	-	Exaustor Guarda	-2,31	mBar	**-231,0**	Pa	-3,17	mBar	**-317,0**	Pa


Legenda: (-) não há projeto; (?) não há dados disponíveis.
Fonte: Baseado nos relatórios IPT: Mar, Jun e Jul/2013


(1Pa = 0,01mBar)


Gráficos de Variação da Pressão Célula de Vácuo x Entrada dos Exaustores I1 (1), I5 (Auditórios, Biblioteca, Portaria P3, Ginásio, Enfermaria e CAT1

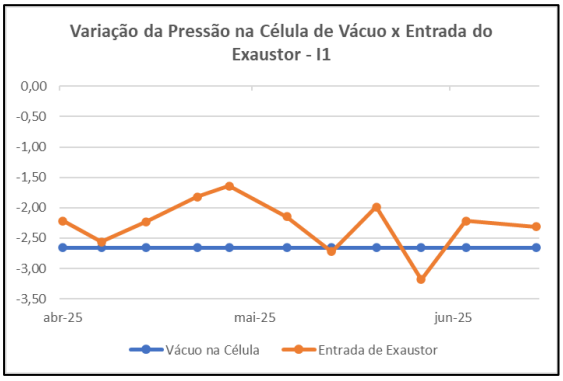


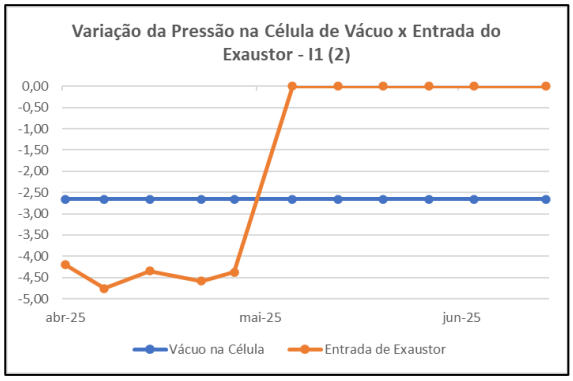


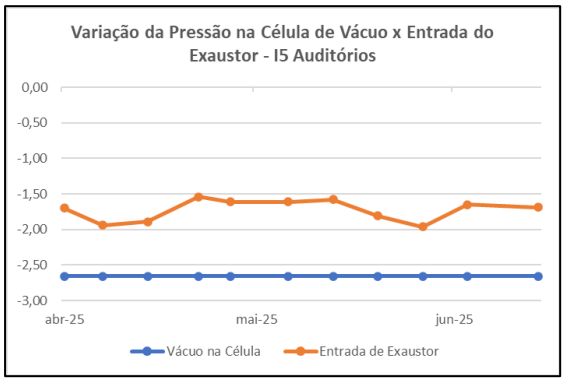


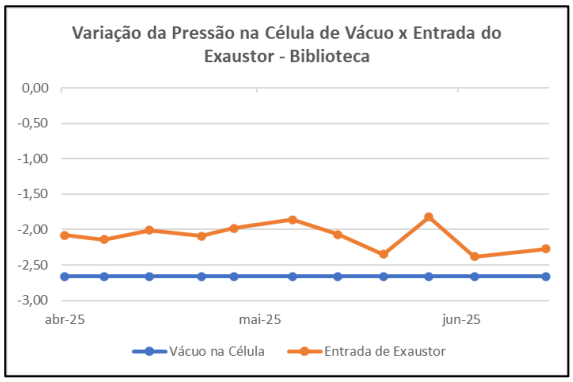

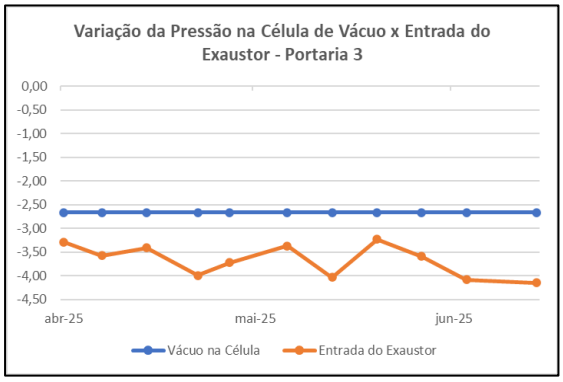

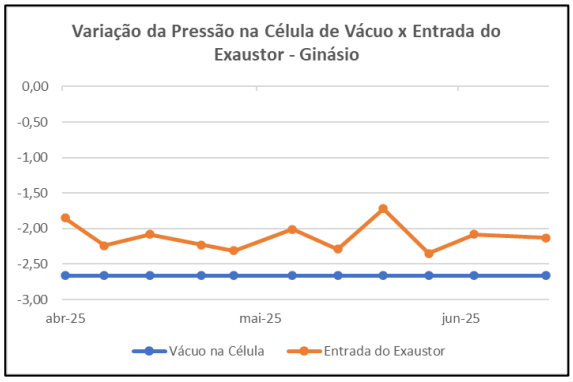


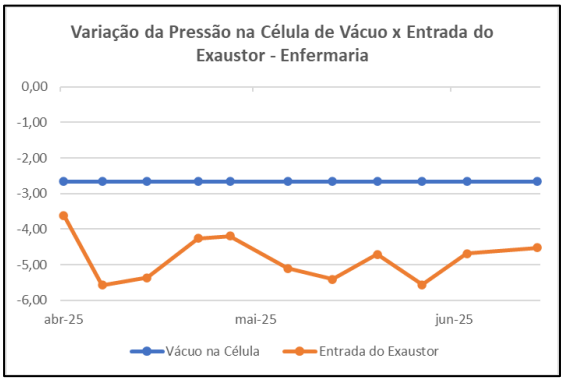


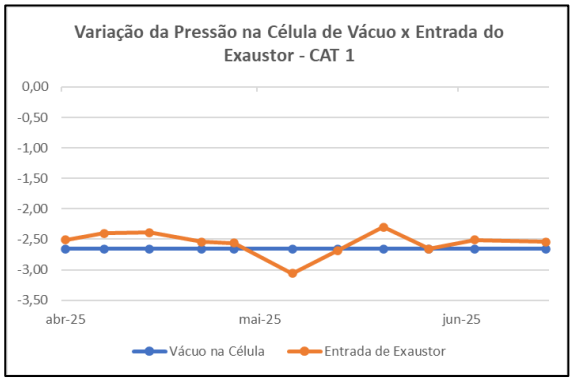



Gráficos de Variação da Pressão Célula de Vácuo x Entrada dos Exaustores CAT2, Transportes, MI (B1), MI (B2), MI (B3), Auditório 1, Auditório 2 e Cantina


z

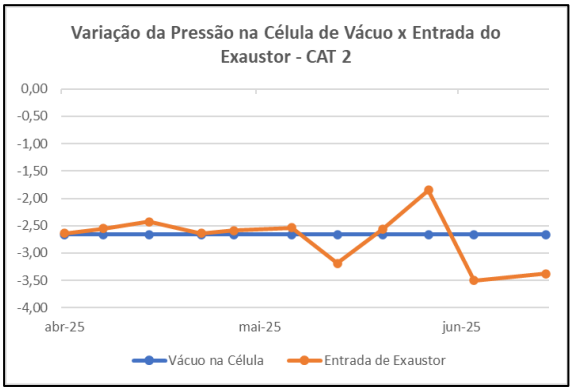


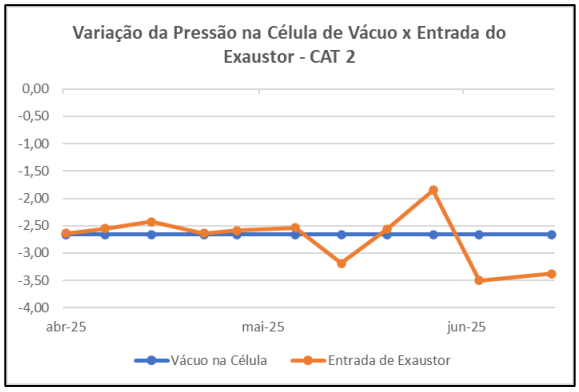


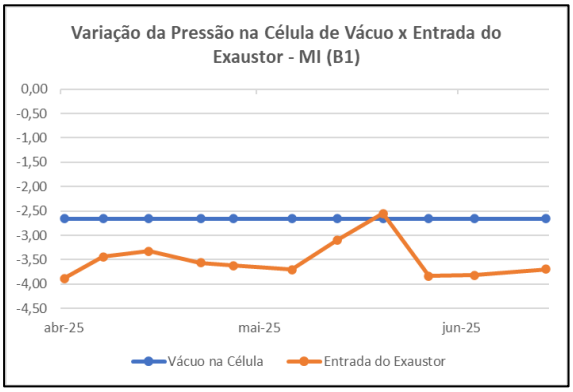


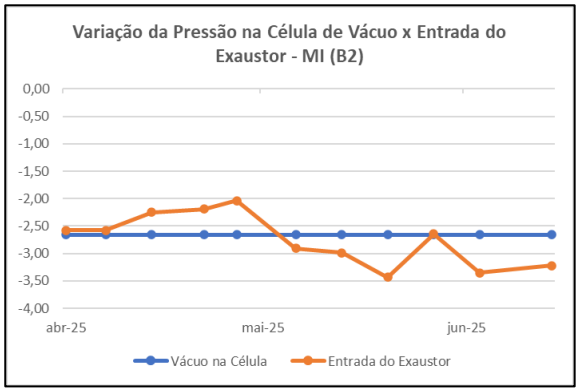

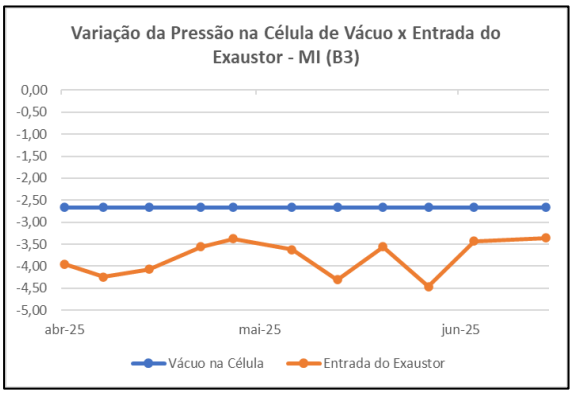


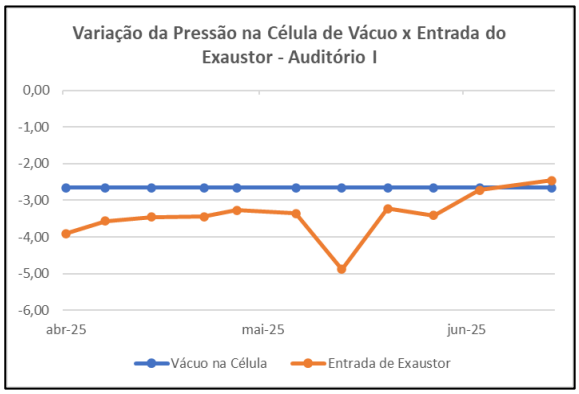


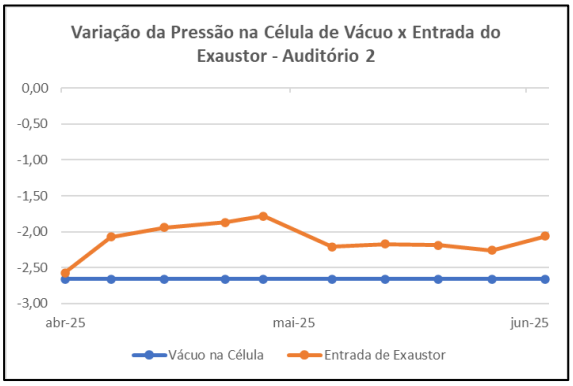


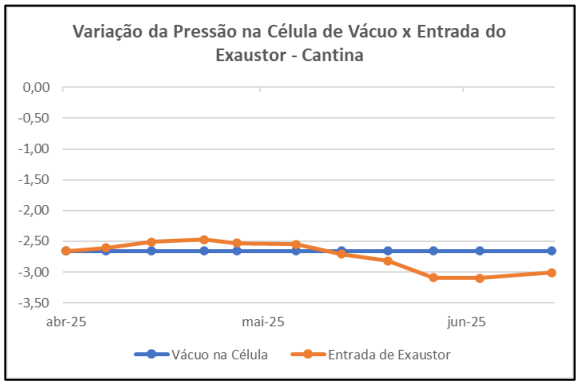



Gráficos de Variação da Pressão Célula de Vácuo x Entrada dos Exaustores Corredor, Conj. Lab. (A1), Conj. Lab. (A2), Conj. Lab. (A3), I4 e Guarda Universitária

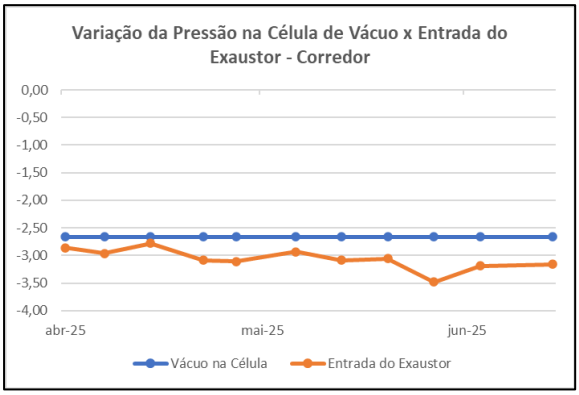


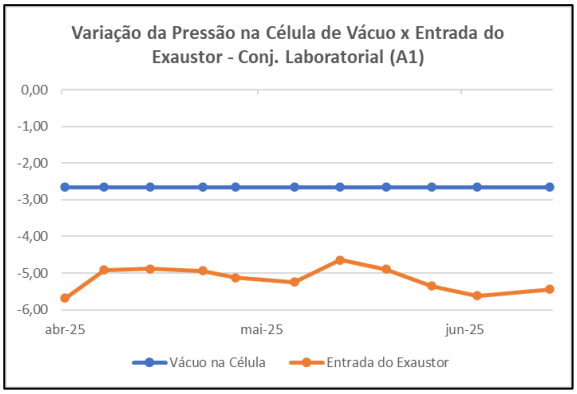

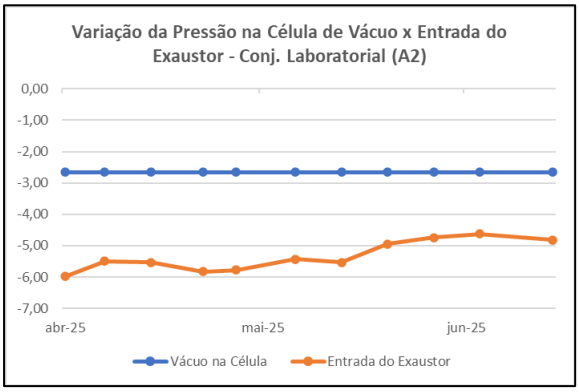

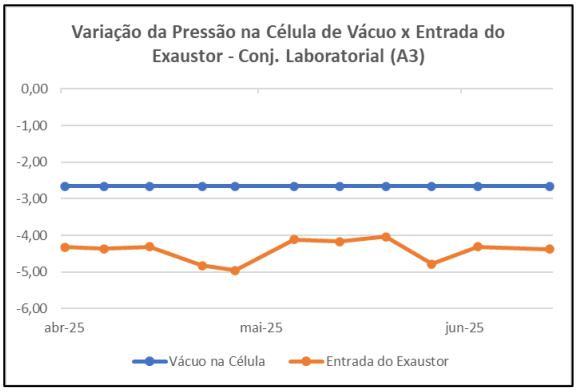

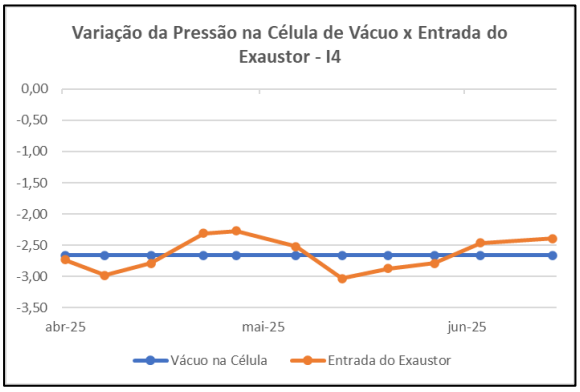

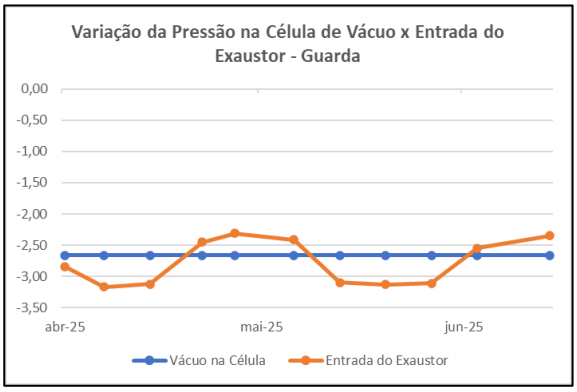

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES

A ENGESOLVE Soluções Ambientais Ltda. foi contratada pela Prefeitura da Universidade de São Paulo Área Capital Leste (PUSP-LESTE) para a operação, manutenção dos sistemas de ventilação de gases no solo bem como o monitoramento de poços de gás e pontos na infraestrutura instalados em edificações da EACH na USP Leste, localizada na Rua Arlindo Béttio, 1.000 – Ermelino Matarazzo, São Paulo/SP, conforme do Processo Administrativo 22.1.18.95.7, Pregão Eletrônico nº 00002/2022 – PUSP – CL e Contrato nº 0000001/2022 – PUSP – CL.

O objetivo da operação dos sistemas de ventilação é impedir o acúmulo de gases sub a laje dos edifícios, aliado ao monitoramento preventivo de intrusão de gases nos ambientes por meio da execução de medições de gases em todos os poços de monitoramento, pontos de infraestrutura e espaços com pouca circulação de ar.

Com base nos resultados obtidos no 2º trimestre de 2025, foram detectadas concentrações de Metano (acima de 1%Vol CH_4) na porção profunda em 6 dos 289 poços de gases monitorados. Nos demais poços profundos, não foram detectadas concentrações significativas.

Para os poços nas porções rasas, não foram detectadas concentrações de metano acima de 1% VolCH_4.

Essas concentrações podem ser consideradas esperadas, uma vez que estes poços estão instalados sobre a fonte de geração do gás Metano (camada de matéria orgânica). Porém, tais concentrações estão localizadas em pontos específicos e não abrangem toda a extensão dos edifícios. É importante ressaltar que as concentrações nulas nos pontos de infraestrutura ratificam a ausência do risco de inflamabilidade ou ocorrência de intrusão de gases.

As concentrações obtidas ao longo deste 2º trimestre de 2025 se mostraram coerentes com a linha de tendência obtida durante os 11 anos e 2 meses de monitoramento da área de estudo. Observa-se que nos períodos de seca há um singelo aumento das concentrações medidas por meio dos poços profundos.

Quanto às medições de H_2S e CO nos poços de monitoramento, foram obtidas concentrações de 3,0 e 18,0, respectivamente. Essas concentrações indicam que há a produção destes compostos devido a degradação da matéria orgânica. Para VOC, não foram constatadas concentrações.

Os resultados obtidos nas medições realizadas nos demais pontos de infraestrutura ao longo deste trimestre (ralos e caixa de passagem) nas demais as edificações, bem como em ambientes com pouca circulação de ar, não detectaram concentrações de Metano e nem de VOC.

Os sistemas de ventilação operaram 24 horas por dia, 30 dias por mês, durante todo o período do trimestre. Estes demonstraram-se eficientes, não permitindo que os gases existentes no solo se acumulassem no tapete de brita (poços a 0,30 m) ou diretamente sob a laje (vapor pin), bem

como diminuindo eventualmente até mesmo as concentrações no solo abaixo do tapete de brita (poços a 1,00 m), por influência da ventilação.

O nível d'água raso existente na área tende a dificultar a migração vertical do gás, bem como as medidas já adotadas ao longo do tempo, como as construções com ventilação fixa, colchão de brita em subsuperfície, drenos geomecânicos, que colaboram com a mitigação da possibilidade de intrusão e gases.

Diante dos resultados obtidos a partir do monitoramento do primeiro trimestre de 2025, e considerando a série histórica de monitoramento ao longo dos 11 anos (abril de 2014 a junho de 2025), verifica-se que não há a intrusão de gases nos ambientes fechados, uma vez que as concentrações de Metano existentes no solo, mesmo com a presença de pressão positiva, não alcançam o tapete de brita (sob a laje) ou, quando alcançam esporadicamente, são arrastadas pelo sistema de ventilação. Além disso, não há presença de Metano em nenhum dos pontos de infraestrutura.

A ENGESOLVE recomenda a continuidade da operação dos sistemas de exaustão, bem como a realização dos monitoramentos semanais e quinzenais nos poços de monitoramento e nos pontos de infraestrutura, respectivamente.

Avenida Paulista, 2064 - 14° Andar I Bela Vista I 01310-200 I São Paulo - SP I 11 2844 4386 engesolve.com.br

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABNT NBR 16.209, de setembro de 2013 – Avaliação de risco a saúde humana para fins de gerenciamento de áreas contaminadas;

AVATZ AMBIENTAL. Relatório Técnico – Instalação de Poços de Monitoramento de Gases e de Monitoramento dos Poços Instalados – R047/21-PR014/21. São Paulo: AVATZ AMBIENTAL, Outubro/2021.

CETESB (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo), 2021 – Biogás. Disponível em: <https://cetesb.sp.gov.br/biogas/>. Acesso em: out 2022.

CETESB (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo), 2017 – Decisão de Diretoria Nº 038/2017, de 07 de fevereiro de 2017, que dispõe sobre a aprovação do "Procedimento para a Proteção da Qualidade do Solo e das Águas Subterrâneas", da revisão do "Procedimento para o Gerenciamento de Áreas Contaminadas" e estabelece "Diretrizes para Gerenciamento de Áreas Contaminadas no Âmbito do Licenciamento Ambiental", e dá outras providências;

CETESB (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo), 2016 – Manual de Produtos Químicos. Constituído de um Guia Técnico e 96 Fichas de Informação de Produtos Químicos.

ENGESOLVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS. Relatório Técnico. Evolução do Monitoramento de Intrusão de Gases e da Operação do Sistema de Ventilação – 4º Trimestre /2024. USP Leste. São Paulo: ENGESOLVE, Janeiro/2025.

ENGESOLVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS. Relatório Técnico. Evolução do Monitoramento de Intrusão de Gases e da Operação do Sistema de Ventilação – 3º Trimestre /2024. USP Leste. São Paulo: ENGESOLVE, Outubro/2024.

ENGESOLVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS. Relatório Técnico. Evolução do Monitoramento de Intrusão de Gases e da Operação do Sistema de Ventilação – 2º Trimestre /2024. USP Leste. São Paulo: ENGESOLVE, Junho/2024.

ENGESOLVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS. Relatório Técnico. Evolução do Monitoramento de Intrusão de Gases e da Operação do Sistema de Ventilação – 1º Trimestre /2024. USP Leste. São Paulo: ENGESOLVE, Março/2024.

ENGESOLVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS. Relatório Técnico. Evolução do Monitoramento de Intrusão de Gases e da Operação do Sistema de Ventilação – 4º Trimestre /2023. USP Leste. São Paulo: ENGESOLVE, Janeiro/2024.

ENGESOLVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS. Relatório Técnico. Evolução do Monitoramento de Intrusão de Gases e da Operação do Sistema de Ventilação – 3º Trimestre /2023. USP Leste. São Paulo: ENGESOLVE, Outubro/2023.

ENGESOLVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS. Relatório Técnico. Evolução do Monitoramento de Intrusão de Gases e da Operação do Sistema de Ventilação – 2º Trimestre /2023. USP Leste. São Paulo: ENGESOLVE, Junho/2023.

ENGESOLVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS. Relatório Técnico. Evolução do Monitoramento de Intrusão de Gases e da Operação do Sistema de Ventilação – 1º Trimestre /2023. USP Leste. São Paulo: ENGESOLVE, Abril/2023.

ENGESOLVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS. Relatório Técnico. Evolução do Monitoramento de Intrusão de Gases e da Operação do Sistema de Ventilação – 4º Trimestre /2022. USP Leste. São Paulo: ENGESOLVE, Janeiro/2023.

ENGESOLVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS. Relatório Técnico. Evolução do Monitoramento de Intrusão de Gases e da Operação do Sistema de Ventilação – 3º Trimestre /2022. USP Leste. São Paulo: ENGESOLVE, Outubro/2022.

IPT. Relatório Técnico 92353-205 – Avaliação e sugestões de aperfeiçoamento para alguns dos sistemas de ventilação de gás e vapor do subsolo de edifícios do campus da USP Leste – resultados preliminares. São Paulo: IPT, 02 de abril de 2007.

SERVMAR. Relatório de Investigação Detalhada, Avaliação de Risco à Saúde Humana e Plano de Intervenção na AI-01 e Investigação Detalhada de Gases – MA/12936/14BLS. São Paulo: SERVMAR, Fevereiro/2014.

WEBER AMBIENTAL. Relatório Técnico: Evolução do Monitoramento de Intrusão de Gases e da Operação do Sistema de Ventilação – 2º Trimestre/2022. USP Leste. São Paulo: WEBER, Julho/2022.

WEBER AMBIENTAL. Relatório Técnico: *As-Built* completo dos sistemas de ventilação de gases instalados na USP Leste – vs.07. Projeto 311.1264.14EGS.VS07 – USP Leste. São Paulo: WEBER, Julho/2021.

WEBER AMBIENTAL. Relatório Técnico: Instalação de novos poços de monitoramento e amostragem de gases – vs.02. Projeto 311.1265.14-IAG.VS02 – USP Leste. São Paulo: WEBER, Janeiro/2016.

WEBER AMBIENTAL. Relatório Técnico: Instalação do Sistema de Exaustão de Gases no Solo sob os Edifícios – Ago/14. Projeto 311.1205.14 – USP Leste. São Paulo: WEBER, Agosto/2014.

ANEXO 1

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DOS EQUIPPAMENTOS

ABNT NBR ISO/IEC 17025
CAL 0540

Certificado de Calibração nº.: RBC.0251.25.rev.00

Controle Interno: 25839

Dados do Cliente:

Nome: Cooperativa Central Aurora Alimentos
Endereço: Al Olga, nº 422 - São Paulo/SP

Local da realização do serviço de calibração:

Laboratório de calibração da Clean Environment Brasil

Dados do Instrumento Calibrado:

Identificação: Detector Portátil de Gás, Landtec, Biogas 5000
Nº. Série: G510623
Nº. Patrimônio: Não Consta
Ident. Adicional: Não Consta

Data da Calibração: 05/03/2025

Método Utilizado: Método de calibração com material de referência certificado

O equipamento foi submetido à medição de um material de referência certificado, sendo as leituras obtidas no display/indicador do equipamento/sistema de medição, e na mesma grandeza do material de referência.
Foram realizadas 3 leituras.

Condições Ambientais: Temperatura: 21,2 ºC ± 0,2 °C Umidade relativa: 60 %UR ± 2 %UR

Dado(s) do(s) Instrumento(s) Utilizado(s):

Descrição	Certificado	Rastreabilidade	Validade
Monitor de gás | MGAS-07	RBC.0884.24.rev.00	CAL 0540	22/05/2025
Termo-higrômetro | TMHG-13	1001074	CAL 0439	18/11/2025
Monitor de gás | MGAS-06	RBC.1306.24.rev.00	CAL 0540	17/10/2025

Materiais de Referência:

Material de referência	Certificado	Rastreabilidade	Validade
Multigás (G)	QCSPC035193	12803	14/03/2026
Dióxido de Carbono	QCSPC024458	12803	05/06/2025

Legendas:

%LEL: *Lower Explosive Limit* (Limite Inferior de Explosividade);
ppm: Partes Por Milhão;
U_{95}: Incerteza de medição para um nível de confiança de 95,45%. Parâmetro associado ao resultado de uma medição que caracteriza a dispersão dos valores que podem ser razoavelmente atribuídos a um mensurando;
k: Fator de abrangência;
Veff: Grau de liberdade efetivo.

Certificado de Calibração nº.: RBC.0251.25.rev.00

Controle Interno: 25839

Resultados da Calibração:

Sensor	Gás de Ref. Aplicado	Medição Antes do Ajuste	Média das Medições	Erro de Medição	U_{95}	k	Veff
CH4 (Metano)	50 %LEL	xxxx	50 %LEL	0 %LEL	1,8 %LEL	2,20	14
O2 (Oxigênio)	18,0 %mol/mol	xxxx	18,1 %mol/mol	0,1 %mol/mol	0,4 %mol/mol	2,18	15
H2S (Sulfeto de Hidrogênio)	26 ppm	xxxx	29 ppm	4 ppm	1,9 ppm	2,25	11
xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
CO2 (Dióxido de Carbono)	4014 ppm	xxxx	4000 ppm	-14 ppm	216,8 ppm	2,87	4

Notas:

1 - O serviço de calibração realizado nesse equipamento não se estende a outros, mesmo que de mesma marca, lote ou modelo;
2 - Este certificado de calibração poderá ser reproduzido somente por inteiro, sem nenhuma alteração;
3 - Esta calibração não desobriga o usuário a testar o equipamento antes de cada utilização, de acordo com a exigência da NR-33;
4 - Este certificado só é válido com as assinaturas dos responsáveis;
5 - A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência k, o qual para k = 2, se tem uma distribuição normal e para k > 2, se tem uma distribuição t com veff graus de liberdade efetivos, que corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02;
6 - Manutenções e Ajuste não fazem parte do escopo de acreditação;
7 - Conversões de unidades: 1 %vol = 10.000 ppm / 1 %vol de CH4 = 20 %LEL / Unidade %mol/mol equivalente a unidade %vol;
8 - Erro de Medição = Média das Medições - Gás de Ref. Aplicado;
9 - A violação ou remoção do lacre de segurança invalida a calibração.
10 - Este certificado atende aos requisitos de acreditação pela Cgcre que avaliou a competência do laboratório e comprovou sua rastreabilidade de medição.

Observações:

Nenhuma.

Data da Emissão: 06/03/2025

Técnico Executante
Vinicius Lima

Signatária Autorizada
Brenda Santos

Clean Environment Brasil Engenharia e Comércio Ltda.
Rua Bartolomeu Bueno da Silva, 457 e 477 • Cond. Portal do Anhanguera • Macuco
Valinhos • SP • 13279-392 • Brasil • Telefone +55 19 3794-2900 • Whatsapp 19 3794-2900
www.clean.com.br • clean@clean.com.br

Almont do Brasil Imp. Com. e Repr. Ltda
Rua Horácio de Castilho, 284
Vila Maria Alta
CEP 02125-030
São Paulo-SP
CNPJ: 01.236.739/0001-60
www.almont.com.br

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO

N° 2857-2025

ABNT NBR ISO/IEC 17025
CAL 0407

Dados do Cliente:

Nome: *Engesolve Soluções Ambientais Integradas Ltda*
Endereço: *Av. Paulista 2064, 2086 14 Andar*
Bairro: *Bela Vista*
Cidade: *São Paulo* *UF: SP*
CEP: *01.310-928* *Contato: 11 9308-4713*

Interessado: *O mesmo*

Identificação do Item:

Item: *Detector de Gás com Indicação Direta*
Marca: *BW Technologies*
Modelo: *GasAlert Micro5 PID*
N.º de Série: *SK317-003332*
B.P: 86020395

Dados da Calibração:

Data da Calibração: *6-jun-25*
N.º do Processo: *824* *Item: 1*
Procedimento de Calibração: *PC-10 REV. 15*

Condições Ambientais:

Temperatura: *22,6 ºC*
Umidade Relativa: *71,5 %*

Método de Medição:

Os resultados são obtidos através da aplicação de material de referência certificado (MRC) de gás sobre o sensor do instrumento sob teste.

Material de Referência Certificado Utilizado:

MRC	***Código***	***Certificado***	***Emitente***	***Validade***
Mistura Padrão de Metano	*CIL-LEL*	*834094*	*Coregas*	*julho-26*
Mistura Padrão de Isobutileno	*CIL-PID*	*683633*	*Coregas*	*março-27*

Laboratório de calibração acreditado pela Cgcre, de acordo com a NBR ISO/IEC 17025 sob o número 407

Almont do Brasil Imp. Com. e Repr. Ltda
Rua Horácio de Castilho, 284
Vila Maria Alta
CEP 02125-030
São Paulo-SP
CNPJ: 01.236.739/0001-60
www.almont.com.br

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO

N° 2857-2025

Resultado Obtido:

Gás	V.M	V.R	R.M	Erro	Unidade	Fator k	Incerteza
CH4	44	50,4	50	-0,4	% LEL	2,00	1,2
C4H8	106	100,4	101	0,6	PPM	2,00	2,1

Legenda:

V.M= Valor de uma medição realizada no sensor sob teste isento de ajustes.
V.R=Valor de referência da MRC.
R.M= Resultado da medição. (média de 3 leituras realizadas após ajuste de SPAN).

Observações:

- *Este certificado de calibração é válido apenas para o instrumento e sensores especificados , não sendo extensivo a quaisquer outros instrumentos ainda que similares.*
- *Não é autorizada a reprodução parcial deste documento sem autorização da ALMONT DO BRASIL. As informações fornecidas neste certificado são de responsabilidade da Almont.*
- *A incerteza expandida estimada relatada é baseada em uma incerteza padrão combinada, multiplicada por um fator de abrangência k, para um nível de confiança de aproximadamente 95 %.*
- *Manutenções, Ajustes e Configurações não fazem parte do escopo de acreditação do laboratório.*
- *Esta calibração não isenta o usuário de realizar o teste de resposta conforme NR-33.*
- *Calibração realizada nas instalações permanentes do laboratório Almont do Brasil.*
- *Este certificado atende aos requisitos de acreditação da Cgcre, que avaliou a competência do laboratório.*
- *Calibração inválida se o lacre for rompido.*
- *A versão original deste certificado é um arquivo PDF.*

Técnico Executor:

Vinicius L. A. Gonçalez
Técnico Instrumentista

Signatário Autorizado
Anderson Fusari de Andrade
Gerente Técnico Subst.

Data de Emissão: 06/06/2025

Laboratório de calibração acreditado pela Cgcre, de acordo com a NBR ISO/IEC 17025 sob o número 407

Fim do certificado de Calibração

ABNT NBR ISO/IEC 17025
CAL 0540

Certificado de Calibração nº.: RBC.1051.25.rev.00

Controle Interno: 26642

Dados do Cliente:

Nome: Engesolve Soluções Ambientais Integradas Ltda
Endereço: Avenida Paulista, nº 2064, 2086 - São Paulo/SP

Local da realização do serviço de calibração:

Laboratório de calibração da Clean Environment Brasil

Dados do Instrumento Calibrado:

Identificação: Detector Portátil de Gás, Landtec, GEM 5000
Nº. Série: G500491
Nº. Patrimônio: 086-018480
Ident. Adicional: Não Consta

Data da Calibração: 11/07/2025

Método Utilizado: Método de calibração com material de referência certificado

O equipamento foi submetido à medição de um material de referência certificado, sendo as leituras obtidas no display/indicador do equipamento/sistema de medição, e na mesma grandeza do material de referência.
Foram realizadas 3 leituras.

Condições Ambientais: Temperatura: 22,3 ºC ± 0,2 °C Umidade relativa: 44 %UR ± 2 %UR

Dado(s) do(s) Instrumento(s) Utilizado(s):

Descrição	Certificado	Rastreabilidade	Validade
Monitor de gás | MGAS-06	RBC.1306.24.rev.00	CAL 0540	17/10/2025
Termo-higrômetro | TMHG-13	1001074	CAL 0439	18/11/2025
Monitor de gás | MGAS-07	RBC.0886.25.rev.00	CAL 0540	23/05/2026

Materiais de Referência:

Material de referência	Certificado	Rastreabilidade	Validade
Multigás (G)	QCSPC035193	12803	14/03/2026
Dióxido de Carbono	QCSPC037274	12803	23/10/2029

Legendas:

%LEL: *Lower Explosive Limit* (Limite Inferior de Explosividade);
ppm: Partes Por Milhão;
U_{95}: Incerteza de medição para um nível de confiança de 95,45%. Parâmetro associado ao resultado de uma medição que caracteriza a dispersão dos valores que podem ser razoavelmente atribuídos a um mensurando;
k: Fator de abrangência;
Veff: Grau de liberdade efetivo.

Certificado de Calibração nº.: RBC.1051.25.rev.00

Controle Interno: 26642

Resultados da Calibração:

Sensor	Gás de Ref. Aplicado	Medição Antes do Ajuste	Média das Medições	Erro de Medição	U_{95}	k	Veff
CH4 (Metano)	50 %LEL	37 %LEL	50 %LEL	0 %LEL	1,8 %LEL	2,20	14
O2 (Oxigênio)	18,0 %mol/mol	18,8 %mol/mol	18,2 %mol/mol	0,2 %mol/mol	0,4 %mol/mol	2,18	15
H2S (Sulfeto de Hidrogênio)	26 ppm	28 ppm	30 ppm	4 ppm	1,9 ppm	2,00	Infinito
CO (Monóxido de Carbono)	102 ppm	105 ppm	101 ppm	-1 ppm	3,2 ppm	2,04	63
CO2 (Dióxido de Carbono)	4000 ppm	5000 ppm	4000 ppm	0 ppm	216,0 ppm	2,87	4

Notas:

1 - O serviço de calibração realizado nesse equipamento não se estende a outros, mesmo que de mesma marca, lote ou modelo;
2 - Este certificado de calibração poderá ser reproduzido somente por inteiro, sem nenhuma alteração;
3 - Esta calibração não desobriga o usuário a testar o equipamento antes de cada utilização, de acordo com a exigência da NR-33;
4 - Este certificado só é válido com as assinaturas dos responsáveis;
5 - A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência k, o qual para k = 2, se tem uma distribuição normal e para k > 2, se tem uma distribuição t com veff graus de liberdade efetivos, que corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02;
6 - Manutenções e Ajuste não fazem parte do escopo de acreditação;
7 - Conversões de unidades: 1 %vol = 10.000 ppm / 1 %vol de CH4 = 20 %LEL / Unidade %mol/mol equivalente a unidade %vol;
8 - Erro de Medição = Média das Medições - Gás de Ref. Aplicado;
9 - A violação ou remoção do lacre de segurança invalida a calibração.
10 - Este certificado atende aos requisitos de acreditação pela Cgcre que avaliou a competência do laboratório e comprovou sua rastreabilidade de medição.

Observações:

Nenhuma.

Data da Emissão: 14/07/2025

Técnico Executante
Vinicius Lima

Signatário Autorizado
Taynan Pedroza

Almont do Brasil Imp. Com. e Repr. Ltda
Rua Horácio de Castilho, 284
Vila Maria Alta
CEP 02125-030
São Paulo-SP
CNPJ: 01.236.739/0001-60
www.almont.com.br

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO

N° 3300-2025

ABNT NBR ISO/IEC 17025
CAL 0407

Dados do Cliente:

Nome: *Engesolve Soluções Ambientais Integradas Ltda*
Endereço: *Av. Paulista 2064, 2086 14 Andar*
Bairro: *Bela Vista*
Cidade: *São Paulo* *UF:* *SP*
CEP: *01.310-928* *Contato:* *11 9308-4713*

Interessado: *O mesmo*

Identificação do Item:

Item: *Detector de Gás com Indicação Direta*
Marca: *Ion Science*
Modelo: *PhoCheck Tiger*
N.º de Série: *T-119059*

Dados da Calibração:

Data da Calibração: *25-jun-25*
N.º do Processo: *1111* *Item:* *1*
Procedimento de Calibração: *PC-10 REV. 15*

Condições Ambientais:

Temperatura: *21,2 ºC*
Umidade Relativa: *52,3 %*

Método de Medição:

Os resultados são obtidos através da aplicação de material de referência certificado (MRC) de gás sobre o sensor do instrumento sob teste.

Material de Referência Certificado Utilizado:

MRC	***Código***	***Certificado***	***Emitente***	***Validade***
Mistura Padrão de Isobutileno	*CIL-PID*	*683633*	*Coregas*	*março-27*

Laboratório de calibração acreditado pela Cgcre, de acordo com a NBR ISO/IEC 17025 sob o número 407

Almont do Brasil Imp. Com. e Repr. Ltda
Rua Horácio de Castilho, 284
Vila Maria Alta
CEP 02125-030
São Paulo-SP
CNPJ: 01.236.739/0001-60
www.almont.com.br

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO

N° 3300-2025

Resultado Obtido:

Gás	V.M	V.R	R.M	Erro	Unidade	Fator k	Incerteza
C4H8	59,3	100,4	101,1	0,7	PPM	2,00	2,1

Legenda:

V.M= Valor de uma medição realizada no sensor sob teste isento de ajustes.
V.R=Valor de referência da MRC.
R.M= Resultado da medição. (média de 3 leituras realizadas após ajuste de SPAN).

Observações:

- *Este certificado de calibração é válido apenas para o instrumento e sensores especificados , não sendo extensivo a quaisquer outros instrumentos ainda que similares.*
- *Não é autorizada a reprodução parcial deste documento sem autorização da ALMONT DO BRASIL. As informações fornecidas neste certificado são de responsabilidade da Almont.*
- *A incerteza expandida estimada relatada é baseada em uma incerteza padrão combinada, multiplicada por um fator de abrangência k, para um nível de confiança de aproximadamente 95 %.*
- *Manutenções, Ajustes e Configurações não fazem parte do escopo de acreditação do laboratório.*
- *Esta calibração não isenta o usuário de realizar o teste de resposta conforme NR-33.*
- *Calibração realizada nas instalações permanentes do laboratório Almont do Brasil.*
- *Este certificado atende aos requisitos de acreditação da Cgcre, que avaliou a competência do laboratório.*
- *Calibração inválida se o lacre for rompido.*
- *A versão original deste certificado é um arquivo PDF.*

Técnico Executor:

Vinicius L. A. Gonçalez
Técnico Instrumentista

Assinado de forma digital por Anderson Fusari de Andrade
DN: cn=Anderson Fusari de Andrade, o=Almont do Brasil Imp. Com. e Rep. LTDA, ou=Laboratório, email=fusari@almont.com.br, c=BR

Signatário Autorizado
Anderson Fusari de Andrade
Gerente Técnico Subst.

Data de Emissão: 25/06/2025

Laboratório de calibração acreditado pela Cgcre, de acordo com a NBR ISO/IEC 17025 sob o número 407

Fim do certificado de Calibração

Almont do Brasil Imp. Com. e Repr. Ltda
Rua Horácio de Castilho, 284
Vila Maria Alta
CEP 02125-030
São Paulo-SP
CNPJ: 01.236.739/0001-60
www.almont.com.br

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO

N° 1944-2025

ABNT NBR ISO/IEC 17025
CAL 0407

Dados do Cliente:

Nome: *Engesolve Soluções Ambientais Integradas Ltda*
Endereço: *Av. Paulista 2064, 2086 14 Andar*
Bairro: *Bela Vista*
Cidade: *São Paulo* *UF:* *SP*
CEP: *01.310-928* *Contato:* *11 9308-4713*

Interessado: *O mesmo*

Identificação do Item:

Item: *Detector de Gás com Indicação Direta*
Marca: *Ion Science*
Modelo: *PhoCheck Tiger*
N.º de Série: *T-119374*

Dados da Calibração:

Data da Calibração: *17-abr-25*
N.º do Processo: *598* *Item:* *1*
Procedimento de Calibração: *PC-10 REV. 14*

Condições Ambientais:

Temperatura: *26,1 ºC*
Umidade Relativa: *54 %*

Método de Medição:

Os resultados são obtidos através da aplicação de material de referência certificado (MRC) de gás sobre o sensor do instrumento sob teste.

Material de Referência Certificado Utilizado:

MRC	***Código***	***Certificado***	***Emitente***	***Validade***
Mistura Padrão de Isobutileno	*CIL-PID*	*683633*	*Coregas*	*março-27*

Laboratório de calibração acreditado pela Cgcre, de acordo com a NBR ISO/IEC 17025 sob o número 407

Almont do Brasil Imp. Com. e Repr. Ltda
Rua Horácio de Castilho, 284
Vila Maria Alta
CEP 02125-030
São Paulo-SP
CNPJ: 01.236.739/0001-60
www.almont.com.br

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO

N° 1944-2025

Resultado Obtido:

Gás	V.M	V.R	R.M	Erro	Unidade	Fator k	Incerteza
C4H8	97,6	100,4	100,8	0,4	PPM	2,00	2,1

Legenda:

V.M= Valor de uma medição realizada no sensor sob teste isento de ajustes.
V.R=Valor de referência da MRC.
R.M= Resultado da medição. (média de 3 leituras realizadas após ajuste de SPAN).

Observações:

- *Este certificado de calibração é válido apenas para o instrumento e sensores especificados , não sendo extensivo a quaisquer outros instrumentos ainda que similares.*
- *Não é autorizada a reprodução parcial deste documento sem autorização da ALMONT DO BRASIL. As informações fornecidas neste certificado são de responsabilidade da Almont.*
- *A incerteza expandida estimada relatada é baseada em uma incerteza padrão combinada, multiplicada por um fator de abrangência k, para um nível de confiança de aproximadamente 95 %.*
- *Manutenções, Ajustes e Configurações não fazem parte do escopo de acreditação do laboratório.*
- *Esta calibração não isenta o usuário de realizar o teste de resposta conforme NR-33.*
- *Calibração realizada nas instalações permanentes do laboratório Almont do Brasil.*
- *Este certificado atende aos requisitos de acreditação da Cgcre, que avaliou a competência do laboratório.*
- *Calibração inválida se o lacre for rompido.*
- *A versão original deste certificado é um arquivo PDF.*

Técnico Executor:

Vinicius L. A. Gonçalez
Técnico Instrumentista

Signatário Autorizado
Anderson Fusari de Andrade
Gerente Técnico Subst.

Data de Emissão: 17/04/2025

Laboratório de calibração acreditado pela Cgcre, de acordo com a NBR ISO/IEC 17025 sob o número 407

Fim do certificado de Calibração

ANEXO 2
PLANO DE AÇÃO

EngeSolve
SOLUÇÕES AMBIENTAIS INTEGRADAS

LOCAL	AÇÃO PREVENTIVA (CONTROLE)	RESPONSÁVEL	SITUAÇÃO	AÇÃO DE RESPOSTA - ATUALIZAÇÃO SET/2022	RESPONSÁVEL
Todos os Edifícios/Blocos Existentes (Aplicável aos futuros)	- Avaliar o Funcionamento do Sistema de Exaustão de Gases.	Técnico de Campo e Engenheiro Ambiental	Sistema Inoperante	Comunicar situação de emergência;	Téc. De Campo -> Eng. Amb.
				Verificar possíveis falhas, solucioná-las e retomar a operação;	Técnico Manutenção
				Caso não seja possível religar o sistema, substituí-lo em até 24h após a detecção do problema;	Téc. Manutenção/Eng. Amb.
				Efetuar a medição nos poços de monitoramento influenciados (dependentes deste sistema), após 2h de sistema inoperante, até o reinício da operação;	Técnico Campo
	- Monitoramento da concentração de Metano em Poços de Monitoramento de Gases (PMG) com equipamento GEM 5000 ou similar; - Avaliar os resultados das medições semanais.	Técnico de Campo e Engenheiro Ambiental	**Ponto de Alerta:** Concentração de Metano (CH4) **acima de 5%vol** **Poço Profundo PMG-B - 1,00m** (Solo abaixo do tapete de brita)	Acompanhar o monitoramento da profundidade A (rasa) para verificar se há movimentação do gás para o tapete de brita;	Técnico de Campo
				Caso sejam detectadas concentrações nos poços de monitoramento rasos PMG-A, aplicar ações específicas, descritas neste plano conforme o resultado obtido.	
			Ponto Crítico: Concentração de Metano (CH4) **entre 5% e 15%vol** **Poço Raso PMG-A - 0,30m** (Sob a laje, no tapete de brita)	Comunicar situação de emergência;	Téc. De Campo -> Eng. Amb.
				Ajustar válvulas do sistema de exaustão a fim de direcionar o fluxo da ventilação para o ponto detectado;	Técnico Campo
				Efetuar medições após o ajuste da ventilação:	Técnico Campo
				- Caso as medições permaneçam nulas ou inferiores a 5%, considera-se a situação sob controle;	-
				- Caso as medições permaneçam entre 5% e 15%vol:	-
				* Efetuar a medição nos pontos de infraestrutura diariamente até que a concentração no Ponto Crítico diminua;	Técnico Campo
				* Caso sejam detectadas concentrações nos pontos de infraestrutura, aplicar ações específicas, descritas neste plano conforme o resultado obtido.	Engenheiro Ambiental
			Ponto Extremamente Crítico: Concentração de Metano (CH4) **acima de 15%vol** **Poço Raso PMG-A - 0,30m** (Sob a laje, no tapete de brita)	Ajustar válvulas do sistema de exaustão a fim de direcionar o fluxo da ventilação para o ponto detectado;	Técnico Campo
				Efetuar medições após o ajuste da ventilação:	Técnico Campo
				- Caso as medições permaneçam nulas ou inferiores a 5%, considera-se a situação sob controle;	-
				- Caso as medições permaneçam entre 5% e 15%vol:	-
				* Efetuar a medição nos pontos de infraestrutura diariamente até que a concentração no Ponto Extremamente Crítico diminua;	Técnico Campo
				*Caso as concentrações permaneçam entre 5% e 15% por mais de 7h diárias, comunicar situação de emergência.	Engenheiro Ambiental
				* Caso sejam detectadas concentrações nos pontos de infraestrutura, aplicar ações específicas, descritas neste plano conforme o resultado obtido;	Téc. de Campo -> Eng. Amb.
			Poços com concentração persistente de Metano no Poço Profundo PMG-B, ainda que abaixo de 5%vol	Acompanhar monitoramento da profundidade A (Rasa) para verificar se há movimentação do gás para o tapete de brita. Acompanhar o monitoramento dos pontos de infraestrutura para verificar possível intrusão de gases.	Técnico Campo
	- Monitoramento da inflamabilidade em caixas de passagem, ralos, grelhas, ambientes pouco ventilados, redes subterrâneas, com equipamento MX6 ou similar;	Técnico de Campo e Engenheiro Ambiental	**Medição de Inflamabilidade: Acima de 20%LEL** (1% vol CH4) nos pontos de infraestrutura em **AMBIENTES INTERNOS**	Comunicar situação de emergência;	Téc. de Campo -> Eng. Amb.
				Remover as pessoas da sala/edifício;	Comissão
				Eliminar as fontes de ignição e desligar a energia elétrica;	Técnico Manutenção
				Ventilar o ambiente;	Técnico Manutenção
				Identificar os pontos de entrada de gás e selá-los;	Técnico Manutenção
				Verificar o funcionamento dos sistemas de ventilação sob a laje;	Téc. Campo/ Eng. Amb.
				Efetuar outras três medições em intervalos de 1 hora após a ventilação e selamento da fissura;	Téc. Campo/ Eng. Amb.
				- Caso as medições permaneçam nulas, considera-se a situação sob controle;	-
				- Caso as medições permaneçam superiores a 20%LEL, evacuar o bloco atingido e acionar os seguintes orgãos:	Membro da Diretoria
				* CIPA EACH;	
				*BOMBEIROS - 193;	
				* Subprefeitura / Defesa Civil - 199;	
				*CETESB Emergências: (11) 3133-4000 ou 0800 11 3560	
	- Monitoramento do vácuo pela célula de vácuo e das concentrações na entrada dos exaustores por meio das medições com equipamento MX6 ou similar.	Técnico de Campo e Engenheiro Ambiental	**Medição de Inflamabilidade: Acima de 20%LEL** (1% vol CH4) nas **Entradas dos Exaustores**	Comunicar situação de emergência;	Téc. de Campo -> Eng. Amb.
				Aumentar frequência do compressor a fim de elevar o vácuo, o fluxo e; por consequêcia, a diluição;	Técnico de Campo
				Efetuar medições após o ajuste da ventilação:	Técnico de Campo
				- Caso as medições permaneçam nulas, considera-se a situação sob controle;	-
				- Caso as medições permaneçam superiores a 20%LEL, evacuar o bloco atingido e acionar os seguintes orgãos:	Membro da Diretoria
				* CIPA EACH;	
				*BOMBEIROS - 193;	
				* Subprefeitura / Defesa Civil - 199;	
				*CETESB Emergências: (11) 3133-4000 ou 0800 11 3560	

ANEXO 3

TABELAS DE MEDIÇÕES SEMANAIS EM PMG

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	C02 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H_2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
Edificio I 1	**PMG-16**	**A**	**01/04/2025**	0,00%	0,00%	1,90	19,00	2,00	1,00	79,10	0,05		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-16**	**B**	**01/04/2025**	0,00%	0,00%	2,80	18,00	1,00	1,00	79,20	0,07		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-17**	**A**	**01/04/2025**	0,00%	0,00%	0,40	20,60	1,00	1,00	79,00	0,08		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-17**	**B**	**01/04/2025**	0,00%	0,00%	0,60	20,40	2,00	1,00	79,00	0,08		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-18**	**A**	**04/04/2025**	0,00%	0,00%	0,20	20,50	2,00	1,00	79,40	0,05		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-18**	**B**	**04/04/2025**	0,00%	0,00%	2,30	18,60	2,00	0,00	79,10	-0,03		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-20**	**A**	**01/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	20,50	2,00	0,00	79,40	0,01		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-20**	**B**	**01/04/2025**	0,00%	0,00%	0,30	20,20	2,00	0,00	79,50	0,08		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-22**	**A**	**01/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,60	2,00	2,00	78,30	0,12		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-22**	**B**	**01/04/2025**	0,00%	0,00%	2,30	19,00	2,00	2,00	78,70	-0,01		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-23**	**A**	**01/04/2025**	0,00%	0,00%	0,40	20,50	2,00	1,00	79,10	0,08		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-23**	**B**	**01/04/2025**	0,00%	0,00%	1,10	19,70	2,00	1,00	79,30	0,01		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-113**	**A**	**01/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	20,10	2,00	0,00	79,80	-0,07		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-113**	**B**	**01/04/2025**	0,00%	0,00%	2,50	17,90	1,00	0,00	79,60	0,02		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-114**	**A**	**01/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	20,40	2,00	0,00	79,50	0,01		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-114**	**B**	**01/04/2025**	0,00%	0,00%	1,00	20,50	2,00	0,00	79,50	0,01		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-115**	**A**	**01/04/2025**	0,00%	0,00%	0,20	20,10	2,00	0,00	79,80	0,02		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-115**	**B**	**01/04/2025**	0,00%	0,00%	0,70	19,90	2,00	0,00	79,40	-0,13		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-11**	**A**	**01/04/2025**	0,00%	0,00%	1,00	20,00	1,00	2,00	79,00	0,13		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-11**	**B**	**01/04/2025**	0,40%	0,40%	0,60	20,50	2,00	2,00	78,50	0,13		0,00	**7,00**	
Edificio I 1	**PMG-12**	**A**	**01/04/2025**	0,00%	0,00%	2,10	18,70	1,00	3,00	79,20	0,14		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-12**	**B**	**01/04/2025**	0,00%	0,00%	2,50	18,00	1,00	2,00	79,50	0,11		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-13**	**A**	**01/04/2025**	0,00%	0,00%	1,00	20,20	1,00	1,00	78,90	0,07		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-13**	**B**	**01/04/2025**	0,00%	0,00%	1,50	19,50	1,00	1,00	79,00	0,08		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-14**	**A**	**01/04/2025**	0,00%	0,00%	2,30	19,00	2,00	2,00	78,70	0,10		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-14**	**B**	**01/04/2025**	0,00%	0,00%	3,10	18,10	2,00	2,00	78,80	0,05		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-15**	**A**	**01/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,10	2,00	1,00	78,90	0,03		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-15**	**B**	**01/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,20	2,00	0,00	78,80	0,02		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-19**	**A**	**01/04/2025**	0,00%	0,00%	0,20	21,10	1,00	2,00	78,60	0,00		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-19**	**B**	**01/04/2025**	0,00%	0,00%	0,80	20,40	2,00	2,00	78,70	0,14		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-21**	**A**	**01/04/2025**	0,00%	0,00%	0,60	20,70	1,00	2,00	78,60	0,18		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-21**	**B**	**01/04/2025**	0,00%	0,00%	1,20	20,20	2,00	2,00	78,70	0,06		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-24**	**A**	**01/04/2025**	0,00%	0,00%	0,30	20,70	2,00	1,00	79,00	0,10		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-24**	**B**	**01/04/2025**	0,00%	0,00%	0,40	20,60	1,00	1,00	78,90	-0,03		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-135**	**A**	**01/04/2025**	0,00%	0,00%	0,20	20,30	1,00	0,00	79,50	-0,20		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG -135**	**B**	**01/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	20,50	2,00	0,00	79,50	-0,02		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-136**	**B**	**01/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	20,20	2,00	0,00	79,60	-0,06		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-30**	**A**	**03/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	20,30	2,00	1,00	79,60	-0,02		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-30**	**B**	**03/04/2025**	0,00%	0,00%	1,20	19,30	2,00	1,00	79,50	0,02		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-31**	**A**	**03/04/2025**	0,00%	0,00%	0,20	20,00	2,00	0,00	79,90	0,14		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-31**	**B**	**03/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	20,30	2,00	0,00	79,70	0,01		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-32**	**A**	**03/04/2025**	0,00%	0,00%	0,20	20,70	1,00	1,00	79,10	0,11		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-32**	**B**	**03/04/2025**	0,00%	0,00%	0,70	20,10	2,00	1,00	79,20	0,09		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-33**	**A**	**03/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	20,70	1,00	1,00	79,10	0,13		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-33**	**B**	**03/04/2025**	0,00%	0,00%	2,70	18,10	2,00	1,00	79,20	0,10		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-34**	**A**	**03/04/2025**	0,00%	0,00%	0,20	20,70	2,00	1,00	79,10	0,10		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-34**	**B**	**03/04/2025**	0,00%	0,00%	1,00	20,00	1,00	1,00	79,00	-0,01		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-35**	**A**	**03/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,00	1,00	2,00	78,90	0,18		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-35**	**B**	**03/04/2025**	0,00%	0,00%	1,00	20,20	1,00	2,00	78,80	0,19		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-36**	**A**	**03/04/2025**	0,00%	0,00%	2,70	18,30	2,00	2,00	79,10	0,13		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-36**	**B**	**03/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	20,80	1,00	2,00	79,10	0,11		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-37**	**A**	**03/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,00	1,00	1,00	78,90	0,10		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-37**	**B**	**03/04/2025**	0,00%	0,00%	1,00	20,10	1,00	1,00	78,90	0,16		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	C02 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H_2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
I-3 Biblioteca	PMG-38	A	03/04/2025	0,00%	0,00%	0,30	20,60	2,00	1,00	79,10	0,06		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-38	B	03/04/2025	0,00%	0,00%	0,30	20,60	1,00	2,00	79,10	0,18		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-39	A	03/04/2025	0,00%	0,00%	0,30	20,60	1,00	2,00	79,10	0,13		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-39	B	03/04/2025	0,00%	0,00%	7,60	13,30	2,00	1,00	79,00	0,18		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-40	A	03/04/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,90	1,00	2,00	79,00	0,16		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-40	B	03/04/2025	0,00%	0,00%	0,30	20,70	2,00	1,00	79,00	0,05		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-41	A	03/04/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,60	2,00	1,00	79,40	0,08		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-41	B	03/04/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,60	1,00	1,00	79,30	-0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-42	A	03/04/2025	0,00%	0,00%	0,70	20,00	1,00	1,00	79,30	0,08		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-42	B	03/04/2025	0,00%	0,00%	4,30	16,90	2,00	1,00	78,70	0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-43	A	03/04/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,50	1,00	1,00	79,40	0,08		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-43	B	03/04/2025	0,00%	0,00%	0,40	20,40	2,00	1,00	79,20	0,08		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-132	A	03/04/2025	0,00%	0,00%	0,20	19,60	2,00	1,00	80,10	0,05		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-132	B	03/04/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,00	2,00	1,00	79,90	0,02		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-133	A	03/04/2025	0,00%	0,00%	0,50	20,10	1,00	1,00	79,40	0,07		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-133	B	03/04/2025	0,00%	0,00%	0,60	20,20	1,00	1,00	79,20	0,08		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-63	A	02/04/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,10	2,00	1,00	78,90	0,11		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-63	B	02/04/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,10	2,00	1,00	78,80	0,20		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-64	A	02/04/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,00	2,00	1,00	78,90	0,22		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-64	B	02/04/2025	0,00%	0,00%	0,40	20,50	2,00	1,00	79,20	0,18		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-65	A	02/04/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,90	3,00	1,00	79,00	0,11		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-65	B	02/04/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,10	2,00	1,00	78,80	0,04		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-66	A	02/04/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,00	2,00	1,00	78,90	0,08		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-66	B	02/04/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,10	2,00	1,00	78,80	0,11		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-67	A	02/04/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,00	2,00	2,00	78,90	0,09		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-67	B	02/04/2025	0,00%	0,00%	0,60	20,50	2,00	1,00	78,90	0,04		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-68	A	02/04/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,10	1,00	2,00	78,80	0,11		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-68	B	02/04/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,20	2,00	2,00	78,80	0,13		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-69	A	02/04/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,20	3,00	1,00	78,70	0,09		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-69	B	02/04/2025	0,00%	0,00%	2,90	18,30	2,00	1,00	78,80	0,16		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-77	A	02/04/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,10	1,00	2,00	78,90	0,21		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-77	B	02/04/2025	0,00%	0,00%	0,50	20,40	2,00	2,00	79,10	0,06		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-78	A	02/04/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,00	1,00	2,00	78,90	0,09		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-78	B	02/04/2025	0,00%	0,00%	1,10	19,80	2,00	2,00	79,10	0,13		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-79	A	02/04/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,10	2,00	2,00	78,80	0,18		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-79	B	02/04/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,20	1,00	1,00	78,70	0,07		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-80	A	02/04/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	2,00	1,00	78,70	0,09		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-80	B	02/04/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	2,00	1,00	78,70	0,07		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-81	A	02/04/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,10	1,00	2,00	78,90	0,02		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-81	B	02/04/2025	0,00%	0,00%	0,50	20,80	2,00	1,00	78,80	0,07		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-144	B	02/04/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,00	2,00	2,00	78,90	0,13		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-145	B	02/04/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,90	2,00	2,00	79,00	0,02		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-146	B	02/04/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,90	2,00	2,00	78,90	0,08		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-147	B	02/04/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,80	2,00	1,00	79,10	0,11		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-148	B	02/04/2025	0,00%	0,00%	0,30	20,90	2,00	1,00	78,80	0,09		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-149	B	02/04/2025	0,00%	0,00%	0,50	20,70	2,00	1,00	78,80	0,02		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-150	B	02/04/2025	0,00%	0,00%	2,80	18,90	3,00	1,00	78,40	0,06		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-151	B	02/04/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,20	2,00	2,00	78,80	0,09		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-46	A	02/04/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,00	1,00	1,00	78,90	0,13		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-46	B	02/04/2025	0,00%	0,00%	2,60	18,70	2,00	2,00	78,80	0,14		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-47	A	02/04/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,80	1,00	2,00	79,00	0,17		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-47	B	02/04/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,10	1,00	2,00	78,80	0,32		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-48	A	02/04/2025	0,00%	0,00%	0,30	20,70	3,00	2,00	79,00	0,10		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	C02 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H_2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
Conjunto Laboratorial	PMG-48	B	02/04/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,80	3,00	1,00	79,00	0,20		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-49	A	02/04/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,90	3,00	1,00	78,90	0,11		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-49	B	02/04/2025	0,00%	0,00%	3,70	17,60	3,00	2,00	78,70	0,16		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-50	A	02/04/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,90	2,00	1,00	78,90	0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-50	B	02/04/2025	0,00%	0,00%	2,00	19,30	2,00	1,00	78,60	0,16		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-51	A	02/04/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,60	1,00	1,00	79,20	0,13		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-51	B	02/04/2025	0,10%	0,40%	0,10	20,70	2,00	1,00	79,20	0,08		0,00	8,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-52	A	02/04/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,70	1,00	1,00	79,30	-0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-52	B	02/04/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,60	1,00	0,00	79,20	0,13		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-53	A	02/04/2025	0,00%	0,00%	0,50	20,10	2,00	1,00	79,40	0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-53	B	02/04/2025	0,00%	0,00%	0,70	19,50	1,00	0,00	79,90	0,29		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-54	A	02/04/2025	0,00%	0,00%	0,30	20,00	2,00	1,00	79,70	0,09		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-54	B	02/04/2025	0,20%	0,20%	2,50	16,60	2,00	0,00	80,70	-0,08		0,00	9,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-55	A	02/04/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,40	2,00	1,00	79,40	-0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-55	B	02/04/2025	0,00%	0,00%	4,50	15,00	3,00	1,00	80,50	-0,07		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-56	A	02/04/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,40	2,00	1,00	79,40	0,10		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-56	B	02/04/2025	0,00%	0,00%	1,10	20,10	3,00	1,00	78,70	0,15		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-57	A	02/04/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,40	1,00	1,00	78,50	0,17		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-57	B	02/04/2025	0,00%	0,00%	1,40	20,40	2,00	1,00	78,20	-0,04		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-58	A	02/04/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,80	1,00	1,00	79,10	0,11		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-58	B	02/04/2025	0,00%	0,00%	2,50	17,90	1,00	1,00	79,60	0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-59	A	02/04/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,80	2,00	1,00	79,10	-0,12		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-59	B	02/04/2025	0,00%	0,00%	0,80	20,20	2,00	1,00	79,00	0,10		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-60	A	02/04/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,80	2,00	1,00	79,10	0,10		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-60	B	02/04/2025	0,00%	0,00%	2,70	18,00	3,00	2,00	79,30	0,07		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-61	A	02/04/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,60	3,00	2,00	79,20	0,09		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-61	B	02/04/2025	0,00%	0,00%	7,00	12,80	3,00	1,00	80,20	-0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-137	B	02/04/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,10	3,00	1,00	78,90	0,05		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-138	B	02/04/2025	0,00%	0,00%	2,50	19,20	3,00	1,00	78,30	0,15		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-139	A	02/04/2025	0,00%	0,00%	0,00	20,60	1,00	0,00	79,40	0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-139	B	02/04/2025	0,00%	0,00%	0,00	20,70	1,00	0,00	79,30	0,25		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-140	A	02/04/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,60	2,00	0,00	79,30	0,07		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-140	B	02/04/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,50	1,00	0,00	79,40	0,04		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-141	B	02/04/2025	0,00%	0,00%	0,00	20,80	2,00	0,00	79,10	0,09		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-62	A	02/04/2025	0,00%	0,00%	0,00	20,90	1,00	1,00	79,10	0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-62	B	02/04/2025	0,10%	0,80%	0,10	20,80	2,00	1,00	79,10	0,18		0,00	18,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-01	A	01/04/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,70	2,00	1,00	79,20	0,07		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-01	B	01/04/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,90	2,00	1,00	79,10	0,01		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-02	A	01/04/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,80	2,00	2,00	79,10	0,12		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-02	B	01/04/2025	0,00%	0,00%	0,00	20,90	2,00	2,00	79,10	0,16		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-03	A	01/04/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,80	2,00	1,00	79,10	0,07		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-03	B	01/04/2025	0,00%	0,00%	2,30	18,00	2,00	1,00	79,70	0,13		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-04	A	04/04/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,80	2,00	2,00	79,20	0,18		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-04	B	04/04/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,10	2,00	1,00	78,90	0,13		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-05	A	01/04/2025	0,00%	0,00%	0,00	20,90	2,00	2,00	79,10	0,14		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-05	B	01/04/2025	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	Não medido. Agua durante a medição.
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-06	A	01/04/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,80	2,00	2,00	79,10	0,03		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-06	B	01/04/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,80	2,00	2,00	79,10	0,13		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-07	A	01/04/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,70	1,00	0,00	79,10	0,01		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-07	B	01/04/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,90	2,00	1,00	79,00	-0,08		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-08	A	01/04/2025	0,00%	0,00%	0,30	20,40	2,00	0,00	79,30	0,07		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-08	B	01/04/2025	0,00%	0,00%	3,70	16,80	2,00	0,00	79,50	0,03		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-09	A	04/04/2025	0,00%	0,00%	2,30	18,40	2,00	1,00	79,30	0,05		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	C02 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H_2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-09**	**B**	**04/04/2025**	0,00%	0,00%	11,00	9,30	2,00	1,00	79,70	-0,03		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-10**	**A**	**04/04/2025**	0,00%	0,00%	0,70	19,90	2,00	1,00	79,40	0,00		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-10**	**B**	**04/04/2025**	0,00%	0,00%	3,20	16,70	1,00	1,00	80,00	0,05		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-84**	**A**	**01/04/2025**	0,00%	0,00%	0,30	20,50	3,00	0,00	79,20	-0,07		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-84**	**B**	**01/04/2025**	0,00%	0,00%	3,90	17,90	3,00	0,00	78,20	0,03		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-85**	**A**	**01/04/2025**	0,00%	0,00%	1,30	19,30	3,00	0,00	79,50	-0,03		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-85**	**B**	**01/04/2025**	0,00%	0,00%	2,80	17,40	3,00	0,00	79,80	-0,06		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-86**	**A**	**01/04/2025**	0,00%	0,00%	0,40	20,10	3,00	0,00	79,50	0,03		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-86**	**B**	**01/04/2025**	0,00%	0,00%	1,40	18,90	3,00	0,00	79,70	0,13		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-87**	**A**	**01/04/2025**	0,00%	0,00%	2,60	16,20	2,00	0,00	81,20	-0,01		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-87**	**B**	**01/04/2025**	0,00%	0,00%	2,30	17,70	2,00	1,00	80,10	0,02		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-152**	**A**	**04/04/2025**	0,00%	0,00%	0,40	19,90	1,00	1,00	79,70	0,03		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-152**	**B**	**04/04/2025**	0,00%	0,00%	7,80	12,70	1,00	1,00	79,60	0,08		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-153**	**B**	**01/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	20,90	2,00	1,00	79,00	0,00		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-154**	**B**	**01/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,00	2,00	1,00	79,00	0,08		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-155**	**B**	**01/04/2025**	0,00%	0,00%	0,80	20,10	2,00	1,00	79,10	-0,01		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-156**	**B**	**01/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	20,80	1,00	2,00	79,20	0,07		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-157**	**B**	**01/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	20,80	2,00	2,00	79,20	0,10		0,00	0,00	
Enfermaria	**PMG-70**	**A**	**04/04/2025**	0,00%	0,00%	0,20	20,20	1,00	2,00	79,60	0,03		0,00	0,00	
Enfermaria	**PMG-70**	**B**	**04/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,00	2,00	2,00	78,90	-0,01		0,00	0,00	
Enfermaria	**PMG-71**	**A**	**04/04/2025**	0,00%	0,00%	0,20	20,40	2,00	1,00	79,40	0,10		0,00	0,00	
Enfermaria	**PMG-71**	**B**	**04/04/2025**	0,00%	0,00%	0,20	20,40	2,00	1,00	79,40	0,19		0,00	0,00	
Enfermaria	**PMG-72**	**A**	**04/04/2025**	0,00%	0,00%	0,60	19,20	1,00	2,00	80,30	0,16		0,00	0,00	
Enfermaria	**PMG-72**	**B**	**04/04/2025**	0,00%	0,00%	1,20	18,10	2,00	1,00	80,70	0,07		0,00	0,00	
Enfermaria	**PMG-73**	**A**	**04/04/2025**	0,00%	0,00%	0,30	20,20	1,00	2,00	79,50	0,17		0,00	0,00	
Enfermaria	**PMG-73**	**B**	**04/04/2025**	0,00%	0,00%	1,20	18,60	2,00	1,00	80,30	0,08		0,00	0,00	
Enfermaria	**PMG-74**	**A**	**04/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,00	2,00	2,00	78,90	0,14		0,00	0,00	
Enfermaria	**PMG-74**	**B**	**04/04/2025**	2,00%	2,00%	0,80	13,90	2,00	1,00	83,30	0,15		0,00	**71,00**	
Enfermaria	**PMG-75**	**A**	**04/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	20,60	1,00	2,00	79,30	0,14		0,00	0,00	
Enfermaria	**PMG-75**	**B**	**04/04/2025**	0,00%	0,00%	2,00	16,00	1,00	2,00	82,10	0,18		0,00	0,00	
Enfermaria	**PMG-76**	**A**	**04/04/2025**	0,00%	0,00%	0,50	19,10	2,00	2,00	80,30	0,13		0,00	0,00	
Enfermaria	**PMG-76**	**B**	**04/04/2025**	0,00%	0,00%	2,90	12,00	2,00	2,00	85,10	0,19		0,00	0,00	
Enfermaria	**PMG-165**	**A**	**04/04/2025**	0,00%	0,00%	0,40	18,50	1,00	1,00	81,00	0,21		0,00	0,00	
Enfermaria	**PMG-165**	**B**	**04/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	20,90	2,00	1,00	79,00	0,25		0,00	0,00	
Incubadora	**PMG-88**	**A**	**04/04/2025**	0,00%	0,00%	0,40	20,30	1,00	1,00	79,30	0,08		0,00	0,00	
Incubadora	**PMG-88**	**B**	**04/04/2025**	0,00%	0,00%	0,60	20,20	1,00	2,00	79,20	-0,08		0,00	0,00	
Incubadora	**PMG-89**	**A**	**04/04/2025**	0,00%	0,00%	0,40	20,70	2,00	1,00	78,90	0,10		0,00	0,00	
Incubadora	**PMG-89**	**B**	**04/04/2025**	0,00%	0,00%	0,90	19,90	1,00	1,00	79,10	0,09		0,00	0,00	
Incubadora	**PMG-90**	**A**	**04/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	20,90	2,00	2,00	79,00	0,03		0,00	0,00	
Incubadora	**PMG-90**	**B**	**04/04/2025**	0,00%	0,00%	0,80	20,10	1,00	1,00	79,20	0,10		0,00	0,00	
Incubadora	**PMG-91**	**A**	**04/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	20,80	1,00	1,00	79,10	0,08		0,00	0,00	
Incubadora	**PMG-91**	**B**	**04/04/2025**	0,00%	0,00%	2,20	18,50	1,00	2,00	79,40	0,08		0,00	0,00	
Incubadora	**PMG-92**	**A**	**04/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	20,80	2,00	2,00	79,10	0,20		0,00	0,00	
Incubadora	**PMG-92**	**B**	**04/04/2025**	0,00%	0,00%	1,00	19,90	1,00	1,00	79,10	0,06		0,00	0,00	
Incubadora	**PMG-93**	**A**	**04/04/2025**	0,00%	0,00%	0,20	20,80	1,00	1,00	79,00	0,03		0,00	0,00	
Incubadora	**PMG-93**	**B**	**04/04/2025**	0,00%	0,00%	1,10	19,80	2,00	1,00	79,00	0,09		0,00	0,00	
Transportes	**PMG-121**	**A**	**03/04/2025**	0,00%	0,00%	0,20	20,80	1,00	2,00	78,90	0,14		0,00	0,00	
Transportes	**PMG-121**	**B**	**03/04/2025**	0,00%	0,00%	3,60	15,80	1,00	2,00	80,60	-0,06		0,00	0,00	
Transportes	**PMG-122**	**A**	**03/04/2025**	0,00%	0,00%	0,60	20,10	1,00	2,00	79,30	0,14		0,00	0,00	
Transportes	**PMG-122**	**B**	**03/04/2025**	0,00%	0,00%	6,40	14,30	1,00	2,00	79,40	0,20		0,00	0,00	
Transportes	**PMG-123**	**A**	**03/04/2025**	0,00%	0,00%	0,70	19,90	1,00	2,00	79,40	0,07		0,00	0,00	
Transportes	**PMG-123**	**B**	**03/04/2025**	0,00%	0,00%	3,50	16,60	2,00	2,00	79,90	0,07		0,00	0,00	
Transportes	**PMG-124**	**A**	**03/04/2025**	0,00%	0,00%	1,10	18,70	1,00	2,00	80,10	0,01		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	C02 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H_2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
Transportes	PMG-124	B	03/04/2025	0,00%	0,00%	3,70	16,90	2,00	2,00	79,40	0,07		0,00	0,00	
Transportes	PMG-158	B	03/04/2025	0,00%	0,00%	5,00	16,00	2,00	2,00	79,00	0,08		0,00	0,00	
Transportes	PMG-159	B	03/04/2025	0,00%	0,00%	1,70	18,50	1,00	2,00	79,80	0,15		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-125	A	03/04/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,30	1,00	2,00	78,60	0,07		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-125	B	03/04/2025	0,00%	0,00%	4,40	16,70	2,00	2,00	79,00	0,11		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-126	A	03/04/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,00	1,00	2,00	78,90	0,09		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-126	B	03/04/2025	0,00%	0,00%	3,20	18,00	1,00	2,00	78,80	0,16		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-127	A	03/04/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,10	1,00	2,00	78,90	0,10		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-127	B	03/04/2025	0,00%	0,00%	3,00	18,40	1,00	2,00	78,60	0,05		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-128	A	03/04/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,10	1,00	2,00	78,80	0,13		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-128	B	03/04/2025	0,00%	0,00%	5,20	16,50	1,00	2,00	78,30	-0,41		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-129	A	03/04/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,90	1,00	1,00	79,00	0,05		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-129	B	03/04/2025	0,00%	0,00%	2,70	18,80	1,00	2,00	78,50	0,01		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-130	A	03/04/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,70	1,00	2,00	79,10	0,13		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-130	B	03/04/2025	0,00%	0,00%	3,50	17,80	1,00	2,00	78,70	0,03		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-131	A	03/04/2025	0,00%	0,00%	0,90	19,70	1,00	2,00	79,50	0,13		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-131	B	03/04/2025	0,00%	0,00%	1,30	19,50	1,00	2,00	79,20	0,09		0,00	0,00	
Edificio I 1	PMG-16	A	08/04/2025	0,00%	0,00%	1,90	19,30	1,00	1,00	78,80	0,05		0,00	0,00	
Edificio I 1	PMG-16	B	08/04/2025	0,00%	0,00%	2,60	18,40	1,00	1,00	79,00	0,04		0,00	0,00	
Edificio I 1	PMG-17	A	08/04/2025	0,00%	0,00%	0,70	20,60	1,00	0,00	78,80	0,04		0,00	0,00	
Edificio I 1	PMG-17	B	08/04/2025	0,00%	0,00%	1,50	20,00	2,00	1,00	78,60	0,03		0,00	0,00	
Edificio I 1	PMG-18	A	10/04/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,60	1,00	0,00	79,30	0,04		0,00	0,00	
Edificio I 1	PMG-18	B	10/04/2025	0,00%	0,00%	1,60	19,30	2,00	0,00	79,10	0,01		0,00	0,00	
Edificio I 1	PMG-20	A	08/04/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,90	2,00	0,00	79,00	0,06		0,00	0,00	
Edificio I 1	PMG-20	B	08/04/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,80	2,00	0,00	79,00	-0,04		0,00	0,00	
Edificio I 1	PMG-22	A	08/04/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,80	2,00	0,00	79,00	0,04		0,00	0,00	
Edificio I 1	PMG-22	B	08/04/2025	0,00%	0,00%	3,00	18,00	1,00	0,00	79,00	0,03		0,00	0,00	
Edificio I 1	PMG-23	A	08/04/2025	0,00%	0,00%	0,30	20,50	1,00	0,00	79,10	0,03		0,00	0,00	
Edificio I 1	PMG-23	B	08/04/2025	0,00%	0,00%	1,10	19,80	2,00	0,00	79,10	-0,04		0,00	0,00	
Edificio I 1	PMG-113	A	08/04/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,50	2,00	0,00	79,40	0,01		0,00	0,00	
Edificio I 1	PMG-113	B	08/04/2025	0,00%	0,00%	2,20	18,60	2,00	0,00	79,20	0,00		0,00	0,00	
Edificio I 1	PMG-114	A	08/04/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,80	1,00	0,00	79,10	-0,07		0,00	0,00	
Edificio I 1	PMG-114	B	08/04/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,80	1,00	0,00	79,10	-0,08		0,00	0,00	
Edificio I 1	PMG-115	A	08/04/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,50	2,00	0,00	79,40	-0,01		0,00	0,00	
Edificio I 1	PMG-115	B	08/04/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,70	2,00	0,00	79,20	-0,08		0,00	0,00	
Edificio I 1	PMG-11	A	08/04/2025	0,00%	0,00%	1,00	20,50	1,00	2,00	78,50	0,10		0,00	0,00	
Edificio I 1	PMG-11	B	08/04/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,40	2,00	2,00	78,40	-0,32		0,00	0,00	
Edificio I 1	PMG-12	A	08/04/2025	0,00%	0,00%	2,40	18,30	1,00	1,00	79,30	0,09		0,00	0,00	
Edificio I 1	PMG-12	B	08/04/2025	0,00%	0,00%	0,60	20,60	1,00	1,00	78,80	0,04		0,00	0,00	
Edificio I 1	PMG-13	A	08/04/2025	0,00%	0,00%	1,20	20,20	1,00	1,00	78,60	0,00		0,00	0,00	
Edificio I 1	PMG-13	B	08/04/2025	0,00%	0,00%	1,40	19,80	1,00	1,00	78,70	0,16		0,00	0,00	
Edificio I 1	PMG-14	A	08/04/2025	0,00%	0,00%	1,90	19,30	1,00	3,00	78,80	0,16		0,00	0,00	
Edificio I 1	PMG-14	B	08/04/2025	0,00%	0,00%	2,70	18,40	2,00	3,00	78,80	0,14		0,00	0,00	
Edificio I 1	PMG-15	A	08/04/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,20	1,00	1,00	78,70	0,09		0,00	0,00	
Edificio I 1	PMG-15	B	08/04/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,30	1,00	0,00	78,60	0,18		0,00	0,00	
Edificio I 1	PMG-19	A	08/04/2025	0,00%	0,00%	0,40	21,20	2,00	2,00	78,50	0,09		0,00	0,00	
Edificio I 1	PMG-19	B	08/04/2025	0,00%	0,00%	0,70	20,70	2,00	2,00	78,60	0,08		0,00	0,00	
Edificio I 1	PMG-21	A	08/04/2025	0,00%	0,00%	0,70	20,60	2,00	3,00	78,60	0,24		0,00	0,00	
Edificio I 1	PMG-21	B	08/04/2025	0,00%	0,00%	1,20	20,20	2,00	2,00	78,60	0,13		0,00	0,00	
Edificio I 1	PMG-24	A	10/04/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,10	2,00	1,00	79,70	0,04		0,00	0,00	
Edificio I 1	PMG-24	B	10/04/2025	0,00%	0,00%	0,40	20,10	2,00	0,00	79,60	0,13		0,00	0,00	
Edificio I 1	PMG-135	A	08/04/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,70	1,00	0,00	79,10	-0,01		0,00	0,00	
Edificio I 1	PMG -135	B	08/04/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,80	2,00	0,00	79,10	-0,08		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	C02 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H_2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
Edifício I 1	**PMG-136**	**B**	**08/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	20,70	2,00	0,00	79,20	-0,03		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	**PMG-25**	**A**	**07/04/2025**	0,00%	0,00%	0,20	21,30	1,00	1,00	78,60	0,03		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	**PMG-25**	**B**	**07/04/2025**	0,00%	0,00%	1,00	20,50	1,00	1,00	78,50	0,00		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	**PMG-26**	**A**	**07/04/2025**	0,00%	0,00%	0,30	21,00	1,00	1,00	78,70	0,08		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	**PMG-26**	**B**	**07/04/2025**	0,00%	0,00%	0,70	20,40	1,00	2,00	78,80	0,06		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	**PMG-27**	**A**	**07/04/2025**	0,00%	0,00%	0,90	20,60	1,00	1,00	78,60	0,09		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	**PMG-27**	**B**	**07/04/2025**	0,00%	0,00%	2,80	18,60	2,00	1,00	78,60	0,09		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	**PMG-28**	**A**	**07/04/2025**	0,00%	0,00%	1,10	19,20	1,00	1,00	79,80	0,15		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	**PMG-28**	**B**	**07/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,50	1,00	1,00	78,50	0,03		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	**PMG-29**	**A**	**07/04/2025**	0,00%	0,00%	0,30	21,30	1,00	1,00	78,40	0,07		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	**PMG-29**	**B**	**07/04/2025**	0,00%	0,00%	0,70	20,80	1,00	1,00	78,50	0,10		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	**PMG-44**	**A**	**07/04/2025**	0,00%	0,00%	0,20	21,40	2,00	1,00	78,40	0,07		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	**PMG-44**	**B**	**07/04/2025**	0,00%	0,00%	0,60	21,10	1,00	1,00	78,30	0,07		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	**PMG-45**	**A**	**07/04/2025**	0,00%	0,00%	0,40	20,90	1,00	1,00	78,70	0,04		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	**PMG-45**	**B**	**07/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,50	1,00	2,00	78,50	-0,05		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	**PMG-134**	**B**	**07/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,60	1,00	1,00	78,40	-0,08		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-30**	**A**	**07/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,00	1,00	0,00	78,90	0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-30**	**B**	**07/04/2025**	0,00%	0,00%	1,10	20,10	1,00	0,00	78,80	-0,04		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-31**	**A**	**07/04/2025**	0,00%	0,00%	0,20	20,90	2,00	0,00	78,90	0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-31**	**B**	**07/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,10	2,00	0,00	78,90	-0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-32**	**A**	**07/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	20,90	2,00	0,00	79,00	0,01		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-32**	**B**	**07/04/2025**	0,00%	0,00%	0,70	20,40	1,00	0,00	78,80	0,08		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-33**	**A**	**07/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	20,90	1,00	1,00	79,00	0,04		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-33**	**B**	**07/04/2025**	0,00%	0,00%	3,20	18,00	1,00	0,00	78,80	0,11		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-34**	**A**	**07/04/2025**	0,00%	0,00%	0,20	20,80	2,00	0,00	79,00	-0,06		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-34**	**B**	**07/04/2025**	0,00%	0,00%	1,30	20,00	1,00	1,00	78,70	0,10		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-35**	**A**	**07/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,20	1,00	1,00	78,70	0,08		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-35**	**B**	**07/04/2025**	0,00%	0,00%	1,20	20,40	1,00	0,00	78,50	0,06		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-36**	**A**	**07/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,20	1,00	1,00	78,70	0,06		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-36**	**B**	**07/04/2025**	0,00%	0,00%	2,20	18,90	1,00	1,00	78,90	0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-37**	**A**	**07/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,30	1,00	1,00	78,70	0,02		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-37**	**B**	**07/04/2025**	0,00%	0,00%	1,10	20,30	1,00	1,00	78,60	0,01		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-38**	**A**	**07/04/2025**	0,00%	0,00%	0,20	21,10	1,00	1,00	78,80	0,06		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-38**	**B**	**07/04/2025**	0,00%	0,00%	0,40	20,80	1,00	1,00	78,80	0,01		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-39**	**A**	**07/04/2025**	0,00%	0,00%	0,20	21,00	1,00	0,00	78,90	0,10		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-39**	**B**	**07/04/2025**	0,00%	0,00%	8,10	13,10	2,00	0,00	78,80	-0,12		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-40**	**A**	**07/04/2025**	0,00%	0,00%	0,20	21,10	1,00	1,00	78,70	0,06		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-40**	**B**	**07/04/2025**	0,00%	0,00%	0,40	20,80	1,00	1,00	78,80	0,04		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-41**	**A**	**07/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,40	1,00	1,00	78,60	0,10		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-41**	**B**	**07/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,30	1,00	1,00	78,60	0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-42**	**A**	**07/04/2025**	0,00%	0,00%	0,50	20,70	1,00	0,00	78,80	0,08		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-42**	**B**	**07/04/2025**	0,00%	0,00%	4,30	17,40	1,00	0,00	78,30	-0,01		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-43**	**A**	**07/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	20,90	1,00	0,00	79,10	-0,13		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-43**	**B**	**07/04/2025**	0,00%	0,00%	0,50	20,60	1,00	0,00	78,80	-0,06		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-132**	**A**	**07/04/2025**	0,00%	0,00%	0,30	20,80	2,00	0,00	78,90	-0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-132**	**B**	**07/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,00	2,00	0,00	78,90	-0,02		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-133**	**A**	**07/04/2025**	0,00%	0,00%	0,20	20,50	1,00	1,00	79,20	0,05		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-133**	**B**	**07/04/2025**	0,00%	0,00%	0,50	20,60	2,00	1,00	78,80	0,01		0,00	0,00	
Edifício I-4	**PMG-63**	**A**	**09/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,50	2,00	2,00	78,50	-0,03		0,00	0,00	
Edifício I-4	**PMG-63**	**B**	**09/04/2025**	0,00%	0,00%	0,20	21,40	2,00	1,00	78,40	0,11		0,00	0,00	
Edifício I-4	**PMG-64**	**A**	**09/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,20	1,00	2,00	78,70	0,11		0,00	0,00	
Edifício I-4	**PMG-64**	**B**	**09/04/2025**	0,00%	0,00%	0,70	20,40	1,00	2,00	78,90	0,04		0,00	0,00	
Edifício I-4	**PMG-65**	**A**	**09/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,20	2,00	1,00	78,80	0,06		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	C02 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H_2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
Edifício I-4	**PMG-65**	**B**	**09/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,40	2,00	2,00	78,60	-0,12		0,00	0,00	
Edifício I-4	**PMG-66**	**A**	**09/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,20	1,00	2,00	78,60	0,14		0,00	0,00	
Edifício I-4	**PMG-66**	**B**	**09/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,40	2,00	2,00	78,60	0,22		0,00	0,00	
Edifício I-4	**PMG-67**	**A**	**09/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,00	2,00	1,00	78,90	0,13		0,00	0,00	
Edifício I-4	**PMG-67**	**B**	**09/04/2025**	0,00%	0,00%	0,60	20,50	2,00	1,00	78,80	0,14		0,00	0,00	
Edifício I-4	**PMG-68**	**A**	**09/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,10	2,00	2,00	78,80	0,13		0,00	0,00	
Edifício I-4	**PMG-68**	**B**	**09/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,20	1,00	1,00	78,80	0,08		0,00	0,00	
Edifício I-4	**PMG-69**	**A**	**09/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,30	2,00	2,00	78,70	0,14		0,00	0,00	
Edifício I-4	**PMG-69**	**B**	**09/04/2025**	0,00%	0,00%	2,50	18,80	1,00	1,00	78,70	0,17		0,00	0,00	
Edifício I-4	**PMG-77**	**A**	**09/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,00	2,00	1,00	78,90	0,11		0,00	0,00	
Edifício I-4	**PMG-77**	**B**	**09/04/2025**	0,00%	0,00%	1,30	19,70	2,00	1,00	79,00	0,10		0,00	0,00	
Edifício I-4	**PMG-78**	**A**	**09/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,00	1,00	1,00	78,90	0,03		0,00	0,00	
Edifício I-4	**PMG-78**	**B**	**09/04/2025**	0,00%	0,00%	1,00	20,10	2,00	1,00	78,90	0,19		0,00	0,00	
Edifício I-4	**PMG-79**	**A**	**09/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,10	1,00	1,00	78,90	0,11		0,00	0,00	
Edifício I-4	**PMG-79**	**B**	**09/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,20	2,00	2,00	78,80	0,13		0,00	0,00	
Edifício I-4	**PMG-80**	**A**	**09/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,60	2,00	1,00	78,40	0,09		0,00	0,00	
Edifício I-4	**PMG-80**	**B**	**09/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,50	2,00	1,00	78,40	0,02		0,00	0,00	
Edifício I-4	**PMG-81**	**A**	**09/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,00	2,00	1,00	78,90	0,07		0,00	0,00	
Edifício I-4	**PMG-81**	**B**	**09/04/2025**	0,00%	0,00%	0,60	20,60	2,00	1,00	78,80	0,13		0,00	0,00	
Edifício I-4	**PMG-144**	**B**	**09/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,00	1,00	1,00	78,90	0,04		0,00	0,00	
Edifício I-4	**PMG-145**	**B**	**09/04/2025**	0,00%	0,00%	1,00	19,20	1,00	1,00	79,90	0,11		0,00	0,00	
Edifício I-4	**PMG-146**	**B**	**09/04/2025**	0,00%	0,00%	0,20	20,70	2,00	1,00	79,00	0,00		0,00	0,00	
Edifício I-4	**PMG-147**	**B**	**09/04/2025**	0,00%	0,00%	0,20	20,90	2,00	1,00	78,90	0,11		0,00	0,00	
Edifício I-4	**PMG-148**	**B**	**09/04/2025**	0,00%	0,00%	0,60	20,70	2,00	2,00	78,70	0,13		0,00	0,00	
Edifício I-4	**PMG-149**	**B**	**09/04/2025**	0,00%	0,00%	0,40	21,10	2,00	2,00	78,50	0,08		0,00	0,00	
Edifício I-4	**PMG-150**	**B**	**09/04/2025**	0,00%	0,00%	2,80	18,60	2,00	1,00	78,60	0,08		0,00	0,00	
Edifício I-4	**PMG-151**	**B**	**09/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,20	1,00	1,00	78,70	0,15		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-46**	**A**	**09/04/2025**	0,00%	0,00%	0,30	20,80	1,00	2,00	78,90	0,15		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-46**	**B**	**09/04/2025**	0,00%	0,00%	2,90	18,20	2,00	1,00	78,80	0,16		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-47**	**A**	**09/04/2025**	0,00%	0,00%	0,20	20,70	1,00	2,00	79,10	0,16		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-47**	**B**	**09/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,30	1,00	2,00	78,70	0,13		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-48**	**A**	**09/04/2025**	0,00%	0,00%	0,30	20,80	1,00	1,00	78,90	0,17		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-48**	**B**	**09/04/2025**	0,00%	0,00%	0,50	20,50	1,00	2,00	79,00	0,09		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-49**	**A**	**09/04/2025**	0,00%	0,00%	0,20	21,00	2,00	1,00	78,80	0,18		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-49**	**B**	**09/04/2025**	0,00%	0,00%	2,60	18,50	1,00	1,00	78,80	0,16		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-50**	**A**	**09/04/2025**	0,00%	0,00%	0,20	20,90	1,00	2,00	78,90	0,12		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-50**	**B**	**09/04/2025**	0,00%	0,00%	2,60	18,90	1,00	1,00	78,50	0,11		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-51**	**A**	**09/04/2025**	0,00%	0,00%	0,40	20,60	1,00	0,00	79,00	0,06		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-51**	**B**	**09/04/2025**	1,00%	1,00%	0,50	19,70	2,00	0,00	78,90	0,13		0,00	**4,00**	
Conjunto Laboratorial	**PMG-52**	**A**	**09/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	20,80	1,00	0,00	79,10	0,01		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-52**	**B**	**09/04/2025**	0,00%	0,00%	0,30	20,60	1,00	0,00	79,10	-0,02		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-53**	**A**	**09/04/2025**	0,00%	0,00%	0,40	20,20	2,00	0,00	79,40	0,01		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-53**	**B**	**09/04/2025**	0,00%	0,00%	0,80	19,40	2,00	0,00	79,80	-0,11		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-54**	**A**	**09/04/2025**	0,00%	0,00%	0,30	20,10	2,00	0,00	79,60	-0,01		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-54**	**B**	**09/04/2025**	0,10%	0,10%	3,20	15,90	2,00	0,00	80,90	0,03		0,00	**4,00**	
Conjunto Laboratorial	**PMG-55**	**A**	**09/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	20,50	3,00	0,00	79,40	0,02		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-55**	**B**	**09/04/2025**	0,00%	0,00%	3,80	16,40	2,00	0,00	79,90	-0,07		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-56**	**A**	**09/04/2025**	0,00%	0,00%	0,20	20,60	2,00	1,00	79,20	0,13		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-56**	**B**	**09/04/2025**	0,00%	0,00%	1,80	19,80	3,00	0,00	78,40	0,06		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-57**	**A**	**09/04/2025**	0,00%	0,00%	0,20	20,90	1,00	1,00	79,00	0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-57**	**B**	**09/04/2025**	0,00%	0,00%	4,00	17,70	1,00	0,00	78,20	0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-58**	**A**	**09/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	20,80	2,00	0,00	79,10	0,07		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-58**	**B**	**09/04/2025**	0,00%	0,00%	4,00	16,00	2,00	0,00	80,00	0,06		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	C02 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H_2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
Conjunto Laboratorial	**PMG-59**	**A**	**09/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	20,70	3,00	0,00	79,20	0,13		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-59**	**B**	**09/04/2025**	0,00%	0,00%	0,90	20,10	3,00	1,00	78,90	0,05		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-60**	**A**	**09/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	20,90	3,00	0,00	78,90	0,10		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-60**	**B**	**09/04/2025**	0,00%	0,00%	4,70	16,10	3,00	1,00	79,20	0,06		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-61**	**A**	**09/04/2025**	0,00%	0,00%	0,30	20,60	2,00	0,00	79,20	0,01		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-61**	**B**	**09/04/2025**	0,00%	0,00%	9,70	9,50	3,00	1,00	80,70	0,04		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-137**	**B**	**09/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,20	1,00	1,00	78,80	0,28		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-138**	**B**	**09/04/2025**	0,00%	0,00%	2,40	19,20	1,00	2,00	78,40	0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-139**	**A**	**09/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	20,70	1,00	0,00	79,20	-0,05		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-139**	**B**	**09/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	20,80	2,00	0,00	79,20	0,02		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-140**	**A**	**09/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	20,70	2,00	0,00	79,20	0,04		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-140**	**B**	**09/04/2025**	0,60%	0,60%	0,40	20,00	2,00	0,00	79,00	0,03		0,00	**8,00**	
Conjunto Laboratorial	**PMG-141**	**B**	**09/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,00	1,00	1,00	79,00	0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-62**	**A**	**09/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	20,80	2,00	0,00	79,10	0,06		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-62**	**B**	**09/04/2025**	0,10%	5,70%	0,10	20,60	1,00	0,00	79,10	0,06		0,00	**46,00**	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-01**	**A**	**08/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	20,80	1,00	1,00	79,10	0,06		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-01**	**B**	**08/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	20,90	2,00	1,00	79,00	0,09		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-02**	**A**	**08/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,00	2,00	1,00	78,90	0,17		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-02**	**B**	**08/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,20	1,00	1,00	78,80	0,14		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-03**	**A**	**08/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,10	1,00	1,00	78,80	0,05		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-03**	**B**	**08/04/2025**	0,00%	0,00%	2,30	19,10	1,00	0,00	78,60	0,02		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-04**	**A**	**08/04/2025**	0,00%	0,00%	0,30	20,80	1,00	2,00	78,90	0,17		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-04**	**B**	**08/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,20	1,00	1,00	78,80	0,08		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-05**	**A**	**08/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,10	1,00	2,00	78,80	0,12		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-05**	**B**	**08/04/2025**	2,20%	3,20%	0,80	20,10	1,00	2,00	76,90	0,86		0,00	**100,00**	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-06**	**A**	**08/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,20	1,00	2,00	78,80	0,10		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-06**	**B**	**08/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,30	2,00	2,00	78,70	0,18		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-07**	**A**	**08/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,10	1,00	1,00	78,80	0,03		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-07**	**B**	**08/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,30	1,00	1,00	78,70	0,07		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-08**	**A**	**08/04/2025**	0,00%	0,00%	0,30	20,90	2,00	1,00	78,80	0,00		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-08**	**B**	**08/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,20	1,00	1,00	78,70	-0,01		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-09**	**A**	**10/04/2025**	0,00%	0,00%	0,90	20,10	1,00	2,00	79,00	0,17		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-09**	**B**	**10/04/2025**	0,00%	0,00%	7,20	13,20	1,00	2,00	79,60	0,18		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-10**	**A**	**10/04/2025**	0,00%	0,00%	0,50	20,40	1,00	2,00	79,00	0,12		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-10**	**B**	**10/04/2025**	0,00%	0,00%	2,00	18,70	1,00	2,00	79,20	0,12		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-84**	**A**	**08/04/2025**	0,00%	0,00%	0,30	21,00	2,00	0,00	78,70	0,16		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-84**	**B**	**08/04/2025**	0,00%	0,00%	3,70	18,30	2,00	0,00	78,00	0,07		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-85**	**A**	**08/04/2025**	0,00%	0,00%	1,10	19,80	1,00	0,00	79,10	0,03		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-85**	**B**	**08/04/2025**	0,00%	0,00%	3,50	17,30	1,00	0,00	79,20	0,03		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-86**	**A**	**08/04/2025**	0,00%	0,00%	0,30	20,70	2,00	1,00	79,00	-0,04		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-86**	**B**	**08/04/2025**	0,00%	0,00%	1,50	19,10	1,00	1,00	79,40	0,08		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-87**	**A**	**08/04/2025**	0,00%	0,00%	2,40	17,50	1,00	1,00	80,10	0,03		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-87**	**B**	**08/04/2025**	0,00%	0,00%	2,30	18,90	2,00	1,00	78,80	-0,07		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-152**	**A**	**10/04/2025**	0,00%	0,00%	0,20	21,00	1,00	2,00	78,80	0,12		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-152**	**B**	**10/04/2025**	0,00%	0,00%	5,70	14,90	1,00	2,00	79,40	0,07		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-153**	**B**	**08/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,00	2,00	1,00	78,90	-0,01		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-154**	**B**	**08/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,10	2,00	2,00	78,90	0,09		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-155**	**B**	**08/04/2025**	0,00%	0,00%	1,30	20,00	1,00	2,00	78,80	0,08		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-156**	**B**	**08/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,20	1,00	1,00	78,80	0,21		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-157**	**B**	**08/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,20	1,00	1,00	78,70	0,15		0,00	0,00	
Enfermaria	**PMG-70**	**A**	**11/04/2025**	0,00%	0,00%	0,30	20,70	2,00	0,00	79,00	0,04		0,00	0,00	
Enfermaria	**PMG-70**	**B**	**11/04/2025**	0,00%	0,00%	0,20	20,90	2,00	0,00	79,00	-0,06		0,00	0,00	
Enfermaria	**PMG-71**	**A**	**11/04/2025**	0,00%	0,00%	0,20	20,50	2,00	0,00	79,30	0,15		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	C02 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H_2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
Enfermaria	**PMG-71**	**B**	**11/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	20,70	2,00	0,00	79,20	-0,02		0,00	0,00	
Enfermaria	**PMG-72**	**A**	**11/04/2025**	0,00%	0,00%	0,60	19,40	2,00	0,00	80,10	-0,04		0,00	0,00	
Enfermaria	**PMG-72**	**B**	**11/04/2025**	0,00%	0,00%	1,80	17,50	2,00	0,00	80,80	0,08		0,00	0,00	
Enfermaria	**PMG-73**	**A**	**11/04/2025**	0,00%	0,00%	0,30	20,60	1,00	0,00	79,10	-0,07		0,00	0,00	
Enfermaria	**PMG-73**	**B**	**11/04/2025**	0,00%	0,00%	0,90	19,40	1,00	0,00	79,70	-0,06		0,00	0,00	
Enfermaria	**PMG-74**	**A**	**11/04/2025**	0,00%	0,00%	0,40	19,80	2,00	0,00	79,80	-0,03		0,00	0,00	
Enfermaria	**PMG-74**	**B**	**11/04/2025**	3,90%	3,90%	1,40	8,10	2,00	0,00	86,50	-0,07		0,00	**84,00**	
Enfermaria	**PMG-75**	**A**	**11/04/2025**	0,00%	0,00%	0,30	20,00	1,00	0,00	79,70	-0,08		0,00	0,00	
Enfermaria	**PMG-75**	**B**	**11/04/2025**	0,00%	0,00%	2,90	15,30	2,00	0,00	81,90	-0,12		0,00	0,00	
Enfermaria	**PMG-76**	**A**	**11/04/2025**	0,00%	0,00%	0,60	19,00	2,00	0,00	80,40	-0,07		0,00	0,00	
Enfermaria	**PMG-76**	**B**	**11/04/2025**	0,00%	0,00%	2,50	13,80	2,00	0,00	83,60	0,04		0,00	0,00	
Enfermaria	**PMG-165**	**A**	**11/04/2025**	0,00%	0,00%	0,50	19,00	2,00	0,00	80,60	0,02		0,00	0,00	
Enfermaria	**PMG-165**	**B**	**11/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,00	2,00	0,00	78,90	-0,03		0,00	0,00	
CAT	**PMG-82**	**A**	**08/04/2025**	0,00%	0,00%	1,30	20,00	1,00	3,00	78,70	0,19		0,00	0,00	
CAT	**PMG-82**	**B**	**08/04/2025**	0,00%	0,00%	4,00	17,00	1,00	3,00	79,00	0,21		0,00	0,00	
CAT	**PMG-83**	**A**	**08/04/2025**	0,00%	0,00%	2,30	18,80	1,00	3,00	78,90	0,16		0,00	0,00	
CAT	**PMG-83**	**B**	**08/04/2025**	0,00%	0,00%	3,50	17,30	2,00	2,00	79,20	0,14		0,00	0,00	
CAT	**PMG-94**	**A**	**08/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,30	1,00	3,00	78,60	0,14		0,00	0,00	
CAT	**PMG-94**	**B**	**08/04/2025**	0,00%	0,00%	2,90	18,00	1,00	3,00	79,20	0,26		0,00	0,00	
CAT	**PMG-95**	**A**	**08/04/2025**	0,00%	0,00%	0,80	20,40	1,00	3,00	78,70	0,27		0,00	0,00	
CAT	**PMG-95**	**B**	**08/04/2025**	0,00%	0,00%	1,70	20,00	1,00	3,00	78,30	0,09		0,00	0,00	
CAT	**PMG-96**	**A**	**08/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,20	1,00	3,00	78,70	0,19		0,00	0,00	
CAT	**PMG-96**	**B**	**08/04/2025**	0,00%	0,00%	4,80	12,90	1,00	3,00	82,30	0,15		0,00	0,00	
CAT	**PMG-97**	**A**	**08/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,30	1,00	2,00	78,70	0,20		0,00	0,00	
CAT	**PMG-97**	**B**	**08/04/2025**	0,00%	0,00%	2,90	17,50	1,00	3,00	79,60	0,13		0,00	0,00	
CAT	**PMG-98**	**A**	**08/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,40	1,00	2,00	78,60	0,21		0,00	0,00	
CAT	**PMG-98**	**B**	**08/04/2025**	0,00%	0,00%	0,20	21,20	1,00	3,00	78,60	0,18		0,00	0,00	
CAT	**PMG-160**	**A**	**08/04/2025**	0,00%	0,00%	0,20	21,10	1,00	3,00	78,70	0,15		0,00	0,00	
CAT	**PMG-160**	**B**	**08/04/2025**	0,00%	0,00%	3,30	17,40	1,00	2,00	79,30	0,24		0,00	0,00	
CAT	**PMG-161**	**A**	**08/04/2025**	0,00%	0,00%	1,50	19,40	1,00	3,00	79,10	0,08		0,00	0,00	
CAT	**PMG-161**	**B**	**08/04/2025**	0,00%	0,00%	3,90	17,60	2,00	3,00	78,50	0,16		0,00	0,00	
Incubadora	**PMG-88**	**A**	**11/04/2025**	0,00%	0,00%	0,30	20,50	2,00	0,00	79,20	0,00		0,00	0,00	
Incubadora	**PMG-88**	**B**	**11/04/2025**	0,00%	0,00%	0,30	20,50	2,00	0,00	79,20	-0,02		0,00	0,00	
Incubadora	**PMG-89**	**A**	**11/04/2025**	0,00%	0,00%	0,20	20,50	2,00	0,00	79,30	0,03		0,00	0,00	
Incubadora	**PMG-89**	**B**	**11/04/2025**	0,00%	0,00%	0,90	20,00	1,00	0,00	79,20	0,00		0,00	0,00	
Incubadora	**PMG-90**	**A**	**11/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	20,80	2,00	0,00	79,10	0,11		0,00	0,00	
Incubadora	**PMG-90**	**B**	**11/04/2025**	0,00%	0,00%	0,30	20,60	2,00	0,00	79,10	0,11		0,00	0,00	
Incubadora	**PMG-91**	**A**	**11/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	20,70	1,00	0,00	79,20	-4,37		0,00	0,00	
Incubadora	**PMG-91**	**B**	**11/04/2025**	0,00%	0,00%	1,80	18,90	1,00	0,00	79,30	-0,06		0,00	0,00	
Incubadora	**PMG-92**	**A**	**11/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	20,70	1,00	0,00	79,20	-0,07		0,00	0,00	
Incubadora	**PMG-92**	**B**	**11/04/2025**	0,00%	0,00%	1,00	19,80	1,00	0,00	79,20	0,10		0,00	0,00	
Incubadora	**PMG-93**	**A**	**11/04/2025**	0,00%	0,00%	0,20	20,60	2,00	0,00	79,20	-0,03		0,00	0,00	
Incubadora	**PMG-93**	**B**	**11/04/2025**	0,00%	0,00%	1,20	19,60	1,00	0,00	79,20	-0,03		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-102**		**07/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,40	1,00	1,00	78,50	0,03		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-103**		**07/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,30	2,00	1,00	78,60	0,11		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-104**		**07/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,40	1,00	2,00	78,50	0,18		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-105**		**07/04/2025**	0,00%	0,00%	1,10	20,40	1,00	1,00	78,50	0,05		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-106**		**07/04/2025**	0,00%	0,00%	0,20	21,30	1,00	1,00	78,60	0,01		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-107**		**07/04/2025**	0,00%	0,00%	2,30	17,60	2,00	1,00	80,10	0,05		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-108**		**07/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,30	1,00	2,00	78,70	0,08		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-109**	**A**	**07/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,50	2,00	1,00	78,40	0,08		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-109**	**B**	**07/04/2025**	0,00%	0,00%	0,40	21,20	2,00	1,00	78,40	0,01		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-110**	**A**	**07/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,40	1,00	1,00	78,60	0,08		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	C02 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H_2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
Ginásio Poliesportivo	**PMG-110**	**B**	**07/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,40	1,00	1,00	78,50	0,07		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-111**	**A**	**07/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,40	1,00	2,00	78,60	0,12		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-111**	**B**	**07/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,30	1,00	1,00	78,60	0,04		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-112**		**07/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,60	1,00	1,00	78,40	0,02		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-162**	**A**	**07/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,40	1,00	1,00	78,50	0,05		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-162**	**B**	**07/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,50	1,00	1,00	78,50	0,17		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-166**	**A**	**07/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,40	1,00	1,00	78,50	0,08		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-166**	**B**	**07/04/2025**	0,00%	0,00%	1,40	18,40	1,00	2,00	80,10	0,12		0,00	0,00	
Portaria P3	**PMG-119**	**A**	**07/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,60	1,00	1,00	78,40	0,09		0,00	0,00	
Portaria P3	**PMG-119**	**B**	**07/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,60	1,00	1,00	78,40	0,09		0,00	0,00	
Portaria P3	**PMG-119**	**C**	**07/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,60	1,00	1,00	78,30	0,03		0,00	0,00	
Portaria P3	**PMG-120**	**A**	**07/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,60	1,00	1,00	78,40	0,03		0,00	0,00	
Portaria P3	**PMG-120**	**B**	**07/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,60	1,00	1,00	78,40	-0,08		0,00	0,00	
Portaria P3	**PMG-120**	**C**	**07/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,60	2,00	1,00	78,30	0,03		0,00	0,00	
Portaria P3	**PMG-163**	**B**	**07/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,70	1,00	1,00	78,30	0,04		0,00	0,00	
Portaria P3	**PMG-164**	**B**	**07/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,60	1,00	1,00	78,40	0,11		0,00	0,00	
Portaria P3	**PMG-164**	**C**	**07/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,60	1,00	1,00	78,40	0,02		0,00	0,00	
Transportes	**PMG-121**	**A**	**09/04/2025**	0,00%	0,00%	0,40	20,80	0,00	2,00	78,90	0,02		0,00	0,00	
Transportes	**PMG-121**	**B**	**09/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,30	1,00	2,00	78,70	0,14		0,00	0,00	
Transportes	**PMG-122**	**A**	**09/04/2025**	0,00%	0,00%	0,20	21,20	1,00	2,00	78,60	0,10		0,00	0,00	
Transportes	**PMG-122**	**B**	**09/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,20	1,00	2,00	78,70	-0,02		0,00	0,00	
Transportes	**PMG-123**	**A**	**09/04/2025**	0,00%	0,00%	0,50	20,60	1,00	2,00	79,00	0,15		0,00	0,00	
Transportes	**PMG-123**	**B**	**09/04/2025**	0,00%	0,00%	1,70	19,30	1,00	2,00	79,00	0,16		0,00	0,00	
Transportes	**PMG-124**	**A**	**09/04/2025**	0,00%	0,00%	0,40	20,20	1,00	2,00	79,40	0,12		0,00	0,00	
Transportes	**PMG-124**	**B**	**09/04/2025**	0,00%	0,00%	2,10	19,40	2,00	2,00	78,50	0,06		0,00	0,00	
Transportes	**PMG-158**	**B**	**09/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,30	1,00	2,00	78,70	0,09		0,00	0,00	
Transportes	**PMG-159**	**B**	**09/04/2025**	0,00%	0,00%	1,20	19,50	1,00	2,00	79,30	0,15		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	**PMG-125**	**A**	**10/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	20,90	2,00	1,00	79,10	0,10		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	**PMG-125**	**B**	**10/04/2025**	0,00%	0,00%	4,40	16,80	1,00	1,00	78,70	0,02		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	**PMG-126**	**A**	**10/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	20,70	2,00	2,00	79,30	0,07		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	**PMG-126**	**B**	**10/04/2025**	0,00%	0,00%	3,10	17,90	1,00	1,00	79,00	0,06		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	**PMG-127**	**A**	**10/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	20,80	1,00	1,00	79,20	0,03		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	**PMG-127**	**B**	**10/04/2025**	0,00%	0,00%	2,80	18,40	1,00	1,00	78,80	0,11		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	**PMG-128**	**A**	**10/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	20,90	1,00	1,00	79,10	0,11		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	**PMG-128**	**B**	**10/04/2025**	0,00%	0,00%	4,70	16,90	1,00	1,00	78,40	-0,79		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	**PMG-129**	**A**	**10/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	20,70	1,00	1,00	79,20	0,10		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	**PMG-129**	**B**	**10/04/2025**	0,00%	0,00%	2,20	19,00	1,00	2,00	78,70	0,03		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	**PMG-130**	**A**	**10/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	20,70	1,00	1,00	79,20	0,12		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	**PMG-130**	**B**	**10/04/2025**	0,00%	0,00%	3,40	17,90	2,00	2,00	78,70	-0,22		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	**PMG-131**	**A**	**10/04/2025**	0,00%	0,00%	0,70	20,00	1,00	2,00	79,30	0,12		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	**PMG-131**	**B**	**10/04/2025**	0,00%	0,00%	1,10	19,70	1,00	2,00	79,20	0,05		0,00	0,00	
Edifício I 1	**PMG-16**	**A**	**15/04/2025**	0,00%	0,00%	1,80	19,50	1,00	1,00	78,70	0,09		0,00	0,00	
Edifício I 1	**PMG-16**	**B**	**15/04/2025**	0,00%	0,00%	2,50	18,50	1,00	2,00	79,00	0,06		0,00	0,00	
Edifício I 1	**PMG-17**	**A**	**15/04/2025**	0,00%	0,00%	0,50	20,70	1,00	1,00	78,80	0,08		0,00	0,00	
Edifício I 1	**PMG-17**	**B**	**15/04/2025**	0,00%	0,00%	1,20	19,90	1,00	1,00	78,90	0,18		0,00	0,00	
Edifício I 1	**PMG-18**	**A**	**15/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	20,70	2,00	0,00	79,20	-0,13		0,00	0,00	
Edifício I 1	**PMG-18**	**B**	**15/04/2025**	0,00%	0,00%	1,60	19,40	2,00	0,00	79,00	-0,01		0,00	0,00	
Edifício I 1	**PMG-20**	**A**	**15/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	20,90	1,00	0,00	79,00	0,11		0,00	0,00	
Edifício I 1	**PMG-20**	**B**	**15/04/2025**	0,00%	0,00%	0,20	20,70	1,00	1,00	79,10	0,04		0,00	0,00	
Edifício I 1	**PMG-22**	**A**	**15/04/2025**	0,00%	0,00%	0,20	21,30	1,00	1,00	78,50	0,08		0,00	0,00	
Edifício I 1	**PMG-22**	**B**	**15/04/2025**	0,00%	0,00%	3,30	17,70	2,00	1,00	78,90	0,03		0,00	0,00	
Edifício I 1	**PMG-23**	**A**	**15/04/2025**	0,00%	0,00%	0,40	20,50	1,00	0,00	79,20	0,04		0,00	0,00	
Edifício I 1	**PMG-23**	**B**	**15/04/2025**	0,00%	0,00%	1,20	19,60	1,00	0,00	79,20	0,04		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	C02 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H_2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
Edifício I 1	**PMG-113**	**A**	**15/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	20,70	2,00	0,00	79,20	-0,02		0,00	0,00	
Edifício I 1	**PMG-113**	**B**	**15/04/2025**	0,00%	0,00%	1,30	19,50	2,00	0,00	79,20	-0,05		0,00	0,00	
Edifício I 1	**PMG-114**	**A**	**15/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	20,90	1,00	0,00	79,10	-0,05		0,00	0,00	
Edifício I 1	**PMG-114**	**B**	**15/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	20,90	1,00	0,00	79,10	-0,02		0,00	0,00	
Edifício I 1	**PMG-115**	**A**	**15/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	20,80	2,00	1,00	79,10	0,02		0,00	0,00	
Edifício I 1	**PMG-115**	**B**	**15/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	20,90	2,00	0,00	79,10	-0,71		0,00	0,00	
Edifício I 1	**PMG-11**	**A**	**15/04/2025**	0,00%	0,00%	1,00	20,10	1,00	1,00	79,00	0,06		0,00	0,00	
Edifício I 1	**PMG-11**	**B**	**15/04/2025**	0,50%	0,50%	0,70	20,40	1,00	2,00	78,40	-0,25		0,00	**37,00**	
Edifício I 1	**PMG-12**	**A**	**16/04/2025**	0,00%	0,00%	3,40	17,90	1,00	1,00	78,80	0,05		0,00	0,00	
Edifício I 1	**PMG-12**	**B**	**16/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,30	2,00	2,00	78,60	0,02		0,00	0,00	
Edifício I 1	**PMG-13**	**A**	**15/04/2025**	0,00%	0,00%	1,10	20,30	1,00	1,00	78,70	0,08		0,00	0,00	
Edifício I 1	**PMG-13**	**B**	**15/04/2025**	0,00%	0,00%	1,40	19,70	1,00	1,00	78,90	0,18		0,00	0,00	
Edifício I 1	**PMG-14**	**A**	**15/04/2025**	0,00%	0,00%	2,40	18,90	1,00	1,00	78,70	0,10		0,00	0,00	
Edifício I 1	**PMG-14**	**B**	**15/04/2025**	0,00%	0,00%	3,30	17,70	2,00	1,00	79,00	0,06		0,00	0,00	
Edifício I 1	**PMG-15**	**A**	**15/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,30	1,00	2,00	78,70	0,07		0,00	0,00	
Edifício I 1	**PMG-15**	**B**	**15/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,40	1,00	1,00	78,60	0,12		0,00	0,00	
Edifício I 1	**PMG-19**	**A**	**15/04/2025**	0,00%	0,00%	0,40	20,90	1,00	1,00	78,70	0,08		0,00	0,00	
Edifício I 1	**PMG-19**	**B**	**15/04/2025**	0,00%	0,00%	0,60	20,60	1,00	2,00	78,80	0,07		0,00	0,00	
Edifício I 1	**PMG-21**	**A**	**15/04/2025**	0,00%	0,00%	0,80	20,40	2,00	1,00	78,80	0,08		0,00	0,00	
Edifício I 1	**PMG-21**	**B**	**15/04/2025**	0,00%	0,00%	1,30	19,90	1,00	1,00	78,80	0,09		0,00	0,00	
Edifício I 1	**PMG-24**	**A**	**15/04/2025**	0,00%	0,00%	0,30	21,00	1,00	2,00	78,70	0,12		0,00	0,00	
Edifício I 1	**PMG-24**	**B**	**15/04/2025**	0,00%	0,00%	0,40	20,80	1,00	2,00	78,70	0,07		0,00	0,00	
Edifício I 1	**PMG-135**	**A**	**15/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	20,90	1,00	0,00	79,10	0,01		0,00	0,00	
Edifício I 1	**PMG -135**	**B**	**15/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	20,90	2,00	0,00	79,10	-0,03		0,00	0,00	
Edifício I 1	**PMG-136**	**B**	**15/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	20,80	2,00	1,00	79,10	-0,08		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	**PMG-25**	**A**	**14/04/2025**	0,00%	0,00%	0,20	20,80	2,00	1,00	79,00	0,03		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	**PMG-25**	**B**	**14/04/2025**	0,00%	0,00%	1,20	19,90	1,00	1,00	78,90	-0,16		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	**PMG-26**	**A**	**14/04/2025**	0,00%	0,00%	0,30	20,70	1,00	1,00	79,00	0,06		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	**PMG-26**	**B**	**14/04/2025**	0,00%	0,00%	1,10	19,90	1,00	1,00	79,00	0,12		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	**PMG-27**	**A**	**14/04/2025**	0,00%	0,00%	1,30	19,20	1,00	0,00	79,50	0,08		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	**PMG-27**	**B**	**14/04/2025**	0,00%	0,00%	2,40	18,10	2,00	1,00	79,50	0,09		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	**PMG-28**	**A**	**14/04/2025**	0,00%	0,00%	1,10	19,00	2,00	1,00	79,80	0,11		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	**PMG-28**	**B**	**14/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,00	2,00	1,00	79,00	0,07		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	**PMG-29**	**A**	**14/04/2025**	0,00%	0,00%	0,20	20,90	1,00	1,00	78,90	0,08		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	**PMG-29**	**B**	**14/04/2025**	0,00%	0,00%	0,60	20,40	1,00	1,00	78,90	0,13		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	**PMG-44**	**A**	**14/04/2025**	0,00%	0,00%	0,50	20,40	2,00	1,00	79,10	0,12		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	**PMG-44**	**B**	**14/04/2025**	0,00%	0,00%	0,60	20,10	1,00	1,00	79,20	0,03		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	**PMG-45**	**A**	**14/04/2025**	0,00%	0,00%	0,50	20,00	1,00	1,00	79,60	0,08		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	**PMG-45**	**B**	**14/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,10	1,00	1,00	78,90	0,13		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	**PMG-134**	**B**	**14/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,10	1,00	1,00	78,80	0,20		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-30**	**A**	**14/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	20,60	2,00	0,00	79,30	-0,06		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-30**	**B**	**14/04/2025**	0,00%	0,00%	0,90	20,00	1,00	0,00	79,10	0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-31**	**A**	**14/04/2025**	0,00%	0,00%	0,20	20,60	1,00	0,00	79,20	-0,01		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-31**	**B**	**14/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	20,70	1,00	0,00	79,20	-0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-32**	**A**	**17/04/2025**	0,00%	0,00%	0,20	20,30	3,00	0,00	79,60	0,00		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-32**	**B**	**17/04/2025**	0,00%	0,00%	0,90	19,70	3,00	0,00	79,40	0,00		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-33**	**A**	**14/04/2025**	0,00%	0,00%	0,20	20,70	1,00	0,00	79,10	-0,05		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-33**	**B**	**14/04/2025**	0,00%	0,00%	3,60	17,40	1,00	0,00	79,00	-0,02		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-34**	**A**	**14/04/2025**	0,00%	0,00%	0,20	20,60	1,00	0,00	79,20	0,11		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-34**	**B**	**14/04/2025**	0,00%	0,00%	0,80	20,10	1,00	0,00	79,00	0,01		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-35**	**A**	**14/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	20,90	1,00	1,00	79,00	0,09		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-35**	**B**	**14/04/2025**	0,00%	0,00%	1,20	20,00	1,00	1,00	78,90	0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-36**	**A**	**14/04/2025**	0,00%	0,00%	2,60	18,40	1,00	0,00	79,00	0,08		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	C02 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H_2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
I-3 Biblioteca	PMG-36	B	14/04/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,70	1,00	1,00	79,20	0,04		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-37	A	14/04/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,90	2,00	1,00	79,00	0,04		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-37	B	14/04/2025	0,00%	0,00%	0,90	20,20	1,00	0,00	78,90	0,13		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-38	A	14/04/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,70	1,00	1,00	79,00	0,07		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-38	B	14/04/2025	0,00%	0,00%	0,30	20,60	2,00	1,00	79,10	-0,02		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-39	A	14/04/2025	0,00%	0,00%	0,30	20,60	1,00	0,00	79,10	0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-39	B	14/04/2025	0,00%	0,00%	5,40	15,70	1,00	0,00	78,90	0,05		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-40	A	14/04/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,90	1,00	0,00	79,00	0,04		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-40	B	14/04/2025	0,00%	0,00%	0,30	20,60	1,00	0,00	79,10	0,10		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-41	A	14/04/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,60	2,00	0,00	79,30	-0,02		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-41	B	14/04/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,60	1,00	0,00	79,20	-0,11		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-42	A	14/04/2025	0,00%	0,00%	0,80	20,00	1,00	0,00	79,20	0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-42	B	14/04/2025	0,00%	0,00%	3,10	18,30	2,00	0,00	78,60	0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-43	A	14/04/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,30	1,00	0,00	79,50	-0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-43	B	14/04/2025	0,00%	0,00%	0,50	20,30	1,00	0,00	79,20	-0,54		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-132	A	14/04/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,60	1,00	0,00	79,20	0,00		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-132	B	14/04/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,60	2,00	0,00	79,30	-0,04		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-133	A	14/04/2025	0,00%	0,00%	0,40	20,30	1,00	0,00	79,30	0,07		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-133	B	14/04/2025	0,00%	0,00%	0,50	20,50	1,00	0,00	79,00	-0,04		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-63	A	16/04/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,30	5,00	1,00	78,70	0,13		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-63	B	16/04/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,30	5,00	1,00	78,50	0,10		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-64	A	16/04/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,40	6,00	1,00	78,60	0,11		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-64	B	16/04/2025	0,00%	0,00%	0,70	20,50	6,00	1,00	78,80	0,04		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-65	A	16/04/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,40	13,00	1,00	78,60	0,08		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-65	B	16/04/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,40	12,00	1,00	78,60	-0,02		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-66	A	16/04/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,30	8,00	1,00	78,60	0,15		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-66	B	16/04/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,40	8,00	1,00	78,60	0,08		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-67	A	16/04/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,30	1,00	1,00	78,60	-0,29		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-67	B	16/04/2025	0,00%	0,00%	0,50	21,00	1,00	1,00	78,60	-0,03		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-68	A	17/04/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,20	1,00	2,00	78,70	0,18		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-68	B	17/04/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	1,00	2,00	78,70	0,17		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-69	A	16/04/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,40	16,00	1,00	78,60	-0,06		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-69	B	16/04/2025	0,00%	0,00%	1,10	20,40	15,00	1,00	78,50	0,00		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-77	A	16/04/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,30	1,00	1,00	78,70	0,07		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-77	B	16/04/2025	0,00%	0,00%	0,30	21,10	1,00	1,00	78,60	0,01		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-78	A	16/04/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,30	1,00	2,00	78,60	0,17		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-78	B	16/04/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	1,00	1,00	78,60	0,10		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-79	A	16/04/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,20	2,00	1,00	78,70	0,09		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-79	B	16/04/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	1,00	1,00	78,70	0,15		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-80	A	16/04/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,40	8,00	1,00	78,60	0,07		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-80	B	16/04/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,40	18,00	1,00	78,50	0,08		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-81	A	16/04/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	1,00	1,00	78,60	0,11		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-81	B	16/04/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	1,00	1,00	78,60	0,04		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-144	B	16/04/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	1,00	2,00	78,60	0,10		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-145	B	16/04/2025	0,00%	0,00%	0,30	20,60	1,00	2,00	79,10	0,06		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-146	B	16/04/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	1,00	1,00	78,60	0,06		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-147	B	16/04/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,20	1,00	2,00	78,70	0,08		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-148	B	16/04/2025	0,00%	0,00%	1,20	20,30	6,00	1,00	78,60	-0,12		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-149	B	16/04/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,40	9,00	1,00	78,60	0,08		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-150	B	16/04/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,30	11,00	2,00	78,60	0,14		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-151	B	17/04/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,20	2,00	2,00	78,80	0,17		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-46	A	16/04/2025	0,00%	0,00%	0,40	20,90	1,00	1,00	78,70	0,09		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-46	B	16/04/2025	0,00%	0,00%	3,00	18,20	1,00	2,00	78,90	0,02		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	C02 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H_2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
Conjunto Laboratorial	**PMG-47**	**A**	**16/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,10	1,00	1,00	78,80	0,11		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-47**	**B**	**16/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,30	1,00	1,00	78,60	0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-48**	**A**	**16/04/2025**	0,00%	0,00%	0,20	21,10	1,00	2,00	78,70	0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-48**	**B**	**16/04/2025**	0,00%	0,00%	0,40	20,90	1,00	2,00	78,70	0,06		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-49**	**A**	**16/04/2025**	0,00%	0,00%	0,20	21,20	1,00	1,00	78,60	0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-49**	**B**	**16/04/2025**	0,00%	0,00%	1,80	19,50	1,00	2,00	78,70	0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-50**	**A**	**16/04/2025**	0,00%	0,00%	0,30	21,10	1,00	1,00	78,60	0,09		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-50**	**B**	**16/04/2025**	0,00%	0,00%	2,70	19,10	1,00	1,00	78,20	0,10		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-51**	**A**	**16/04/2025**	0,00%	0,00%	0,20	20,90	1,00	1,00	78,90	0,05		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-51**	**B**	**16/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,10	1,00	1,00	78,90	0,11		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-52**	**A**	**16/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,10	1,00	0,00	78,90	0,04		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-52**	**B**	**16/04/2025**	0,00%	0,00%	0,20	21,00	1,00	0,00	78,90	0,09		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-53**	**A**	**16/04/2025**	0,00%	0,00%	0,40	20,40	2,00	1,00	79,20	0,01		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-53**	**B**	**16/04/2025**	0,00%	0,00%	0,20	20,70	2,00	0,00	79,00	0,00		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-54**	**A**	**16/04/2025**	0,00%	0,00%	0,30	20,50	2,00	0,00	79,20	0,02		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-54**	**B**	**16/04/2025**	0,00%	0,00%	3,40	15,80	2,00	0,00	80,80	-0,01		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-55**	**A**	**16/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,10	2,00	1,00	78,80	0,04		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-55**	**B**	**16/04/2025**	0,00%	0,00%	4,20	16,30	2,00	0,00	79,50	-0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-56**	**A**	**16/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	20,30	2,00	1,00	79,50	0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-56**	**B**	**16/04/2025**	0,00%	0,00%	1,10	20,40	1,00	1,00	78,60	-0,04		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-57**	**A**	**16/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,30	1,00	1,00	78,50	0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-57**	**B**	**16/04/2025**	0,00%	0,00%	1,70	20,00	2,00	1,00	78,30	0,05		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-58**	**A**	**16/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,10	2,00	1,00	78,80	0,05		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-58**	**B**	**16/04/2025**	0,00%	0,00%	2,50	18,30	1,00	1,00	79,20	0,02		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-59**	**A**	**16/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	20,90	2,00	1,00	79,00	0,00		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-59**	**B**	**16/04/2025**	0,00%	0,00%	1,30	19,40	1,00	1,00	79,30	0,06		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-60**	**A**	**16/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	20,90	1,00	1,00	79,00	0,05		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-60**	**B**	**16/04/2025**	0,00%	0,00%	2,70	18,10	2,00	1,00	79,20	0,07		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-61**	**A**	**16/04/2025**	0,00%	0,00%	0,20	20,70	2,00	1,00	79,00	0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-61**	**B**	**16/04/2025**	0,00%	0,00%	6,80	12,70	2,00	1,00	80,50	0,05		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-137**	**B**	**16/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,40	2,00	1,00	78,60	0,10		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-138**	**B**	**16/04/2025**	0,00%	0,00%	2,60	19,20	1,00	1,00	78,30	0,11		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-139**	**A**	**16/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,00	1,00	0,00	78,90	0,06		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-139**	**B**	**16/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,00	1,00	0,00	78,90	0,06		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-140**	**A**	**16/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,00	1,00	0,00	78,90	0,13		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-140**	**B**	**16/04/2025**	0,10%	0,10%	0,10	20,80	1,00	0,00	79,00	0,04		0,00	**9,00**	
Conjunto Laboratorial	**PMG-141**	**B**	**16/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,10	1,00	0,00	78,90	0,14		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-62**	**A**	**16/04/2025**	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	Não medido. Sala sendo reformada.
Conjunto Laboratorial	**PMG-62**	**B**	**16/04/2025**	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	Não medido. Sala sendo reformada.
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-01**	**A**	**15/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,30	1,00	1,00	78,60	0,08		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-01**	**B**	**15/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,40	1,00	2,00	78,60	-0,01		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-02**	**A**	**15/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,40	1,00	1,00	78,50	0,11		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-02**	**B**	**15/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,40	2,00	1,00	78,50	0,08		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-03**	**A**	**15/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,40	1,00	1,00	78,60	0,08		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-03**	**B**	**15/04/2025**	0,00%	0,00%	1,30	20,00	1,00	1,00	78,70	0,05		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-04**	**A**	**15/04/2025**	0,00%	0,00%	0,40	21,20	1,00	1,00	78,40	0,07		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-04**	**B**	**15/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,40	2,00	1,00	78,60	0,08		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-05**	**A**	**15/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,30	2,00	1,00	78,60	0,08		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-05**	**B**	**15/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,30	2,00	1,00	78,70	0,08		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-06**	**A**	**17/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	20,80	2,00	1,00	79,20	0,04		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-06**	**B**	**17/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	20,80	2,00	0,00	79,10	0,02		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-07**	**A**	**15/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,30	1,00	1,00	78,60	0,18		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-07**	**B**	**15/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,30	1,00	1,00	78,60	-0,02		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	C02 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H_2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-08**	**A**	**15/04/2025**	0,00%	0,00%	0,20	21,00	2,00	1,00	78,70	0,06		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-08**	**B**	**15/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,20	2,00	1,00	78,70	0,06		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-09**	**A**	**15/04/2025**	0,00%	0,00%	1,60	19,30	2,00	1,00	79,10	0,13		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-09**	**B**	**15/04/2025**	0,00%	0,00%	7,90	12,70	2,00	1,00	79,40	0,00		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-10**	**A**	**15/04/2025**	0,00%	0,00%	0,60	20,10	1,00	1,00	79,30	0,07		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-10**	**B**	**15/04/2025**	0,00%	0,00%	0,70	20,40	1,00	1,00	78,90	0,09		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-84**	**A**	**15/04/2025**	0,00%	0,00%	0,20	20,80	1,00	1,00	79,00	0,05		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-84**	**B**	**15/04/2025**	0,00%	0,00%	3,70	18,00	1,00	0,00	78,30	-0,09		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-85**	**A**	**15/04/2025**	0,00%	0,00%	1,70	19,00	1,00	1,00	79,30	0,06		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-85**	**B**	**15/04/2025**	0,00%	0,00%	2,60	17,80	1,00	1,00	79,60	0,32		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-86**	**A**	**15/04/2025**	0,00%	0,00%	0,40	20,70	1,00	0,00	79,00	0,06		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-86**	**B**	**15/04/2025**	0,00%	0,00%	1,20	19,90	1,00	1,00	78,90	0,13		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-87**	**A**	**15/04/2025**	0,00%	0,00%	3,00	16,20	2,00	1,00	80,80	0,03		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-87**	**B**	**15/04/2025**	0,00%	0,00%	2,40	17,60	1,00	1,00	79,90	0,00		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-152**	**A**	**15/04/2025**	0,00%	0,00%	0,50	20,60	1,00	1,00	78,90	0,09		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-152**	**B**	**15/04/2025**	0,00%	0,00%	4,20	16,60	1,00	1,00	79,20	0,19		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-153**	**B**	**15/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,40	1,00	1,00	78,60	-0,03		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-154**	**B**	**15/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,40	1,00	1,00	78,60	0,08		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-155**	**B**	**15/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,30	1,00	1,00	78,70	0,00		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-156**	**B**	**15/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,30	1,00	1,00	78,60	0,18		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-157**	**B**	**17/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	20,70	3,00	0,00	79,20	0,08		0,00	0,00	
Enfermaria	**PMG-70**	**A**	**17/04/2025**	0,00%	0,00%	0,20	20,60	1,00	2,00	79,20	0,10		0,00	0,00	
Enfermaria	**PMG-70**	**B**	**17/04/2025**	0,00%	0,00%	0,20	20,80	2,00	2,00	79,10	0,11		0,00	0,00	
Enfermaria	**PMG-71**	**A**	**17/04/2025**	0,00%	0,00%	0,20	20,60	2,00	1,00	79,20	0,13		0,00	0,00	
Enfermaria	**PMG-71**	**B**	**17/04/2025**	0,00%	0,00%	0,30	17,60	1,00	2,00	82,10	0,05		0,00	0,00	
Enfermaria	**PMG-72**	**A**	**17/04/2025**	0,00%	0,00%	0,40	20,10	1,00	2,00	79,40	0,13		0,00	0,00	
Enfermaria	**PMG-72**	**B**	**17/04/2025**	0,00%	0,00%	1,30	19,20	2,00	2,00	79,40	0,13		0,00	0,00	
Enfermaria	**PMG-73**	**A**	**17/04/2025**	0,00%	0,00%	0,20	20,90	2,00	2,00	79,00	0,10		0,00	0,00	
Enfermaria	**PMG-73**	**B**	**17/04/2025**	0,00%	0,00%	0,70	20,40	1,00	1,00	78,90	0,08		0,00	0,00	
Enfermaria	**PMG-74**	**A**	**17/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,10	2,00	2,00	78,90	-0,24		0,00	0,00	
Enfermaria	**PMG-74**	**B**	**17/04/2025**	0,00%	0,00%	0,70	17,20	1,00	1,00	82,10	0,16		0,00	0,00	
Enfermaria	**PMG-75**	**A**	**17/04/2025**	0,00%	0,00%	0,20	20,40	2,00	2,00	79,30	0,13		0,00	0,00	
Enfermaria	**PMG-75**	**B**	**17/04/2025**	0,00%	0,00%	2,20	16,30	2,00	2,00	81,50	0,19		0,00	0,00	
Enfermaria	**PMG-76**	**A**	**17/04/2025**	0,00%	0,00%	0,50	20,30	1,00	2,00	79,20	-0,23		0,00	0,00	
Enfermaria	**PMG-76**	**B**	**17/04/2025**	0,00%	0,00%	2,20	16,00	2,00	1,00	81,80	0,16		0,00	0,00	
Enfermaria	**PMG-165**	**A**	**17/04/2025**	0,00%	0,00%	0,50	19,20	1,00	2,00	80,40	0,13		0,00	0,00	
Enfermaria	**PMG-165**	**B**	**17/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,00	2,00	2,00	79,00	0,12		0,00	0,00	
CAT	**PMG-82**	**A**	**17/04/2025**	0,00%	0,00%	1,40	19,40	2,00	1,00	79,20	0,07		0,00	0,00	
CAT	**PMG-82**	**B**	**17/04/2025**	0,00%	0,00%	5,20	15,70	2,00	1,00	79,10	0,06		0,00	0,00	
CAT	**PMG-83**	**A**	**17/04/2025**	0,00%	0,00%	3,10	18,00	2,00	1,00	78,90	0,12		0,00	0,00	
CAT	**PMG-83**	**B**	**17/04/2025**	0,00%	0,00%	4,20	16,30	2,00	1,00	79,40	0,11		0,00	0,00	
CAT	**PMG-94**	**A**	**17/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	20,60	2,00	1,00	79,30	0,00		0,00	0,00	
CAT	**PMG-94**	**B**	**17/04/2025**	0,00%	0,00%	4,70	16,10	2,00	1,00	79,30	0,06		0,00	0,00	
CAT	**PMG-95**	**A**	**17/04/2025**	0,00%	0,00%	1,00	20,10	1,00	1,00	79,00	0,03		0,00	0,00	
CAT	**PMG-95**	**B**	**17/04/2025**	0,00%	0,00%	1,90	19,50	2,00	1,00	78,60	0,04		0,00	0,00	
CAT	**PMG-96**	**A**	**17/04/2025**	0,00%	0,00%	0,20	20,80	1,00	1,00	79,00	0,10		0,00	0,00	
CAT	**PMG-96**	**B**	**17/04/2025**	0,00%	0,00%	3,50	15,70	2,00	1,00	80,90	0,08		0,00	0,00	
CAT	**PMG-97**	**A**	**17/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	20,70	2,00	1,00	79,20	0,11		0,00	0,00	
CAT	**PMG-97**	**B**	**17/04/2025**	0,00%	0,00%	3,20	16,80	1,00	1,00	80,00	0,13		0,00	0,00	
CAT	**PMG-98**	**A**	**17/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	20,80	1,00	1,00	79,10	0,11		0,00	0,00	
CAT	**PMG-98**	**B**	**17/04/2025**	0,00%	0,00%	0,30	20,80	1,00	2,00	79,00	0,04		0,00	0,00	
CAT	**PMG-160**	**A**	**17/04/2025**	0,00%	0,00%	0,20	20,70	2,00	1,00	79,20	0,04		0,00	0,00	
CAT	**PMG-160**	**B**	**17/04/2025**	0,00%	0,00%	3,30	17,40	2,00	1,00	79,30	0,02		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	C02 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H_2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
CAT	PMG-161	A	17/04/2025	0,00%	0,00%	1,80	18,90	1,00	1,00	79,30	0,10		0,00	0,00	
CAT	PMG-161	B	17/04/2025	0,00%	0,00%	1,70	19,40	1,00	1,00	79,00	0,07		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-88	A	17/04/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,30	2,00	2,00	78,50	0,07		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-88	B	17/04/2025	0,00%	0,00%	0,30	21,20	2,00	1,00	78,50	0,02		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-89	A	17/04/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,60	2,00	0,00	78,40	-0,05		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-89	B	17/04/2025	0,00%	0,00%	0,70	21,00	2,00	1,00	78,30	-0,03		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-90	A	17/04/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,50	1,00	2,00	78,50	0,08		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-90	B	17/04/2025	0,00%	0,00%	0,50	21,00	2,00	1,00	78,50	0,06		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-91	A	17/04/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,40	2,00	1,00	78,50	0,08		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-91	B	17/04/2025	0,00%	0,00%	1,40	19,90	1,00	1,00	78,70	0,04		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-92	A	17/04/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,40	1,00	1,00	78,60	0,12		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-92	B	17/04/2025	0,00%	0,00%	0,80	20,70	1,00	1,00	78,50	0,03		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-93	A	17/04/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,20	2,00	1,00	78,70	0,10		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-93	B	17/04/2025	0,00%	0,00%	1,10	20,00	1,00	1,00	78,80	0,15		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-102		14/04/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	1,00	1,00	78,70	0,08		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-103		14/04/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,10	1,00	2,00	78,80	0,05		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-104		14/04/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,10	1,00	1,00	78,70	0,05		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-105		14/04/2025	0,00%	0,00%	0,90	20,40	1,00	1,00	78,70	0,08		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-106		14/04/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,70	1,00	1,00	79,00	-0,18		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-107		14/04/2025	0,00%	0,00%	2,90	16,60	1,00	1,00	80,50	0,08		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-108		14/04/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,00	1,00	1,00	79,00	0,08		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-109	A	14/04/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,20	1,00	1,00	78,70	0,06		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-109	B	14/04/2025	0,00%	0,00%	1,40	19,80	1,00	1,00	78,80	-0,36		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-110	A	14/04/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,20	1,00	2,00	78,70	0,07		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-110	B	14/04/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	1,00	1,00	78,70	0,08		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-111	A	14/04/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	1,00	2,00	78,70	0,01		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-111	B	14/04/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,10	1,00	1,00	78,80	0,06		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-112		14/04/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	1,00	1,00	78,70	0,07		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-162	A	14/04/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,20	1,00	1,00	78,70	0,09		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-162	B	14/04/2025	0,00%	0,00%	5,30	14,10	2,00	1,00	80,60	0,12		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-166	A	14/04/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	1,00	1,00	78,70	0,08		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-166	B	14/04/2025	0,00%	0,00%	1,40	18,40	1,00	1,00	80,20	0,13		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-119	A	14/04/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,40	2,00	1,00	78,50	0,06		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-119	B	14/04/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,40	2,00	1,00	78,50	0,12		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-119	C	14/04/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,40	1,00	1,00	78,60	0,08		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-120	A	14/04/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,30	1,00	1,00	78,70	0,08		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-120	B	14/04/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,30	1,00	1,00	78,70	0,03		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-120	C	14/04/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,30	2,00	1,00	78,70	0,03		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-163	B	14/04/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,40	2,00	1,00	78,60	0,00		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-164	B	14/04/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,30	2,00	2,00	78,60	0,03		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-164	C	14/04/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	1,00	1,00	78,70	0,03		0,00	0,00	
Transportes	PMG-121	A	16/04/2025	0,00%	0,00%	0,40	20,90	4,00	2,00	78,70	0,13		0,00	0,00	
Transportes	PMG-121	B	16/04/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	3,00	2,00	78,60	-0,02		0,00	0,00	
Transportes	PMG-122	A	16/04/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,20	3,00	2,00	78,60	0,11		0,00	0,00	
Transportes	PMG-122	B	16/04/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	3,00	2,00	78,60	0,10		0,00	0,00	
Transportes	PMG-123	A	16/04/2025	0,00%	0,00%	0,80	20,60	2,00	1,00	78,70	0,00		0,00	0,00	
Transportes	PMG-123	B	16/04/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,30	3,00	2,00	78,60	0,03		0,00	0,00	
Transportes	PMG-124	A	16/04/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,30	2,00	2,00	78,50	-0,03		0,00	0,00	
Transportes	PMG-124	B	16/04/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,40	2,00	2,00	78,60	-0,18		0,00	0,00	
Transportes	PMG-158	B	16/04/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,40	3,00	2,00	78,60	0,17		0,00	0,00	
Transportes	PMG-159	B	16/04/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,40	3,00	1,00	78,60	0,08		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-125	A	17/04/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,20	2,00	2,00	78,70	0,16		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-125	B	17/04/2025	0,00%	0,00%	4,00	18,10	2,00	2,00	77,90	0,06		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	C02 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H_2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
Posto Guarda Universitário	**PMG-126**	**A**	**17/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,10	1,00	2,00	78,80	0,18		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	**PMG-126**	**B**	**17/04/2025**	0,00%	0,00%	3,00	18,70	1,00	2,00	78,30	0,14		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	**PMG-127**	**A**	**17/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,30	1,00	2,00	78,70	0,18		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	**PMG-127**	**B**	**17/04/2025**	0,00%	0,00%	2,60	19,20	1,00	2,00	78,20	0,14		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	**PMG-128**	**A**	**17/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,30	1,00	2,00	78,70	0,16		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	**PMG-128**	**B**	**17/04/2025**	0,00%	0,00%	4,30	17,90	1,00	2,00	77,80	0,13		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	**PMG-129**	**A**	**17/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,10	1,00	2,00	78,90	0,17		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	**PMG-129**	**B**	**17/04/2025**	0,00%	0,00%	1,00	20,40	2,00	3,00	78,50	0,13		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	**PMG-130**	**A**	**17/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,20	1,00	2,00	78,70	0,18		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	**PMG-130**	**B**	**17/04/2025**	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	Não medido. Agua durante a medição.
Posto Guarda Universitário	**PMG-131**	**A**	**17/04/2025**	0,00%	0,00%	0,30	20,80	1,00	3,00	78,90	0,20		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	**PMG-131**	**B**	**17/04/2025**	0,00%	0,00%	1,10	20,30	1,00	2,00	78,60	0,10		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-16**	**A**	**23/04/2025**	0,00%	0,00%	2,20	19,30	1,00	1,00	78,50	0,08		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-16**	**B**	**23/04/2025**	0,00%	0,00%	2,70	18,80	1,00	1,00	78,60	0,13		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-17**	**A**	**23/04/2025**	0,00%	0,00%	0,50	20,90	1,00	1,00	78,50	0,07		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-17**	**B**	**23/04/2025**	0,00%	0,00%	1,50	19,90	1,00	1,00	78,50	0,08		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-18**	**A**	**23/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,30	2,00	0,00	78,60	-0,06		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-18**	**B**	**23/04/2025**	0,00%	0,00%	1,50	20,10	2,00	0,00	78,40	0,01		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-20**	**A**	**23/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,20	1,00	0,00	78,70	0,04		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-20**	**B**	**23/04/2025**	0,00%	0,00%	0,20	21,10	1,00	0,00	78,70	0,04		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-22**	**A**	**23/04/2025**	0,00%	0,00%	0,20	21,50	1,00	2,00	78,40	0,11		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-22**	**B**	**23/04/2025**	0,00%	0,00%	2,10	19,30	2,00	2,00	78,60	0,12		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-23**	**A**	**23/04/2025**	0,00%	0,00%	0,30	21,10	1,00	0,00	78,70	0,03		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-23**	**B**	**23/04/2025**	0,00%	0,00%	1,20	20,00	1,00	0,00	78,80	0,06		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-113**	**A**	**23/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,30	2,00	0,00	78,60	0,02		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-113**	**B**	**23/04/2025**	0,00%	0,00%	1,90	19,40	2,00	0,00	78,70	-0,45		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-114**	**A**	**23/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,30	1,00	0,00	78,60	-0,03		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-114**	**B**	**23/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,30	1,00	0,00	78,60	0,06		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-115**	**A**	**23/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,10	2,00	0,00	78,80	0,08		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-115**	**B**	**23/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,30	2,00	0,00	78,60	-0,25		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-11**	**A**	**23/04/2025**	0,00%	0,00%	1,00	20,70	2,00	2,00	78,30	0,07		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-11**	**B**	**23/04/2025**	0,50%	0,50%	0,60	20,90	2,00	2,00	77,90	-0,03		0,00	**31,00**	
Edificio I 1	**PMG-12**	**A**	**23/04/2025**	0,00%	0,00%	2,40	19,00	1,00	1,00	78,60	0,02		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-12**	**B**	**23/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,50	1,00	1,00	78,40	0,03		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-13**	**A**	**23/04/2025**	0,00%	0,00%	1,20	20,30	1,00	0,00	78,50	0,09		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-13**	**B**	**23/04/2025**	0,00%	0,00%	1,70	19,30	1,00	1,00	78,90	0,06		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-14**	**A**	**23/04/2025**	0,00%	0,00%	1,80	19,50	2,00	2,00	78,70	0,13		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-14**	**B**	**23/04/2025**	0,00%	0,00%	3,20	17,90	1,00	2,00	79,00	0,03		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-15**	**A**	**23/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,50	1,00	1,00	78,40	-0,03		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-15**	**B**	**23/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,60	1,00	1,00	78,30	0,04		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-19**	**A**	**23/04/2025**	0,00%	0,00%	0,30	21,50	2,00	2,00	78,20	0,11		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-19**	**B**	**23/04/2025**	0,00%	0,00%	0,50	21,10	2,00	2,00	78,40	0,20		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-21**	**A**	**23/04/2025**	0,00%	0,00%	0,70	20,90	2,00	2,00	78,40	0,16		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-21**	**B**	**23/04/2025**	0,00%	0,00%	1,30	20,10	1,00	2,00	78,60	0,08		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-24**	**A**	**23/04/2025**	0,00%	0,00%	0,30	21,10	3,00	0,00	78,60	-0,12		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-24**	**B**	**23/04/2025**	0,00%	0,00%	0,20	21,20	3,00	0,00	78,60	-0,09		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-135**	**A**	**23/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,30	1,00	0,00	78,60	0,01		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG -135**	**B**	**23/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,30	1,00	0,00	78,60	-0,01		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-136**	**B**	**23/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,20	1,00	0,00	78,70	0,01		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	**PMG-25**	**A**	**22/04/2025**	0,00%	0,00%	0,20	21,40	2,00	1,00	78,40	0,08		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	**PMG-25**	**B**	**22/04/2025**	0,00%	0,00%	0,90	20,60	1,00	0,00	78,50	0,08		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	**PMG-26**	**A**	**22/04/2025**	0,00%	0,00%	0,30	21,20	2,00	1,00	78,50	0,10		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	**PMG-26**	**B**	**22/04/2025**	0,00%	0,00%	1,10	20,30	1,00	1,00	78,60	0,08		0,00	0,00	

EngeSolve
SOLUÇÕES AMBIENTAIS INTEGRADAS

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	C02 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H_2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
I-5 Auditórios	PMG-27	A	22/04/2025	0,00%	0,00%	1,10	20,50	1,00	1,00	78,40	0,06		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-27	B	22/04/2025	0,00%	0,00%	3,30	18,00	1,00	1,00	78,70	0,03		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-28	A	22/04/2025	0,00%	0,00%	1,10	19,50	1,00	1,00	79,40	0,07		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-28	B	22/04/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,50	1,00	1,00	78,40	0,12		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-29	A	22/04/2025	0,00%	0,00%	0,40	21,30	1,00	1,00	78,40	0,09		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-29	B	22/04/2025	0,00%	0,00%	0,90	20,70	1,00	1,00	78,40	0,00		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-44	A	22/04/2025	0,00%	0,00%	0,30	21,40	2,00	1,00	78,30	0,05		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-44	B	22/04/2025	0,00%	0,00%	0,70	21,20	1,00	1,00	78,20	0,01		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-45	A	22/04/2025	0,00%	0,00%	0,40	20,70	1,00	1,00	78,90	0,04		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-45	B	22/04/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,70	1,00	1,00	78,30	-0,43		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-134	B	22/04/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,70	2,00	2,00	78,30	-0,16		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-30	A	22/04/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,60	1,00	0,00	79,20	0,00		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-30	B	22/04/2025	0,00%	0,00%	0,50	20,20	2,00	0,00	79,20	-0,08		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-31	A	22/04/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,10	2,00	0,00	79,60	-0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-31	B	22/04/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,50	2,00	0,00	79,40	-0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-32	A	22/04/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,10	2,00	1,00	78,70	0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-32	B	22/04/2025	0,00%	0,00%	0,60	20,70	1,00	0,00	78,60	0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-33	A	22/04/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,20	1,00	0,00	78,70	0,09		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-33	B	22/04/2025	0,00%	0,00%	2,70	18,60	2,00	0,00	78,70	0,02		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-34	A	22/04/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,20	1,00	0,00	78,60	0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-34	B	22/04/2025	0,00%	0,00%	1,00	20,60	1,00	1,00	78,40	0,05		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-35	A	22/04/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,50	2,00	2,00	78,40	0,08		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-35	B	22/04/2025	0,00%	0,00%	1,00	20,60	1,00	1,00	78,40	0,01		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-36	A	22/04/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,40	1,00	2,00	78,50	0,06		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-36	B	22/04/2025	0,00%	0,00%	1,40	19,90	2,00	1,00	78,70	0,09		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-37	A	22/04/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,40	1,00	1,00	78,50	0,07		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-37	B	22/04/2025	0,00%	0,00%	1,00	20,70	1,00	1,00	78,40	0,10		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-38	A	22/04/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,30	1,00	1,00	78,50	0,05		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-38	B	22/04/2025	0,00%	0,00%	0,40	21,10	1,00	1,00	78,50	0,07		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-39	A	22/04/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,30	2,00	1,00	78,60	0,04		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-39	B	22/04/2025	0,00%	0,00%	7,70	13,70	2,00	0,00	78,70	0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-40	A	22/04/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,40	1,00	1,00	78,50	0,06		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-40	B	22/04/2025	0,00%	0,00%	0,30	21,10	1,00	1,00	78,60	0,05		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-41	A	22/04/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,90	1,00	0,00	79,00	0,01		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-41	B	22/04/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,90	2,00	0,00	78,90	-0,01		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-42	A	22/04/2025	0,00%	0,00%	0,70	20,50	1,00	0,00	78,80	0,05		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-42	B	22/04/2025	0,00%	0,00%	3,50	18,10	2,00	0,00	78,40	0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-43	A	22/04/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,90	1,00	0,00	79,00	0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-43	B	22/04/2025	0,00%	0,00%	0,60	20,60	1,00	0,00	78,80	0,00		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-132	A	22/04/2025	0,00%	0,00%	0,50	19,40	2,00	0,00	80,00	-0,01		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-132	B	22/04/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,10	3,00	0,00	79,80	-0,04		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-133	A	22/04/2025	0,00%	0,00%	0,30	21,20	1,00	1,00	78,60	0,08		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-133	B	22/04/2025	0,00%	0,00%	0,50	20,90	2,00	0,00	78,50	-0,03		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-63	A	24/04/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,40	2,00	1,00	78,50	-0,21		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-63	B	24/04/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,40	2,00	1,00	78,40	0,01		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-64	A	24/04/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,40	2,00	1,00	78,60	0,03		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-64	B	24/04/2025	0,00%	0,00%	1,10	20,60	2,00	1,00	78,30	0,04		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-65	A	24/04/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,50	2,00	1,00	78,50	0,10		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-65	B	24/04/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,50	2,00	1,00	78,50	0,09		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-66	A	24/04/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,30	2,00	1,00	78,50	0,09		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-66	B	24/04/2025	0,00%	0,00%	0,30	21,20	2,00	1,00	78,50	0,12		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-67	A	24/04/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,40	1,00	1,00	78,50	0,14		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-67	B	24/04/2025	0,00%	0,00%	0,70	20,80	1,00	2,00	78,50	0,03		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	C02 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H_2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
Edifício I-4	**PMG-68**	**A**	**24/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,40	1,00	1,00	78,50	0,13		0,00	0,00	
Edifício I-4	**PMG-68**	**B**	**24/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,50	2,00	1,00	78,50	0,11		0,00	0,00	
Edifício I-4	**PMG-69**	**A**	**24/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,50	3,00	1,00	78,40	-0,04		0,00	0,00	
Edifício I-4	**PMG-69**	**B**	**24/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,50	3,00	1,00	78,40	0,11		0,00	0,00	
Edifício I-4	**PMG-77**	**A**	**24/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,40	2,00	1,00	78,50	0,06		0,00	0,00	
Edifício I-4	**PMG-77**	**B**	**24/04/2025**	0,00%	0,00%	0,90	20,10	1,00	1,00	78,90	0,08		0,00	0,00	
Edifício I-4	**PMG-78**	**A**	**24/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,40	1,00	2,00	78,50	0,13		0,00	0,00	
Edifício I-4	**PMG-78**	**B**	**24/04/2025**	0,00%	0,00%	1,40	19,10	1,00	1,00	79,60	0,04		0,00	0,00	
Edifício I-4	**PMG-79**	**A**	**24/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,40	1,00	2,00	78,50	0,12		0,00	0,00	
Edifício I-4	**PMG-79**	**B**	**24/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,40	1,00	2,00	78,50	0,10		0,00	0,00	
Edifício I-4	**PMG-80**	**A**	**24/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,60	2,00	0,00	78,30	0,04		0,00	0,00	
Edifício I-4	**PMG-80**	**B**	**24/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,60	2,00	1,00	78,30	0,04		0,00	0,00	
Edifício I-4	**PMG-81**	**A**	**24/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,50	1,00	1,00	78,50	0,08		0,00	0,00	
Edifício I-4	**PMG-81**	**B**	**24/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,50	2,00	2,00	78,50	0,08		0,00	0,00	
Edifício I-4	**PMG-144**	**B**	**24/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,40	2,00	2,00	78,50	0,24		0,00	0,00	
Edifício I-4	**PMG-145**	**B**	**24/04/2025**	0,00%	0,00%	0,20	20,90	1,00	1,00	78,80	0,08		0,00	0,00	
Edifício I-4	**PMG-146**	**B**	**24/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,50	1,00	2,00	78,40	0,08		0,00	0,00	
Edifício I-4	**PMG-147**	**B**	**24/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,50	1,00	2,00	78,50	0,11		0,00	0,00	
Edifício I-4	**PMG-148**	**B**	**24/04/2025**	0,00%	0,00%	1,40	20,40	2,00	1,00	78,20	0,09		0,00	0,00	
Edifício I-4	**PMG-149**	**B**	**24/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,50	2,00	1,00	78,50	-0,02		0,00	0,00	
Edifício I-4	**PMG-150**	**B**	**24/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,50	2,00	1,00	78,40	0,08		0,00	0,00	
Edifício I-4	**PMG-151**	**B**	**24/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,50	1,00	2,00	78,40	0,13		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-46**	**A**	**24/04/2025**	0,00%	0,00%	0,60	20,60	1,00	1,00	78,80	0,10		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-46**	**B**	**24/04/2025**	0,00%	0,00%	4,10	17,10	2,00	1,00	78,80	0,06		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-47**	**A**	**24/04/2025**	0,00%	0,00%	0,30	20,80	2,00	1,00	79,00	0,09		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-47**	**B**	**24/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,30	1,00	2,00	78,60	0,07		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-48**	**A**	**24/04/2025**	0,00%	0,00%	0,60	20,90	1,00	1,00	78,50	0,13		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-48**	**B**	**24/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,50	2,00	1,00	78,50	0,13		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-49**	**A**	**24/04/2025**	0,00%	0,00%	0,60	21,00	1,00	1,00	78,40	-0,02		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-49**	**B**	**24/04/2025**	0,00%	0,00%	8,70	13,10	2,00	1,00	78,20	0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-50**	**A**	**24/04/2025**	0,00%	0,00%	0,20	21,30	1,00	1,00	78,40	0,06		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-50**	**B**	**24/04/2025**	0,00%	0,00%	3,60	18,40	1,00	2,00	78,00	0,12		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-51**	**A**	**24/04/2025**	0,00%	0,00%	0,30	21,00	1,00	1,00	78,70	0,05		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-51**	**B**	**24/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,30	1,00	0,00	78,70	0,13		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-52**	**A**	**24/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,30	1,00	0,00	78,70	0,01		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-52**	**B**	**24/04/2025**	0,00%	0,00%	0,30	21,00	2,00	1,00	78,70	0,07		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-53**	**A**	**24/04/2025**	0,00%	0,00%	0,40	20,50	1,00	0,00	79,00	0,05		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-53**	**B**	**24/04/2025**	0,00%	0,00%	0,40	20,40	2,00	0,00	79,20	0,09		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-54**	**A**	**24/04/2025**	0,00%	0,00%	0,30	20,70	1,00	0,00	79,00	0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-54**	**B**	**24/04/2025**	0,00%	0,00%	2,90	16,40	2,00	0,00	80,60	-0,05		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-55**	**A**	**24/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,10	2,00	0,00	78,80	0,04		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-55**	**B**	**24/04/2025**	0,00%	0,00%	2,60	18,40	2,00	0,00	79,00	-0,04		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-56**	**A**	**24/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,10	1,00	1,00	78,80	0,09		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-56**	**B**	**24/04/2025**	0,00%	0,00%	1,80	20,10	1,00	1,00	78,10	-0,04		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-57**	**A**	**24/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,60	2,00	1,00	78,30	0,07		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-57**	**B**	**24/04/2025**	0,00%	0,00%	3,60	18,80	1,00	1,00	77,60	0,18		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-58**	**A**	**24/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,20	1,00	1,00	78,70	0,04		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-58**	**B**	**24/04/2025**	0,00%	0,00%	1,80	19,90	1,00	0,00	78,20	0,04		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-59**	**A**	**24/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,20	1,00	1,00	78,70	-0,06		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-59**	**B**	**24/04/2025**	0,00%	0,00%	1,50	20,10	1,00	1,00	78,30	0,12		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-60**	**A**	**24/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,20	1,00	1,00	78,70	0,05		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-60**	**B**	**24/04/2025**	0,00%	0,00%	3,60	17,30	1,00	1,00	79,00	0,00		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-61**	**A**	**24/04/2025**	0,00%	0,00%	0,30	20,80	1,00	1,00	78,90	0,08		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	C02 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H_2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
Conjunto Laboratorial	**PMG-61**	**B**	**24/04/2025**	0,00%	0,00%	11,70	7,20	1,00	1,00	81,10	0,02		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-137**	**B**	**24/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,50	1,00	1,00	78,50	0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-138**	**B**	**24/04/2025**	0,00%	0,00%	2,90	19,20	1,00	2,00	77,90	-0,01		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-139**	**A**	**24/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,20	1,00	0,00	78,80	0,04		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-139**	**B**	**24/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,20	1,00	0,00	78,80	0,06		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-140**	**A**	**24/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,20	1,00	1,00	78,70	0,04		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-140**	**B**	**24/04/2025**	0,20%	0,20%	0,20	20,70	1,00	1,00	78,90	0,07		0,00	**5,00**	
Conjunto Laboratorial	**PMG-141**	**B**	**24/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,30	1,00	1,00	78,70	0,12		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-62**	**A**	**24/04/2025**	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	Não medido. Sala em reforma.
Conjunto Laboratorial	**PMG-62**	**B**	**24/04/2025**	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	Não medido. Sala em reforma.
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-01**	**A**	**23/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,40	1,00	2,00	78,60	0,08		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-01**	**B**	**23/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,50	2,00	1,00	78,50	0,07		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-02**	**A**	**23/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,50	1,00	1,00	78,40	0,11		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-02**	**B**	**23/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,60	1,00	1,00	78,40	0,03		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-03**	**A**	**23/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,50	1,00	2,00	78,50	0,08		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-03**	**B**	**23/04/2025**	0,00%	0,00%	1,00	20,50	2,00	1,00	78,50	0,08		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-04**	**A**	**23/04/2025**	0,00%	0,00%	0,20	21,30	2,00	2,00	78,40	0,12		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-04**	**B**	**23/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,50	2,00	1,00	78,50	0,05		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-05**	**A**	**25/04/2025**	0,00%	0,00%	1,00	21,40	1,00	1,00	78,50	0,08		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-05**	**B**	**25/04/2025**	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	Não medido. Agua durante a medição.
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-06**	**A**	**23/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,50	2,00	2,00	78,50	0,10		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-06**	**B**	**23/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,50	2,00	1,00	78,50	0,08		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-07**	**A**	**25/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,50	2,00	1,00	78,50	-0,22		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-07**	**B**	**25/04/2025**	0,00%	0,00%	2,00	19,10	3,00	1,00	78,90	-0,13		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-08**	**A**	**23/04/2025**	0,00%	0,00%	0,30	21,10	1,00	1,00	78,60	0,08		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-08**	**B**	**23/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,50	1,00	1,00	78,40	0,04		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-09**	**A**	**25/04/2025**	0,00%	0,00%	2,30	19,30	2,00	1,00	78,40	0,10		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-09**	**B**	**25/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,20	2,00	1,00	78,70	0,08		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-10**	**A**	**25/04/2025**	0,00%	0,00%	0,70	20,80	1,00	1,00	78,50	0,13		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-10**	**B**	**25/04/2025**	0,00%	0,00%	2,40	19,00	1,00	1,00	78,60	0,18		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-84**	**A**	**23/04/2025**	0,00%	0,00%	0,30	21,20	1,00	1,00	78,50	0,03		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-84**	**B**	**23/04/2025**	0,00%	0,00%	3,80	18,30	1,00	0,00	77,90	0,04		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-85**	**A**	**23/04/2025**	0,00%	0,00%	1,10	20,40	1,00	1,00	78,50	0,06		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-85**	**B**	**23/04/2025**	0,00%	0,00%	2,70	19,70	1,00	0,00	77,60	0,03		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-86**	**A**	**23/04/2025**	0,00%	0,00%	0,30	21,20	1,00	1,00	78,50	0,02		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-86**	**B**	**23/04/2025**	0,00%	0,00%	0,60	20,80	1,00	1,00	78,60	0,02		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-87**	**A**	**23/04/2025**	0,00%	0,00%	2,00	18,70	1,00	1,00	79,30	0,04		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-87**	**B**	**23/04/2025**	0,00%	0,00%	2,40	19,00	1,00	1,00	78,60	0,05		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-152**	**A**	**25/04/2025**	0,00%	0,00%	0,50	20,70	2,00	1,00	78,80	0,12		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-152**	**B**	**25/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,40	2,00	1,00	78,60	0,08		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-153**	**B**	**23/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,50	1,00	1,00	78,40	-0,01		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-154**	**B**	**23/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,60	2,00	1,00	78,40	0,08		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-155**	**B**	**23/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,50	2,00	1,00	78,50	0,12		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-156**	**B**	**25/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,50	2,00	2,00	78,50	0,10		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-157**	**B**	**23/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,50	1,00	2,00	78,50	0,08		0,00	0,00	
Enfermaria	**PMG-70**	**A**	**25/04/2025**	0,00%	0,00%	0,30	20,70	2,00	1,00	79,00	0,14		0,00	0,00	
Enfermaria	**PMG-70**	**B**	**25/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,40	3,00	2,00	78,50	0,13		0,00	0,00	
Enfermaria	**PMG-71**	**A**	**25/04/2025**	0,00%	0,00%	0,40	20,60	1,00	2,00	79,00	0,13		0,00	0,00	
Enfermaria	**PMG-71**	**B**	**25/04/2025**	0,00%	0,00%	0,30	19,10	1,00	1,00	80,60	0,32		0,00	0,00	
Enfermaria	**PMG-72**	**A**	**25/04/2025**	0,00%	0,00%	0,60	20,10	2,00	1,00	79,30	0,03		0,00	0,00	
Enfermaria	**PMG-72**	**B**	**25/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,40	2,00	2,00	78,50	0,01		0,00	0,00	
Enfermaria	**PMG-73**	**A**	**25/04/2025**	0,00%	0,00%	0,30	20,80	2,00	2,00	78,90	0,10		0,00	0,00	
Enfermaria	**PMG-73**	**B**	**25/04/2025**	0,00%	0,00%	0,90	20,40	2,00	2,00	78,70	0,09		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	C02 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H_2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
Enfermaria	**PMG-74**	**A**	**25/04/2025**	0,00%	0,00%	0,60	19,40	2,00	1,00	80,00	0,09		0,00	0,00	
Enfermaria	**PMG-74**	**B**	**25/04/2025**	0,00%	0,00%	2,60	7,10	2,00	1,00	90,30	0,23		0,00	0,00	
Enfermaria	**PMG-75**	**A**	**25/04/2025**	0,00%	0,00%	0,70	19,50	2,00	1,00	79,80	0,13		0,00	0,00	
Enfermaria	**PMG-75**	**B**	**25/04/2025**	0,00%	0,00%	5,00	10,10	2,00	1,00	85,00	0,08		0,00	0,00	
Enfermaria	**PMG-76**	**A**	**25/04/2025**	0,00%	0,00%	0,80	19,90	2,00	2,00	79,30	0,13		0,00	0,00	
Enfermaria	**PMG-76**	**B**	**25/04/2025**	0,00%	0,00%	3,10	13,90	2,00	1,00	83,00	0,05		0,00	0,00	
Enfermaria	**PMG-165**	**A**	**25/04/2025**	0,00%	0,00%	0,50	20,60	3,00	1,00	78,90	0,11		0,00	0,00	
Enfermaria	**PMG-165**	**B**	**25/04/2025**	0,00%	0,00%	1,90	18,60	1,00	1,00	79,40	0,10		0,00	0,00	
CAT	**PMG-82**	**A**	**23/04/2025**	0,00%	0,00%	1,20	20,50	1,00	2,00	78,30	0,16		0,00	0,00	
CAT	**PMG-82**	**B**	**23/04/2025**	0,00%	0,00%	5,10	15,90	1,00	2,00	78,90	0,11		0,00	0,00	
CAT	**PMG-83**	**A**	**23/04/2025**	0,00%	0,00%	2,50	18,90	1,00	2,00	78,60	0,12		0,00	0,00	
CAT	**PMG-83**	**B**	**23/04/2025**	0,00%	0,00%	3,90	17,40	1,00	2,00	78,70	0,14		0,00	0,00	
CAT	**PMG-94**	**A**	**23/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,50	2,00	2,00	78,40	0,13		0,00	0,00	
CAT	**PMG-94**	**B**	**23/04/2025**	0,00%	0,00%	4,00	17,20	1,00	3,00	78,80	0,13		0,00	0,00	
CAT	**PMG-95**	**A**	**25/04/2025**	0,00%	0,00%	1,50	20,10	1,00	1,00	78,40	0,16		0,00	0,00	
CAT	**PMG-95**	**B**	**25/04/2025**	0,00%	0,00%	2,70	19,40	2,00	2,00	77,90	0,03		0,00	0,00	
CAT	**PMG-96**	**A**	**23/04/2025**	0,00%	0,00%	0,20	21,40	2,00	2,00	78,50	0,12		0,00	0,00	
CAT	**PMG-96**	**B**	**23/04/2025**	0,00%	0,00%	4,10	16,50	1,00	3,00	79,30	-0,03		0,00	0,00	
CAT	**PMG-97**	**A**	**23/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,60	1,00	2,00	78,30	0,16		0,00	0,00	
CAT	**PMG-97**	**B**	**23/04/2025**	0,00%	0,00%	3,10	17,50	1,00	2,00	79,40	-0,06		0,00	0,00	
CAT	**PMG-98**	**A**	**23/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,70	1,00	3,00	78,30	0,14		0,00	0,00	
CAT	**PMG-98**	**B**	**23/04/2025**	0,00%	0,00%	0,40	21,20	1,00	2,00	78,40	0,28		0,00	0,00	
CAT	**PMG-160**	**A**	**23/04/2025**	0,00%	0,00%	0,20	21,40	1,00	2,00	78,40	0,07		0,00	0,00	
CAT	**PMG-160**	**B**	**23/04/2025**	0,00%	0,00%	3,30	17,90	1,00	2,00	78,80	0,12		0,00	0,00	
CAT	**PMG-161**	**A**	**25/04/2025**	0,00%	0,00%	1,90	19,60	2,00	1,00	78,50	0,09		0,00	0,00	
CAT	**PMG-161**	**B**	**25/04/2025**	0,00%	0,00%	5,00	17,10	1,00	2,00	77,90	0,12		0,00	0,00	
Incubadora	**PMG-88**	**A**	**25/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,50	2,00	2,00	78,30	0,10		0,00	0,00	
Incubadora	**PMG-88**	**B**	**25/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,50	2,00	2,00	78,30	-0,01		0,00	0,00	
Incubadora	**PMG-89**	**A**	**25/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,60	2,00	2,00	78,40	0,04		0,00	0,00	
Incubadora	**PMG-89**	**B**	**25/04/2025**	0,00%	0,00%	0,60	21,10	1,00	1,00	78,20	0,09		0,00	0,00	
Incubadora	**PMG-90**	**A**	**25/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,60	2,00	2,00	78,30	0,08		0,00	0,00	
Incubadora	**PMG-90**	**B**	**25/04/2025**	0,00%	0,00%	0,50	21,20	2,00	2,00	78,30	0,09		0,00	0,00	
Incubadora	**PMG-91**	**A**	**25/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,60	2,00	2,00	78,30	0,11		0,00	0,00	
Incubadora	**PMG-91**	**B**	**25/04/2025**	0,00%	0,00%	1,40	20,30	1,00	2,00	78,30	0,03		0,00	0,00	
Incubadora	**PMG-92**	**A**	**25/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,50	2,00	2,00	78,40	0,10		0,00	0,00	
Incubadora	**PMG-92**	**B**	**25/04/2025**	0,00%	0,00%	0,80	20,90	2,00	2,00	78,30	0,11		0,00	0,00	
Incubadora	**PMG-93**	**A**	**25/04/2025**	0,00%	0,00%	0,20	21,40	2,00	2,00	78,40	0,11		0,00	0,00	
Incubadora	**PMG-93**	**B**	**25/04/2025**	0,00%	0,00%	1,00	20,60	1,00	2,00	78,40	0,13		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-102**		**22/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,60	1,00	1,00	78,40	0,06		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-103**		**22/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,40	1,00	1,00	78,50	0,08		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-104**		**22/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,50	2,00	1,00	78,40	0,06		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-105**		**22/04/2025**	0,00%	0,00%	1,20	20,50	1,00	1,00	78,30	0,03		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-106**		**22/04/2025**	0,00%	0,00%	0,20	21,10	1,00	1,00	78,60	0,09		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-107**		**22/04/2025**	0,00%	0,00%	2,00	18,10	2,00	1,00	79,90	0,05		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-108**		**22/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,40	1,00	1,00	78,50	-0,01		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-109**	**A**	**22/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,70	1,00	1,00	78,20	0,04		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-109**	**B**	**22/04/2025**	0,00%	0,00%	1,10	20,60	1,00	1,00	78,30	0,12		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-110**	**A**	**22/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,60	2,00	1,00	78,40	0,05		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-110**	**B**	**22/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,60	1,00	1,00	78,40	-0,11		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-111**	**A**	**22/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,60	1,00	1,00	78,40	0,11		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-111**	**B**	**22/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,40	1,00	1,00	78,40	0,12		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-112**		**22/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,70	2,00	1,00	78,20	0,10		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-162**	**A**	**22/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,60	1,00	1,00	78,30	0,06		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	C02 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H_2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
Ginásio Poliesportivo	**PMG-162**	**B**	**22/04/2025**	0,00%	0,00%	6,20	11,90	1,00	1,00	81,90	0,18		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-166**	**A**	**22/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,60	1,00	1,00	78,40	0,08		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-166**	**B**	**22/04/2025**	0,00%	0,00%	1,30	18,90	1,00	1,00	79,80	-0,05		0,00	0,00	
Portaria P3	**PMG-119**	**A**	**22/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,70	1,00	1,00	78,20	0,08		0,00	0,00	
Portaria P3	**PMG-119**	**B**	**22/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,70	1,00	1,00	78,20	0,09		0,00	0,00	
Portaria P3	**PMG-119**	**C**	**22/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,70	1,00	1,00	78,20	0,11		0,00	0,00	
Portaria P3	**PMG-120**	**A**	**22/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,80	1,00	1,00	78,20	0,03		0,00	0,00	
Portaria P3	**PMG-120**	**B**	**22/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,80	1,00	1,00	78,20	0,09		0,00	0,00	
Portaria P3	**PMG-120**	**C**	**22/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,80	2,00	1,00	78,20	0,10		0,00	0,00	
Portaria P3	**PMG-163**	**B**	**22/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,70	1,00	1,00	78,20	0,05		0,00	0,00	
Portaria P3	**PMG-164**	**B**	**22/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,80	2,00	1,00	78,20	0,06		0,00	0,00	
Portaria P3	**PMG-164**	**C**	**22/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,70	1,00	1,00	78,30	0,00		0,00	0,00	
Transportes	**PMG-121**	**A**	**24/04/2025**	0,00%	0,00%	0,20	21,20	2,00	1,00	78,50	0,13		0,00	0,00	
Transportes	**PMG-121**	**B**	**24/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,40	2,00	1,00	78,50	0,15		0,00	0,00	
Transportes	**PMG-122**	**A**	**24/04/2025**	0,00%	0,00%	0,20	21,30	2,00	2,00	78,50	0,06		0,00	0,00	
Transportes	**PMG-122**	**B**	**24/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,40	4,00	2,00	78,60	0,09		0,00	0,00	
Transportes	**PMG-123**	**A**	**24/04/2025**	0,00%	0,00%	0,50	21,00	1,00	2,00	78,50	0,08		0,00	0,00	
Transportes	**PMG-123**	**B**	**24/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,50	2,00	1,00	78,50	0,07		0,00	0,00	
Transportes	**PMG-124**	**A**	**24/04/2025**	0,00%	0,00%	0,20	21,00	1,00	2,00	78,80	0,10		0,00	0,00	
Transportes	**PMG-124**	**B**	**24/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,40	2,00	2,00	78,50	0,08		0,00	0,00	
Transportes	**PMG-158**	**B**	**24/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,40	4,00	1,00	78,50	0,09		0,00	0,00	
Transportes	**PMG-159**	**B**	**24/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,50	3,00	1,00	78,50	0,09		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	**PMG-125**	**A**	**25/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,30	2,00	0,00	78,70	0,07		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	**PMG-125**	**B**	**25/04/2025**	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	Não medido. Agua durante a medição.
Posto Guarda Universitário	**PMG-126**	**A**	**25/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,20	1,00	1,00	78,70	0,03		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	**PMG-126**	**B**	**25/04/2025**	0,00%	0,00%	4,90	15,90	1,00	1,00	79,30	-0,47		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	**PMG-127**	**A**	**25/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,00	1,00	1,00	78,90	0,07		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	**PMG-127**	**B**	**25/04/2025**	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	Não medido. Agua durante a medição.
Posto Guarda Universitário	**PMG-128**	**A**	**25/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,20	1,00	1,00	78,70	0,08		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	**PMG-128**	**B**	**25/04/2025**	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	Não medido. Agua durante a medição.
Posto Guarda Universitário	**PMG-129**	**A**	**25/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,30	1,00	1,00	78,70	0,08		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	**PMG-129**	**B**	**25/04/2025**	0,00%	0,00%	0,90	20,70	1,00	1,00	78,50	0,08		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	**PMG-130**	**A**	**25/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,30	1,00	1,00	78,70	0,06		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	**PMG-130**	**B**	**25/04/2025**	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	Não medido. Agua durante a medição.
Posto Guarda Universitário	**PMG-131**	**A**	**25/04/2025**	0,00%	0,00%	0,30	21,00	1,00	1,00	78,70	0,08		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	**PMG-131**	**B**	**25/04/2025**	0,00%	0,00%	0,80	20,60	1,00	1,00	78,70	-0,01		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-16**	**A**	**29/04/2025**	0,00%	0,00%	1,80	19,70	1,00	1,00	78,50	0,04		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-16**	**B**	**29/04/2025**	0,00%	0,00%	2,00	19,60	1,00	1,00	78,40	0,06		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-17**	**A**	**29/04/2025**	0,00%	0,00%	0,50	21,00	1,00	1,00	78,50	0,08		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-17**	**B**	**29/04/2025**	0,00%	0,00%	0,80	20,70	2,00	1,00	78,50	0,04		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-18**	**A**	**29/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,70	1,00	1,00	78,30	0,08		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-18**	**B**	**29/04/2025**	0,00%	0,00%	1,30	20,50	1,00	1,00	78,20	0,06		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-20**	**A**	**29/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,10	1,00	0,00	78,80	0,03		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-20**	**B**	**29/04/2025**	0,00%	0,00%	0,20	21,20	2,00	0,00	78,60	0,02		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-22**	**A**	**29/04/2025**	0,00%	0,00%	0,20	21,10	1,00	0,00	78,80	0,13		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-22**	**B**	**29/04/2025**	0,00%	0,00%	3,70	16,70	2,00	0,00	79,60	0,00		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-23**	**A**	**29/04/2025**	0,00%	0,00%	0,50	21,10	1,00	1,00	78,40	0,08		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-23**	**B**	**29/04/2025**	0,00%	0,00%	1,30	20,30	1,00	1,00	78,40	0,08		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-113**	**A**	**29/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	20,80	2,00	0,00	79,10	0,01		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-113**	**B**	**29/04/2025**	0,00%	0,00%	1,70	19,10	2,00	1,00	79,20	-0,03		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-114**	**A**	**29/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,10	2,00	0,00	78,80	-0,02		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-114**	**B**	**29/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,20	2,00	0,00	78,70	0,01		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-115**	**A**	**29/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	20,90	2,00	0,00	79,00	-0,28		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	C02 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H_2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
Edificio I 1	**PMG-115**	**B**	**29/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,10	2,00	0,00	78,90	0,02		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-11**	**A**	**29/04/2025**	0,00%	0,00%	0,90	21,00	2,00	2,00	78,10	0,11		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-11**	**B**	**29/04/2025**	0,50%	0,50%	0,60	21,10	1,00	1,00	77,80	0,18		0,00	**26,00**	
Edificio I 1	**PMG-12**	**A**	**29/04/2025**	0,00%	0,00%	3,50	17,70	1,00	1,00	78,80	0,05		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-12**	**B**	**29/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,60	1,00	1,00	78,30	0,03		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-13**	**A**	**29/04/2025**	0,00%	0,00%	1,00	20,60	1,00	2,00	78,40	0,13		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-13**	**B**	**29/04/2025**	0,00%	0,00%	1,10	20,50	1,00	2,00	78,40	0,10		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-14**	**A**	**29/04/2025**	0,00%	0,00%	2,30	19,00	2,00	2,00	78,70	0,15		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-14**	**B**	**29/04/2025**	0,00%	0,00%	3,20	17,60	1,00	2,00	79,10	0,08		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-15**	**A**	**29/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,70	1,00	2,00	78,30	0,03		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-15**	**B**	**29/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,70	1,00	1,00	78,20	0,08		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-19**	**A**	**29/04/2025**	0,00%	0,00%	0,20	21,80	1,00	1,00	78,10	0,13		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-19**	**B**	**29/04/2025**	0,00%	0,00%	0,50	21,20	2,00	2,00	78,30	0,09		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-21**	**A**	**30/04/2025**	0,00%	0,00%	0,50	21,20	2,00	2,00	78,30	0,09		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-21**	**B**	**30/04/2025**	0,00%	0,00%	0,90	19,80	3,00	0,00	79,30	-0,03		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-24**	**A**	**29/04/2025**	0,00%	0,00%	0,20	21,60	1,00	1,00	78,20	0,08		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-24**	**B**	**29/04/2025**	0,00%	0,00%	0,30	21,60	1,00	1,00	78,20	0,11		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-135**	**A**	**29/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,10	2,00	0,00	78,80	0,03		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG -135**	**B**	**29/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,20	2,00	0,00	78,80	-0,01		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-136**	**B**	**29/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,00	2,00	0,00	78,90	0,00		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	**PMG-25**	**A**	**28/04/2025**	0,00%	0,00%	0,20	21,20	1,00	1,00	78,60	0,11		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	**PMG-25**	**B**	**28/04/2025**	0,00%	0,00%	1,20	20,20	2,00	2,00	78,60	0,15		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	**PMG-26**	**A**	**28/04/2025**	0,00%	0,00%	0,50	20,70	2,00	1,00	78,80	0,13		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	**PMG-26**	**B**	**28/04/2025**	0,00%	0,00%	1,30	20,00	2,00	2,00	78,80	0,05		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	**PMG-27**	**A**	**28/04/2025**	0,00%	0,00%	1,40	19,20	2,00	2,00	79,40	0,12		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	**PMG-27**	**B**	**28/04/2025**	0,00%	0,00%	3,30	17,60	2,00	1,00	79,20	0,10		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	**PMG-28**	**A**	**28/04/2025**	0,00%	0,00%	0,90	20,00	1,00	2,00	79,20	0,10		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	**PMG-28**	**B**	**28/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,50	2,00	1,00	78,50	0,11		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	**PMG-29**	**A**	**28/04/2025**	0,00%	0,00%	0,30	21,20	2,00	2,00	78,50	0,09		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	**PMG-29**	**B**	**28/04/2025**	0,00%	0,00%	0,90	20,60	2,00	2,00	78,50	0,17		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	**PMG-44**	**A**	**28/04/2025**	0,00%	0,00%	0,40	20,90	2,00	1,00	78,70	0,14		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	**PMG-44**	**B**	**28/04/2025**	0,00%	0,00%	0,60	20,60	1,00	2,00	78,70	0,03		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	**PMG-45**	**A**	**28/04/2025**	0,00%	0,00%	0,40	20,30	1,00	2,00	79,30	0,10		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	**PMG-45**	**B**	**28/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,60	2,00	2,00	78,40	0,11		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	**PMG-134**	**B**	**28/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,60	1,00	2,00	78,40	0,12		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-30**	**A**	**28/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	20,50	2,00	0,00	79,30	0,07		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-30**	**B**	**28/04/2025**	0,00%	0,00%	1,10	19,80	2,00	0,00	79,10	0,02		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-31**	**A**	**28/04/2025**	0,00%	0,00%	0,20	20,50	3,00	0,00	79,30	0,00		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-31**	**B**	**28/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	20,70	3,00	0,00	79,30	0,01		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-32**	**A**	**28/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,00	2,00	1,00	78,90	0,09		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-32**	**B**	**28/04/2025**	0,00%	0,00%	0,80	20,30	2,00	1,00	78,90	0,04		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-33**	**A**	**28/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,00	2,00	1,00	78,90	0,09		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-33**	**B**	**28/04/2025**	0,00%	0,00%	3,00	18,20	2,00	1,00	78,80	0,08		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-34**	**A**	**28/04/2025**	0,00%	0,00%	0,20	20,90	1,00	1,00	78,90	0,09		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-34**	**B**	**28/04/2025**	0,00%	0,00%	1,00	20,30	2,00	1,00	78,70	0,06		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-35**	**A**	**28/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,30	2,00	1,00	78,60	0,11		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-35**	**B**	**28/04/2025**	0,00%	0,00%	1,00	20,50	1,00	1,00	78,50	0,11		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-36**	**A**	**28/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,20	1,00	1,00	78,70	0,12		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-36**	**B**	**28/04/2025**	0,00%	0,00%	1,60	19,70	1,00	1,00	78,80	0,09		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-37**	**A**	**28/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,30	1,00	2,00	78,60	0,13		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-37**	**B**	**28/04/2025**	0,00%	0,00%	0,80	20,70	1,00	2,00	78,50	0,08		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-38**	**A**	**28/04/2025**	0,00%	0,00%	0,20	21,00	1,00	1,00	78,80	-0,07		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-38**	**B**	**28/04/2025**	0,00%	0,00%	0,40	21,00	2,00	1,00	78,60	0,00		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	C02 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H_2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
I-3 Biblioteca	PMG-39	A	28/04/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,90	1,00	1,00	78,90	0,10		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-39	B	28/04/2025	0,00%	0,00%	7,30	13,90	2,00	1,00	78,90	0,09		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-40	A	28/04/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	2,00	1,00	78,60	0,12		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-40	B	28/04/2025	0,00%	0,00%	0,30	21,00	2,00	1,00	78,70	0,11		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-41	A	28/04/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,70	2,00	0,00	79,20	-0,02		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-41	B	28/04/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,80	2,00	0,00	79,00	0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-42	A	28/04/2025	0,00%	0,00%	0,80	20,10	2,00	0,00	79,00	0,06		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-42	B	28/04/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,80	2,00	0,00	79,00	0,04		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-43	A	28/04/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,80	2,00	0,00	79,00	0,07		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-43	B	28/04/2025	0,00%	0,00%	0,60	20,60	2,00	0,00	78,90	0,26		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-132	A	28/04/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,30	4,00	0,00	79,50	0,02		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-132	B	28/04/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,50	3,00	0,00	79,40	-0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-133	A	28/04/2025	0,00%	0,00%	0,30	20,80	1,00	1,00	78,90	0,12		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-133	B	28/04/2025	0,00%	0,00%	0,70	20,60	1,00	1,00	78,70	0,09		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-63	A	30/04/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,80	1,00	1,00	78,20	0,11		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-63	B	30/04/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,80	1,00	1,00	78,10	0,08		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-64	A	30/04/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,90	1,00	1,00	78,00	0,08		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-64	B	30/04/2025	0,00%	0,00%	0,30	21,70	1,00	1,00	78,00	0,08		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-65	A	30/04/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,90	2,00	1,00	78,10	0,07		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-65	B	30/04/2025	0,00%	0,00%	0,00	22,00	1,00	1,00	78,00	-0,04		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-66	A	30/04/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,90	1,00	1,00	78,00	0,07		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-66	B	30/04/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,90	1,00	1,00	78,00	0,13		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-67	A	30/04/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,80	1,00	1,00	78,10	0,08		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-67	B	30/04/2025	0,00%	0,00%	0,30	21,50	1,00	2,00	78,20	0,09		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-68	A	30/04/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,80	1,00	1,00	78,20	0,08		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-68	B	30/04/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,80	2,00	1,00	78,10	0,17		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-69	A	30/04/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,90	1,00	1,00	78,10	0,08		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-69	B	30/04/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,90	1,00	1,00	78,10	0,08		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-77	A	30/04/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,80	1,00	1,00	78,10	0,08		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-77	B	30/04/2025	0,00%	0,00%	0,50	20,70	1,00	1,00	78,70	0,10		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-78	A	30/04/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,70	1,00	1,00	78,20	0,11		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-78	B	30/04/2025	0,00%	0,00%	1,00	20,30	1,00	1,00	78,70	0,01		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-79	A	30/04/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,70	1,00	2,00	78,20	0,08		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-79	B	30/04/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,70	1,00	2,00	78,20	0,07		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-80	A	30/04/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,70	1,00	2,00	78,30	0,11		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-80	B	30/04/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,80	1,00	1,00	78,20	0,11		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-81	A	30/04/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,80	1,00	2,00	78,10	0,08		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-81	B	30/04/2025	0,00%	0,00%	0,30	21,60	1,00	1,00	78,20	0,11		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-144	B	30/04/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,80	1,00	2,00	78,10	0,11		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-145	B	30/04/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,60	1,00	1,00	78,30	0,11		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-146	B	30/04/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,80	1,00	1,00	78,10	0,07		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-147	B	30/04/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,80	1,00	1,00	78,10	0,09		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-148	B	30/04/2025	0,00%	0,00%	0,00	22,00	1,00	1,00	78,00	-0,11		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-149	B	30/04/2025	0,00%	0,00%	0,00	22,00	2,00	1,00	78,00	0,13		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-150	B	30/04/2025	0,00%	0,00%	0,00	22,00	1,00	1,00	78,00	0,12		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-151	B	30/04/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,90	1,00	1,00	78,00	-0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-46	A	30/04/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,50	2,00	0,00	78,40	0,10		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-46	B	30/04/2025	0,00%	0,00%	3,00	18,60	2,00	1,00	78,40	0,06		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-47	A	30/04/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,40	1,00	0,00	78,40	0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-47	B	30/04/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,70	2,00	1,00	78,30	0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-48	A	30/04/2025	0,00%	0,00%	0,30	21,40	2,00	2,00	78,30	0,07		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-48	B	30/04/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,50	2,00	1,00	78,30	0,11		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-49	A	30/04/2025	0,00%	0,00%	2,20	20,20	2,00	1,00	77,60	0,08		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	C02 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H_2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
Conjunto Laboratorial	**PMG-49**	**B**	**30/04/2025**	0,00%	0,00%	3,40	18,40	1,00	1,00	78,20	0,13		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-50**	**A**	**30/04/2025**	0,00%	0,00%	0,20	21,60	1,00	1,00	78,20	0,05		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-50**	**B**	**30/04/2025**	0,00%	0,00%	2,70	19,40	1,00	1,00	77,90	0,01		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-51**	**A**	**30/04/2025**	0,00%	0,00%	0,20	21,30	2,00	0,00	78,40	0,05		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-51**	**B**	**30/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,50	1,00	0,00	78,50	-0,04		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-52**	**A**	**30/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,40	1,00	0,00	78,50	0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-52**	**B**	**30/04/2025**	0,00%	0,00%	0,20	21,30	1,00	1,00	78,50	-0,02		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-53**	**A**	**30/04/2025**	0,00%	0,00%	0,40	20,70	1,00	0,00	78,90	0,02		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-53**	**B**	**30/04/2025**	0,00%	0,00%	0,60	20,30	1,00	0,00	79,20	-0,01		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-54**	**A**	**30/04/2025**	0,00%	0,00%	0,30	20,90	2,00	1,00	78,90	0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-54**	**B**	**30/04/2025**	0,00%	0,00%	2,70	17,00	2,00	0,00	80,30	-0,01		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-55**	**A**	**30/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	20,90	2,00	0,00	78,90	0,00		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-55**	**B**	**30/04/2025**	0,00%	0,00%	2,50	18,30	2,00	0,00	79,20	0,01		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-56**	**A**	**30/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,50	1,00	1,00	78,40	0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-56**	**B**	**30/04/2025**	0,00%	0,00%	1,20	20,70	1,00	1,00	78,00	-0,04		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-57**	**A**	**30/04/2025**	0,00%	0,00%	1,00	21,50	1,00	1,00	78,40	0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-57**	**B**	**30/04/2025**	0,00%	0,00%	1,50	20,50	2,00	1,00	78,00	0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-58**	**A**	**30/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,50	2,00	1,00	78,40	0,06		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-58**	**B**	**30/04/2025**	0,00%	0,00%	1,30	20,60	1,00	1,00	78,10	0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-59**	**A**	**30/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,50	1,00	1,00	78,40	0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-59**	**B**	**30/04/2025**	0,00%	0,00%	0,90	21,00	1,00	0,00	78,10	0,07		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-60**	**A**	**30/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,50	1,00	1,00	78,40	0,05		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-60**	**B**	**30/04/2025**	0,00%	0,00%	3,10	18,30	1,00	1,00	78,50	0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-61**	**A**	**30/04/2025**	0,00%	0,00%	0,20	21,40	1,00	1,00	78,50	0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-61**	**B**	**30/04/2025**	0,00%	0,00%	6,80	13,80	1,00	1,00	79,50	0,04		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-137**	**B**	**30/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,80	1,00	1,00	78,10	0,05		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-138**	**B**	**30/04/2025**	0,00%	0,00%	0,40	21,50	1,00	1,00	78,10	0,07		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-139**	**A**	**30/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,40	1,00	0,00	78,60	-0,02		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-139**	**B**	**30/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,30	1,00	0,00	78,60	0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-140**	**A**	**30/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,40	1,00	0,00	78,50	0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-140**	**B**	**30/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,20	1,00	0,00	78,70	-0,01		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-141**	**B**	**30/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,50	1,00	0,00	78,50	0,00		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-62**	**A**	**30/04/2025**	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	Não medido. Sala em reforma.
Conjunto Laboratorial	**PMG-62**	**B**	**30/04/2025**	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	Não medido. Sala em reforma.
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-01**	**A**	**29/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	20,70	1,00	1,00	78,30	0,12		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-01**	**B**	**29/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,70	2,00	2,00	78,30	0,03		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-02**	**A**	**29/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,60	1,00	1,00	78,30	0,00		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-02**	**B**	**29/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,60	1,00	1,00	78,30	0,04		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-03**	**A**	**29/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,80	1,00	2,00	78,20	0,06		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-03**	**B**	**29/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,70	1,00	1,00	78,20	0,09		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-04**	**A**	**29/04/2025**	0,00%	0,00%	0,20	21,60	1,00	2,00	78,10	0,12		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-04**	**B**	**29/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,80	2,00	1,00	78,20	0,10		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-05**	**A**	**29/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,80	1,00	2,00	78,20	0,10		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-05**	**B**	**29/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,70	1,00	2,00	78,30	0,03		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-06**	**A**	**29/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,70	1,00	2,00	78,20	0,10		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-06**	**B**	**29/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,80	1,00	2,00	78,20	0,08		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-07**	**A**	**29/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,70	1,00	1,00	78,30	-0,09		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-07**	**B**	**29/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,70	1,00	1,00	78,30	0,03		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-08**	**A**	**29/04/2025**	0,00%	0,00%	0,20	21,40	1,00	1,00	78,40	0,07		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-08**	**B**	**29/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,60	1,00	0,00	78,30	0,06		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-09**	**A**	**29/04/2025**	0,00%	0,00%	1,40	20,30	1,00	1,00	78,30	0,08		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-09**	**B**	**29/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,60	1,00	1,00	78,40	0,03		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-10**	**A**	**29/04/2025**	0,00%	0,00%	0,30	21,40	2,00	1,00	78,30	0,10		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	C02 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H_2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-10**	**B**	**29/04/2025**	0,00%	0,00%	0,70	20,60	1,00	2,00	78,60	0,15		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-84**	**A**	**29/04/2025**	0,00%	0,00%	0,20	21,30	1,00	0,00	78,50	0,02		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-84**	**B**	**29/04/2025**	0,00%	0,00%	3,70	18,50	2,00	1,00	77,70	-0,08		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-85**	**A**	**29/04/2025**	0,00%	0,00%	0,70	21,00	1,00	0,00	78,30	0,05		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-85**	**B**	**29/04/2025**	0,00%	0,00%	2,30	20,10	1,00	0,00	77,60	-0,04		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-86**	**A**	**29/04/2025**	0,00%	0,00%	0,30	21,30	1,00	0,00	78,40	0,07		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-86**	**B**	**29/04/2025**	0,00%	0,00%	0,90	20,70	1,00	0,00	78,40	0,03		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-87**	**A**	**29/04/2025**	0,00%	0,00%	2,30	17,80	1,00	1,00	79,90	0,08		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-87**	**B**	**29/04/2025**	0,00%	0,00%	2,40	18,40	2,00	0,00	79,20	0,08		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-152**	**A**	**29/04/2025**	0,00%	0,00%	0,40	21,10	2,00	1,00	78,60	0,05		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-152**	**B**	**29/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,60	1,00	1,00	78,40	0,18		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-153**	**B**	**29/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,70	1,00	1,00	78,20	0,13		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-154**	**B**	**29/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,70	1,00	0,00	78,30	-0,01		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-155**	**B**	**29/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,70	2,00	1,00	78,20	0,11		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-156**	**B**	**29/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,80	1,00	2,00	78,20	0,13		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-157**	**B**	**29/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,80	1,00	2,00	78,20	0,08		0,00	0,00	
Enfermaria	**PMG-70**	**A**	**29/04/2025**	0,00%	0,00%	0,20	21,10	2,00	3,00	78,70	0,10		0,00	0,00	
Enfermaria	**PMG-70**	**B**	**29/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,50	2,00	2,00	78,40	0,14		0,00	0,00	
Enfermaria	**PMG-71**	**A**	**29/04/2025**	0,00%	0,00%	0,20	21,40	1,00	3,00	78,50	0,17		0,00	0,00	
Enfermaria	**PMG-71**	**B**	**29/04/2025**	0,00%	0,00%	0,20	20,00	1,00	2,00	79,80	0,11		0,00	0,00	
Enfermaria	**PMG-72**	**A**	**29/04/2025**	0,00%	0,00%	0,30	21,40	2,00	2,00	78,30	0,12		0,00	0,00	
Enfermaria	**PMG-72**	**B**	**29/04/2025**	0,00%	0,00%	1,20	20,00	2,00	2,00	78,80	0,12		0,00	0,00	
Enfermaria	**PMG-73**	**A**	**29/04/2025**	0,00%	0,00%	0,20	21,40	2,00	3,00	78,40	0,31		0,00	0,00	
Enfermaria	**PMG-73**	**B**	**29/04/2025**	0,00%	0,00%	0,50	21,20	2,00	3,00	78,40	0,08		0,00	0,00	
Enfermaria	**PMG-74**	**A**	**29/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,60	2,00	2,00	78,30	0,13		0,00	0,00	
Enfermaria	**PMG-74**	**B**	**29/04/2025**	0,00%	0,00%	0,90	16,70	2,00	2,00	82,40	0,19		0,00	0,00	
Enfermaria	**PMG-75**	**A**	**29/04/2025**	0,00%	0,00%	0,30	21,00	2,00	2,00	78,60	0,19		0,00	0,00	
Enfermaria	**PMG-75**	**B**	**29/04/2025**	0,00%	0,00%	0,90	18,90	2,00	2,00	80,20	0,13		0,00	0,00	
Enfermaria	**PMG-76**	**A**	**29/04/2025**	0,00%	0,00%	0,40	21,30	2,00	2,00	78,30	0,13		0,00	0,00	
Enfermaria	**PMG-76**	**B**	**29/04/2025**	0,00%	0,00%	1,60	17,80	2,00	2,00	80,60	0,06		0,00	0,00	
Enfermaria	**PMG-165**	**A**	**29/04/2025**	0,00%	0,00%	0,50	21,10	1,00	3,00	78,40	0,12		0,00	0,00	
Enfermaria	**PMG-165**	**B**	**29/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,70	1,00	2,00	78,30	0,14		0,00	0,00	
CAT	**PMG-82**	**A**	**28/04/2025**	0,00%	0,00%	1,40	19,70	1,00	2,00	78,90	0,13		0,00	0,00	
CAT	**PMG-82**	**B**	**28/04/2025**	0,00%	0,00%	6,90	13,90	1,00	2,00	79,20	0,08		0,00	0,00	
CAT	**PMG-83**	**A**	**28/04/2025**	0,00%	0,00%	2,80	18,20	2,00	1,00	79,00	0,11		0,00	0,00	
CAT	**PMG-83**	**B**	**28/04/2025**	0,00%	0,00%	3,10	18,00	1,00	2,00	78,90	0,05		0,00	0,00	
CAT	**PMG-94**	**A**	**28/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,30	2,00	1,00	78,60	0,10		0,00	0,00	
CAT	**PMG-94**	**B**	**28/04/2025**	0,00%	0,00%	4,30	17,10	1,00	1,00	78,60	0,10		0,00	0,00	
CAT	**PMG-95**	**A**	**28/04/2025**	0,00%	0,00%	0,90	20,70	2,00	2,00	78,40	0,13		0,00	0,00	
CAT	**PMG-95**	**B**	**28/04/2025**	0,00%	0,00%	1,90	20,20	2,00	2,00	77,90	0,09		0,00	0,00	
CAT	**PMG-96**	**A**	**28/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,40	1,00	2,00	78,50	0,18		0,00	0,00	
CAT	**PMG-96**	**B**	**28/04/2025**	0,00%	0,00%	3,70	17,30	1,00	2,00	79,00	0,13		0,00	0,00	
CAT	**PMG-97**	**A**	**28/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,30	2,00	2,00	78,60	0,15		0,00	0,00	
CAT	**PMG-97**	**B**	**28/04/2025**	0,00%	0,00%	3,00	17,60	2,00	2,00	79,30	0,10		0,00	0,00	
CAT	**PMG-98**	**A**	**28/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,50	1,00	2,00	78,50	0,12		0,00	0,00	
CAT	**PMG-98**	**B**	**28/04/2025**	0,00%	0,00%	0,40	21,10	1,00	2,00	78,50	0,10		0,00	0,00	
CAT	**PMG-160**	**A**	**28/04/2025**	0,00%	0,00%	2,00	19,30	1,00	2,00	78,70	0,14		0,00	0,00	
CAT	**PMG-160**	**B**	**28/04/2025**	0,00%	0,00%	3,90	18,10	1,00	1,00	78,00	0,05		0,00	0,00	
CAT	**PMG-161**	**A**	**28/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,40	1,00	2,00	78,50	0,09		0,00	0,00	
CAT	**PMG-161**	**B**	**28/04/2025**	0,00%	0,00%	2,60	18,70	1,00	1,00	78,70	0,24		0,00	0,00	
Incubadora	**PMG-88**	**A**	**30/04/2025**	0,00%	0,00%	0,20	21,60	1,00	1,00	78,20	0,12		0,00	0,00	
Incubadora	**PMG-88**	**B**	**30/04/2025**	0,00%	0,00%	0,20	21,60	1,00	2,00	78,20	0,09		0,00	0,00	
Incubadora	**PMG-89**	**A**	**30/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,80	1,00	2,00	78,10	0,15		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	C02 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H_2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
Incubadora	**PMG-89**	**B**	**30/04/2025**	0,00%	0,00%	0,70	21,30	1,00	1,00	78,00	0,08		0,00	0,00	
Incubadora	**PMG-90**	**A**	**30/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,80	1,00	2,00	78,20	0,10		0,00	0,00	
Incubadora	**PMG-90**	**B**	**30/04/2025**	0,00%	0,00%	0,30	21,50	1,00	2,00	78,20	0,03		0,00	0,00	
Incubadora	**PMG-91**	**A**	**30/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,80	1,00	2,00	78,10	0,11		0,00	0,00	
Incubadora	**PMG-91**	**B**	**30/04/2025**	0,00%	0,00%	1,40	20,60	1,00	1,00	78,10	0,07		0,00	0,00	
Incubadora	**PMG-92**	**A**	**30/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,70	1,00	2,00	78,20	0,13		0,00	0,00	
Incubadora	**PMG-92**	**B**	**30/04/2025**	0,00%	0,00%	0,80	21,10	1,00	2,00	78,10	0,10		0,00	0,00	
Incubadora	**PMG-93**	**A**	**30/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,70	1,00	2,00	78,20	0,12		0,00	0,00	
Incubadora	**PMG-93**	**B**	**30/04/2025**	0,00%	0,00%	1,00	20,80	1,00	1,00	78,20	0,06		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-102**		**28/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,40	1,00	1,00	78,50	0,09		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-103**		**28/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,50	2,00	1,00	78,50	0,13		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-104**		**28/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,30	1,00	1,00	78,60	0,05		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-105**		**28/04/2025**	0,00%	0,00%	1,00	20,50	1,00	2,00	78,50	0,04		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-106**		**28/04/2025**	0,00%	0,00%	0,20	21,30	2,00	1,00	78,50	0,01		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-107**		**28/04/2025**	0,00%	0,00%	1,70	18,40	1,00	1,00	79,90	0,09		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-108**		**28/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,60	2,00	1,00	78,40	0,08		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-109**	**A**	**28/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,70	2,00	1,00	78,20	0,05		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-109**	**B**	**28/04/2025**	0,00%	0,00%	0,90	21,00	2,00	1,00	78,00	0,08		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-110**	**A**	**28/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,40	1,00	1,00	78,50	0,12		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-110**	**B**	**28/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,40	2,00	1,00	78,60	0,12		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-111**	**A**	**28/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,40	1,00	1,00	78,50	0,16		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-111**	**B**	**28/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,30	1,00	1,00	78,60	-0,03		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-112**		**28/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,80	2,00	0,00	78,10	0,08		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-162**	**A**	**28/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,50	1,00	1,00	78,40	0,09		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-162**	**B**	**28/04/2025**	2,10%	2,10%	6,40	10,50	1,00	1,00	81,00	0,08		0,00	**50,00**	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-166**	**A**	**30/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,70	1,00	2,00	78,30	0,11		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-166**	**B**	**30/04/2025**	0,00%	0,00%	1,30	18,90	1,00	1,00	79,80	0,23		0,00	0,00	
Portaria P3	**PMG-119**	**A**	**28/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,60	2,00	1,00	78,30	0,12		0,00	0,00	
Portaria P3	**PMG-119**	**B**	**28/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,60	1,00	2,00	78,30	0,06		0,00	0,00	
Portaria P3	**PMG-119**	**C**	**28/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,70	1,00	2,00	78,30	0,07		0,00	0,00	
Portaria P3	**PMG-120**	**A**	**28/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,60	1,00	2,00	78,40	0,05		0,00	0,00	
Portaria P3	**PMG-120**	**B**	**28/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,60	1,00	2,00	78,30	-0,33		0,00	0,00	
Portaria P3	**PMG-120**	**C**	**28/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,60	1,00	1,00	78,30	-0,05		0,00	0,00	
Portaria P3	**PMG-163**	**B**	**28/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,70	2,00	2,00	78,30	0,11		0,00	0,00	
Portaria P3	**PMG-164**	**B**	**28/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,70	1,00	2,00	78,30	0,13		0,00	0,00	
Portaria P3	**PMG-164**	**C**	**28/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,60	1,00	1,00	78,40	0,08		0,00	0,00	
Transportes	**PMG-121**	**A**	**29/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,50	1,00	2,00	78,40	0,14		0,00	0,00	
Transportes	**PMG-121**	**B**	**29/04/2025**	0,00%	0,00%	1,70	18,80	1,00	2,00	79,40	-0,14		0,00	0,00	
Transportes	**PMG-122**	**A**	**29/04/2025**	0,00%	0,00%	0,30	21,40	1,00	2,00	78,30	0,16		0,00	0,00	
Transportes	**PMG-122**	**B**	**29/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,80	1,00	1,00	78,20	0,19		0,00	0,00	
Transportes	**PMG-123**	**A**	**29/04/2025**	0,00%	0,00%	0,70	20,80	1,00	2,00	78,40	0,09		0,00	0,00	
Transportes	**PMG-123**	**B**	**29/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,90	2,00	2,00	78,10	0,09		0,00	0,00	
Transportes	**PMG-124**	**A**	**29/04/2025**	0,00%	0,00%	0,30	21,70	1,00	2,00	78,10	0,14		0,00	0,00	
Transportes	**PMG-124**	**B**	**29/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,90	1,00	2,00	78,10	0,14		0,00	0,00	
Transportes	**PMG-158**	**B**	**29/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,90	2,00	3,00	78,10	0,11		0,00	0,00	
Transportes	**PMG-159**	**B**	**29/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	22,00	1,00	2,00	78,00	0,13		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	**PMG-125**	**A**	**30/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	22,00	2,00	1,00	78,00	0,15		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	**PMG-125**	**B**	**30/04/2025**	0,00%	0,00%	5,10	17,20	2,00	1,00	77,70	-1,06		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	**PMG-126**	**A**	**30/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,60	1,00	1,00	78,30	0,06		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	**PMG-126**	**B**	**30/04/2025**	0,00%	0,00%	6,00	14,50	1,00	1,00	79,50	-1,32		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	**PMG-127**	**A**	**30/04/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,40	2,00	1,00	78,50	0,06		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	**PMG-127**	**B**	**30/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,80	2,00	1,00	78,20	0,15		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	**PMG-128**	**A**	**30/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,80	1,00	1,00	78,10	0,09		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	C02 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H_2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
Posto Guarda Universitário	**PMG-128**	**B**	**30/04/2025**	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	Não medido. Agua durante a medição.
Posto Guarda Universitário	**PMG-129**	**A**	**30/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,80	1,00	1,00	78,20	0,09		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	**PMG-129**	**B**	**30/04/2025**	0,00%	0,00%	0,70	21,20	2,00	2,00	78,10	0,05		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	**PMG-130**	**A**	**30/04/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,70	1,00	1,00	78,20	0,13		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	**PMG-130**	**B**	**30/04/2025**	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	Não medido. Agua durante a medição.
Posto Guarda Universitário	**PMG-131**	**A**	**30/04/2025**	0,00%	0,00%	0,30	21,40	1,00	1,00	78,30	0,10		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	**PMG-131**	**B**	**30/04/2025**	0,00%	0,00%	0,80	20,90	1,00	1,00	78,30	0,08		0,00	0,00	
Edifício I 1	**PMG-16**	**A**	**06/05/2025**	0,00%	0,00%	1,90	20,00	2,00	1,00	78,20	0,07		0,00	0,00	
Edifício I 1	**PMG-16**	**B**	**06/05/2025**	0,00%	0,00%	2,60	19,00	1,00	1,00	78,50	0,08		0,00	0,00	
Edifício I 1	**PMG-17**	**A**	**06/05/2025**	0,00%	0,00%	0,60	21,20	1,00	1,00	78,20	0,09		0,00	0,00	
Edifício I 1	**PMG-17**	**B**	**06/05/2025**	0,00%	0,00%	0,80	21,00	1,00	1,00	78,20	0,01		0,00	0,00	
Edifício I 1	**PMG-18**	**A**	**06/05/2025**	0,00%	0,00%	0,20	20,90	2,00	0,00	78,90	0,01		0,00	0,00	
Edifício I 1	**PMG-18**	**B**	**06/05/2025**	0,00%	0,00%	1,60	19,80	2,00	0,00	78,70	-0,12		0,00	0,00	
Edifício I 1	**PMG-20**	**A**	**06/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,40	1,00	0,00	78,50	0,05		0,00	0,00	
Edifício I 1	**PMG-20**	**B**	**06/05/2025**	0,00%	0,00%	0,30	21,30	1,00	0,00	78,50	0,06		0,00	0,00	
Edifício I 1	**PMG-22**	**A**	**06/05/2025**	0,00%	0,00%	0,20	21,30	1,00	0,00	78,50	0,03		0,00	0,00	
Edifício I 1	**PMG-22**	**B**	**06/05/2025**	0,00%	0,00%	3,30	18,30	2,00	0,00	78,40	-0,03		0,00	0,00	
Edifício I 1	**PMG-23**	**A**	**06/05/2025**	0,00%	0,00%	0,50	20,90	1,00	0,00	78,70	0,03		0,00	0,00	
Edifício I 1	**PMG-23**	**B**	**06/05/2025**	0,00%	0,00%	0,90	20,50	2,00	1,00	78,60	0,03		0,00	0,00	
Edifício I 1	**PMG-113**	**A**	**06/05/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,20	2,00	0,00	78,70	0,02		0,00	0,00	
Edifício I 1	**PMG-113**	**B**	**06/05/2025**	0,00%	0,00%	1,10	20,20	2,00	0,00	78,60	0,00		0,00	0,00	
Edifício I 1	**PMG-114**	**A**	**06/05/2025**	0,00%	0,00%	0,20	21,30	2,00	0,00	78,60	0,03		0,00	0,00	
Edifício I 1	**PMG-114**	**B**	**06/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,40	2,00	0,00	78,50	0,01		0,00	0,00	
Edifício I 1	**PMG-115**	**A**	**06/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,20	2,00	0,00	78,70	0,06		0,00	0,00	
Edifício I 1	**PMG-115**	**B**	**06/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,30	2,00	0,00	78,60	-0,01		0,00	0,00	
Edifício I 1	**PMG-11**	**A**	**06/05/2025**	0,00%	0,00%	0,90	20,40	2,00	1,00	78,80	0,08		0,00	0,00	
Edifício I 1	**PMG-11**	**B**	**06/05/2025**	0,20%	0,20%	0,40	20,80	2,00	1,00	78,60	0,08		0,00	**32,00**	
Edifício I 1	**PMG-12**	**A**	**06/05/2025**	0,00%	0,00%	2,70	18,70	1,00	1,00	78,60	0,09		0,00	0,00	
Edifício I 1	**PMG-12**	**B**	**06/05/2025**	0,00%	0,00%	1,60	19,70	1,00	1,00	78,70	0,08		0,00	0,00	
Edifício I 1	**PMG-13**	**A**	**06/05/2025**	0,00%	0,00%	1,20	20,70	2,00	1,00	78,20	0,09		0,00	0,00	
Edifício I 1	**PMG-13**	**B**	**06/05/2025**	0,00%	0,00%	1,60	20,00	2,00	2,00	78,40	0,04		0,00	0,00	
Edifício I 1	**PMG-14**	**A**	**06/05/2025**	0,00%	0,00%	2,30	19,20	2,00	1,00	78,60	0,09		0,00	0,00	
Edifício I 1	**PMG-14**	**B**	**06/05/2025**	0,00%	0,00%	3,60	17,70	1,00	0,00	78,70	0,03		0,00	0,00	
Edifício I 1	**PMG-15**	**A**	**06/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,80	1,00	2,00	78,10	0,08		0,00	0,00	
Edifício I 1	**PMG-15**	**B**	**06/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,80	1,00	1,00	78,10	0,04		0,00	0,00	
Edifício I 1	**PMG-19**	**A**	**06/05/2025**	0,00%	0,00%	0,40	21,40	1,00	1,00	78,20	0,09		0,00	0,00	
Edifício I 1	**PMG-19**	**B**	**06/05/2025**	0,00%	0,00%	0,60	21,20	1,00	1,00	78,20	0,05		0,00	0,00	
Edifício I 1	**PMG-21**	**A**	**06/05/2025**	0,00%	0,00%	0,80	20,80	1,00	1,00	78,40	0,08		0,00	0,00	
Edifício I 1	**PMG-21**	**B**	**06/05/2025**	0,00%	0,00%	0,90	20,70	1,00	1,00	78,40	0,03		0,00	0,00	
Edifício I 1	**PMG-24**	**A**	**06/05/2025**	0,00%	0,00%	0,30	20,30	4,00	0,00	79,40	-0,02		0,00	0,00	
Edifício I 1	**PMG-24**	**B**	**06/05/2025**	0,00%	0,00%	0,50	20,20	3,00	0,00	79,30	-0,01		0,00	0,00	
Edifício I 1	**PMG-135**	**A**	**06/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,30	2,00	0,00	78,60	0,01		0,00	0,00	
Edifício I 1	**PMG -135**	**B**	**06/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,40	2,00	0,00	78,60	-0,04		0,00	0,00	
Edifício I 1	**PMG-136**	**B**	**06/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,30	2,00	0,00	78,60	0,02		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	**PMG-25**	**A**	**05/05/2025**	0,00%	0,00%	0,20	21,70	2,00	1,00	78,10	0,07		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	**PMG-25**	**B**	**05/05/2025**	0,00%	0,00%	1,20	20,60	1,00	1,00	78,20	0,07		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	**PMG-26**	**A**	**05/05/2025**	0,00%	0,00%	0,60	21,00	2,00	1,00	78,40	0,07		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	**PMG-26**	**B**	**05/05/2025**	0,00%	0,00%	1,00	20,40	2,00	2,00	78,60	0,03		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	**PMG-27**	**A**	**05/05/2025**	0,00%	0,00%	1,30	19,70	2,00	1,00	78,90	0,07		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	**PMG-27**	**B**	**05/05/2025**	0,00%	0,00%	3,30	18,00	2,00	1,00	78,60	0,01		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	**PMG-28**	**A**	**05/05/2025**	0,00%	0,00%	1,00	20,20	1,00	1,00	78,90	0,07		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	**PMG-28**	**B**	**05/05/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,80	2,00	1,00	78,20	0,08		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	**PMG-29**	**A**	**05/05/2025**	0,00%	0,00%	0,30	21,80	2,00	1,00	78,00	0,08		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	C02 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H_2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
I-5 Auditórios	PMG-29	B	05/05/2025	0,00%	0,00%	0,90	21,00	1,00	1,00	78,10	-0,03		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-44	A	05/05/2025	0,00%	0,00%	0,70	20,90	1,00	1,00	78,40	0,10		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-44	B	05/05/2025	0,00%	0,00%	0,70	21,00	1,00	1,00	78,30	-0,06		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-45	A	05/05/2025	0,00%	0,00%	0,50	20,30	1,00	1,00	79,20	-0,03		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-45	B	05/05/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,90	2,00	1,00	78,10	-0,22		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-134	B	05/05/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,90	1,00	1,00	78,00	0,24		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-30	A	05/05/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,40	2,00	0,00	78,50	0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-30	B	05/05/2025	0,00%	0,00%	1,00	20,60	2,00	0,00	78,40	-0,07		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-31	A	05/05/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,20	2,00	0,00	78,60	-0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-31	B	05/05/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,40	2,00	0,00	78,60	-0,05		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-32	A	09/05/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,30	3,00	0,00	78,60	-0,01		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-32	B	09/05/2025	0,00%	0,00%	0,70	20,80	3,00	0,00	78,50	0,04		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-33	A	05/05/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,40	1,00	1,00	78,40	0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-33	B	05/05/2025	0,00%	0,00%	3,30	18,20	2,00	0,00	78,50	0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-34	A	05/05/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,10	2,00	0,00	78,70	0,05		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-34	B	05/05/2025	0,00%	0,00%	1,00	20,70	1,00	0,00	78,30	0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-35	A	05/05/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,60	1,00	1,00	78,40	0,06		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-35	B	05/05/2025	0,00%	0,00%	0,80	20,90	2,00	1,00	78,20	0,07		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-36	A	05/05/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,60	1,00	1,00	78,30	0,06		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-36	B	05/05/2025	0,00%	0,00%	1,90	19,70	2,00	1,00	78,40	0,04		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-37	A	05/05/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,60	2,00	0,00	78,30	0,06		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-37	B	05/05/2025	0,00%	0,00%	0,90	20,90	2,00	1,00	78,10	0,04		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-38	A	05/05/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,60	2,00	0,00	78,30	0,19		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-38	B	05/05/2025	0,00%	0,00%	0,40	21,30	2,00	0,00	78,30	0,12		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-39	A	05/05/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,40	2,00	1,00	78,40	0,04		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-39	B	05/05/2025	0,00%	0,00%	7,80	14,10	2,00	1,00	78,10	-0,09		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-40	A	05/05/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,60	1,00	1,00	78,30	0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-40	B	05/05/2025	0,00%	0,00%	0,30	21,30	1,00	1,00	78,30	0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-41	A	05/05/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,40	2,00	0,00	78,60	-0,04		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-41	B	05/05/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,40	2,00	0,00	78,50	0,00		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-42	A	05/05/2025	0,00%	0,00%	0,60	21,00	2,00	0,00	78,40	0,02		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-42	B	05/05/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,50	2,00	0,00	78,50	-0,01		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-43	A	05/05/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,50	1,00	0,00	78,40	0,02		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-43	B	05/05/2025	0,00%	0,00%	0,60	21,10	2,00	0,00	78,40	-0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-132	A	05/05/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,10	2,00	0,00	78,70	0,00		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-132	B	05/05/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,20	2,00	0,00	78,70	-0,07		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-133	A	05/05/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,50	1,00	1,00	78,30	0,09		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-133	B	05/05/2025	0,00%	0,00%	0,50	21,20	2,00	0,00	78,30	0,05		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-63	A	07/05/2025	0,00%	0,00%	0,10	22,00	2,00	1,00	78,00	0,15		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-63	B	07/05/2025	0,00%	0,00%	0,10	22,00	2,00	0,00	77,90	-0,02		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-64	A	07/05/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,80	1,00	2,00	78,10	0,02		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-64	B	07/05/2025	0,00%	0,00%	0,30	21,50	1,00	1,00	78,20	0,08		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-65	A	07/05/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,70	2,00	1,00	78,30	0,06		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-65	B	07/05/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,80	2,00	1,00	78,10	0,01		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-66	A	07/05/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,70	1,00	1,00	78,20	0,08		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-66	B	07/05/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,70	2,00	1,00	78,20	0,08		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-67	A	07/05/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,80	2,00	1,00	78,20	0,03		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-67	B	07/05/2025	0,00%	0,00%	0,50	21,40	2,00	2,00	78,10	0,02		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-68	A	07/05/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,80	2,00	1,00	78,20	0,14		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-68	B	07/05/2025	0,00%	0,00%	0,50	21,10	2,00	2,00	78,40	0,07		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-69	A	07/05/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,90	2,00	0,00	78,00	0,06		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-69	B	07/05/2025	0,00%	0,00%	2,30	19,10	2,00	1,00	78,60	0,05		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-77	A	07/05/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,80	3,00	1,00	78,20	0,08		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	C02 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H_2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
Edifício I-4	**PMG-77**	**B**	**07/05/2025**	0,00%	0,00%	0,70	20,80	3,00	1,00	78,60	0,00		0,00	0,00	
Edifício I-4	**PMG-78**	**A**	**07/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,70	3,00	1,00	78,20	0,08		0,00	0,00	
Edifício I-4	**PMG-78**	**B**	**07/05/2025**	0,00%	0,00%	1,20	20,10	2,00	1,00	78,60	-0,02		0,00	0,00	
Edifício I-4	**PMG-79**	**A**	**07/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,80	2,00	1,00	78,20	0,10		0,00	0,00	
Edifício I-4	**PMG-79**	**B**	**07/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,80	2,00	1,00	78,20	0,08		0,00	0,00	
Edifício I-4	**PMG-80**	**A**	**07/05/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,90	2,00	1,00	78,10	0,09		0,00	0,00	
Edifício I-4	**PMG-80**	**B**	**07/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,10	2,00	1,00	78,80	0,13		0,00	0,00	
Edifício I-4	**PMG-81**	**A**	**07/05/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,90	1,00	1,00	78,10	0,12		0,00	0,00	
Edifício I-4	**PMG-81**	**B**	**07/05/2025**	0,00%	0,00%	0,50	21,40	2,00	1,00	78,10	-0,16		0,00	0,00	
Edifício I-4	**PMG-144**	**B**	**07/05/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,80	2,00	1,00	78,10	0,06		0,00	0,00	
Edifício I-4	**PMG-145**	**B**	**07/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,60	2,00	1,00	78,30	0,03		0,00	0,00	
Edifício I-4	**PMG-146**	**B**	**07/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,90	2,00	1,00	78,10	0,08		0,00	0,00	
Edifício I-4	**PMG-147**	**B**	**07/05/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,80	2,00	1,00	78,20	0,04		0,00	0,00	
Edifício I-4	**PMG-148**	**B**	**07/05/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,90	1,00	0,00	78,10	0,08		0,00	0,00	
Edifício I-4	**PMG-149**	**B**	**07/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,90	1,00	1,00	78,10	0,02		0,00	0,00	
Edifício I-4	**PMG-150**	**B**	**07/05/2025**	0,00%	0,00%	3,30	17,10	2,00	0,00	79,60	0,09		0,00	0,00	
Edifício I-4	**PMG-151**	**B**	**07/05/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,80	2,00	1,00	78,20	-0,10		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-46**	**A**	**07/05/2025**	0,00%	0,00%	0,30	21,40	2,00	1,00	78,30	0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-46**	**B**	**07/05/2025**	0,00%	0,00%	2,50	19,00	2,00	1,00	78,40	0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-47**	**A**	**07/05/2025**	0,00%	0,00%	0,20	21,50	1,00	1,00	78,30	0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-47**	**B**	**07/05/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,80	1,00	1,00	78,20	0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-48**	**A**	**07/05/2025**	0,00%	0,00%	0,20	21,60	1,00	2,00	78,20	0,09		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-48**	**B**	**07/05/2025**	0,00%	0,00%	0,40	21,40	1,00	1,00	78,30	0,06		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-49**	**A**	**07/05/2025**	0,00%	0,00%	0,40	21,50	1,00	1,00	78,20	0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-49**	**B**	**07/05/2025**	0,00%	0,00%	2,60	19,20	2,00	1,00	78,20	0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-50**	**A**	**07/05/2025**	0,00%	0,00%	0,20	21,60	1,00	1,00	78,20	0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-50**	**B**	**07/05/2025**	0,00%	0,00%	2,50	19,70	1,00	1,00	77,80	0,09		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-51**	**A**	**07/05/2025**	0,00%	0,00%	0,20	21,50	1,00	0,00	78,30	0,04		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-51**	**B**	**07/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,70	2,00	1,00	78,30	0,00		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-52**	**A**	**07/05/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,70	2,00	0,00	78,30	0,02		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-52**	**B**	**07/05/2025**	0,00%	0,00%	0,20	21,60	2,00	1,00	78,30	0,04		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-53**	**A**	**07/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,70	2,00	1,00	78,20	0,02		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-53**	**B**	**07/05/2025**	0,00%	0,00%	0,60	20,60	2,00	0,00	78,80	0,00		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-54**	**A**	**07/05/2025**	0,00%	0,00%	0,20	21,00	2,00	0,00	78,80	0,02		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-54**	**B**	**07/05/2025**	0,00%	0,00%	3,00	16,90	2,00	0,00	80,10	-0,01		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-55**	**A**	**07/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,80	3,00	0,00	78,10	-0,04		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-55**	**B**	**07/05/2025**	0,00%	0,00%	4,40	16,30	2,00	0,00	79,30	-0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-56**	**A**	**07/05/2025**	0,00%	0,00%	0,20	21,20	1,00	1,00	78,60	0,07		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-56**	**B**	**07/05/2025**	0,00%	0,00%	1,10	20,90	2,00	1,00	78,00	0,00		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-57**	**A**	**07/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,60	2,00	1,00	78,30	0,01		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-57**	**B**	**07/05/2025**	0,00%	0,00%	1,40	20,70	1,00	2,00	77,90	0,07		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-58**	**A**	**07/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,70	1,00	1,00	78,20	0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-58**	**B**	**07/05/2025**	0,00%	0,00%	1,50	20,50	2,00	1,00	78,00	0,11		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-59**	**A**	**07/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,80	2,00	1,00	78,20	0,07		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-59**	**B**	**07/05/2025**	0,00%	0,00%	1,00	21,00	2,00	1,00	78,00	0,07		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-60**	**A**	**07/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,60	2,00	1,00	78,30	0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-60**	**B**	**07/05/2025**	0,00%	0,00%	2,80	18,70	2,00	1,00	78,40	0,04		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-61**	**A**	**07/05/2025**	0,00%	0,00%	0,20	21,50	2,00	1,00	78,30	-0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-61**	**B**	**07/05/2025**	0,00%	0,00%	6,90	13,80	2,00	1,00	79,30	0,05		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-137**	**B**	**07/05/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,80	1,00	1,00	78,10	0,05		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-138**	**B**	**07/05/2025**	0,00%	0,00%	2,30	20,20	2,00	1,00	77,50	0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-139**	**A**	**07/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,60	1,00	0,00	78,30	-0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-139**	**B**	**07/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,60	2,00	0,00	78,30	-0,03		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	C02 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H_2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
Conjunto Laboratorial	**PMG-140**	**A**	**07/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,70	1,00	1,00	78,30	0,04		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-140**	**B**	**07/05/2025**	0,10%	0,10%	0,10	21,40	2,00	1,00	78,40	0,03		0,00	**6,00**	
Conjunto Laboratorial	**PMG-141**	**B**	**07/05/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,70	2,00	0,00	78,30	0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-62**	**A**	**07/05/2025**	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	Não medido. Sala em reforma.
Conjunto Laboratorial	**PMG-62**	**B**	**07/05/2025**	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	Não medido. Sala em reforma.
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-01**	**A**	**06/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,80	2,00	1,00	78,10	0,07		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-01**	**B**	**06/05/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,80	2,00	1,00	78,10	0,08		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-02**	**A**	**06/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,70	1,00	1,00	78,20	0,08		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-02**	**B**	**06/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,80	1,00	1,00	78,20	0,04		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-03**	**A**	**06/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,70	1,00	1,00	78,20	0,11		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-03**	**B**	**06/05/2025**	0,00%	0,00%	1,90	19,80	2,00	1,00	78,30	0,01		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-04**	**A**	**06/05/2025**	0,00%	0,00%	0,20	21,50	1,00	1,00	78,20	0,11		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-04**	**B**	**06/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,80	1,00	1,00	78,10	0,08		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-05**	**A**	**06/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,80	1,00	1,00	78,10	0,03		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-05**	**B**	**06/05/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,80	1,00	1,00	78,10	0,10		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-06**	**A**	**06/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,70	1,00	1,00	78,20	0,00		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-06**	**B**	**06/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,70	2,00	1,00	78,20	0,01		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-07**	**A**	**06/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,80	1,00	1,00	78,20	0,03		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-07**	**B**	**06/05/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,80	1,00	1,00	78,20	0,08		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-08**	**A**	**06/05/2025**	0,00%	0,00%	0,20	21,30	1,00	0,00	78,40	0,06		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-08**	**B**	**06/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,70	1,00	0,00	78,20	0,03		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-09**	**A**	**08/05/2025**	0,00%	0,00%	1,60	19,90	2,00	1,00	78,50	0,04		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-09**	**B**	**08/05/2025**	0,00%	0,00%	5,10	15,80	1,00	2,00	79,10	-0,07		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-10**	**A**	**08/05/2025**	0,00%	0,00%	0,60	20,80	1,00	1,00	78,60	0,09		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-10**	**B**	**08/05/2025**	0,00%	0,00%	2,30	18,70	1,00	1,00	79,00	0,07		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-84**	**A**	**06/05/2025**	0,00%	0,00%	0,20	21,50	2,00	0,00	78,30	0,04		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-84**	**B**	**06/05/2025**	0,00%	0,00%	2,90	19,30	2,00	1,00	77,70	0,07		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-85**	**A**	**06/05/2025**	0,00%	0,00%	0,90	20,90	1,00	1,00	78,10	0,05		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-85**	**B**	**06/05/2025**	0,00%	0,00%	1,80	20,60	1,00	0,00	77,60	0,05		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-86**	**A**	**06/05/2025**	0,00%	0,00%	0,20	21,50	1,00	1,00	78,30	-0,01		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-86**	**B**	**06/05/2025**	0,00%	0,00%	1,10	20,20	1,00	1,00	78,70	0,03		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-87**	**A**	**06/05/2025**	0,00%	0,00%	2,60	17,50	1,00	1,00	79,90	0,08		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-87**	**B**	**06/05/2025**	0,00%	0,00%	2,50	18,40	1,00	1,00	79,10	0,05		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-152**	**A**	**08/05/2025**	0,00%	0,00%	0,20	21,40	2,00	1,00	78,40	0,15		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-152**	**B**	**08/05/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,70	2,00	1,00	78,30	-0,03		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-153**	**B**	**06/05/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,90	2,00	0,00	78,10	-0,08		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-154**	**B**	**06/05/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,80	2,00	1,00	78,10	0,09		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-155**	**B**	**06/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,60	2,00	1,00	78,30	0,06		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-156**	**B**	**06/05/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,80	2,00	2,00	78,20	0,02		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-157**	**B**	**06/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,80	2,00	1,00	78,10	0,03		0,00	0,00	
Enfermaria	**PMG-70**	**A**	**08/05/2025**	0,00%	0,00%	0,20	21,30	2,00	1,00	78,60	0,08		0,00	0,00	
Enfermaria	**PMG-70**	**B**	**08/05/2025**	0,00%	0,00%	0,90	19,70	1,00	1,00	79,50	-0,02		0,00	0,00	
Enfermaria	**PMG-71**	**A**	**08/05/2025**	0,00%	0,00%	0,20	21,10	1,00	1,00	78,70	0,05		0,00	0,00	
Enfermaria	**PMG-71**	**B**	**08/05/2025**	0,30%	0,30%	1,90	3,10	2,00	1,00	94,70	-0,32		0,00	**6,00**	
Enfermaria	**PMG-72**	**A**	**08/05/2025**	0,00%	0,00%	0,40	20,70	1,00	1,00	78,90	0,04		0,00	0,00	
Enfermaria	**PMG-72**	**B**	**08/05/2025**	0,00%	0,00%	1,30	19,10	2,00	1,00	79,60	0,00		0,00	0,00	
Enfermaria	**PMG-73**	**A**	**08/05/2025**	0,00%	0,00%	0,20	21,20	1,00	1,00	78,60	0,09		0,00	0,00	
Enfermaria	**PMG-73**	**B**	**08/05/2025**	0,00%	0,00%	0,50	20,80	1,00	1,00	78,60	0,07		0,00	0,00	
Enfermaria	**PMG-74**	**A**	**08/05/2025**	0,00%	0,00%	0,40	20,60	2,00	1,00	79,00	0,02		0,00	0,00	
Enfermaria	**PMG-74**	**B**	**08/05/2025**	0,70%	0,70%	1,10	14,00	2,00	1,00	84,20	0,07		0,00	**25,00**	
Enfermaria	**PMG-75**	**A**	**08/05/2025**	0,00%	0,00%	0,50	20,30	1,00	1,00	79,10	0,08		0,00	0,00	
Enfermaria	**PMG-75**	**B**	**08/05/2025**	0,00%	0,00%	3,00	15,10	2,00	1,00	81,90	0,06		0,00	0,00	
Enfermaria	**PMG-76**	**A**	**08/05/2025**	0,00%	0,00%	0,50	20,50	1,00	1,00	79,00	0,06		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	C02 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H_2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
Enfermaria	**PMG-76**	**B**	**08/05/2025**	0,00%	0,00%	1,90	16,20	2,00	1,00	82,00	-0,24		0,00	0,00	
Enfermaria	**PMG-165**	**A**	**08/05/2025**	0,00%	0,00%	0,60	20,30	1,00	1,00	79,10	-0,02		0,00	0,00	
Enfermaria	**PMG-165**	**B**	**08/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,40	2,00	1,00	78,60	0,00		0,00	0,00	
CAT	**PMG-82**	**A**	**08/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,70	3,00	0,00	78,30	-0,10		0,00	0,00	
CAT	**PMG-82**	**B**	**08/05/2025**	0,00%	0,00%	2,90	19,80	3,00	0,00	77,30	0,03		0,00	0,00	
CAT	**PMG-83**	**A**	**08/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,40	2,00	0,00	78,50	0,02		0,00	0,00	
CAT	**PMG-83**	**B**	**08/05/2025**	0,00%	0,00%	1,80	20,00	3,00	0,00	78,20	0,04		0,00	0,00	
CAT	**PMG-94**	**A**	**08/05/2025**	0,00%	0,00%	0,20	21,30	2,00	0,00	78,50	-0,01		0,00	0,00	
CAT	**PMG-94**	**B**	**08/05/2025**	0,00%	0,00%	4,40	17,10	2,00	0,00	78,50	-0,03		0,00	0,00	
CAT	**PMG-95**	**A**	**08/05/2025**	0,00%	0,00%	1,00	20,40	2,00	0,00	78,50	0,01		0,00	0,00	
CAT	**PMG-95**	**B**	**08/05/2025**	0,00%	0,00%	1,80	20,20	2,00	0,00	78,00	0,01		0,00	0,00	
CAT	**PMG-96**	**A**	**08/05/2025**	0,00%	0,00%	0,20	21,20	2,00	0,00	78,60	0,04		0,00	0,00	
CAT	**PMG-96**	**B**	**08/05/2025**	0,00%	0,00%	4,10	15,90	2,00	1,00	80,00	-0,01		0,00	0,00	
CAT	**PMG-97**	**A**	**08/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,00	2,00	0,00	78,90	0,04		0,00	0,00	
CAT	**PMG-97**	**B**	**08/05/2025**	0,00%	0,00%	3,40	17,40	1,00	0,00	79,20	-0,01		0,00	0,00	
CAT	**PMG-98**	**A**	**08/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,50	2,00	0,00	78,50	-0,03		0,00	0,00	
CAT	**PMG-98**	**B**	**08/05/2025**	0,00%	0,00%	0,50	21,00	2,00	0,00	78,60	0,03		0,00	0,00	
CAT	**PMG-160**	**A**	**08/05/2025**	0,00%	0,00%	0,20	21,50	4,00	0,00	78,30	-0,12		0,00	0,00	
CAT	**PMG-160**	**B**	**08/05/2025**	0,00%	0,00%	3,20	18,40	3,00	0,00	78,40	-0,04		0,00	0,00	
CAT	**PMG-161**	**A**	**08/05/2025**	0,00%	0,00%	1,70	19,80	2,00	0,00	78,50	0,06		0,00	0,00	
CAT	**PMG-161**	**B**	**08/05/2025**	0,00%	0,00%	2,50	19,10	2,00	0,00	78,30	-0,03		0,00	0,00	
Incubadora	**PMG-88**	**A**	**08/05/2025**	0,00%	0,00%	0,20	21,50	1,00	1,00	78,30	0,01		0,00	0,00	
Incubadora	**PMG-88**	**B**	**08/05/2025**	0,00%	0,00%	0,20	21,50	1,00	1,00	78,20	0,00		0,00	0,00	
Incubadora	**PMG-89**	**A**	**08/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,60	1,00	1,00	78,30	0,07		0,00	0,00	
Incubadora	**PMG-89**	**B**	**08/05/2025**	0,00%	0,00%	0,60	21,00	1,00	1,00	78,30	0,11		0,00	0,00	
Incubadora	**PMG-90**	**A**	**08/05/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,70	2,00	1,00	78,30	-0,02		0,00	0,00	
Incubadora	**PMG-90**	**B**	**08/05/2025**	0,00%	0,00%	0,30	21,40	2,00	1,00	78,30	0,12		0,00	0,00	
Incubadora	**PMG-91**	**A**	**08/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,60	2,00	1,00	78,30	0,05		0,00	0,00	
Incubadora	**PMG-91**	**B**	**08/05/2025**	0,00%	0,00%	1,30	20,30	1,00	0,00	78,30	0,07		0,00	0,00	
Incubadora	**PMG-92**	**A**	**08/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,50	1,00	0,00	78,40	0,10		0,00	0,00	
Incubadora	**PMG-92**	**B**	**08/05/2025**	0,00%	0,00%	0,80	20,80	2,00	1,00	78,30	0,06		0,00	0,00	
Incubadora	**PMG-93**	**A**	**08/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,50	1,00	0,00	78,30	0,06		0,00	0,00	
Incubadora	**PMG-93**	**B**	**08/05/2025**	0,00%	0,00%	1,00	20,70	1,00	1,00	78,30	-0,11		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-102**		**05/05/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,80	2,00	2,00	78,20	0,09		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-103**		**05/05/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,70	1,00	1,00	78,20	0,08		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-104**		**05/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,80	1,00	1,00	78,20	0,03		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-105**		**05/05/2025**	0,00%	0,00%	1,00	20,70	2,00	2,00	78,30	0,05		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-106**		**05/05/2025**	0,00%	0,00%	0,20	21,20	2,00	2,00	78,60	0,03		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-107**		**05/05/2025**	0,00%	0,00%	2,60	17,60	1,00	1,00	79,80	0,08		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-108**		**05/05/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,80	2,00	1,00	78,10	0,06		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-109**	**A**	**05/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,90	1,00	1,00	78,00	0,04		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-109**	**B**	**05/05/2025**	0,00%	0,00%	1,00	20,90	2,00	1,00	78,10	0,07		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-110**	**A**	**05/05/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,70	1,00	1,00	78,30	0,35		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-110**	**B**	**05/05/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,70	2,00	1,00	78,20	0,15		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-111**	**A**	**05/05/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,80	2,00	2,00	78,20	0,07		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-111**	**B**	**05/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,60	1,00	1,00	78,30	0,00		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-112**		**05/05/2025**	0,00%	0,00%	0,00	22,00	2,00	1,00	78,00	0,07		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-162**	**A**	**05/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,60	2,00	1,00	78,40	0,05		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-162**	**B**	**05/05/2025**	0,00%	0,00%	6,70	10,00	2,00	1,00	83,30	0,05		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-166**	**A**	**05/05/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,80	1,00	1,00	78,20	0,04		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-166**	**B**	**05/05/2025**	0,00%	0,00%	1,30	19,00	1,00	2,00	79,70	0,08		0,00	0,00	
Portaria P3	**PMG-119**	**A**	**05/05/2025**	0,00%	0,00%	0,00	22,00	2,00	1,00	78,00	0,09		0,00	0,00	
Portaria P3	**PMG-119**	**B**	**05/05/2025**	0,00%	0,00%	0,00	22,00	1,00	1,00	78,00	0,10		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	C02 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H_2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
Portaria P3	**PMG-119**	**C**	**05/05/2025**	0,00%	0,00%	0,00	22,00	2,00	1,00	77,90	0,03		0,00	0,00	
Portaria P3	**PMG-120**	**A**	**05/05/2025**	0,00%	0,00%	0,00	22,00	1,00	2,00	78,00	-0,06		0,00	0,00	
Portaria P3	**PMG-120**	**B**	**05/05/2025**	0,00%	0,00%	0,00	22,00	2,00	1,00	78,00	0,25		0,00	0,00	
Portaria P3	**PMG-120**	**C**	**05/05/2025**	0,00%	0,00%	0,00	22,00	1,00	1,00	77,90	0,13		0,00	0,00	
Portaria P3	**PMG-163**	**B**	**05/05/2025**	0,00%	0,00%	0,00	22,10	2,00	1,00	77,90	0,04		0,00	0,00	
Portaria P3	**PMG-164**	**B**	**05/05/2025**	0,00%	0,00%	0,00	22,00	1,00	1,00	77,90	0,08		0,00	0,00	
Portaria P3	**PMG-164**	**C**	**05/05/2025**	0,00%	0,00%	0,00	22,00	2,00	0,00	78,00	0,08		0,00	0,00	
Transportes	**PMG-121**	**A**	**12/05/2025**	0,00%	0,00%	0,20	22,00	2,00	1,00	77,80	0,03		0,00	0,00	
Transportes	**PMG-121**	**B**	**12/05/2025**	0,00%	0,00%	3,80	16,00	1,00	1,00	80,20	0,06		0,00	0,00	
Transportes	**PMG-122**	**A**	**12/05/2025**	0,00%	0,00%	0,20	21,70	1,00	0,00	78,10	0,04		0,00	0,00	
Transportes	**PMG-122**	**B**	**12/05/2025**	0,00%	0,00%	5,90	15,70	2,00	1,00	78,40	0,05		0,00	0,00	
Transportes	**PMG-123**	**A**	**12/05/2025**	0,00%	0,00%	0,60	21,50	1,00	1,00	77,90	-0,06		0,00	0,00	
Transportes	**PMG-123**	**B**	**12/05/2025**	0,00%	0,00%	1,70	20,20	2,00	1,00	78,10	-0,07		0,00	0,00	
Transportes	**PMG-124**	**A**	**12/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	22,00	2,00	1,00	77,90	0,00		0,00	0,00	
Transportes	**PMG-124**	**B**	**12/05/2025**	0,00%	0,00%	2,60	19,90	2,00	1,00	77,50	0,00		0,00	0,00	
Transportes	**PMG-158**	**B**	**12/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,80	1,00	1,00	78,10	0,03		0,00	0,00	
Transportes	**PMG-159**	**B**	**12/05/2025**	0,00%	0,00%	0,90	20,80	1,00	1,00	78,30	0,08		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	**PMG-125**	**A**	**08/05/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,60	2,00	1,00	78,40	0,08		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	**PMG-125**	**B**	**08/05/2025**	0,00%	0,00%	4,90	17,60	2,00	1,00	77,50	0,08		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	**PMG-126**	**A**	**08/05/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,50	1,00	1,00	78,50	0,06		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	**PMG-126**	**B**	**08/05/2025**	0,00%	0,00%	6,80	15,60	2,00	1,00	77,50	-0,08		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	**PMG-127**	**A**	**08/05/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,50	1,00	1,00	78,50	0,08		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	**PMG-127**	**B**	**08/05/2025**	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	Não medido. Agua durante a medição.
Posto Guarda Universitário	**PMG-128**	**A**	**08/05/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,50	1,00	1,00	78,50	0,08		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	**PMG-128**	**B**	**08/05/2025**	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	Não medido. Agua durante a medição.
Posto Guarda Universitário	**PMG-129**	**A**	**08/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,50	1,00	2,00	78,40	0,06		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	**PMG-129**	**B**	**08/05/2025**	0,00%	0,00%	1,20	20,30	1,00	1,00	78,50	0,06		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	**PMG-130**	**A**	**08/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,50	1,00	1,00	78,50	0,08		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	**PMG-130**	**B**	**08/05/2025**	0,00%	0,00%	4,10	17,60	1,00	1,00	78,30	-0,74		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	**PMG-131**	**A**	**08/05/2025**	0,00%	0,00%	0,40	20,90	1,00	1,00	78,70	0,11		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	**PMG-131**	**B**	**08/05/2025**	0,00%	0,00%	0,90	20,50	2,00	2,00	78,60	0,29		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-16**	**A**	**13/05/2025**	0,00%	0,00%	1,90	20,00	1,00	1,00	78,10	0,03		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-16**	**B**	**13/05/2025**	0,00%	0,00%	2,50	19,30	1,00	0,00	78,20	-0,03		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-17**	**A**	**13/05/2025**	0,00%	0,00%	0,40	21,50	2,00	1,00	78,10	0,08		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-17**	**B**	**13/05/2025**	0,00%	0,00%	1,40	20,50	2,00	1,00	78,10	0,01		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-18**	**A**	**13/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	20,70	3,00	0,00	79,10	-0,06		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-18**	**B**	**13/05/2025**	0,00%	0,00%	1,20	19,90	2,00	0,00	78,90	-0,08		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-20**	**A**	**13/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,50	1,00	0,00	78,40	0,02		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-20**	**B**	**13/05/2025**	0,00%	0,00%	0,20	21,50	1,00	0,00	78,40	-0,03		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-22**	**A**	**13/05/2025**	0,00%	0,00%	0,20	21,30	1,00	0,00	78,50	0,01		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-22**	**B**	**13/05/2025**	0,00%	0,00%	3,60	17,50	1,00	0,00	78,90	-0,08		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-23**	**A**	**13/05/2025**	0,00%	0,00%	0,30	21,20	1,00	0,00	78,50	0,03		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-23**	**B**	**13/05/2025**	0,00%	0,00%	1,10	20,50	1,00	0,00	78,40	0,00		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-113**	**A**	**13/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,10	2,00	0,00	78,80	-0,03		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-113**	**B**	**13/05/2025**	0,00%	0,00%	1,20	20,10	2,00	0,00	78,70	0,00		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-114**	**A**	**13/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,30	2,00	0,00	78,50	-0,03		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-114**	**B**	**13/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,40	1,00	0,00	78,50	-0,03		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-115**	**A**	**13/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,20	1,00	0,00	78,70	0,03		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-115**	**B**	**13/05/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,30	2,00	0,00	78,60	-0,06		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-11**	**A**	**13/05/2025**	0,00%	0,00%	0,60	21,30	1,00	1,00	78,10	0,08		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-11**	**B**	**13/05/2025**	0,40%	0,40%	0,50	21,20	1,00	1,00	77,90	-0,12		0,00	**35,00**	
Edificio I 1	**PMG-12**	**A**	**13/05/2025**	0,00%	0,00%	2,20	19,30	1,00	1,00	78,50	0,03		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-12**	**B**	**13/05/2025**	0,00%	0,00%	2,60	18,80	1,00	1,00	78,60	0,14		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	C02 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H_2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
Edificio I 1	**PMG-13**	**A**	**13/05/2025**	0,00%	0,00%	1,10	20,80	1,00	1,00	78,10	0,06		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-13**	**B**	**13/05/2025**	0,00%	0,00%	1,50	20,50	2,00	1,00	78,10	0,06		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-14**	**A**	**13/05/2025**	0,00%	0,00%	1,80	20,10	1,00	1,00	78,10	0,07		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-14**	**B**	**13/05/2025**	0,00%	0,00%	3,30	18,50	1,00	1,00	78,20	0,00		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-15**	**A**	**13/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,90	2,00	1,00	78,00	0,06		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-15**	**B**	**13/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,90	2,00	1,00	78,00	0,00		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-19**	**A**	**13/05/2025**	0,00%	0,00%	0,30	21,70	1,00	1,00	78,00	0,07		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-19**	**B**	**13/05/2025**	0,00%	0,00%	0,60	21,30	1,00	1,00	78,10	0,07		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-21**	**A**	**13/05/2025**	0,00%	0,00%	0,70	21,30	1,00	1,00	78,00	0,07		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-21**	**B**	**13/05/2025**	0,00%	0,00%	1,20	20,70	1,00	1,00	78,10	-0,01		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-24**	**A**	**13/05/2025**	0,00%	0,00%	0,20	21,80	1,00	1,00	78,00	0,04		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-24**	**B**	**13/05/2025**	0,00%	0,00%	0,20	21,80	1,00	1,00	78,00	0,00		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-135**	**A**	**13/05/2025**	0,00%	0,00%	0,20	21,30	1,00	0,00	78,60	-0,02		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG -135**	**B**	**13/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,40	1,00	0,00	78,50	-0,02		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-136**	**B**	**13/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,40	2,00	0,00	78,60	-0,06		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	**PMG-25**	**A**	**12/05/2025**	0,00%	0,00%	0,20	21,80	1,00	1,00	78,00	0,03		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	**PMG-25**	**B**	**12/05/2025**	0,00%	0,00%	1,00	20,90	1,00	1,00	78,10	0,05		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	**PMG-26**	**A**	**12/05/2025**	0,00%	0,00%	0,30	21,70	1,00	1,00	78,00	0,05		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	**PMG-26**	**B**	**12/05/2025**	0,00%	0,00%	1,10	20,70	1,00	1,00	78,20	0,08		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	**PMG-27**	**A**	**12/05/2025**	0,00%	0,00%	1,20	20,60	1,00	1,00	78,20	0,06		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	**PMG-27**	**B**	**12/05/2025**	0,00%	0,00%	2,60	19,00	2,00	1,00	78,40	0,15		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	**PMG-28**	**A**	**12/05/2025**	0,00%	0,00%	0,90	20,70	1,00	1,00	78,40	0,04		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	**PMG-28**	**B**	**12/05/2025**	0,00%	0,00%	0,00	22,00	2,00	1,00	77,90	-0,05		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	**PMG-29**	**A**	**12/05/2025**	0,00%	0,00%	0,40	21,80	1,00	1,00	77,80	0,02		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	**PMG-29**	**B**	**12/05/2025**	0,00%	0,00%	1,00	21,00	1,00	1,00	78,10	-0,02		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	**PMG-44**	**A**	**12/05/2025**	0,00%	0,00%	0,70	21,30	1,00	1,00	78,00	0,04		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	**PMG-44**	**B**	**12/05/2025**	0,00%	0,00%	0,80	21,20	2,00	1,00	77,90	0,12		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	**PMG-45**	**A**	**12/05/2025**	0,00%	0,00%	0,40	21,00	1,00	1,00	78,60	0,00		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	**PMG-45**	**B**	**12/05/2025**	0,00%	0,00%	0,00	22,00	2,00	0,00	78,00	0,01		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	**PMG-134**	**B**	**12/05/2025**	0,00%	0,00%	0,00	22,00	1,00	1,00	78,00	0,13		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-30**	**A**	**12/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,20	2,00	0,00	78,70	0,00		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-30**	**B**	**12/05/2025**	0,00%	0,00%	0,70	20,70	2,00	0,00	78,60	0,01		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-31**	**A**	**12/05/2025**	0,00%	0,00%	0,20	20,90	2,00	0,00	78,90	0,00		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-31**	**B**	**12/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,10	3,00	0,00	78,80	-0,27		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-32**	**A**	**15/05/2025**	0,00%	0,00%	0,20	21,80	1,00	1,00	78,10	0,11		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-32**	**B**	**15/05/2025**	0,00%	0,00%	0,90	21,10	1,00	1,00	78,00	0,13		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-33**	**A**	**12/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,50	1,00	0,00	78,40	0,04		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-33**	**B**	**12/05/2025**	0,00%	0,00%	3,00	18,50	2,00	0,00	78,50	0,00		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-34**	**A**	**12/05/2025**	0,00%	0,00%	0,20	21,20	1,00	0,00	78,60	0,00		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-34**	**B**	**12/05/2025**	0,00%	0,00%	0,90	20,90	2,00	0,00	78,20	-0,01		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-35**	**A**	**12/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,80	2,00	1,00	78,10	0,04		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-35**	**B**	**12/05/2025**	0,00%	0,00%	0,60	21,20	2,00	1,00	78,20	-0,04		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-36**	**A**	**12/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,80	1,00	0,00	78,10	-0,02		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-36**	**B**	**12/05/2025**	0,00%	0,00%	2,30	19,30	1,00	1,00	78,30	0,13		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-37**	**A**	**12/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,70	1,00	1,00	78,20	0,04		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-37**	**B**	**12/05/2025**	0,00%	0,00%	1,00	21,00	1,00	0,00	78,00	-0,17		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-38**	**A**	**12/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,60	1,00	0,00	78,30	0,07		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-38**	**B**	**12/05/2025**	0,00%	0,00%	0,30	21,40	1,00	0,00	78,30	0,00		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-39**	**A**	**12/05/2025**	0,00%	0,00%	0,20	21,40	1,00	1,00	78,40	0,01		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-39**	**B**	**12/05/2025**	0,00%	0,00%	7,70	14,30	2,00	0,00	78,10	-0,12		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-40**	**A**	**12/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,70	1,00	0,00	78,20	0,00		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-40**	**B**	**12/05/2025**	0,00%	0,00%	0,30	21,40	1,00	1,00	78,30	0,00		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-41**	**A**	**12/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,40	2,00	0,00	78,50	0,02		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	C02 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H_2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
I-3 Biblioteca	PMG-41	B	12/05/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,40	2,00	0,00	78,50	-0,05		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-42	A	12/05/2025	0,00%	0,00%	0,70	20,90	2,00	0,00	78,40	-0,02		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-42	B	12/05/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,40	1,00	0,00	78,50	0,01		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-43	A	12/05/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,50	1,00	0,00	78,50	0,00		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-43	B	12/05/2025	0,00%	0,00%	0,60	21,00	1,00	0,00	78,40	-0,05		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-132	A	12/05/2025	0,00%	0,00%	0,40	20,50	3,00	0,00	79,00	-0,04		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-132	B	12/05/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,80	3,00	0,00	79,10	-0,12		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-133	A	12/05/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,50	1,00	1,00	78,30	0,00		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-133	B	12/05/2025	0,00%	0,00%	0,50	21,30	1,00	0,00	78,30	0,09		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-63	A	14/05/2025	0,00%	0,00%	0,10	22,00	1,00	1,00	77,90	0,06		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-63	B	14/05/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,90	1,00	1,00	77,90	0,03		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-64	A	14/05/2025	0,00%	0,00%	0,00	22,00	1,00	1,00	77,90	0,03		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-64	B	14/05/2025	0,00%	0,00%	0,50	21,60	1,00	0,00	78,00	0,02		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-65	A	14/05/2025	0,00%	0,00%	0,00	22,00	2,00	0,00	77,90	0,00		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-65	B	14/05/2025	0,00%	0,00%	0,00	22,10	2,00	0,00	77,90	0,03		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-66	A	14/05/2025	0,00%	0,00%	0,10	22,00	1,00	0,00	77,90	-0,04		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-66	B	14/05/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,90	2,00	0,00	77,90	0,02		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-67	A	14/05/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,90	3,00	1,00	78,00	0,08		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-67	B	14/05/2025	0,00%	0,00%	0,50	21,50	2,00	1,00	78,00	0,03		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-68	A	14/05/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,90	2,00	1,00	78,00	0,09		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-68	B	14/05/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,90	1,00	1,00	78,00	0,08		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-69	A	14/05/2025	0,00%	0,00%	0,10	22,10	1,00	0,00	77,90	-0,03		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-69	B	14/05/2025	0,00%	0,00%	1,90	20,00	1,00	1,00	78,10	0,12		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-77	A	14/05/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,90	1,00	1,00	78,00	0,09		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-77	B	14/05/2025	0,00%	0,00%	0,80	20,80	2,00	1,00	78,40	0,07		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-78	A	14/05/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,90	2,00	1,00	78,00	0,07		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-78	B	14/05/2025	0,00%	0,00%	1,50	20,20	2,00	1,00	78,30	0,06		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-79	A	14/05/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,80	2,00	1,00	78,10	0,08		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-79	B	14/05/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,80	1,00	1,00	78,10	0,08		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-80	A	14/05/2025	0,00%	0,00%	0,00	22,10	1,00	1,00	77,90	-0,06		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-80	B	14/05/2025	0,00%	0,00%	0,00	22,10	1,00	0,00	77,80	0,02		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-81	A	14/05/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,90	2,00	1,00	78,00	0,00		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-81	B	14/05/2025	0,00%	0,00%	0,30	21,60	2,00	1,00	78,00	0,04		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-144	B	14/05/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,90	2,00	1,00	78,10	0,09		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-145	B	14/05/2025	0,00%	0,00%	0,30	21,40	2,00	1,00	78,30	0,07		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-146	B	14/05/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,90	2,00	2,00	78,00	-0,02		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-147	B	14/05/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,90	2,00	2,00	78,00	0,11		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-148	B	14/05/2025	0,00%	0,00%	0,00	22,10	1,00	0,00	77,90	0,02		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-149	B	14/05/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,90	1,00	1,00	77,90	0,08		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-150	B	14/05/2025	0,00%	0,00%	0,80	21,00	2,00	1,00	78,10	0,05		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-151	B	14/05/2025	0,00%	0,00%	0,00	22,00	1,00	2,00	78,00	0,17		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-46	A	14/05/2025	0,00%	0,00%	0,30	21,50	4,00	0,00	78,20	0,06		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-46	B	14/05/2025	0,00%	0,00%	3,60	18,00	5,00	1,00	78,40	-0,50		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-47	A	14/05/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,60	5,00	1,00	78,30	0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-47	B	14/05/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,80	5,00	1,00	78,20	-0,24		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-48	A	14/05/2025	0,00%	0,00%	0,30	21,50	5,00	1,00	78,20	0,06		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-48	B	14/05/2025	0,00%	0,00%	0,40	21,30	4,00	1,00	78,20	0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-49	A	14/05/2025	0,00%	0,00%	0,30	21,60	3,00	1,00	78,10	0,14		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-49	B	14/05/2025	0,00%	0,00%	3,50	18,40	4,00	1,00	78,10	0,06		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-50	A	14/05/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,70	3,00	1,00	78,10	0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-50	B	14/05/2025	0,00%	0,00%	2,40	19,80	3,00	1,00	77,80	0,04		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-51	A	14/05/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,40	2,00	0,00	78,40	0,00		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-51	B	14/05/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,50	1,00	0,00	78,40	-0,08		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	C02 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H_2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
Conjunto Laboratorial	**PMG-52**	**A**	**14/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,50	1,00	0,00	78,40	0,02		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-52**	**B**	**14/05/2025**	0,00%	0,00%	0,20	21,40	1,00	0,00	78,40	-0,02		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-53**	**A**	**14/05/2025**	0,00%	0,00%	0,30	21,10	1,00	0,00	78,50	-0,02		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-53**	**B**	**14/05/2025**	0,00%	0,00%	0,40	20,80	2,00	0,00	78,80	-0,02		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-54**	**A**	**14/05/2025**	0,00%	0,00%	0,20	20,80	2,00	0,00	79,00	-0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-54**	**B**	**14/05/2025**	0,00%	0,00%	3,00	16,70	2,00	0,00	80,30	-0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-55**	**A**	**14/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,30	2,00	0,00	78,60	-0,06		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-55**	**B**	**14/05/2025**	0,00%	0,00%	4,30	16,50	2,00	0,00	79,10	-0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-56**	**A**	**14/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,50	2,00	1,00	78,40	0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-56**	**B**	**14/05/2025**	0,00%	0,00%	1,00	20,90	2,00	1,00	78,10	0,05		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-57**	**A**	**14/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,60	2,00	1,00	78,30	0,06		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-57**	**B**	**14/05/2025**	0,00%	0,00%	0,70	21,20	2,00	0,00	78,10	0,00		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-58**	**A**	**14/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,50	2,00	0,00	78,40	0,05		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-58**	**B**	**14/05/2025**	0,00%	0,00%	1,90	19,90	1,00	0,00	78,20	-0,13		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-59**	**A**	**14/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,60	1,00	0,00	78,30	0,02		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-59**	**B**	**14/05/2025**	0,00%	0,00%	1,00	20,80	2,00	1,00	78,20	-0,02		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-60**	**A**	**14/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,50	2,00	1,00	78,40	0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-60**	**B**	**14/05/2025**	0,00%	0,00%	3,20	18,30	2,00	0,00	78,50	0,04		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-61**	**A**	**14/05/2025**	0,00%	0,00%	0,20	21,40	3,00	0,00	78,40	0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-61**	**B**	**14/05/2025**	0,00%	0,00%	7,10	13,50	3,00	1,00	79,40	0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-137**	**B**	**14/05/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,90	4,00	1,00	78,10	-0,36		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-138**	**B**	**14/05/2025**	0,00%	0,00%	1,70	20,60	4,00	1,00	77,70	0,05		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-139**	**A**	**14/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,40	1,00	0,00	78,50	-0,22		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-139**	**B**	**14/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,40	2,00	0,00	78,50	-0,05		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-140**	**A**	**14/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,40	1,00	0,00	78,50	-0,02		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-140**	**B**	**14/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,30	1,00	0,00	78,60	-0,05		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-141**	**B**	**14/05/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,50	2,00	0,00	78,40	-0,05		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-62**	**A**	**14/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,50	1,00	0,00	78,40	-0,02		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-62**	**B**	**14/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,30	1,00	0,00	78,70	-0,03		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-01**	**A**	**13/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,40	2,00	1,00	78,50	0,13		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-01**	**B**	**13/05/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,50	1,00	1,00	78,40	0,07		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-02**	**A**	**13/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,60	1,00	1,00	78,20	0,08		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-02**	**B**	**13/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,70	1,00	1,00	78,20	0,06		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-03**	**A**	**13/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,50	1,00	1,00	78,40	0,08		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-03**	**B**	**13/05/2025**	0,00%	0,00%	1,90	19,40	1,00	1,00	78,70	-0,01		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-04**	**A**	**13/05/2025**	0,00%	0,00%	0,20	21,50	1,00	1,00	78,20	0,07		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-04**	**B**	**13/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,70	1,00	0,00	78,20	0,07		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-05**	**A**	**13/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,80	1,00	1,00	78,10	-0,01		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-05**	**B**	**13/05/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,70	2,00	1,00	78,20	0,08		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-06**	**A**	**13/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,70	1,00	1,00	78,20	0,05		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-06**	**B**	**13/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,70	1,00	1,00	78,20	0,05		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-07**	**A**	**13/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,80	1,00	0,00	78,10	0,08		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-07**	**B**	**13/05/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,90	1,00	1,00	78,10	-0,01		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-08**	**A**	**13/05/2025**	0,00%	0,00%	0,20	21,60	1,00	1,00	78,20	0,05		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-08**	**B**	**13/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,90	1,00	1,00	78,10	0,00		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-09**	**A**	**15/05/2025**	0,00%	0,00%	1,40	20,30	1,00	1,00	78,30	0,04		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-09**	**B**	**15/05/2025**	0,00%	0,00%	5,00	15,90	1,00	1,00	79,10	0,07		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-10**	**A**	**13/05/2025**	0,00%	0,00%	0,50	21,30	1,00	1,00	78,20	-0,03		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-10**	**B**	**13/05/2025**	0,00%	0,00%	2,20	18,90	1,00	1,00	79,00	0,03		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-84**	**A**	**13/05/2025**	0,00%	0,00%	0,20	21,60	1,00	0,00	78,10	-0,03		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-84**	**B**	**13/05/2025**	0,00%	0,00%	3,10	19,30	2,00	0,00	77,60	0,01		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-85**	**A**	**13/05/2025**	0,00%	0,00%	0,70	21,30	1,00	1,00	77,90	0,06		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-85**	**B**	**13/05/2025**	0,00%	0,00%	2,20	20,20	1,00	0,00	77,60	-0,04		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	C02 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H_2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-86**	**A**	**13/05/2025**	0,00%	0,00%	0,30	21,40	1,00	1,00	78,30	0,03		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-86**	**B**	**13/05/2025**	0,00%	0,00%	1,30	19,80	1,00	0,00	78,90	0,03		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-87**	**A**	**13/05/2025**	0,00%	0,00%	2,50	17,70	1,00	0,00	79,80	0,05		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-87**	**B**	**13/05/2025**	0,00%	0,00%	2,30	19,20	1,00	1,00	78,50	0,00		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-152**	**A**	**15/05/2025**	0,00%	0,00%	0,20	21,50	1,00	1,00	78,30	-0,06		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-152**	**B**	**15/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,70	1,00	1,00	78,20	0,03		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-153**	**B**	**13/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,30	1,00	0,00	78,70	0,08		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-154**	**B**	**13/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,70	1,00	1,00	78,20	0,05		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-155**	**B**	**13/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,60	1,00	1,00	78,30	0,10		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-156**	**B**	**13/05/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,80	1,00	0,00	78,10	0,15		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-157**	**B**	**13/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,80	2,00	1,00	78,10	0,06		0,00	0,00	
Enfermaria	**PMG-70**	**A**	**15/05/2025**	0,00%	0,00%	0,20	21,60	1,00	0,00	78,20	0,00		0,00	0,00	
Enfermaria	**PMG-70**	**B**	**15/05/2025**	0,00%	0,00%	1,10	20,00	1,00	0,00	79,00	-0,02		0,00	0,00	
Enfermaria	**PMG-71**	**A**	**15/05/2025**	0,00%	0,00%	0,30	21,30	1,00	1,00	78,40	0,08		0,00	0,00	
Enfermaria	**PMG-71**	**B**	**15/05/2025**	0,30%	0,30%	1,90	3,60	1,00	1,00	94,20	-0,22		0,00	**9,00**	
Enfermaria	**PMG-72**	**A**	**15/05/2025**	0,00%	0,00%	0,50	20,80	1,00	0,00	78,70	0,03		0,00	0,00	
Enfermaria	**PMG-72**	**B**	**15/05/2025**	0,00%	0,00%	1,30	18,90	1,00	1,00	79,80	0,02		0,00	0,00	
Enfermaria	**PMG-73**	**A**	**15/05/2025**	0,00%	0,00%	0,20	21,60	1,00	1,00	78,20	0,04		0,00	0,00	
Enfermaria	**PMG-73**	**B**	**15/05/2025**	0,00%	0,00%	0,90	20,90	1,00	1,00	78,30	0,05		0,00	0,00	
Enfermaria	**PMG-74**	**A**	**15/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,60	2,00	1,00	78,30	0,01		0,00	0,00	
Enfermaria	**PMG-74**	**B**	**15/05/2025**	1,50%	1,50%	1,10	13,40	2,00	1,00	84,00	0,05		0,00	**41,00**	
Enfermaria	**PMG-75**	**A**	**15/05/2025**	0,00%	0,00%	0,30	21,20	1,00	0,00	78,40	0,05		0,00	0,00	
Enfermaria	**PMG-75**	**B**	**15/05/2025**	0,00%	0,00%	1,50	18,40	1,00	0,00	80,10	-0,04		0,00	0,00	
Enfermaria	**PMG-76**	**A**	**15/05/2025**	0,00%	0,00%	0,40	21,30	2,00	1,00	78,30	0,10		0,00	0,00	
Enfermaria	**PMG-76**	**B**	**15/05/2025**	0,00%	0,00%	2,40	14,50	1,00	1,00	83,10	0,10		0,00	0,00	
Enfermaria	**PMG-165**	**A**	**15/05/2025**	0,00%	0,00%	0,50	21,20	1,00	0,00	78,30	0,04		0,00	0,00	
Enfermaria	**PMG-165**	**B**	**15/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,70	1,00	0,00	78,30	0,00		0,00	0,00	
CAT	**PMG-82**	**A**	**16/05/2025**	0,00%	0,00%	1,80	20,00	1,00	1,00	78,20	0,07		0,00	0,00	
CAT	**PMG-82**	**B**	**16/05/2025**	0,00%	0,00%	7,30	13,90	1,00	1,00	78,80	0,07		0,00	0,00	
CAT	**PMG-83**	**A**	**16/05/2025**	0,00%	0,00%	3,40	18,20	1,00	1,00	78,40	0,08		0,00	0,00	
CAT	**PMG-83**	**B**	**16/05/2025**	0,00%	0,00%	6,80	14,10	1,00	1,00	79,20	0,06		0,00	0,00	
CAT	**PMG-94**	**A**	**15/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,10	2,00	0,00	78,80	-0,08		0,00	0,00	
CAT	**PMG-94**	**B**	**15/05/2025**	0,00%	0,00%	4,70	16,70	1,00	0,00	78,50	-0,06		0,00	0,00	
CAT	**PMG-95**	**A**	**15/05/2025**	0,00%	0,00%	0,90	20,60	1,00	0,00	78,50	-0,13		0,00	0,00	
CAT	**PMG-95**	**B**	**15/05/2025**	0,00%	0,00%	1,70	20,20	1,00	0,00	78,10	-0,06		0,00	0,00	
CAT	**PMG-96**	**A**	**15/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,40	1,00	0,00	78,50	-0,02		0,00	0,00	
CAT	**PMG-96**	**B**	**15/05/2025**	0,00%	0,00%	3,80	15,60	1,00	0,00	80,60	-0,05		0,00	0,00	
CAT	**PMG-97**	**A**	**15/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,50	1,00	0,00	78,40	0,01		0,00	0,00	
CAT	**PMG-97**	**B**	**15/05/2025**	0,00%	0,00%	3,40	17,50	1,00	0,00	79,20	-0,11		0,00	0,00	
CAT	**PMG-98**	**A**	**15/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,50	2,00	0,00	78,40	-0,08		0,00	0,00	
CAT	**PMG-98**	**B**	**15/05/2025**	0,00%	0,00%	0,60	20,90	1,00	0,00	78,50	0,08		0,00	0,00	
CAT	**PMG-160**	**A**	**15/05/2025**	0,00%	0,00%	0,20	21,30	2,00	0,00	78,50	-0,07		0,00	0,00	
CAT	**PMG-160**	**B**	**15/05/2025**	0,00%	0,00%	3,50	17,80	2,00	0,00	78,60	-0,08		0,00	0,00	
CAT	**PMG-161**	**A**	**15/05/2025**	0,00%	0,00%	1,70	20,00	1,00	0,00	78,40	-0,06		0,00	0,00	
CAT	**PMG-161**	**B**	**15/05/2025**	0,00%	0,00%	2,70	19,00	2,00	0,00	78,40	0,00		0,00	0,00	
Incubadora	**PMG-88**	**A**	**15/05/2025**	0,00%	0,00%	0,30	21,70	2,00	1,00	78,00	0,03		0,00	0,00	
Incubadora	**PMG-88**	**B**	**15/05/2025**	0,00%	0,00%	0,40	21,50	1,00	1,00	78,00	-0,01		0,00	0,00	
Incubadora	**PMG-89**	**A**	**15/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	22,00	1,00	1,00	77,90	0,03		0,00	0,00	
Incubadora	**PMG-89**	**B**	**15/05/2025**	0,00%	0,00%	0,70	21,30	1,00	1,00	78,00	0,10		0,00	0,00	
Incubadora	**PMG-90**	**A**	**15/05/2025**	0,00%	0,00%	0,00	22,00	1,00	1,00	78,00	0,00		0,00	0,00	
Incubadora	**PMG-90**	**B**	**15/05/2025**	0,00%	0,00%	0,60	21,40	1,00	1,00	78,00	0,01		0,00	0,00	
Incubadora	**PMG-91**	**A**	**15/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,90	2,00	1,00	78,00	0,07		0,00	0,00	
Incubadora	**PMG-91**	**B**	**15/05/2025**	0,00%	0,00%	2,20	19,70	1,00	0,00	78,10	0,10		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	C02 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H_2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
Incubadora	**PMG-92**	**A**	**15/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,80	1,00	1,00	78,10	0,05		0,00	0,00	
Incubadora	**PMG-92**	**B**	**15/05/2025**	0,00%	0,00%	1,00	20,90	1,00	1,00	78,10	0,03		0,00	0,00	
Incubadora	**PMG-93**	**A**	**15/05/2025**	0,00%	0,00%	0,20	21,70	1,00	1,00	78,10	0,07		0,00	0,00	
Incubadora	**PMG-93**	**B**	**15/05/2025**	0,00%	0,00%	1,30	20,40	1,00	1,00	78,30	0,12		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-102**		**12/05/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,90	1,00	1,00	78,10	0,01		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-103**		**12/05/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,80	1,00	2,00	78,20	0,07		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-104**		**12/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,80	1,00	1,00	78,10	0,07		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-105**		**12/05/2025**	0,00%	0,00%	1,20	20,70	1,00	1,00	78,10	0,06		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-106**		**12/05/2025**	0,00%	0,00%	0,30	21,20	1,00	1,00	78,60	0,12		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-107**		**12/05/2025**	0,00%	0,00%	3,00	17,00	1,00	1,00	80,00	0,05		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-108**		**12/05/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,90	1,00	1,00	78,10	0,04		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-109**	**A**	**12/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,90	1,00	1,00	78,00	0,07		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-109**	**B**	**12/05/2025**	0,00%	0,00%	0,70	21,20	1,00	1,00	78,10	0,08		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-110**	**A**	**12/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,80	1,00	1,00	78,10	0,08		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-110**	**B**	**12/05/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,90	2,00	1,00	78,10	0,13		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-111**	**A**	**12/05/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,90	1,00	1,00	78,10	0,08		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-111**	**B**	**12/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,80	1,00	2,00	78,10	0,06		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-112**		**12/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,90	1,00	1,00	78,00	0,06		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-162**	**A**	**12/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,60	1,00	1,00	78,30	0,07		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-162**	**B**	**12/05/2025**	0,00%	0,00%	6,70	11,20	2,00	1,00	82,10	0,00		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-166**	**A**	**12/05/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,90	1,00	1,00	78,10	0,06		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-166**	**B**	**12/05/2025**	0,00%	0,00%	0,60	20,50	1,00	1,00	78,90	0,03		0,00	0,00	
Portaria P3	**PMG-119**	**A**	**12/05/2025**	0,00%	0,00%	0,00	22,00	2,00	1,00	77,90	0,05		0,00	0,00	
Portaria P3	**PMG-119**	**B**	**12/05/2025**	0,00%	0,00%	0,00	22,00	2,00	1,00	78,00	0,09		0,00	0,00	
Portaria P3	**PMG-119**	**C**	**12/05/2025**	0,00%	0,00%	0,00	22,00	1,00	1,00	77,90	0,00		0,00	0,00	
Portaria P3	**PMG-120**	**A**	**12/05/2025**	0,00%	0,00%	0,00	22,00	1,00	1,00	78,00	0,03		0,00	0,00	
Portaria P3	**PMG-120**	**B**	**12/05/2025**	0,00%	0,00%	0,00	22,00	1,00	1,00	77,90	-0,12		0,00	0,00	
Portaria P3	**PMG-120**	**C**	**12/05/2025**	0,00%	0,00%	0,00	22,00	1,00	1,00	77,90	0,06		0,00	0,00	
Portaria P3	**PMG-163**	**B**	**12/05/2025**	0,00%	0,00%	0,00	22,00	1,00	1,00	77,90	0,04		0,00	0,00	
Portaria P3	**PMG-164**	**B**	**12/05/2025**	0,00%	0,00%	0,00	22,00	1,00	1,00	77,90	0,06		0,00	0,00	
Portaria P3	**PMG-164**	**C**	**12/05/2025**	0,00%	0,00%	0,00	22,00	1,00	0,00	78,00	-0,09		0,00	0,00	
Transportes	**PMG-121**	**A**	**16/05/2025**	0,00%	0,00%	0,20	21,50	1,00	1,00	78,30	0,01		0,00	0,00	
Transportes	**PMG-121**	**B**	**16/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,60	1,00	1,00	78,30	0,02		0,00	0,00	
Transportes	**PMG-122**	**A**	**16/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,60	1,00	1,00	78,30	-0,12		0,00	0,00	
Transportes	**PMG-122**	**B**	**16/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,60	1,00	1,00	78,30	0,06		0,00	0,00	
Transportes	**PMG-123**	**A**	**16/05/2025**	0,00%	0,00%	0,30	21,50	1,00	0,00	78,20	-0,03		0,00	0,00	
Transportes	**PMG-123**	**B**	**16/05/2025**	0,00%	0,00%	0,80	20,60	1,00	0,00	78,50	0,00		0,00	0,00	
Transportes	**PMG-124**	**A**	**16/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,70	1,00	1,00	78,20	0,08		0,00	0,00	
Transportes	**PMG-124**	**B**	**16/05/2025**	0,00%	0,00%	0,40	21,40	1,00	1,00	78,20	0,15		0,00	0,00	
Transportes	**PMG-158**	**B**	**16/05/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,70	1,00	1,00	78,30	-0,08		0,00	0,00	
Transportes	**PMG-159**	**B**	**16/05/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,80	1,00	1,00	78,20	0,04		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	**PMG-125**	**A**	**15/05/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,90	1,00	1,00	78,00	0,06		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	**PMG-125**	**B**	**15/05/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,90	1,00	1,00	78,00	0,08		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	**PMG-126**	**A**	**15/05/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,90	2,00	1,00	78,00	0,05		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	**PMG-126**	**B**	**15/05/2025**	0,00%	0,00%	6,30	17,00	1,00	1,00	76,70	-0,03		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	**PMG-127**	**A**	**15/05/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,90	1,00	1,00	78,10	0,03		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	**PMG-127**	**B**	**15/05/2025**	0,00%	0,00%	3,40	18,90	1,00	1,00	77,70	-2,03		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	**PMG-128**	**A**	**15/05/2025**	0,00%	0,00%	0,00	22,00	1,00	1,00	78,00	0,03		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	**PMG-128**	**B**	**15/05/2025**	0,00%	0,00%	5,50	15,80	1,00	2,00	78,70	-1,17		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	**PMG-129**	**A**	**15/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,90	1,00	1,00	78,00	0,08		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	**PMG-129**	**B**	**15/05/2025**	0,00%	0,00%	1,60	20,10	1,00	2,00	78,30	0,00		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	**PMG-130**	**A**	**15/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,90	1,00	1,00	78,10	-0,03		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	**PMG-130**	**B**	**15/05/2025**	0,00%	0,00%	4,50	17,30	1,00	2,00	78,10	-0,19		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	C02 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H_2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
Posto Guarda Universitário	**PMG-131**	**A**	**15/05/2025**	0,00%	0,00%	0,30	21,60	1,00	2,00	78,10	0,07		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	**PMG-131**	**B**	**15/05/2025**	0,00%	0,00%	1,00	20,90	1,00	1,00	78,10	0,05		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-16**	**A**	**20/05/2025**	0,00%	0,00%	1,80	19,90	2,00	1,00	78,30	0,05		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-16**	**B**	**20/05/2025**	0,00%	0,00%	2,50	19,30	1,00	1,00	78,30	-0,05		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-17**	**A**	**20/05/2025**	0,00%	0,00%	0,40	21,30	2,00	1,00	78,30	0,05		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-17**	**B**	**20/05/2025**	0,00%	0,00%	1,40	20,40	2,00	1,00	78,20	0,02		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-18**	**A**	**20/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	20,90	2,00	0,00	78,90	-0,02		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-18**	**B**	**20/05/2025**	0,00%	0,00%	1,40	19,90	3,00	0,00	78,70	-0,06		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-20**	**A**	**20/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,30	2,00	0,00	78,60	0,05		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-20**	**B**	**20/05/2025**	0,00%	0,00%	0,30	21,10	2,00	0,00	78,70	-0,02		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-22**	**A**	**20/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	22,10	2,00	1,00	77,70	0,07		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-22**	**B**	**20/05/2025**	0,00%	0,00%	4,40	16,70	1,00	1,00	78,90	0,06		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-23**	**A**	**23/05/2025**	0,00%	0,00%	0,30	21,30	1,00	0,00	78,40	0,03		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-23**	**B**	**23/05/2025**	0,00%	0,00%	1,20	20,30	1,00	0,00	78,50	0,04		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-113**	**A**	**20/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,00	2,00	0,00	78,90	-0,01		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-113**	**B**	**20/05/2025**	0,00%	0,00%	1,60	19,50	2,00	0,00	78,90	-0,04		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-114**	**A**	**20/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,10	2,00	0,00	78,70	-0,02		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-114**	**B**	**20/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,20	1,00	0,00	78,70	-0,10		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-115**	**A**	**20/05/2025**	0,00%	0,00%	0,20	21,00	2,00	0,00	78,80	-0,08		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-115**	**B**	**20/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,20	2,00	0,00	78,80	-0,04		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-11**	**A**	**20/05/2025**	0,00%	0,00%	0,60	21,30	2,00	2,00	78,00	0,08		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-11**	**B**	**20/05/2025**	0,30%	0,30%	0,60	21,20	2,00	1,00	78,00	0,07		0,00	**10,00**	
Edificio I 1	**PMG-12**	**A**	**20/05/2025**	0,00%	0,00%	2,70	18,40	1,00	1,00	78,90	0,07		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-12**	**B**	**20/05/2025**	0,00%	0,00%	2,80	17,90	1,00	1,00	79,30	0,09		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-13**	**A**	**20/05/2025**	0,00%	0,00%	1,10	20,60	2,00	1,00	78,30	0,07		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-13**	**B**	**20/05/2025**	0,00%	0,00%	1,40	20,20	1,00	1,00	78,40	0,00		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-14**	**A**	**23/05/2025**	0,00%	0,00%	1,50	19,90	1,00	0,00	78,60	0,01		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-14**	**B**	**23/05/2025**	0,00%	0,00%	3,50	18,00	1,00	0,00	78,50	0,11		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-15**	**A**	**20/05/2025**	0,00%	0,00%	0,20	21,50	1,00	1,00	78,30	0,03		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-15**	**B**	**20/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,60	1,00	1,00	78,30	0,06		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-19**	**A**	**20/05/2025**	0,00%	0,00%	0,20	21,50	1,00	2,00	78,20	0,06		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-19**	**B**	**20/05/2025**	0,00%	0,00%	0,60	21,10	1,00	1,00	78,30	0,03		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-21**	**A**	**23/05/2025**	0,00%	0,00%	0,80	20,70	1,00	0,00	78,50	-0,01		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-21**	**B**	**23/05/2025**	0,00%	0,00%	1,30	20,10	2,00	0,00	78,60	-0,03		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-24**	**A**	**20/05/2025**	0,00%	0,00%	0,30	20,10	3,00	0,00	79,60	-0,04		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-24**	**B**	**20/05/2025**	0,00%	0,00%	0,50	20,10	3,00	0,00	79,40	-0,18		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-135**	**A**	**20/05/2025**	0,00%	0,00%	0,20	21,10	2,00	0,00	78,80	0,03		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG -135**	**B**	**20/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,20	2,00	0,00	78,70	-0,03		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-136**	**B**	**20/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,10	2,00	0,00	78,80	0,13		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	**PMG-25**	**A**	**19/05/2025**	0,00%	0,00%	0,20	21,50	2,00	1,00	78,20	0,05		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	**PMG-25**	**B**	**19/05/2025**	0,00%	0,00%	0,90	20,90	1,00	1,00	78,20	0,04		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	**PMG-26**	**A**	**19/05/2025**	0,00%	0,00%	0,40	21,40	2,00	1,00	78,20	0,08		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	**PMG-26**	**B**	**19/05/2025**	0,00%	0,00%	1,30	20,20	2,00	1,00	78,50	0,02		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	**PMG-27**	**A**	**19/05/2025**	0,00%	0,00%	1,00	20,30	2,00	1,00	78,60	0,06		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	**PMG-27**	**B**	**19/05/2025**	0,00%	0,00%	2,90	18,40	2,00	0,00	78,70	0,06		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	**PMG-28**	**A**	**19/05/2025**	0,00%	0,00%	0,70	20,90	2,00	1,00	78,40	0,08		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	**PMG-28**	**B**	**19/05/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,80	2,00	1,00	78,10	0,12		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	**PMG-29**	**A**	**19/05/2025**	0,00%	0,00%	0,20	21,60	2,00	1,00	78,10	0,08		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	**PMG-29**	**B**	**19/05/2025**	0,00%	0,00%	0,90	21,00	1,00	1,00	78,10	0,08		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	**PMG-44**	**A**	**19/05/2025**	0,00%	0,00%	0,80	20,90	1,00	1,00	78,30	0,09		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	**PMG-44**	**B**	**19/05/2025**	0,00%	0,00%	0,80	20,90	2,00	1,00	78,30	-0,03		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	**PMG-45**	**A**	**19/05/2025**	0,00%	0,00%	0,50	21,00	2,00	1,00	78,50	0,08		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	**PMG-45**	**B**	**19/05/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,90	2,00	1,00	78,10	0,03		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	C02 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H_2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
I-5 Auditórios	PMG-134	B	19/05/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,90	2,00	1,00	78,10	0,15		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-30	A	23/05/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,00	2,00	0,00	78,90	-0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-30	B	23/05/2025	0,00%	0,00%	0,90	20,30	2,00	0,00	78,90	0,00		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-31	A	19/05/2025	0,00%	0,00%	0,30	21,10	2,00	0,00	78,60	0,01		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-31	B	19/05/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,40	3,00	0,00	78,50	-0,11		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-32	A	19/05/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,30	2,00	0,00	78,50	0,00		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-32	B	19/05/2025	0,00%	0,00%	1,40	20,20	2,00	0,00	78,40	-0,01		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-33	A	19/05/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,40	1,00	0,00	78,50	-0,18		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-33	B	19/05/2025	0,00%	0,00%	3,00	18,40	2,00	1,00	78,60	0,02		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-34	A	19/05/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,40	2,00	1,00	78,40	0,02		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-34	B	19/05/2025	0,00%	0,00%	1,00	20,70	2,00	0,00	78,30	0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-35	A	19/05/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,70	2,00	1,00	78,20	0,06		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-35	B	19/05/2025	0,00%	0,00%	0,90	20,80	1,00	1,00	78,30	0,08		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-36	A	19/05/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,60	2,00	1,00	78,30	0,08		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-36	B	19/05/2025	0,00%	0,00%	1,30	20,20	2,00	1,00	78,50	0,04		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-37	A	19/05/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,60	2,00	1,00	78,30	0,05		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-37	B	19/05/2025	0,00%	0,00%	0,90	20,90	2,00	1,00	78,20	0,01		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-38	A	19/05/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,50	2,00	0,00	78,40	0,06		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-38	B	19/05/2025	0,00%	0,00%	0,30	21,30	2,00	1,00	78,50	0,02		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-39	A	19/05/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,40	2,00	0,00	78,40	0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-39	B	19/05/2025	0,00%	0,00%	7,10	14,60	3,00	0,00	78,30	0,09		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-40	A	19/05/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,60	2,00	1,00	78,30	0,08		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-40	B	19/05/2025	0,00%	0,00%	0,30	21,40	2,00	1,00	78,40	-0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-41	A	19/05/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,40	2,00	0,00	78,50	-0,01		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-41	B	19/05/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,40	2,00	0,00	78,40	0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-42	A	19/05/2025	0,00%	0,00%	1,00	20,50	2,00	0,00	78,50	-0,01		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-42	B	19/05/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,40	2,00	0,00	78,60	0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-43	A	19/05/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,50	2,00	0,00	78,50	-0,01		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-43	B	19/05/2025	0,00%	0,00%	0,60	21,00	1,00	0,00	78,40	0,06		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-132	A	19/05/2025	0,00%	0,00%	0,30	21,10	3,00	0,00	78,60	-0,04		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-132	B	19/05/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,30	3,00	0,00	78,50	-0,01		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-133	A	19/05/2025	0,00%	0,00%	0,30	21,20	2,00	0,00	78,50	0,04		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-133	B	19/05/2025	0,00%	0,00%	0,60	20,90	3,00	1,00	78,50	0,01		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-63	A	21/05/2025	0,00%	0,00%	0,10	22,00	2,00	1,00	77,90	0,05		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-63	B	21/05/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,90	2,00	1,00	77,90	0,03		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-64	A	21/05/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,90	2,00	1,00	78,10	0,11		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-64	B	21/05/2025	0,00%	0,00%	0,30	21,50	2,00	1,00	78,20	0,11		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-65	A	21/05/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,90	2,00	1,00	78,10	0,07		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-65	B	21/05/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,90	2,00	1,00	78,10	0,00		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-66	A	21/05/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,70	1,00	1,00	78,20	0,09		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-66	B	21/05/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,80	2,00	1,00	78,10	0,04		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-67	A	21/05/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,80	3,00	2,00	78,20	0,10		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-67	B	21/05/2025	0,00%	0,00%	0,30	21,50	2,00	1,00	78,20	0,08		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-68	A	21/05/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,90	4,00	1,00	78,00	0,14		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-68	B	21/05/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,60	3,00	2,00	78,10	0,04		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-69	A	21/05/2025	0,00%	0,00%	0,00	22,00	2,00	1,00	78,00	0,09		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-69	B	21/05/2025	0,00%	0,00%	1,00	20,50	2,00	1,00	78,50	0,03		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-77	A	21/05/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,80	6,00	2,00	78,10	0,10		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-77	B	21/05/2025	0,00%	0,00%	0,80	20,60	6,00	1,00	78,60	0,08		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-78	A	21/05/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,70	5,00	2,00	78,20	0,17		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-78	B	21/05/2025	0,00%	0,00%	1,00	20,60	5,00	2,00	78,40	0,12		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-79	A	21/05/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,80	5,00	2,00	78,10	0,11		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-79	B	21/05/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,80	5,00	2,00	78,10	0,09		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	C02 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H_2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
Edifício I-4	**PMG-80**	**A**	**21/05/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,90	4,00	2,00	78,10	0,11		0,00	0,00	
Edifício I-4	**PMG-80**	**B**	**21/05/2025**	0,00%	0,00%	0,20	21,70	4,00	2,00	78,20	0,14		0,00	0,00	
Edifício I-4	**PMG-81**	**A**	**21/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,70	2,00	2,00	78,30	0,13		0,00	0,00	
Edifício I-4	**PMG-81**	**B**	**21/05/2025**	0,00%	0,00%	0,50	21,10	3,00	2,00	78,40	0,16		0,00	0,00	
Edifício I-4	**PMG-144**	**B**	**21/05/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,90	7,00	2,00	78,10	0,03		0,00	0,00	
Edifício I-4	**PMG-145**	**B**	**21/05/2025**	0,00%	0,00%	0,30	21,10	6,00	2,00	78,50	0,08		0,00	0,00	
Edifício I-4	**PMG-146**	**B**	**21/05/2025**	0,00%	0,00%	0,20	21,30	2,00	1,00	78,50	0,13		0,00	0,00	
Edifício I-4	**PMG-147**	**B**	**21/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,70	3,00	2,00	78,30	0,15		0,00	0,00	
Edifício I-4	**PMG-148**	**B**	**21/05/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,90	2,00	1,00	78,10	0,13		0,00	0,00	
Edifício I-4	**PMG-149**	**B**	**21/05/2025**	0,00%	0,00%	1,20	20,90	2,00	2,00	77,90	0,10		0,00	0,00	
Edifício I-4	**PMG-150**	**B**	**21/05/2025**	0,00%	0,00%	2,50	18,40	2,00	1,00	79,00	0,09		0,00	0,00	
Edifício I-4	**PMG-151**	**B**	**21/05/2025**	0,00%	0,00%	0,60	21,20	2,00	1,00	78,20	0,13		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-46**	**A**	**21/05/2025**	0,00%	0,00%	0,20	21,30	5,00	1,00	78,40	0,09		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-46**	**B**	**21/05/2025**	0,00%	0,00%	3,40	17,70	6,00	1,00	78,90	0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-47**	**A**	**21/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,40	6,00	1,00	78,50	0,15		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-47**	**B**	**21/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,60	7,00	1,00	78,40	0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-48**	**A**	**21/05/2025**	0,00%	0,00%	0,20	21,30	5,00	1,00	78,40	0,10		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-48**	**B**	**21/05/2025**	0,00%	0,00%	0,50	21,10	5,00	1,00	78,50	0,09		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-49**	**A**	**21/05/2025**	0,00%	0,00%	0,30	21,30	4,00	1,00	78,40	0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-49**	**B**	**21/05/2025**	0,00%	0,00%	5,70	16,10	4,00	1,00	78,20	0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-50**	**A**	**21/05/2025**	0,00%	0,00%	0,20	21,50	4,00	1,00	78,20	0,07		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-50**	**B**	**21/05/2025**	0,00%	0,00%	2,40	19,50	4,00	1,00	78,20	0,13		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-51**	**A**	**21/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,30	3,00	1,00	78,50	0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-51**	**B**	**21/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,40	3,00	1,00	78,50	0,05		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-52**	**A**	**21/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,40	2,00	0,00	78,60	0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-52**	**B**	**21/05/2025**	0,00%	0,00%	0,20	21,30	2,00	0,00	78,60	0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-53**	**A**	**21/05/2025**	0,00%	0,00%	0,30	21,00	2,00	0,00	78,70	0,09		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-53**	**B**	**21/05/2025**	0,00%	0,00%	0,70	20,00	3,00	0,00	79,30	-0,05		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-54**	**A**	**21/05/2025**	0,00%	0,00%	0,30	20,70	2,00	0,00	79,10	-0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-54**	**B**	**21/05/2025**	0,10%	0,10%	3,40	15,80	2,00	0,00	80,70	-0,03		0,00	**6,00**	
Conjunto Laboratorial	**PMG-55**	**A**	**21/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,20	3,00	0,00	78,70	-0,07		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-55**	**B**	**21/05/2025**	0,00%	0,00%	4,10	16,50	3,00	0,00	79,50	-0,04		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-56**	**A**	**21/05/2025**	0,00%	0,00%	0,20	20,90	3,00	1,00	78,80	0,07		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-56**	**B**	**21/05/2025**	0,00%	0,00%	1,00	20,70	4,00	1,00	78,30	0,11		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-57**	**A**	**21/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,40	2,00	1,00	78,50	0,06		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-57**	**B**	**21/05/2025**	0,00%	0,00%	1,50	20,30	2,00	0,00	78,20	0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-58**	**A**	**21/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,30	2,00	1,00	78,50	0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-58**	**B**	**21/05/2025**	0,00%	0,00%	1,70	19,90	2,00	1,00	78,40	0,07		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-59**	**A**	**21/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,50	3,00	1,00	78,40	0,05		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-59**	**B**	**21/05/2025**	0,00%	0,00%	0,90	20,70	4,00	1,00	78,40	0,09		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-60**	**A**	**21/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,40	3,00	1,00	78,50	0,09		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-60**	**B**	**21/05/2025**	0,00%	0,00%	2,30	19,00	3,00	1,00	78,70	0,02		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-61**	**A**	**21/05/2025**	0,00%	0,00%	0,20	21,30	3,00	0,00	78,50	0,05		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-61**	**B**	**21/05/2025**	0,00%	0,00%	7,50	12,60	3,00	1,00	79,90	0,06		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-137**	**B**	**21/05/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,70	5,00	1,00	78,30	0,06		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-138**	**B**	**21/05/2025**	0,00%	0,00%	2,60	19,40	5,00	1,00	78,00	0,10		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-139**	**A**	**21/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,20	2,00	0,00	78,70	-0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-139**	**B**	**21/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,30	3,00	0,00	78,70	-0,02		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-140**	**A**	**21/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,30	2,00	0,00	78,60	0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-140**	**B**	**21/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,30	3,00	0,00	78,60	-0,10		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-141**	**B**	**21/05/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,40	3,00	1,00	78,50	0,00		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-62**	**A**	**21/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,40	2,00	1,00	78,50	0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-62**	**B**	**21/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,20	2,00	0,00	78,70	0,03		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	C02 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H_2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-01**	**A**	**20/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,00	2,00	1,00	78,90	0,08		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-01**	**B**	**20/05/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,20	2,00	1,00	78,80	0,02		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-02**	**A**	**20/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,60	2,00	0,00	78,30	0,06		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-02**	**B**	**20/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,60	2,00	0,00	78,30	0,07		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-03**	**A**	**20/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,30	1,00	1,00	78,60	0,13		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-03**	**B**	**20/05/2025**	0,00%	0,00%	1,90	19,00	1,00	1,00	79,20	0,09		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-04**	**A**	**22/05/2025**	0,00%	0,00%	0,30	21,50	2,00	2,00	78,20	0,12		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-04**	**B**	**22/05/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,90	1,00	2,00	78,10	0,08		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-05**	**A**	**22/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,10	4,00	0,00	78,80	-0,06		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-05**	**B**	**22/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,20	3,00	0,00	78,80	-0,05		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-06**	**A**	**20/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,50	1,00	1,00	78,50	0,15		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-06**	**B**	**20/05/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,50	2,00	1,00	78,50	0,13		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-07**	**A**	**20/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,60	2,00	1,00	78,30	0,07		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-07**	**B**	**20/05/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,60	2,00	0,00	78,30	0,02		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-08**	**A**	**20/05/2025**	0,00%	0,00%	0,20	21,30	2,00	1,00	78,40	0,06		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-08**	**B**	**20/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,60	2,00	0,00	78,40	-0,01		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-09**	**A**	**22/05/2025**	0,00%	0,00%	1,30	20,20	2,00	1,00	78,60	0,08		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-09**	**B**	**22/05/2025**	0,00%	0,00%	7,20	12,90	2,00	1,00	79,90	0,17		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-10**	**A**	**22/05/2025**	0,00%	0,00%	0,50	20,70	2,00	0,00	78,80	-0,01		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-10**	**B**	**22/05/2025**	0,00%	0,00%	1,60	19,20	2,00	0,00	79,20	0,03		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-84**	**A**	**20/05/2025**	0,00%	0,00%	0,20	21,20	2,00	0,00	78,60	0,01		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-84**	**B**	**20/05/2025**	0,00%	0,00%	2,80	19,20	2,00	0,00	78,00	0,00		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-85**	**A**	**20/05/2025**	0,00%	0,00%	0,80	20,60	2,00	0,00	78,50	0,03		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-85**	**B**	**20/05/2025**	0,00%	0,00%	1,70	20,00	2,00	1,00	78,30	-0,02		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-86**	**A**	**20/05/2025**	0,00%	0,00%	0,30	21,20	2,00	0,00	78,60	0,07		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-86**	**B**	**20/05/2025**	0,00%	0,00%	1,10	20,10	1,00	0,00	78,80	0,01		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-87**	**A**	**20/05/2025**	0,00%	0,00%	2,20	18,00	2,00	0,00	79,90	0,03		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-87**	**B**	**20/05/2025**	0,00%	0,00%	2,30	18,00	2,00	0,00	79,70	0,00		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-152**	**A**	**22/05/2025**	0,00%	0,00%	0,40	20,80	2,00	1,00	78,80	-0,05		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-152**	**B**	**22/05/2025**	0,00%	0,00%	1,00	20,40	2,00	2,00	78,60	0,12		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-153**	**B**	**20/05/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,30	1,00	2,00	78,70	-0,03		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-154**	**B**	**20/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,60	2,00	1,00	78,30	0,05		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-155**	**B**	**20/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,30	2,00	2,00	78,60	0,10		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-156**	**B**	**22/05/2025**	0,00%	0,00%	0,00	31,20	3,00	0,00	78,80	-0,07		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-157**	**B**	**20/05/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,60	1,00	1,00	78,40	0,09		0,00	0,00	
Enfermaria	**PMG-70**	**A**	**22/05/2025**	0,00%	0,00%	0,20	21,20	1,00	1,00	78,60	0,08		0,00	0,00	
Enfermaria	**PMG-70**	**B**	**22/05/2025**	0,00%	0,00%	1,00	19,50	1,00	1,00	79,50	0,06		0,00	0,00	
Enfermaria	**PMG-71**	**A**	**22/05/2025**	0,00%	0,00%	0,20	21,10	2,00	1,00	78,70	0,09		0,00	0,00	
Enfermaria	**PMG-71**	**B**	**22/05/2025**	0,00%	0,00%	1,10	10,70	2,00	1,00	88,10	0,06		0,00	0,00	
Enfermaria	**PMG-72**	**A**	**22/05/2025**	0,00%	0,00%	0,60	19,80	1,00	1,00	79,60	0,08		0,00	0,00	
Enfermaria	**PMG-72**	**B**	**22/05/2025**	0,00%	0,00%	1,80	16,90	1,00	1,00	81,40	0,12		0,00	0,00	
Enfermaria	**PMG-73**	**A**	**22/05/2025**	0,00%	0,00%	0,30	20,80	2,00	1,00	78,80	0,08		0,00	0,00	
Enfermaria	**PMG-73**	**B**	**22/05/2025**	0,00%	0,00%	0,80	20,40	1,00	1,00	78,90	0,05		0,00	0,00	
Enfermaria	**PMG-74**	**A**	**22/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,60	2,00	1,00	78,40	0,10		0,00	0,00	
Enfermaria	**PMG-74**	**B**	**22/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,60	2,00	1,00	78,40	0,17		0,00	0,00	
Enfermaria	**PMG-75**	**A**	**22/05/2025**	0,00%	0,00%	0,30	20,80	1,00	1,00	78,90	0,10		0,00	0,00	
Enfermaria	**PMG-75**	**B**	**22/05/2025**	0,00%	0,00%	1,60	18,00	2,00	1,00	80,40	0,08		0,00	0,00	
Enfermaria	**PMG-76**	**A**	**22/05/2025**	0,00%	0,00%	0,40	20,20	2,00	2,00	79,40	0,08		0,00	0,00	
Enfermaria	**PMG-76**	**B**	**22/05/2025**	0,00%	0,00%	1,70	16,00	2,00	1,00	82,30	0,04		0,00	0,00	
Enfermaria	**PMG-165**	**A**	**22/05/2025**	0,00%	0,00%	0,60	19,30	1,00	1,00	80,00	0,07		0,00	0,00	
Enfermaria	**PMG-165**	**B**	**22/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,40	1,00	1,00	78,50	0,06		0,00	0,00	
CAT	**PMG-82**	**A**	**22/05/2025**	0,00%	0,00%	1,20	20,40	2,00	0,00	78,40	0,03		0,00	0,00	
CAT	**PMG-82**	**B**	**22/05/2025**	0,00%	0,00%	5,10	16,20	2,00	0,00	78,60	0,06		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	C02 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H_2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
CAT	PMG-83	A	22/05/2025	0,00%	0,00%	2,90	18,80	1,00	0,00	78,30	0,05		0,00	0,00	
CAT	PMG-83	B	22/05/2025	0,00%	0,00%	2,50	19,00	2,00	0,00	78,50	0,01		0,00	0,00	
CAT	PMG-94	A	22/05/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,40	2,00	0,00	78,50	0,04		0,00	0,00	
CAT	PMG-94	B	22/05/2025	0,00%	0,00%	4,60	16,80	1,00	0,00	78,70	0,03		0,00	0,00	
CAT	PMG-95	A	22/05/2025	0,00%	0,00%	0,90	20,80	1,00	1,00	78,30	0,06		0,00	0,00	
CAT	PMG-95	B	22/05/2025	0,00%	0,00%	1,80	20,40	1,00	1,00	77,90	0,13		0,00	0,00	
CAT	PMG-96	A	22/05/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,50	2,00	0,00	78,40	0,06		0,00	0,00	
CAT	PMG-96	B	22/05/2025	0,00%	0,00%	4,40	14,20	2,00	1,00	81,40	0,03		0,00	0,00	
CAT	PMG-97	A	22/05/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,20	2,00	1,00	78,70	0,04		0,00	0,00	
CAT	PMG-97	B	22/05/2025	0,00%	0,00%	3,40	17,30	1,00	1,00	79,30	0,05		0,00	0,00	
CAT	PMG-98	A	22/05/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,30	1,00	1,00	78,60	0,08		0,00	0,00	
CAT	PMG-98	B	22/05/2025	0,00%	0,00%	0,50	21,00	1,00	1,00	78,40	0,03		0,00	0,00	
CAT	PMG-160	A	22/05/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,30	1,00	0,00	78,50	-0,03		0,00	0,00	
CAT	PMG-160	B	22/05/2025	0,00%	0,00%	1,90	19,40	2,00	0,00	78,60	-0,02		0,00	0,00	
CAT	PMG-161	A	22/05/2025	0,00%	0,00%	1,70	19,90	1,00	0,00	78,40	-0,09		0,00	0,00	
CAT	PMG-161	B	22/05/2025	0,00%	0,00%	3,00	18,90	2,00	1,00	78,10	-0,08		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-88	A	23/05/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,50	2,00	1,00	78,30	0,03		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-88	B	23/05/2025	0,00%	0,00%	0,30	21,50	1,00	1,00	78,30	-0,04		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-89	A	23/05/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,70	1,00	1,00	78,20	0,03		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-89	B	23/05/2025	0,00%	0,00%	0,60	21,00	1,00	1,00	78,30	0,08		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-90	A	23/05/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,80	1,00	1,00	78,20	-0,02		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-90	B	23/05/2025	0,00%	0,00%	0,30	21,40	1,00	1,00	78,30	0,08		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-91	A	23/05/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,70	1,00	1,00	78,20	0,06		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-91	B	23/05/2025	0,00%	0,00%	1,30	20,30	1,00	1,00	78,40	0,07		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-92	A	23/05/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,80	1,00	1,00	78,20	0,09		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-92	B	23/05/2025	0,00%	0,00%	0,70	21,00	2,00	1,00	78,30	0,08		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-93	A	23/05/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,80	1,00	1,00	78,10	0,08		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-93	B	23/05/2025	0,00%	0,00%	0,70	21,10	1,00	1,00	78,20	0,01		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-102		19/05/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,40	2,00	0,00	78,60	0,04		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-103		19/05/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,30	1,00	0,00	78,60	0,02		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-104		19/05/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,20	2,00	0,00	78,70	0,04		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-105		19/05/2025	0,00%	0,00%	1,10	20,30	1,00	0,00	78,60	-0,38		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-106		19/05/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,10	1,00	0,00	78,70	-0,06		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-107		19/05/2025	0,00%	0,00%	1,80	18,30	1,00	0,00	79,90	0,02		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-108		19/05/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,20	1,00	0,00	78,70	0,00		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-109	A	19/05/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,20	1,00	0,00	78,70	0,02		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-109	B	19/05/2025	0,00%	0,00%	1,40	19,30	1,00	0,00	79,30	-0,03		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-110	A	19/05/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,30	1,00	0,00	78,60	0,03		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-110	B	19/05/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,30	1,00	0,00	78,60	-0,02		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-111	A	19/05/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,30	1,00	0,00	78,60	0,06		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-111	B	19/05/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,20	1,00	0,00	78,60	0,01		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-112		19/05/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,20	2,00	0,00	78,80	0,01		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-162	A	19/05/2025	0,00%	0,00%	0,10	31,30	2,00	0,00	78,60	0,01		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-162	B	19/05/2025	6,10%	6,10%	9,00	6,30	2,00	0,00	78,60	0,05		0,00	85,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-166	A	19/05/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,30	1,00	0,00	78,60	0,03		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-166	B	19/05/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,00	1,00	0,00	78,80	0,01		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-119	A	19/05/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,90	1,00	1,00	78,00	0,05		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-119	B	19/05/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,90	2,00	1,00	78,10	0,04		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-119	C	19/05/2025	0,00%	0,00%	0,00	22,00	1,00	1,00	78,00	0,05		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-120	A	19/05/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,90	2,00	1,00	78,10	0,09		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-120	B	19/05/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,80	2,00	1,00	78,10	0,08		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-120	C	19/05/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,90	2,00	1,00	78,10	0,09		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-163	B	19/05/2025	0,00%	0,00%	0,00	22,00	1,00	1,00	78,00	0,02		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	C02 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H_2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
Portaria P3	PMG-164	B	19/05/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,90	2,00	1,00	78,00	0,09		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-164	C	19/05/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,90	1,00	1,00	78,00	0,10		0,00	0,00	
Transportes	PMG-121	A	22/05/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,80	2,00	2,00	78,10	0,10		0,00	0,00	
Transportes	PMG-121	B	22/05/2025	0,00%	0,00%	3,30	16,30	1,00	1,00	80,40	0,05		0,00	0,00	
Transportes	PMG-122	A	22/05/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,60	1,00	1,00	78,10	0,08		0,00	0,00	
Transportes	PMG-122	B	22/05/2025	0,00%	0,00%	4,20	15,10	2,00	2,00	80,60	0,08		0,00	0,00	
Transportes	PMG-123	A	22/05/2025	0,00%	0,00%	0,60	21,20	1,00	1,00	78,20	0,10		0,00	0,00	
Transportes	PMG-123	B	22/05/2025	0,00%	0,00%	0,40	21,20	2,00	2,00	78,40	0,11		0,00	0,00	
Transportes	PMG-124	A	22/05/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,80	1,00	2,00	79,10	0,04		0,00	0,00	
Transportes	PMG-124	B	22/05/2025	0,00%	0,00%	2,10	19,60	1,00	2,00	78,30	0,11		0,00	0,00	
Transportes	PMG-158	B	22/05/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,90	1,00	1,00	78,10	0,14		0,00	0,00	
Transportes	PMG-159	B	22/05/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,90	2,00	2,00	78,10	0,08		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-125	A	22/05/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,80	2,00	1,00	78,20	0,08		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-125	B	22/05/2025	0,00%	0,00%	4,40	17,70	1,00	2,00	77,90	-0,08		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-126	A	22/05/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,80	1,00	2,00	78,20	0,11		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-126	B	22/05/2025	0,00%	0,00%	4,80	18,10	1,00	2,00	77,00	0,07		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-127	A	22/05/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,70	1,00	2,00	78,30	0,08		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-127	B	22/05/2025	0,00%	0,00%	2,00	20,00	1,00	1,00	78,00	-0,52		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-128	A	22/05/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,80	1,00	2,00	78,20	0,11		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-128	B	22/05/2025	0,00%	0,00%	5,10	16,40	1,00	2,00	78,40	-1,35		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-129	A	22/05/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,60	1,00	2,00	78,30	0,10		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-129	B	22/05/2025	0,00%	0,00%	1,40	20,10	1,00	2,00	78,50	0,10		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-130	A	22/05/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,70	1,00	2,00	78,20	0,09		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-130	B	22/05/2025	0,00%	0,00%	4,20	17,90	2,00	2,00	77,90	-0,34		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-131	A	22/05/2025	0,00%	0,00%	0,30	21,40	1,00	1,00	78,40	0,08		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-131	B	22/05/2025	0,00%	0,00%	1,00	20,70	1,00	2,00	78,30	0,09		0,00	0,00	
Edificio I 1	PMG-16	A	27/05/2025	0,00%	0,00%	2,00	19,90	1,00	1,00	78,20	0,08		0,00	0,00	
Edificio I 1	PMG-16	B	27/05/2025	0,00%	0,00%	1,40	20,30	1,00	1,00	78,20	0,00		0,00	0,00	
Edificio I 1	PMG-17	A	27/05/2025	0,00%	0,00%	0,40	21,50	2,00	2,00	78,10	0,07		0,00	0,00	
Edificio I 1	PMG-17	B	27/05/2025	0,00%	0,00%	1,40	20,50	1,00	2,00	78,10	0,05		0,00	0,00	
Edificio I 1	PMG-18	A	27/05/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,10	3,00	0,00	78,80	-0,03		0,00	0,00	
Edificio I 1	PMG-18	B	27/05/2025	0,00%	0,00%	1,50	19,90	2,00	0,00	78,60	-0,11		0,00	0,00	
Edificio I 1	PMG-20	A	27/05/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,50	2,00	0,00	78,50	0,02		0,00	0,00	
Edificio I 1	PMG-20	B	27/05/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,20	2,00	0,00	78,50	0,11		0,00	0,00	
Edificio I 1	PMG-22	A	27/05/2025	0,00%	0,00%	0,30	21,20	1,00	0,00	78,50	0,03		0,00	0,00	
Edificio I 1	PMG-22	B	27/05/2025	0,00%	0,00%	4,20	16,50	2,00	0,00	79,30	-0,03		0,00	0,00	
Edificio I 1	PMG-23	A	27/05/2025	0,00%	0,00%	0,30	21,30	1,00	0,00	78,50	0,00		0,00	0,00	
Edificio I 1	PMG-23	B	27/05/2025	0,00%	0,00%	1,10	20,40	2,00	0,00	78,50	0,11		0,00	0,00	
Edificio I 1	PMG-113	A	27/05/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,30	2,00	0,00	78,60	-0,03		0,00	0,00	
Edificio I 1	PMG-113	B	27/05/2025	0,00%	0,00%	0,90	20,40	2,00	0,00	78,70	0,02		0,00	0,00	
Edificio I 1	PMG-114	A	27/05/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,30	2,00	0,00	78,60	0,08		0,00	0,00	
Edificio I 1	PMG-114	B	27/05/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,40	2,00	0,00	78,60	0,06		0,00	0,00	
Edificio I 1	PMG-115	A	27/05/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,10	2,00	0,00	78,70	0,09		0,00	0,00	
Edificio I 1	PMG-115	B	27/05/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,30	2,00	0,00	78,60	-0,06		0,00	0,00	
Edificio I 1	PMG-11	A	27/05/2025	0,00%	0,00%	0,90	20,60	1,00	1,00	78,60	0,14		0,00	0,00	
Edificio I 1	PMG-11	B	27/05/2025	0,50%	0,50%	0,70	20,70	1,00	1,00	78,10	0,06		0,00	36,00	
Edificio I 1	PMG-12	A	27/05/2025	0,00%	0,00%	1,80	19,60	1,00	1,00	78,60	0,06		0,00	0,00	
Edificio I 1	PMG-12	B	27/05/2025	0,00%	0,00%	1,90	19,40	2,00	2,00	78,70	0,06		0,00	0,00	
Edificio I 1	PMG-13	A	27/05/2025	0,00%	0,00%	1,10	20,70	1,00	1,00	78,20	0,09		0,00	0,00	
Edificio I 1	PMG-13	B	27/05/2025	0,00%	0,00%	1,20	20,60	1,00	2,00	78,30	0,06		0,00	0,00	
Edificio I 1	PMG-14	A	27/05/2025	0,00%	0,00%	1,60	19,90	1,00	1,00	78,50	0,12		0,00	0,00	
Edificio I 1	PMG-14	B	27/05/2025	0,00%	0,00%	3,60	17,80	2,00	1,00	78,50	0,10		0,00	0,00	
Edificio I 1	PMG-15	A	27/05/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,80	1,00	2,00	78,10	0,05		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	C02 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H_2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
Edificio I 1	**PMG-15**	**B**	**27/05/2025**	0,00%	0,00%	0,20	21,70	1,00	1,00	78,10	0,05		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-19**	**A**	**27/05/2025**	0,00%	0,00%	0,40	21,30	1,00	2,00	78,30	0,11		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-19**	**B**	**27/05/2025**	0,00%	0,00%	0,70	20,80	1,00	1,00	78,50	0,13		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-21**	**A**	**27/05/2025**	0,00%	0,00%	0,60	21,00	1,00	1,00	78,30	0,10		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-21**	**B**	**27/05/2025**	0,00%	0,00%	1,20	20,30	1,00	1,00	78,50	0,08		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-24**	**A**	**27/05/2025**	0,00%	0,00%	0,20	21,60	2,00	1,00	78,20	0,10		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-24**	**B**	**27/05/2025**	0,00%	0,00%	0,30	21,60	1,00	1,00	78,10	0,08		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-135**	**A**	**27/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,30	1,00	0,00	78,60	-0,02		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG -135**	**B**	**27/05/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,30	1,00	0,00	78,60	-0,12		0,00	0,00	
Edificio I 1	**PMG-136**	**B**	**27/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,20	2,00	0,00	78,60	0,06		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	**PMG-25**	**A**	**26/05/2025**	0,00%	0,00%	0,20	21,70	2,00	1,00	78,10	0,08		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	**PMG-25**	**B**	**26/05/2025**	0,00%	0,00%	1,00	20,80	2,00	2,00	78,20	0,09		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	**PMG-26**	**A**	**26/05/2025**	0,00%	0,00%	0,60	20,90	2,00	1,00	78,40	0,08		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	**PMG-26**	**B**	**26/05/2025**	0,00%	0,00%	1,20	20,10	2,00	1,00	78,70	-0,06		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	**PMG-27**	**A**	**26/05/2025**	0,00%	0,00%	1,50	19,60	2,00	1,00	78,90	0,10		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	**PMG-27**	**B**	**26/05/2025**	0,00%	0,00%	2,80	18,50	2,00	1,00	78,70	0,07		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	**PMG-28**	**A**	**26/05/2025**	0,00%	0,00%	0,70	20,40	2,00	1,00	78,90	0,06		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	**PMG-28**	**B**	**26/05/2025**	0,00%	0,00%	1,60	19,40	2,00	1,00	79,00	0,03		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	**PMG-29**	**A**	**26/05/2025**	0,00%	0,00%	0,20	21,80	1,00	2,00	78,00	0,06		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	**PMG-29**	**B**	**26/05/2025**	0,00%	0,00%	1,00	20,80	1,00	1,00	78,20	0,09		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	**PMG-44**	**A**	**26/05/2025**	0,00%	0,00%	0,70	21,10	2,00	1,00	78,20	0,09		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	**PMG-44**	**B**	**26/05/2025**	0,00%	0,00%	0,90	20,90	1,00	2,00	78,20	0,07		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	**PMG-45**	**A**	**26/05/2025**	0,00%	0,00%	0,30	21,30	2,00	1,00	78,40	0,08		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	**PMG-45**	**B**	**26/05/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,90	1,00	1,00	78,10	0,03		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	**PMG-134**	**B**	**26/05/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,90	2,00	1,00	78,10	0,07		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-30**	**A**	**26/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,30	2,00	0,00	78,60	-0,02		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-30**	**B**	**26/05/2025**	0,00%	0,00%	1,00	20,60	2,00	0,00	78,40	-0,01		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-31**	**A**	**26/05/2025**	0,00%	0,00%	0,20	21,20	3,00	0,00	78,60	-0,07		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-31**	**B**	**26/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,30	2,00	0,00	78,60	-0,02		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-32**	**A**	**26/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	22,00	2,00	1,00	77,90	0,04		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-32**	**B**	**26/05/2025**	0,00%	0,00%	0,60	21,50	3,00	0,00	77,90	-0,02		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-33**	**A**	**26/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,50	2,00	0,00	78,40	0,01		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-33**	**B**	**26/05/2025**	0,00%	0,00%	2,60	19,00	2,00	0,00	78,40	0,05		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-34**	**A**	**26/05/2025**	0,00%	0,00%	0,20	21,30	1,00	0,00	78,50	0,02		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-34**	**B**	**26/05/2025**	0,00%	0,00%	1,00	20,70	2,00	0,00	78,30	0,01		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-35**	**A**	**26/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,70	2,00	1,00	78,20	0,08		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-35**	**B**	**26/05/2025**	0,00%	0,00%	1,00	20,80	1,00	1,00	78,20	0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-36**	**A**	**26/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,60	2,00	1,00	78,30	0,06		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-36**	**B**	**26/05/2025**	0,00%	0,00%	2,40	19,10	2,00	1,00	78,50	0,04		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-37**	**A**	**26/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,70	1,00	0,00	78,20	0,04		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-37**	**B**	**26/05/2025**	0,00%	0,00%	1,00	20,90	1,00	1,00	78,10	0,05		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-38**	**A**	**26/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,60	1,00	0,00	78,30	-0,01		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-38**	**B**	**26/05/2025**	0,00%	0,00%	0,30	21,30	2,00	1,00	78,40	-0,02		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-39**	**A**	**26/05/2025**	0,00%	0,00%	0,20	21,40	2,00	0,00	78,40	0,02		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-39**	**B**	**26/05/2025**	0,00%	0,00%	8,20	12,90	2,00	0,00	78,30	0,00		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-40**	**A**	**26/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,70	1,00	1,00	78,30	0,06		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-40**	**B**	**26/05/2025**	0,00%	0,00%	0,30	21,40	1,00	0,00	78,30	0,07		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-41**	**A**	**26/05/2025**	0,00%	0,00%	1,00	21,40	2,00	0,00	78,50	0,01		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-41**	**B**	**26/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,40	1,00	0,00	78,50	-0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-42**	**A**	**26/05/2025**	0,00%	0,00%	0,60	20,90	2,00	0,00	78,40	-0,01		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-42**	**B**	**26/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,40	2,00	0,00	78,50	-0,08		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-43**	**A**	**26/05/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,50	2,00	0,00	78,50	0,01		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-43**	**B**	**26/05/2025**	0,00%	0,00%	0,60	21,10	2,00	0,00	78,40	-0,07		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	C02 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H_2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
I-3 Biblioteca	PMG-132	A	26/05/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,10	3,00	0,00	78,70	-0,04		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-132	B	26/05/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,20	3,00	0,00	78,70	-0,05		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-133	A	26/05/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,40	1,00	0,00	78,40	0,04		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-133	B	26/05/2025	0,00%	0,00%	0,50	21,20	2,00	1,00	78,30	0,00		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-63	A	28/05/2025	0,00%	0,00%	0,10	22,00	1,00	1,00	77,90	0,05		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-63	B	28/05/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,90	2,00	0,00	77,90	0,06		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-64	A	28/05/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,80	2,00	1,00	78,10	0,06		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-64	B	28/05/2025	0,00%	0,00%	0,40	21,30	1,00	1,00	78,20	0,11		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-65	A	28/05/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,90	1,00	1,00	78,10	0,03		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-65	B	28/05/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,80	1,00	1,00	78,10	0,08		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-66	A	28/05/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,80	1,00	1,00	78,20	0,00		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-66	B	28/05/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,80	1,00	0,00	78,10	0,18		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-67	A	28/05/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,80	1,00	1,00	78,10	0,08		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-67	B	28/05/2025	0,00%	0,00%	0,30	21,60	1,00	1,00	78,10	0,07		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-68	A	28/05/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,80	1,00	1,00	78,10	0,08		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-68	B	28/05/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,60	1,00	2,00	78,20	0,10		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-69	A	28/05/2025	0,00%	0,00%	0,10	22,00	2,00	0,00	78,00	0,07		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-69	B	28/05/2025	0,00%	0,00%	1,60	20,30	1,00	1,00	78,10	0,07		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-77	A	28/05/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,80	2,00	1,00	78,10	0,08		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-77	B	28/05/2025	0,00%	0,00%	0,90	20,60	1,00	1,00	78,50	0,11		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-78	A	28/05/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,70	2,00	1,00	78,20	0,10		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-78	B	28/05/2025	0,00%	0,00%	1,50	20,00	1,00	1,00	78,50	0,12		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-79	A	29/05/2025	0,00%	0,00%	0,10	22,00	1,00	0,00	78,00	0,06		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-79	B	29/05/2025	0,00%	0,00%	0,10	22,00	1,00	1,00	77,90	-0,03		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-80	A	28/05/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,80	1,00	1,00	78,20	0,03		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-80	B	28/05/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,70	1,00	2,00	78,20	0,08		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-81	A	28/05/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,80	1,00	2,00	78,20	0,11		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-81	B	28/05/2025	0,00%	0,00%	0,40	21,50	1,00	1,00	78,10	0,04		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-144	B	28/05/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,80	2,00	2,00	78,20	-0,03		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-145	B	28/05/2025	0,00%	0,00%	0,40	20,80	1,00	2,00	78,80	0,10		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-146	B	28/05/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,60	2,00	1,00	78,20	0,06		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-147	B	28/05/2025	0,00%	0,00%	0,30	21,40	2,00	1,00	78,30	0,05		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-148	B	28/05/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,80	2,00	1,00	78,10	0,12		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-149	B	28/05/2025	0,00%	0,00%	1,50	20,70	1,00	1,00	77,80	0,09		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-150	B	28/05/2025	0,00%	0,00%	2,80	18,80	1,00	1,00	78,40	0,08		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-151	B	28/05/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,90	1,00	1,00	78,10	0,15		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-46	A	28/05/2025	0,00%	0,00%	0,30	21,30	2,00	1,00	78,40	0,06		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-46	B	28/05/2025	0,00%	0,00%	3,90	17,20	2,00	1,00	78,90	0,04		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-47	A	28/05/2025	0,00%	0,00%	0,30	21,00	2,00	1,00	78,70	0,07		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-47	B	28/05/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,70	2,00	1,00	78,20	0,05		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-48	A	28/05/2025	0,00%	0,00%	0,30	21,50	1,00	1,00	78,20	0,07		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-48	B	28/05/2025	0,00%	0,00%	0,30	21,50	1,00	1,00	78,30	0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-49	A	28/05/2025	0,00%	0,00%	0,30	21,60	1,00	1,00	78,10	-0,17		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-49	B	28/05/2025	0,00%	0,00%	4,00	17,80	1,00	1,00	78,20	0,11		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-50	A	28/05/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,80	2,00	1,00	78,10	0,00		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-50	B	28/05/2025	0,00%	0,00%	1,80	20,30	1,00	1,00	77,90	0,10		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-51	A	28/05/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,30	1,00	0,00	78,50	0,00		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-51	B	28/05/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,20	2,00	0,00	78,60	0,01		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-52	A	28/05/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,40	2,00	0,00	78,50	0,05		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-52	B	28/05/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,40	1,00	0,00	78,50	0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-53	A	28/05/2025	0,00%	0,00%	0,30	21,20	2,00	0,00	78,50	0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-53	B	28/05/2025	0,00%	0,00%	0,50	20,50	2,00	0,00	79,00	-0,13		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-54	A	28/05/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,10	2,00	0,00	78,60	-0,01		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	C02 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H_2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
Conjunto Laboratorial	**PMG-54**	**B**	**28/05/2025**	0,00%	0,00%	2,50	17,10	2,00	0,00	80,30	-0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-55**	**A**	**28/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,20	2,00	0,00	78,70	-0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-55**	**B**	**28/05/2025**	0,00%	0,00%	3,80	16,60	2,00	0,00	79,50	-0,06		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-56**	**A**	**28/05/2025**	0,00%	0,00%	0,20	21,00	1,00	1,00	78,80	0,07		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-56**	**B**	**28/05/2025**	0,00%	0,00%	1,00	20,80	1,00	0,00	78,20	0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-57**	**A**	**28/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,60	1,00	1,00	78,30	0,06		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-57**	**B**	**28/05/2025**	0,00%	0,00%	1,20	20,60	1,00	1,00	78,20	0,04		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-58**	**A**	**28/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,70	2,00	1,00	78,30	0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-58**	**B**	**28/05/2025**	0,00%	0,00%	1,70	20,10	1,00	1,00	78,30	0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-59**	**A**	**28/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,50	1,00	1,00	78,40	0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-59**	**B**	**28/05/2025**	0,00%	0,00%	0,90	20,70	2,00	1,00	78,40	0,09		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-60**	**A**	**28/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,40	1,00	1,00	78,50	0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-60**	**B**	**28/05/2025**	0,00%	0,00%	2,80	18,60	2,00	1,00	78,60	0,00		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-61**	**A**	**28/05/2025**	0,00%	0,00%	0,20	21,30	1,00	1,00	78,60	-0,01		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-61**	**B**	**28/05/2025**	0,00%	0,00%	6,40	14,10	1,00	1,00	79,50	0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-137**	**B**	**28/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,80	1,00	1,00	78,10	0,12		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-138**	**B**	**28/05/2025**	0,00%	0,00%	2,20	20,00	1,00	1,00	77,90	-0,18		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-139**	**A**	**28/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,40	1,00	0,00	78,60	-0,09		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-139**	**B**	**28/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,30	1,00	0,00	78,60	-0,02		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-140**	**A**	**28/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,40	2,00	0,00	78,50	0,02		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-140**	**B**	**28/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,40	2,00	0,00	78,60	-0,02		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-141**	**B**	**28/05/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,50	2,00	0,00	78,50	0,02		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-62**	**A**	**28/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,50	2,00	0,00	78,40	0,04		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-62**	**B**	**28/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,50	1,00	0,00	78,40	0,03		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-01**	**A**	**27/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,00	1,00	1,00	78,90	0,10		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-01**	**B**	**27/05/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,20	1,00	1,00	78,80	-0,01		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-02**	**A**	**27/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,70	2,00	1,00	78,20	0,08		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-02**	**B**	**27/05/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,80	2,00	2,00	78,20	0,06		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-03**	**A**	**27/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,40	1,00	1,00	78,60	0,05		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-03**	**B**	**27/05/2025**	0,00%	0,00%	1,60	19,50	1,00	1,00	78,90	0,06		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-04**	**A**	**27/05/2025**	0,00%	0,00%	0,30	21,50	2,00	1,00	78,30	0,08		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-04**	**B**	**27/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,80	2,00	0,00	78,10	0,05		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-05**	**A**	**27/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,50	1,00	1,00	78,40	0,10		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-05**	**B**	**27/05/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,40	1,00	1,00	78,50	0,11		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-06**	**A**	**27/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,60	1,00	1,00	78,30	0,02		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-06**	**B**	**27/05/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,70	2,00	1,00	78,30	0,02		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-07**	**A**	**27/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,80	1,00	2,00	78,10	0,06		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-07**	**B**	**27/05/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,80	2,00	1,00	78,10	0,07		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-08**	**A**	**27/05/2025**	0,00%	0,00%	0,20	21,60	1,00	1,00	78,20	0,05		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-08**	**B**	**27/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,70	2,00	1,00	78,20	-0,03		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-09**	**A**	**29/05/2025**	0,00%	0,00%	1,20	20,40	2,00	0,00	78,40	-0,07		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-09**	**B**	**29/05/2025**	0,00%	0,00%	7,50	13,10	1,00	0,00	79,40	-0,04		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-10**	**A**	**29/05/2025**	0,00%	0,00%	0,50	21,30	2,00	1,00	78,20	0,07		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-10**	**B**	**29/05/2025**	0,00%	0,00%	2,10	19,10	2,00	0,00	78,90	0,08		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-84**	**A**	**27/05/2025**	0,00%	0,00%	0,20	21,50	2,00	0,00	78,30	0,04		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-84**	**B**	**27/05/2025**	0,00%	0,00%	3,10	19,00	2,00	1,00	77,90	0,04		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-85**	**A**	**27/05/2025**	0,00%	0,00%	0,90	20,70	1,00	1,00	78,30	0,03		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-85**	**B**	**27/05/2025**	0,00%	0,00%	2,40	19,20	2,00	1,00	78,30	0,06		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-86**	**A**	**27/05/2025**	0,00%	0,00%	0,20	21,40	1,00	1,00	78,30	0,04		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-86**	**B**	**27/05/2025**	0,00%	0,00%	1,20	19,90	2,00	1,00	78,90	0,03		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-87**	**A**	**27/05/2025**	0,00%	0,00%	2,70	17,40	2,00	1,00	80,00	0,06		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-87**	**B**	**27/05/2025**	0,00%	0,00%	2,40	18,70	1,00	1,00	78,80	-0,04		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-152**	**A**	**29/05/2025**	0,00%	0,00%	0,20	21,40	2,00	0,00	78,30	-0,07		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	C02 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H_2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-152**	**B**	**29/05/2025**	0,00%	0,00%	3,50	17,80	2,00	0,00	78,70	0,02		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-153**	**B**	**27/05/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,30	2,00	1,00	78,70	0,05		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-154**	**B**	**27/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,80	2,00	1,00	78,10	0,04		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-155**	**B**	**27/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,30	2,00	1,00	78,60	0,08		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-156**	**B**	**27/05/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,60	1,00	1,00	78,40	0,13		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-157**	**B**	**27/05/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,60	1,00	1,00	78,40	0,07		0,00	0,00	
Enfermaria	**PMG-70**	**A**	**29/05/2025**	0,00%	0,00%	0,20	21,80	1,00	1,00	78,10	-0,02		0,00	0,00	
Enfermaria	**PMG-70**	**B**	**29/05/2025**	0,00%	0,00%	1,00	20,20	1,00	1,00	78,70	0,05		0,00	0,00	
Enfermaria	**PMG-71**	**A**	**29/05/2025**	0,00%	0,00%	0,20	21,70	1,00	0,00	78,10	0,04		0,00	0,00	
Enfermaria	**PMG-71**	**B**	**29/05/2025**	0,00%	0,00%	1,10	11,50	1,00	0,00	87,40	-0,03		0,00	0,00	
Enfermaria	**PMG-72**	**A**	**29/05/2025**	0,00%	0,00%	0,50	21,60	1,00	1,00	77,90	0,04		0,00	0,00	
Enfermaria	**PMG-72**	**B**	**29/05/2025**	0,00%	0,00%	0,90	20,00	2,00	1,00	79,10	0,03		0,00	0,00	
Enfermaria	**PMG-73**	**A**	**29/05/2025**	0,00%	0,00%	0,20	21,60	2,00	1,00	78,20	0,02		0,00	0,00	
Enfermaria	**PMG-73**	**B**	**29/05/2025**	0,00%	0,00%	0,70	21,10	1,00	1,00	78,20	0,04		0,00	0,00	
Enfermaria	**PMG-74**	**A**	**29/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,90	1,00	1,00	78,10	0,04		0,00	0,00	
Enfermaria	**PMG-74**	**B**	**29/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,80	1,00	1,00	78,10	0,02		0,00	0,00	
Enfermaria	**PMG-75**	**A**	**29/05/2025**	0,00%	0,00%	0,40	21,70	2,00	0,00	77,90	0,03		0,00	0,00	
Enfermaria	**PMG-75**	**B**	**29/05/2025**	0,00%	0,00%	3,00	15,40	2,00	0,00	81,60	-0,02		0,00	0,00	
Enfermaria	**PMG-76**	**A**	**29/05/2025**	0,00%	0,00%	0,50	21,40	2,00	1,00	78,20	-0,13		0,00	0,00	
Enfermaria	**PMG-76**	**B**	**29/05/2025**	0,00%	0,00%	2,40	14,50	2,00	1,00	83,10	0,08		0,00	0,00	
Enfermaria	**PMG-165**	**A**	**29/05/2025**	0,00%	0,00%	0,40	21,60	1,00	1,00	78,00	0,06		0,00	0,00	
Enfermaria	**PMG-165**	**B**	**29/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,80	1,00	1,00	78,20	0,02		0,00	0,00	
CAT	**PMG-82**	**A**	**29/05/2025**	0,00%	0,00%	2,10	19,20	2,00	0,00	78,70	-0,03		0,00	0,00	
CAT	**PMG-82**	**B**	**29/05/2025**	0,00%	0,00%	8,20	12,40	1,00	0,00	79,40	-0,06		0,00	0,00	
CAT	**PMG-83**	**A**	**29/05/2025**	0,00%	0,00%	3,60	18,00	1,00	0,00	78,30	-0,03		0,00	0,00	
CAT	**PMG-83**	**B**	**29/05/2025**	0,00%	0,00%	5,00	16,50	1,00	0,00	78,60	0,00		0,00	0,00	
CAT	**PMG-94**	**A**	**29/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,50	2,00	0,00	78,40	-0,04		0,00	0,00	
CAT	**PMG-94**	**B**	**29/05/2025**	0,00%	0,00%	3,90	17,90	2,00	0,00	78,20	-0,08		0,00	0,00	
CAT	**PMG-95**	**A**	**29/05/2025**	0,00%	0,00%	0,90	20,80	1,00	0,00	78,30	-0,07		0,00	0,00	
CAT	**PMG-95**	**B**	**29/05/2025**	0,00%	0,00%	1,60	20,50	1,00	1,00	77,90	-0,01		0,00	0,00	
CAT	**PMG-96**	**A**	**29/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,50	1,00	1,00	78,30	0,02		0,00	0,00	
CAT	**PMG-96**	**B**	**29/05/2025**	0,00%	0,00%	2,90	16,80	1,00	1,00	80,20	0,02		0,00	0,00	
CAT	**PMG-97**	**A**	**29/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,70	2,00	0,00	78,20	0,01		0,00	0,00	
CAT	**PMG-97**	**B**	**29/05/2025**	0,00%	0,00%	3,40	17,50	1,00	0,00	79,10	0,03		0,00	0,00	
CAT	**PMG-98**	**A**	**29/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,70	2,00	0,00	78,20	0,04		0,00	0,00	
CAT	**PMG-98**	**B**	**29/05/2025**	0,00%	0,00%	0,50	21,20	1,00	0,00	78,20	0,04		0,00	0,00	
CAT	**PMG-160**	**A**	**29/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,70	1,00	0,00	78,20	-0,03		0,00	0,00	
CAT	**PMG-160**	**B**	**29/05/2025**	0,00%	0,00%	2,00	19,60	2,00	0,00	78,30	-0,17		0,00	0,00	
CAT	**PMG-161**	**A**	**29/05/2025**	0,00%	0,00%	1,70	20,10	1,00	0,00	78,20	-0,03		0,00	0,00	
CAT	**PMG-161**	**B**	**29/05/2025**	0,00%	0,00%	2,40	19,40	1,00	1,00	78,20	0,00		0,00	0,00	
Incubadora	**PMG-88**	**A**	**30/05/2025**	0,00%	0,00%	0,20	21,70	2,00	0,00	78,20	-0,03		0,00	0,00	
Incubadora	**PMG-88**	**B**	**30/05/2025**	0,00%	0,00%	0,30	21,50	2,00	0,00	78,20	-0,06		0,00	0,00	
Incubadora	**PMG-89**	**A**	**30/05/2025**	0,00%	0,00%	0,20	21,70	2,00	0,00	78,10	-0,04		0,00	0,00	
Incubadora	**PMG-89**	**B**	**30/05/2025**	0,00%	0,00%	0,50	21,40	1,00	1,00	78,10	-0,12		0,00	0,00	
Incubadora	**PMG-90**	**A**	**30/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,90	2,00	0,00	78,10	-0,08		0,00	0,00	
Incubadora	**PMG-90**	**B**	**30/05/2025**	0,00%	0,00%	0,40	21,50	1,00	0,00	78,20	-0,07		0,00	0,00	
Incubadora	**PMG-91**	**A**	**30/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,90	1,00	0,00	78,10	0,01		0,00	0,00	
Incubadora	**PMG-91**	**B**	**30/05/2025**	0,00%	0,00%	1,20	20,70	1,00	0,00	78,20	-0,05		0,00	0,00	
Incubadora	**PMG-92**	**A**	**30/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,80	1,00	0,00	78,10	0,00		0,00	0,00	
Incubadora	**PMG-92**	**B**	**30/05/2025**	0,00%	0,00%	0,80	21,10	1,00	0,00	78,00	0,13		0,00	0,00	
Incubadora	**PMG-93**	**A**	**30/05/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,80	2,00	1,00	78,00	0,03		0,00	0,00	
Incubadora	**PMG-93**	**B**	**30/05/2025**	0,00%	0,00%	0,90	21,30	1,00	0,00	77,90	-0,02		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-102**		**26/05/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,80	2,00	2,00	78,20	0,07		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	C02 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H_2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
Ginásio Poliesportivo	PMG-103		26/05/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,80	1,00	1,00	78,20	0,12		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-104		26/05/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,80	2,00	1,00	78,20	0,07		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-105		26/05/2025	0,00%	0,00%	0,90	20,90	2,00	2,00	78,30	0,08		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-106		26/05/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,60	2,00	1,00	78,30	0,03		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-107		26/05/2025	0,00%	0,00%	2,70	17,60	2,00	1,00	79,80	0,15		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-108		26/05/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,80	2,00	1,00	78,20	0,03		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-109	A	26/05/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,90	2,00	1,00	78,10	0,03		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-109	B	26/05/2025	0,00%	0,00%	0,90	20,70	2,00	1,00	78,40	0,13		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-110	A	26/05/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,70	1,00	1,00	78,20	0,12		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-110	B	26/05/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,80	2,00	1,00	78,20	0,03		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-111	A	26/05/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,80	1,00	2,00	78,20	0,08		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-111	B	26/05/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,70	1,00	1,00	78,20	0,00		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-112		26/05/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,90	2,00	1,00	78,00	0,06		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-162	A	26/05/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,80	2,00	1,00	78,20	0,06		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-162	B	26/05/2025	0,00%	0,00%	5,50	12,70	1,00	1,00	81,80	0,07		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-166	A	26/05/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,80	1,00	1,00	78,20	-0,12		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-166	B	26/05/2025	0,00%	0,00%	1,20	19,00	1,00	2,00	79,70	0,01		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-119	A	26/05/2025	0,00%	0,00%	0,00	22,00	2,00	1,00	78,00	0,06		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-119	B	26/05/2025	0,00%	0,00%	0,00	22,00	2,00	1,00	78,00	-0,02		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-119	C	26/05/2025	0,00%	0,00%	0,00	22,00	2,00	1,00	78,00	0,03		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-120	A	26/05/2025	0,00%	0,00%	0,00	22,00	2,00	1,00	78,00	0,21		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-120	B	26/05/2025	0,00%	0,00%	0,00	22,00	1,00	2,00	78,00	0,08		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-120	C	26/05/2025	0,00%	0,00%	0,00	22,00	2,00	1,00	78,00	-0,04		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-163	B	26/05/2025	0,00%	0,00%	0,00	22,00	2,00	1,00	78,00	0,15		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-164	B	26/05/2025	0,00%	0,00%	0,00	22,00	1,00	1,00	78,00	0,10		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-164	C	26/05/2025	0,00%	0,00%	0,00	22,00	1,00	1,00	78,00	0,25		0,00	0,00	
Transportes	PMG-121	A	29/05/2025	0,00%	0,00%	0,20	22,00	1,00	1,00	77,80	0,04		0,00	0,00	
Transportes	PMG-121	B	29/05/2025	0,00%	0,00%	0,10	22,00	1,00	1,00	77,90	0,08		0,00	0,00	
Transportes	PMG-122	A	29/05/2025	0,00%	0,00%	0,40	21,60	1,00	0,00	78,00	0,00		0,00	0,00	
Transportes	PMG-122	B	29/05/2025	0,00%	0,00%	0,10	22,00	1,00	1,00	77,90	-0,01		0,00	0,00	
Transportes	PMG-123	A	29/05/2025	0,00%	0,00%	0,60	21,30	1,00	1,00	78,10	0,13		0,00	0,00	
Transportes	PMG-123	B	29/05/2025	0,00%	0,00%	0,90	20,80	2,00	1,00	78,30	0,03		0,00	0,00	
Transportes	PMG-124	A	29/05/2025	0,00%	0,00%	0,90	21,00	2,00	1,00	78,00	0,08		0,00	0,00	
Transportes	PMG-124	B	29/05/2025	0,00%	0,00%	1,70	19,80	1,00	1,00	78,50	0,02		0,00	0,00	
Transportes	PMG-158	B	29/05/2025	0,00%	0,00%	0,00	22,00	1,00	0,00	77,90	0,04		0,00	0,00	
Transportes	PMG-159	B	29/05/2025	0,00%	0,00%	0,00	22,10	2,00	0,00	77,90	-0,02		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-125	A	29/05/2025	0,00%	0,00%	0,00	22,10	1,00	2,00	77,90	0,03		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-125	B	29/05/2025	0,00%	0,00%	4,30	18,10	1,00	1,00	77,60	-0,02		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-126	A	29/05/2025	0,00%	0,00%	0,10	22,10	1,00	1,00	77,90	-0,13		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-126	B	29/05/2025	0,00%	0,00%	4,20	18,90	1,00	2,00	76,90	0,15		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-127	A	29/05/2025	0,00%	0,00%	0,00	22,00	1,00	1,00	77,90	0,08		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-127	B	29/05/2025	0,00%	0,00%	2,90	19,70	1,00	1,00	77,30	0,19		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-128	A	29/05/2025	0,00%	0,00%	0,10	22,00	2,00	1,00	78,00	0,04		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-128	B	29/05/2025	0,00%	0,00%	4,80	17,70	1,00	1,00	77,50	0,03		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-129	A	29/05/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,90	1,00	1,00	77,90	0,05		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-129	B	29/05/2025	0,00%	0,00%	1,00	21,20	2,00	1,00	77,90	0,02		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-130	A	29/05/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,90	1,00	1,00	77,90	0,05		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-130	B	29/05/2025	0,00%	0,00%	4,00	18,70	1,00	1,00	77,30	-0,99		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-131	A	29/05/2025	0,00%	0,00%	0,70	20,80	1,00	1,00	78,60	0,08		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-131	B	29/05/2025	0,00%	0,00%	1,00	20,70	2,00	2,00	78,30	0,05		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-16	A	03/06/2025	0,00%	0,00%	1,70	20,30	2,00	1,00	77,90	0,06		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-16	B	03/06/2025	0,00%	0,00%	1,60	20,30	1,00	1,00	78,00	0,15		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-17	A	03/06/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,80	2,00	1,00	77,90	0,03		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	C02 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H_2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
Edificio I 1	PMG-17	B	03/06/2025	0,00%	0,00%	1,30	20,80	2,00	2,00	77,90	0,07		0,00	0,00	
Edificio I 1	PMG-18	A	03/06/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,30	2,00	0,00	78,60	-0,02		0,00	0,00	
Edificio I 1	PMG-18	B	03/06/2025	0,00%	0,00%	1,30	20,20	2,00	0,00	78,50	0,01		0,00	0,00	
Edificio I 1	PMG-20	A	03/06/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,70	2,00	1,00	78,30	0,03		0,00	0,00	
Edificio I 1	PMG-20	B	03/06/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,40	1,00	0,00	78,40	0,05		0,00	0,00	
Edificio I 1	PMG-22	A	03/06/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,50	1,00	0,00	78,30	0,04		0,00	0,00	
Edificio I 1	PMG-22	B	03/06/2025	0,00%	0,00%	3,90	17,20	2,00	0,00	78,90	0,04		0,00	0,00	
Edificio I 1	PMG-23	A	03/06/2025	0,00%	0,00%	0,30	21,30	1,00	0,00	78,40	0,05		0,00	0,00	
Edificio I 1	PMG-23	B	03/06/2025	0,00%	0,00%	1,00	20,70	1,00	0,00	78,40	0,04		0,00	0,00	
Edificio I 1	PMG-113	A	03/06/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,40	2,00	0,00	78,50	0,00		0,00	0,00	
Edificio I 1	PMG-113	B	03/06/2025	0,00%	0,00%	1,10	20,30	2,00	0,00	78,60	0,03		0,00	0,00	
Edificio I 1	PMG-114	A	03/06/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,50	2,00	0,00	78,40	-0,05		0,00	0,00	
Edificio I 1	PMG-114	B	03/06/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,60	2,00	0,00	78,40	-0,03		0,00	0,00	
Edificio I 1	PMG-115	A	03/06/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,40	1,00	0,00	78,50	0,08		0,00	0,00	
Edificio I 1	PMG-115	B	03/06/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,50	2,00	0,00	78,50	0,02		0,00	0,00	
Edificio I 1	PMG-11	A	03/06/2025	0,00%	0,00%	0,50	21,50	2,00	2,00	77,90	0,07		0,00	0,00	
Edificio I 1	PMG-11	B	03/06/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,70	1,00	2,00	78,10	0,04		0,00	0,00	
Edificio I 1	PMG-12	A	03/06/2025	0,00%	0,00%	2,90	18,70	1,00	1,00	78,40	0,09		0,00	0,00	
Edificio I 1	PMG-12	B	03/06/2025	0,00%	0,00%	2,40	19,50	2,00	1,00	78,10	0,03		0,00	0,00	
Edificio I 1	PMG-13	A	03/06/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,10	2,00	1,00	77,90	0,10		0,00	0,00	
Edificio I 1	PMG-13	B	03/06/2025	0,00%	0,00%	1,30	20,60	2,00	1,00	78,10	0,03		0,00	0,00	
Edificio I 1	PMG-14	A	03/06/2025	0,00%	0,00%	1,30	20,90	1,00	1,00	77,80	0,11		0,00	0,00	
Edificio I 1	PMG-14	B	03/06/2025	0,00%	0,00%	3,40	18,70	2,00	1,00	78,00	0,01		0,00	0,00	
Edificio I 1	PMG-15	A	03/06/2025	0,00%	0,00%	0,10	22,00	2,00	1,00	77,90	0,01		0,00	0,00	
Edificio I 1	PMG-15	B	03/06/2025	0,00%	0,00%	0,10	22,00	2,00	1,00	77,90	0,05		0,00	0,00	
Edificio I 1	PMG-19	A	03/06/2025	0,00%	0,00%	0,30	21,90	1,00	2,00	77,90	0,07		0,00	0,00	
Edificio I 1	PMG-19	B	03/06/2025	0,00%	0,00%	0,60	21,40	1,00	2,00	78,00	0,04		0,00	0,00	
Edificio I 1	PMG-21	A	03/06/2025	0,00%	0,00%	0,70	21,50	1,00	1,00	77,80	0,08		0,00	0,00	
Edificio I 1	PMG-21	B	03/06/2025	0,00%	0,00%	1,10	20,90	2,00	1,00	78,00	0,13		0,00	0,00	
Edificio I 1	PMG-24	A	03/06/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,80	4,00	0,00	79,00	-0,04		0,00	0,00	
Edificio I 1	PMG-24	B	03/06/2025	0,00%	0,00%	0,40	20,70	3,00	0,00	78,90	-0,03		0,00	0,00	
Edificio I 1	PMG-135	A	03/06/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,40	2,00	0,00	78,40	-0,04		0,00	0,00	
Edificio I 1	PMG -135	B	03/06/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,60	2,00	0,00	78,40	0,02		0,00	0,00	
Edificio I 1	PMG-136	B	03/06/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,40	2,00	1,00	78,50	0,03		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-25	A	02/06/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,60	1,00	1,00	78,20	0,05		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-25	B	02/06/2025	0,00%	0,00%	1,00	20,90	1,00	1,00	78,10	0,06		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-26	A	02/06/2025	0,00%	0,00%	0,50	21,30	1,00	0,00	78,10	0,08		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-26	B	02/06/2025	0,00%	0,00%	0,70	20,90	1,00	1,00	78,30	0,10		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-27	A	02/06/2025	0,00%	0,00%	1,20	20,70	1,00	0,00	78,10	0,04		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-27	B	02/06/2025	0,00%	0,00%	3,30	18,30	1,00	1,00	78,40	0,13		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-28	A	02/06/2025	0,00%	0,00%	0,80	19,80	2,00	1,00	79,40	0,08		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-28	B	02/06/2025	0,00%	0,00%	1,60	19,30	1,00	1,00	79,10	0,01		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-29	A	02/06/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,60	1,00	1,00	78,10	0,08		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-29	B	02/06/2025	0,00%	0,00%	0,80	20,90	1,00	1,00	78,30	-0,06		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-44	A	02/06/2025	0,00%	0,00%	0,60	21,40	1,00	1,00	78,00	0,07		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-44	B	02/06/2025	0,00%	0,00%	0,90	21,10	1,00	1,00	78,00	0,03		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-45	A	02/06/2025	0,00%	0,00%	0,30	21,20	2,00	1,00	78,50	0,02		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-45	B	02/06/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,20	2,00	1,00	78,60	0,20		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-134	B	02/06/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,70	1,00	1,00	78,20	0,06		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-30	A	02/06/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,70	1,00	0,00	78,20	-0,04		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-30	B	02/06/2025	0,00%	0,00%	0,10	20,80	2,00	0,00	78,20	-0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-31	A	02/06/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,50	2,00	0,00	78,20	-0,11		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-31	B	02/06/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,70	2,00	0,00	78,20	-0,03		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	C02 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H_2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
I-3 Biblioteca	PMG-32	A	06/06/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,80	1,00	0,00	78,00	-0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-32	B	06/06/2025	0,00%	0,00%	0,90	21,00	1,00	0,00	78,10	-0,01		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-33	A	02/06/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,60	1,00	0,00	78,30	-0,02		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-33	B	02/06/2025	0,00%	0,00%	3,10	18,60	1,00	0,00	78,20	0,05		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-34	A	02/06/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,60	2,00	0,00	78,30	0,02		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-34	B	02/06/2025	0,00%	0,00%	1,00	20,90	2,00	0,00	78,10	0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-35	A	02/06/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,80	2,00	1,00	78,20	0,05		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-35	B	02/06/2025	0,00%	0,00%	1,00	20,90	1,00	0,00	78,10	-0,04		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-36	A	02/06/2025	0,00%	0,00%	2,20	19,40	1,00	0,00	78,30	0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-36	B	02/06/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,60	1,00	0,00	78,30	0,08		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-37	A	02/06/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,70	1,00	0,00	78,20	0,06		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-37	B	02/06/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,00	1,00	1,00	78,10	0,14		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-38	A	02/06/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,60	1,00	1,00	78,20	0,04		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-38	B	02/06/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,50	1,00	0,00	78,30	0,08		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-39	A	02/06/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,60	1,00	0,00	78,20	0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-39	B	02/06/2025	0,00%	0,00%	4,90	16,70	1,00	0,00	78,40	0,01		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-40	A	02/06/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,70	1,00	0,00	78,20	0,02		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-40	B	02/06/2025	0,00%	0,00%	0,30	21,50	2,00	1,00	78,20	0,06		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-41	A	02/06/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,70	2,00	0,00	78,20	0,02		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-41	B	02/06/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,70	1,00	0,00	78,20	-0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-42	A	02/06/2025	0,00%	0,00%	0,70	21,20	2,00	0,00	78,20	-0,01		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-42	B	02/06/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,70	2,00	0,00	78,30	0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-43	A	02/06/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,70	1,00	0,00	78,20	-0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-43	B	02/06/2025	0,00%	0,00%	0,50	21,30	1,00	0,00	78,20	-0,14		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-132	A	02/06/2025	0,00%	0,00%	0,30	21,50	2,00	0,00	78,20	-0,04		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-132	B	02/06/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,60	2,00	0,00	78,20	-0,11		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-133	A	02/06/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,60	1,00	0,00	78,20	0,00		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-133	B	02/06/2025	0,00%	0,00%	0,60	21,20	1,00	0,00	78,20	0,04		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-63	A	04/06/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,90	1,00	1,00	78,00	0,05		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-63	B	04/06/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,80	2,00	1,00	78,00	0,04		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-64	A	04/06/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,80	1,00	1,00	78,10	0,06		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-64	B	04/06/2025	0,00%	0,00%	0,40	21,30	2,00	1,00	78,30	-0,05		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-65	A	04/06/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,80	2,00	1,00	78,20	0,06		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-65	B	04/06/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,80	2,00	1,00	78,10	-0,02		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-66	A	04/06/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,60	1,00	1,00	78,30	0,11		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-66	B	04/06/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,60	2,00	1,00	78,20	0,06		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-67	A	04/06/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,60	2,00	1,00	78,30	0,16		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-67	B	04/06/2025	0,00%	0,00%	0,30	21,40	2,00	1,00	78,30	0,08		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-68	A	04/06/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,80	2,00	1,00	78,10	0,09		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-68	B	04/06/2025	0,00%	0,00%	0,60	21,20	1,00	2,00	78,20	0,10		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-69	A	04/06/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,90	1,00	1,00	78,10	0,06		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-69	B	04/06/2025	0,00%	0,00%	1,10	20,40	2,00	1,00	78,50	0,10		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-77	A	04/06/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,70	2,00	1,00	78,20	0,09		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-77	B	04/06/2025	0,00%	0,00%	0,80	20,60	2,00	1,00	78,60	0,04		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-78	A	04/06/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,60	2,00	1,00	78,30	0,02		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-78	B	04/06/2025	0,00%	0,00%	1,30	20,20	1,00	1,00	78,50	0,07		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-79	A	04/06/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,70	1,00	1,00	78,30	0,12		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-79	B	04/06/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,70	2,00	1,00	78,30	0,00		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-80	A	04/06/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,80	1,00	2,00	78,20	0,09		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-80	B	04/06/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,60	2,00	1,00	78,20	0,12		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-81	A	04/06/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,60	2,00	1,00	78,40	0,08		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-81	B	04/06/2025	0,00%	0,00%	0,40	21,10	2,00	0,00	78,40	0,08		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-144	B	04/06/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,70	2,00	1,00	78,30	0,07		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	C02 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H_2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
Edifício I-4	**PMG-145**	**B**	**04/06/2025**	0,00%	0,00%	0,40	20,70	2,00	1,00	78,90	0,11		0,00	0,00	
Edifício I-4	**PMG-146**	**B**	**04/06/2025**	0,00%	0,00%	0,30	21,00	1,00	1,00	78,70	0,11		0,00	0,00	
Edifício I-4	**PMG-147**	**B**	**04/06/2025**	0,00%	0,00%	0,50	21,10	2,00	1,00	78,40	0,08		0,00	0,00	
Edifício I-4	**PMG-148**	**B**	**04/06/2025**	0,00%	0,00%	0,70	21,20	1,00	2,00	78,20	0,13		0,00	0,00	
Edifício I-4	**PMG-149**	**B**	**04/06/2025**	0,00%	0,00%	1,60	20,50	2,00	1,00	77,90	0,08		0,00	0,00	
Edifício I-4	**PMG-150**	**B**	**04/06/2025**	0,00%	0,00%	1,80	18,90	1,00	1,00	79,30	0,07		0,00	0,00	
Edifício I-4	**PMG-151**	**B**	**04/06/2025**	0,00%	0,00%	1,00	20,70	1,00	1,00	78,30	0,09		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-46**	**A**	**04/06/2025**	0,00%	0,00%	0,50	21,10	2,00	1,00	78,40	0,04		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-46**	**B**	**04/06/2025**	0,00%	0,00%	3,60	17,60	3,00	0,00	78,80	-0,02		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-47**	**A**	**04/06/2025**	0,00%	0,00%	0,20	21,50	2,00	1,00	78,30	0,04		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-47**	**B**	**04/06/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,70	2,00	1,00	78,20	0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-48**	**A**	**04/06/2025**	0,00%	0,00%	0,30	21,50	1,00	1,00	78,30	0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-48**	**B**	**04/06/2025**	0,00%	0,00%	0,30	21,50	1,00	1,00	78,20	0,01		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-49**	**A**	**04/06/2025**	0,00%	0,00%	0,30	21,50	1,00	1,00	78,20	0,06		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-49**	**B**	**04/06/2025**	0,00%	0,00%	4,70	17,10	1,00	1,00	78,10	0,02		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-50**	**A**	**04/06/2025**	0,00%	0,00%	0,20	21,50	2,00	2,00	78,20	0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-50**	**B**	**04/06/2025**	0,00%	0,00%	1,40	20,60	1,00	1,00	78,00	0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-51**	**A**	**04/06/2025**	0,00%	0,00%	0,20	21,40	2,00	0,00	78,50	0,02		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-51**	**B**	**04/06/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,50	2,00	0,00	78,50	-0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-52**	**A**	**04/06/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,40	1,00	0,00	78,50	-0,01		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-52**	**B**	**04/06/2025**	0,00%	0,00%	0,20	21,30	2,00	0,00	78,50	0,01		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-53**	**A**	**04/06/2025**	0,00%	0,00%	0,30	20,90	2,00	0,00	78,80	-0,01		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-53**	**B**	**04/06/2025**	0,00%	0,00%	0,40	20,70	2,00	0,00	78,90	0,00		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-54**	**A**	**04/06/2025**	0,00%	0,00%	0,20	21,20	2,00	0,00	78,60	-0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-54**	**B**	**04/06/2025**	0,00%	0,00%	2,80	17,00	2,00	0,00	80,20	0,06		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-55**	**A**	**04/06/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,30	2,00	0,00	78,60	0,04		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-55**	**B**	**04/06/2025**	0,00%	0,00%	3,80	16,80	2,00	0,00	79,40	-0,10		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-56**	**A**	**04/06/2025**	0,00%	0,00%	0,60	21,20	2,00	0,00	78,20	0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-56**	**B**	**04/06/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,50	3,00	1,00	78,40	0,12		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-57**	**A**	**04/06/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,50	2,00	0,00	78,40	0,00		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-57**	**B**	**04/06/2025**	0,00%	0,00%	1,60	20,10	2,00	1,00	78,40	0,01		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-58**	**A**	**04/06/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,40	2,00	0,00	78,50	0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-58**	**B**	**04/06/2025**	0,00%	0,00%	1,80	19,90	1,00	0,00	78,40	0,02		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-59**	**A**	**04/06/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,50	2,00	0,00	78,40	0,06		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-59**	**B**	**04/06/2025**	0,00%	0,00%	1,20	20,50	3,00	0,00	78,30	0,09		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-60**	**A**	**04/06/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,40	3,00	1,00	78,50	0,01		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-60**	**B**	**04/06/2025**	0,00%	0,00%	2,20	19,30	2,00	1,00	78,50	0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-61**	**A**	**04/06/2025**	0,00%	0,00%	0,20	21,40	2,00	1,00	78,40	0,04		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-61**	**B**	**04/06/2025**	0,00%	0,00%	6,00	14,50	2,00	1,00	79,50	0,05		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-137**	**B**	**04/06/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,90	2,00	1,00	78,10	0,12		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-138**	**B**	**04/06/2025**	0,00%	0,00%	1,10	20,90	2,00	1,00	78,10	0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-139**	**A**	**04/06/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,30	1,00	0,00	78,60	-0,05		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-139**	**B**	**04/06/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,30	2,00	0,00	78,60	0,02		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-140**	**A**	**04/06/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,40	1,00	0,00	78,50	-0,01		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-140**	**B**	**04/06/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,20	2,00	0,00	78,70	-0,18		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-141**	**B**	**04/06/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,50	2,00	0,00	78,50	0,06		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-62**	**A**	**04/06/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,50	2,00	0,00	78,40	0,02		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-62**	**B**	**04/06/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,30	2,00	0,00	78,70	0,03		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-01**	**A**	**03/06/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,30	1,00	2,00	78,70	0,08		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-01**	**B**	**03/06/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,40	2,00	2,00	78,60	0,07		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-02**	**A**	**03/06/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,50	2,00	2,00	78,50	0,08		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-02**	**B**	**03/06/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,60	2,00	1,00	78,40	-0,02		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-03**	**A**	**03/06/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,70	2,00	2,00	78,20	0,09		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	C02 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H_2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-03	B	03/06/2025	0,00%	0,00%	1,40	19,60	1,00	1,00	79,00	0,06		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-04	A	03/06/2025	0,00%	0,00%	0,30	21,30	1,00	2,00	78,40	0,10		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-04	B	03/06/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,50	1,00	1,00	78,30	0,04		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-05	A	03/06/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,80	1,00	1,00	78,10	0,08		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-05	B	03/06/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,90	1,00	1,00	78,10	0,08		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-06	A	03/06/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,90	1,00	1,00	78,00	0,07		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-06	B	03/06/2025	0,00%	0,00%	0,00	22,00	1,00	1,00	78,00	0,09		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-07	A	03/06/2025	0,00%	0,00%	0,00	22,00	1,00	2,00	78,00	0,09		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-07	B	03/06/2025	0,00%	0,00%	0,00	22,00	1,00	1,00	78,00	0,08		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-08	A	03/06/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,70	2,00	1,00	78,00	0,06		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-08	B	03/06/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,90	2,00	1,00	78,00	-0,01		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-09	A	06/06/2025	0,00%	0,00%	1,20	20,30	1,00	1,00	78,50	0,02		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-09	B	06/06/2025	0,00%	0,00%	6,40	14,00	1,00	1,00	79,60	-0,02		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-10	A	06/06/2025	0,00%	0,00%	0,50	21,00	1,00	0,00	78,60	0,04		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-10	B	06/06/2025	0,00%	0,00%	1,80	19,00	2,00	0,00	79,20	0,03		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-84	A	03/06/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,70	2,00	1,00	78,10	0,01		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-84	B	03/06/2025	0,00%	0,00%	3,10	19,20	1,00	0,00	77,60	-0,03		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-85	A	03/06/2025	0,00%	0,00%	0,60	21,30	1,00	1,00	78,10	0,03		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-85	B	03/06/2025	0,00%	0,00%	2,40	19,20	1,00	1,00	78,30	-0,02		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-86	A	03/06/2025	0,00%	0,00%	0,30	21,50	2,00	1,00	78,20	0,03		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-86	B	03/06/2025	0,00%	0,00%	1,40	19,80	1,00	1,00	78,80	0,09		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-87	A	03/06/2025	0,00%	0,00%	2,70	17,40	1,00	2,00	80,00	0,03		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-87	B	03/06/2025	0,00%	0,00%	2,50	18,80	1,00	1,00	78,70	0,03		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-152	A	06/06/2025	0,00%	0,00%	0,40	20,90	1,00	1,00	78,60	-0,02		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-152	B	06/06/2025	0,00%	0,00%	2,40	18,70	2,00	0,00	78,90	-0,08		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-153	B	03/06/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,20	2,00	1,00	78,80	0,09		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-154	B	03/06/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,60	1,00	1,00	78,40	0,05		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-155	B	03/06/2025	0,00%	0,00%	0,30	21,30	2,00	1,00	78,40	0,09		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-156	B	03/06/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,90	2,00	1,00	78,10	0,22		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-157	B	03/06/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,90	2,00	2,00	78,00	0,09		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-70	A	05/06/2025	0,00%	0,00%	0,20	20,80	1,00	1,00	79,00	0,01		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-70	B	05/06/2025	0,00%	0,00%	1,00	19,60	1,00	1,00	79,40	0,03		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-71	A	05/06/2025	0,00%	0,00%	0,30	20,90	2,00	1,00	78,90	0,05		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-71	B	05/06/2025	0,00%	0,00%	1,20	9,50	1,00	1,00	89,20	0,09		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-72	A	05/06/2025	0,00%	0,00%	0,30	21,10	2,00	2,00	78,60	0,03		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-72	B	05/06/2025	0,00%	0,00%	1,10	19,40	2,00	1,00	79,50	0,04		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-73	A	05/06/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,60	2,00	1,00	78,40	0,10		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-73	B	05/06/2025	0,00%	0,00%	0,70	20,60	2,00	1,00	78,70	0,13		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-74	A	05/06/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,60	2,00	1,00	78,40	0,10		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-74	B	05/06/2025	1,50%	1,50%	0,70	15,30	2,00	1,00	82,60	-0,13		0,00	38,00	
Enfermaria	PMG-75	A	05/06/2025	0,00%	0,00%	0,30	20,80	2,00	1,00	78,90	0,09		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-75	B	05/06/2025	0,00%	0,00%	1,70	18,00	2,00	1,00	80,30	0,09		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-76	A	05/06/2025	0,00%	0,00%	0,40	20,80	1,00	1,00	78,70	0,04		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-76	B	05/06/2025	0,00%	0,00%	2,30	14,60	1,00	1,00	83,10	0,11		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-165	A	05/06/2025	0,00%	0,00%	0,50	19,70	1,00	0,00	79,80	0,02		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-165	B	05/06/2025	0,20%	0,20%	0,10	21,00	2,00	1,00	78,60	0,05		0,00	12,00	
CAT	PMG-82	A	05/06/2025	0,00%	0,00%	0,80	20,80	2,00	0,00	78,40	0,01		0,00	0,00	
CAT	PMG-82	B	05/06/2025	0,00%	0,00%	6,60	14,30	2,00	0,00	79,10	0,03		0,00	0,00	
CAT	PMG-83	A	05/06/2025	0,00%	0,00%	2,20	19,60	2,00	1,00	78,20	0,02		0,00	0,00	
CAT	PMG-83	B	05/06/2025	0,00%	0,00%	3,60	17,50	2,00	0,00	78,90	0,04		0,00	0,00	
CAT	PMG-94	A	05/06/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,20	3,00	0,00	78,70	-0,03		0,00	0,00	
CAT	PMG-94	B	05/06/2025	0,00%	0,00%	4,20	17,00	2,00	0,00	78,80	-0,03		0,00	0,00	
CAT	PMG-95	A	05/06/2025	0,00%	0,00%	0,90	20,80	2,00	1,00	78,40	0,01		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	C02 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H_2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
CAT	PMG-95	B	05/06/2025	0,00%	0,00%	1,90	20,20	2,00	0,00	77,90	-0,22		0,00	0,00	
CAT	PMG-96	A	05/06/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,50	2,00	1,00	78,40	0,04		0,00	0,00	
CAT	PMG-96	B	05/06/2025	0,00%	0,00%	4,70	13,70	1,00	1,00	81,60	0,10		0,00	0,00	
CAT	PMG-97	A	05/06/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,30	1,00	1,00	78,60	0,04		0,00	0,00	
CAT	PMG-97	B	05/06/2025	0,00%	0,00%	3,40	17,20	2,00	1,00	79,40	0,07		0,00	0,00	
CAT	PMG-98	A	05/06/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,60	2,00	1,00	78,30	0,03		0,00	0,00	
CAT	PMG-98	B	05/06/2025	0,00%	0,00%	0,30	21,40	2,00	1,00	78,40	-0,01		0,00	0,00	
CAT	PMG-160	A	05/06/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,50	2,00	0,00	78,40	-0,05		0,00	0,00	
CAT	PMG-160	B	05/06/2025	0,00%	0,00%	3,60	17,70	3,00	0,00	78,70	-0,03		0,00	0,00	
CAT	PMG-161	A	05/06/2025	0,00%	0,00%	1,60	19,90	1,00	1,00	78,50	0,01		0,00	0,00	
CAT	PMG-161	B	05/06/2025	0,00%	0,00%	3,90	17,90	2,00	0,00	78,10	-0,04		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-88	A	06/06/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,70	1,00	1,00	78,10	0,04		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-88	B	06/06/2025	0,00%	0,00%	0,30	21,60	1,00	1,00	78,10	0,08		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-89	A	06/06/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,90	1,00	1,00	78,00	0,03		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-89	B	06/06/2025	0,00%	0,00%	0,60	21,30	1,00	1,00	78,10	0,04		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-90	A	06/06/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,90	1,00	1,00	78,10	0,08		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-90	B	06/06/2025	0,00%	0,00%	0,30	21,50	2,00	1,00	78,10	0,04		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-91	A	06/06/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,90	1,00	1,00	78,00	0,05		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-91	B	06/06/2025	0,00%	0,00%	1,20	20,40	2,00	1,00	78,30	0,05		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-92	A	06/06/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,90	1,00	0,00	78,00	0,05		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-92	B	06/06/2025	0,00%	0,00%	0,80	21,10	1,00	1,00	78,10	0,12		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-93	A	06/06/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,90	2,00	1,00	78,00	0,13		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-93	B	06/06/2025	0,00%	0,00%	0,80	21,20	1,00	1,00	78,00	0,01		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-102		02/06/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,90	1,00	2,00	78,10	0,09		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-103		02/06/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,80	1,00	2,00	78,10	0,08		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-104		02/06/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,80	1,00	1,00	78,10	0,01		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-105		02/06/2025	0,00%	0,00%	1,10	20,70	1,00	1,00	78,20	0,08		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-106		02/06/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,60	1,00	1,00	78,20	0,14		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-107		02/06/2025	0,00%	0,00%	2,20	17,90	1,00	1,00	79,80	0,05		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-108		02/06/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,80	1,00	1,00	78,10	0,06		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-109	A	02/06/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,80	1,00	1,00	78,10	0,07		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-109	B	02/06/2025	0,00%	0,00%	0,70	21,20	1,00	1,00	78,20	0,08		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-110	A	02/06/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,80	1,00	2,00	78,20	0,07		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-110	B	02/06/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,80	1,00	1,00	78,10	0,07		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-111	A	02/06/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,80	1,00	1,00	78,10	0,09		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-111	B	02/06/2025	0,00%	0,00%	0,20	21,60	1,00	2,00	78,20	0,08		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-112		02/06/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,80	1,00	1,00	78,10	0,03		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-162	A	02/06/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,80	1,00	1,00	78,10	-0,01		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-162	B	02/06/2025	0,10%	0,10%	6,00	11,40	2,00	1,00	82,50	0,11		0,00	8,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-166	A	02/06/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,90	1,00	1,00	78,10	-0,18		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-166	B	02/06/2025	0,00%	0,00%	0,60	20,40	1,00	1,00	78,90	0,05		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-119	A	02/06/2025	0,00%	0,00%	0,00	22,10	1,00	1,00	77,90	0,09		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-119	B	02/06/2025	0,00%	0,00%	0,00	22,10	1,00	1,00	77,90	0,01		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-119	C	02/06/2025	0,00%	0,00%	0,00	22,10	2,00	1,00	77,90	-0,02		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-120	A	02/06/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,90	1,00	0,00	78,00	0,08		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-120	B	02/06/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,90	1,00	1,00	78,10	0,03		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-120	C	02/06/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,90	1,00	1,00	78,00	0,02		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-163	B	02/06/2025	0,00%	0,00%	0,00	22,00	2,00	0,00	77,90	0,03		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-164	B	02/06/2025	0,00%	0,00%	0,00	22,00	2,00	1,00	78,00	0,06		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-164	C	02/06/2025	0,00%	0,00%	0,00	21,90	2,00	1,00	78,00	0,07		0,00	0,00	
Transportes	PMG-121	A	06/06/2025	0,00%	0,00%	0,10	21,70	1,00	1,00	78,10	0,07		0,00	0,00	
Transportes	PMG-121	B	06/06/2025	0,00%	0,00%	3,80	15,10	1,00	1,00	81,10	0,03		0,00	0,00	
Transportes	PMG-122	A	06/06/2025	0,00%	0,00%	0,60	21,10	1,00	0,00	78,40	0,04		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	C02 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H_2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
Transportes	**PMG-122**	**B**	**06/06/2025**	0,00%	0,00%	3,90	17,00	1,00	1,00	79,10	0,08		0,00	0,00	
Transportes	**PMG-123**	**A**	**06/06/2025**	0,00%	0,00%	0,90	20,30	1,00	1,00	78,80	-0,03		0,00	0,00	
Transportes	**PMG-123**	**B**	**06/06/2025**	0,00%	0,00%	1,30	19,80	1,00	1,00	78,80	0,06		0,00	0,00	
Transportes	**PMG-124**	**A**	**06/06/2025**	0,00%	0,00%	1,40	19,50	1,00	1,00	79,20	0,07		0,00	0,00	
Transportes	**PMG-124**	**B**	**06/06/2025**	0,00%	0,00%	1,90	19,30	1,00	1,00	78,80	0,01		0,00	0,00	
Transportes	**PMG-158**	**B**	**06/06/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,60	2,00	1,00	78,30	-0,01		0,00	0,00	
Transportes	**PMG-159**	**B**	**06/06/2025**	0,00%	0,00%	1,00	20,30	2,00	1,00	78,70	0,07		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	**PMG-125**	**A**	**05/06/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,90	2,00	0,00	78,10	-0,05		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	**PMG-125**	**B**	**05/06/2025**	0,00%	0,00%	3,90	18,40	1,00	1,00	77,80	-0,23		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	**PMG-126**	**A**	**05/06/2025**	0,00%	0,00%	0,00	21,70	1,00	0,00	78,20	0,03		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	**PMG-126**	**B**	**05/06/2025**	0,00%	0,00%	3,40	19,00	1,00	1,00	77,60	0,10		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	**PMG-127**	**A**	**05/06/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,60	1,00	1,00	78,40	0,09		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	**PMG-127**	**B**	**05/06/2025**	0,00%	0,00%	2,60	19,50	1,00	1,00	77,90	0,13		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	**PMG-128**	**A**	**05/06/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,70	1,00	1,00	78,20	0,03		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	**PMG-128**	**B**	**05/06/2025**	0,00%	0,00%	3,00	19,10	1,00	1,00	77,90	0,03		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	**PMG-129**	**A**	**05/06/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,60	1,00	1,00	78,30	0,03		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	**PMG-129**	**B**	**05/06/2025**	0,00%	0,00%	2,10	19,90	2,00	2,00	78,00	0,04		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	**PMG-130**	**A**	**05/06/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,60	2,00	1,00	78,30	0,01		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	**PMG-130**	**B**	**05/06/2025**	0,00%	0,00%	3,50	18,80	1,00	1,00	77,70	0,18		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	**PMG-131**	**A**	**05/06/2025**	0,00%	0,00%	0,30	21,30	1,00	1,00	78,50	0,09		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	**PMG-131**	**B**	**05/06/2025**	0,00%	0,00%	1,00	20,60	1,00	1,00	78,40	0,01		0,00	0,00	
Edifício I 1	**PMG-16**	**A**	**11/06/2025**	0,00%	0,00%	2,00	19,20	-	0,00	78,80	-0,47		0,00	0,00	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Edifício I 1	**PMG-16**	**B**	**11/06/2025**	0,00%	0,00%	2,30	18,80	-	0,00	78,80	-0,33		0,00	0,00	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Edifício I 1	**PMG-17**	**A**	**11/06/2025**	0,00%	0,00%	0,40	20,60	-	0,00	78,90	-0,23		0,00	0,00	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Edifício I 1	**PMG-17**	**B**	**11/06/2025**	0,00%	0,00%	1,30	19,80	-	0,00	78,90	-0,20		0,00	0,00	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Edifício I 1	**PMG-18**	**A**	**13/06/2025**	-	-	-	-	-	-	-	-		0,00	0,00	Não medido com o GEM 5000.
Edifício I 1	**PMG-18**	**B**	**13/06/2025**	-	-	-	-	-	-	-	-		0,00	0,00	Não medido com o GEM 5000.
Edifício I 1	**PMG-20**	**A**	**11/06/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,70	1,00	0,00	78,20	-0,01		0,00	0,00	
Edifício I 1	**PMG-20**	**B**	**11/06/2025**	0,00%	0,00%	0,20	21,60	1,00	0,00	78,10	-0,11		0,00	0,00	
Edifício I 1	**PMG-22**	**A**	**11/06/2025**	0,00%	0,00%	0,20	21,60	1,00	0,00	78,20	-0,02		0,00	0,00	
Edifício I 1	**PMG-22**	**B**	**11/06/2025**	0,00%	0,00%	3,50	18,10	1,00	0,00	78,40	-0,06		0,00	0,00	
Edifício I 1	**PMG-23**	**A**	**11/06/2025**	0,00%	0,00%	0,30	21,70	1,00	0,00	77,90	0,03		0,00	0,00	
Edifício I 1	**PMG-23**	**B**	**11/06/2025**	0,00%	0,00%	1,40	20,50	1,00	0,00	78,10	-0,02		0,00	0,00	
Edifício I 1	**PMG-113**	**A**	**11/06/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,70	2,00	0,00	78,30	-0,08		0,00	0,00	
Edifício I 1	**PMG-113**	**B**	**11/06/2025**	0,00%	0,00%	1,20	20,50	2,00	0,00	78,40	0,15		0,00	0,00	
Edifício I 1	**PMG-114**	**A**	**11/06/2025**	0,00%	0,00%	0,20	21,60	1,00	0,00	78,20	-0,08		0,00	0,00	
Edifício I 1	**PMG-114**	**B**	**11/06/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,70	2,00	0,00	78,20	-0,07		0,00	0,00	
Edifício I 1	**PMG-115**	**A**	**11/06/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,70	2,00	0,00	78,30	-0,02		0,00	0,00	
Edifício I 1	**PMG-115**	**B**	**11/06/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,70	2,00	0,00	78,20	-0,08		0,00	0,00	
Edifício I 1	**PMG-11**	**A**	**11/06/2025**	0,00%	0,00%	0,70	20,20	-	0,00	79,10	-0,26		0,00	0,00	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Edifício I 1	**PMG-11**	**B**	**11/06/2025**	0,80%	0,80%	1,00	19,70	-	0,00	78,50	-0,42		0,00	**28,00**	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Edifício I 1	**PMG-12**	**A**	**11/06/2025**	0,00%	0,00%	2,10	19,70	1,00	0,00	78,20	0,03		0,00	0,00	
Edifício I 1	**PMG-12**	**B**	**11/06/2025**	0,00%	0,00%	2,80	18,60	1,00	0,00	78,70	-0,03		0,00	0,00	
Edifício I 1	**PMG-13**	**A**	**11/06/2025**	0,00%	0,00%	0,90	21,20	1,00	1,00	77,90	-0,01		0,00	0,00	
Edifício I 1	**PMG-13**	**B**	**11/06/2025**	0,00%	0,00%	1,30	20,60	1,00	0,00	78,10	-0,03		0,00	0,00	
Edifício I 1	**PMG-14**	**A**	**11/06/2025**	0,00%	0,00%	1,70	19,20	-	0,00	79,00	-0,23		0,00	0,00	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Edifício I 1	**PMG-14**	**B**	**11/06/2025**	0,00%	0,00%	3,70	17,30	-	0,00	79,00	-0,25		0,00	0,00	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Edifício I 1	**PMG-15**	**A**	**11/06/2025**	0,00%	0,00%	0,10	22,00	1,00	1,00	77,80	-0,01		0,00	0,00	
Edifício I 1	**PMG-15**	**B**	**11/06/2025**	0,00%	0,00%	0,10	22,00	1,00	0,00	77,90	0,00		0,00	0,00	
Edifício I 1	**PMG-19**	**A**	**11/06/2025**	0,00%	0,00%	0,50	20,40	-	0,00	79,10	-0,27		0,00	0,00	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Edifício I 1	**PMG-19**	**B**	**11/06/2025**	0,00%	0,00%	0,70	20,10	-	0,00	79,10	-0,27		0,00	0,00	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Edifício I 1	**PMG-21**	**A**	**11/06/2025**	0,00%	0,00%	1,00	20,00	-	0,00	79,00	-0,20		0,00	0,00	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Edifício I 1	**PMG-21**	**B**	**11/06/2025**	0,00%	0,00%	1,40	19,50	-	0,00	79,10	-0,18		0,00	0,00	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	C02 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H_2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
Edifício I 1	**PMG-24**	**A**	**11/06/2025**	0,00%	0,00%	0,40	21,70	1,00	0,00	77,80	0,03		0,00	0,00	
Edifício I 1	**PMG-24**	**B**	**11/06/2025**	0,00%	0,00%	0,50	21,60	1,00	0,00	77,90	0,01		0,00	0,00	
Edifício I 1	**PMG-135**	**A**	**11/06/2025**	0,00%	0,00%	0,20	21,60	2,00	0,00	78,20	-0,04		0,00	0,00	
Edifício I 1	**PMG -135**	**B**	**11/06/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,70	1,00	0,00	78,20	-0,05		0,00	0,00	
Edifício I 1	**PMG-136**	**B**	**11/06/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,70	2,00	0,00	78,20	-0,08		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	**PMG-25**	**A**	**10/06/2025**	0,00%	0,00%	0,20	21,80	1,00	1,00	78,00	0,03		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	**PMG-25**	**B**	**10/06/2025**	0,00%	0,00%	0,80	21,20	1,00	1,00	77,90	0,15		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	**PMG-26**	**A**	**10/06/2025**	0,00%	0,00%	0,70	21,10	1,00	1,00	78,20	0,05		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	**PMG-26**	**B**	**10/06/2025**	0,00%	0,00%	0,00	22,00	2,00	0,00	77,90	-0,05		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	**PMG-27**	**A**	**10/06/2025**	0,00%	0,00%	1,80	19,50	2,00	1,00	78,70	0,03		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	**PMG-27**	**B**	**10/06/2025**	0,00%	0,00%	2,20	19,20	1,00	1,00	78,60	0,02		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	**PMG-28**	**A**	**10/06/2025**	0,00%	0,00%	0,60	20,20	2,00	1,00	79,10	0,03		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	**PMG-28**	**B**	**10/06/2025**	0,00%	0,00%	2,60	17,20	1,00	1,00	80,10	0,03		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	**PMG-29**	**A**	**10/06/2025**	0,00%	0,00%	0,30	21,40	1,00	0,00	78,30	-0,03		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	**PMG-29**	**B**	**10/06/2025**	0,00%	0,00%	0,90	20,70	1,00	1,00	78,30	-0,03		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	**PMG-44**	**A**	**10/06/2025**	0,00%	0,00%	0,70	21,00	2,00	0,00	78,30	0,05		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	**PMG-44**	**B**	**10/06/2025**	0,00%	0,00%	0,90	20,60	2,00	1,00	78,60	-0,10		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	**PMG-45**	**A**	**10/06/2025**	0,00%	0,00%	0,40	20,90	1,00	1,00	78,70	-0,03		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	**PMG-45**	**B**	**10/06/2025**	0,00%	0,00%	0,30	21,10	1,00	1,00	78,60	0,08		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	**PMG-134**	**B**	**10/06/2025**	0,00%	0,00%	0,20	21,30	2,00	0,00	78,50	0,12		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-30**	**A**	**10/06/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,10	1,00	0,00	78,80	0,01		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-30**	**B**	**10/06/2025**	0,00%	0,00%	0,70	20,70	1,00	0,00	78,60	-0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-31**	**A**	**10/06/2025**	0,00%	0,00%	0,20	20,80	2,00	0,00	79,00	-0,09		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-31**	**B**	**10/06/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,00	2,00	0,00	78,90	-0,08		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-32**	**A**	**10/06/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,50	1,00	0,00	78,40	-0,01		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-32**	**B**	**10/06/2025**	0,00%	0,00%	0,80	20,80	1,00	0,00	78,40	0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-33**	**A**	**10/06/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,60	1,00	0,00	78,30	-0,01		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-33**	**B**	**10/06/2025**	0,00%	0,00%	3,10	18,60	1,00	0,00	78,30	0,14		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-34**	**A**	**10/06/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,70	1,00	1,00	78,20	-0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-34**	**B**	**10/06/2025**	0,00%	0,00%	0,90	20,90	1,00	0,00	78,10	-0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-35**	**A**	**10/06/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,90	1,00	1,00	78,00	0,00		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-35**	**B**	**10/06/2025**	0,00%	0,00%	0,90	21,10	1,00	0,00	78,00	-0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-36**	**A**	**10/06/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,80	1,00	0,00	78,10	0,04		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-36**	**B**	**10/06/2025**	0,00%	0,00%	2,20	19,40	1,00	0,00	78,30	-0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-37**	**A**	**10/06/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,90	1,00	0,00	78,10	0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-37**	**B**	**10/06/2025**	0,00%	0,00%	0,90	21,10	2,00	0,00	77,90	0,00		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-38**	**A**	**10/06/2025**	0,00%	0,00%	0,20	21,60	1,00	0,00	78,20	0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-38**	**B**	**10/06/2025**	0,00%	0,00%	0,40	21,40	1,00	0,00	78,20	-0,04		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-39**	**A**	**10/06/2025**	0,00%	0,00%	0,20	21,70	1,00	0,00	78,20	-0,02		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-39**	**B**	**10/06/2025**	0,00%	0,00%	7,20	14,50	1,00	0,00	78,30	0,00		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-40**	**A**	**10/06/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,80	1,00	1,00	78,10	0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-40**	**B**	**10/06/2025**	0,00%	0,00%	0,30	21,60	1,00	0,00	78,10	0,00		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-41**	**A**	**10/06/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,30	2,00	0,00	78,60	-0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-41**	**B**	**10/06/2025**	0,00%	0,00%	0,20	21,30	2,00	0,00	78,50	0,01		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-42**	**A**	**10/06/2025**	0,00%	0,00%	0,50	21,10	2,00	0,00	78,40	-0,06		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-42**	**B**	**10/06/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,50	1,00	0,00	78,40	0,07		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-43**	**A**	**10/06/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,50	2,00	0,00	78,40	0,01		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-43**	**B**	**10/06/2025**	0,00%	0,00%	0,60	21,10	1,00	0,00	78,30	-0,08		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-132**	**A**	**10/06/2025**	0,00%	0,00%	0,30	20,30	2,00	0,00	79,40	0,06		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-132**	**B**	**10/06/2025**	0,00%	0,00%	0,20	20,60	3,00	0,00	79,20	-0,05		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-133**	**A**	**10/06/2025**	0,00%	0,00%	0,30	21,40	1,00	0,00	78,20	0,00		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-133**	**B**	**10/06/2025**	0,00%	0,00%	0,60	21,10	2,00	0,00	78,30	0,11		0,00	0,00	
Edifício I-4	**PMG-63**	**A**	**13/06/2025**	-	-	-	-	-	-	-	-		0,00	0,00	Não medido com o GEM 5000.

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	C02 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H_2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
Edifício I-4	**PMG-63**	**B**	**13/06/2025**	-	-	-	-	-	-	-	-		0,00	0,00	Não medido com o GEM 5000.
Edifício I-4	**PMG-64**	**A**	**13/06/2025**	-	-	-	-	-	-	-	-		0,00	0,00	Não medido com o GEM 5000.
Edifício I-4	**PMG-64**	**B**	**13/06/2025**	-	-	-	-	-	-	-	-		0,00	0,00	Não medido com o GEM 5000.
Edifício I-4	**PMG-65**	**A**	**13/06/2025**	-	-	-	-	-	-	-	-		0,00	0,00	Não medido com o GEM 5000.
Edifício I-4	**PMG-65**	**B**	**13/06/2025**	-	-	-	-	-	-	-	-		0,00	0,00	Não medido com o GEM 5000.
Edifício I-4	**PMG-66**	**A**	**13/06/2025**	-	-	-	-	-	-	-	-		0,00	0,00	Não medido com o GEM 5000.
Edifício I-4	**PMG-66**	**B**	**13/06/2025**	-	-	-	-	-	-	-	-		0,00	0,00	Não medido com o GEM 5000.
Edifício I-4	**PMG-67**	**A**	**12/06/2025**	0,00%	0,00%	0,10	20,90	-	0,00	79,00	-0,33		0,00	0,00	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Edifício I-4	**PMG-67**	**B**	**12/06/2025**	0,00%	0,00%	0,30	20,70	-	0,00	79,00	-0,38		0,00	0,00	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Edifício I-4	**PMG-68**	**A**	**13/06/2025**	-	-	-	-	-	-	-	-		0,00	0,00	Não medido com o GEM 5000.
Edifício I-4	**PMG-68**	**B**	**13/06/2025**	-	-	-	-	-	-	-	-		0,00	0,00	Não medido com o GEM 5000.
Edifício I-4	**PMG-69**	**A**	**13/06/2025**	-	-	-	-	-	-	-	-		0,00	0,00	Não medido com o GEM 5000.
Edifício I-4	**PMG-69**	**B**	**13/06/2025**	-	-	-	-	-	-	-	-		0,00	0,00	Não medido com o GEM 5000.
Edifício I-4	**PMG-77**	**A**	**12/06/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,10	-	0,00	78,80	-0,36		0,00	0,00	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Edifício I-4	**PMG-77**	**B**	**12/06/2025**	0,00%	0,00%	1,00	19,80	-	0,00	79,20	-0,32		0,00	0,00	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Edifício I-4	**PMG-78**	**A**	**12/06/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,10	-	0,00	78,80	-0,37		0,00	0,00	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Edifício I-4	**PMG-78**	**B**	**12/06/2025**	0,00%	0,00%	1,60	19,40	-	0,00	79,00	-0,39		0,00	0,00	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Edifício I-4	**PMG-79**	**A**	**12/06/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,00	-	0,00	78,90	-0,39		0,00	0,00	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Edifício I-4	**PMG-79**	**B**	**12/06/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,10	-	0,00	78,80	-0,42		0,00	0,00	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Edifício I-4	**PMG-80**	**A**	**12/06/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,10	-	0,00	78,80	-0,41		0,00	0,00	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Edifício I-4	**PMG-80**	**B**	**12/06/2025**	0,00%	0,00%	0,20	21,00	-	0,00	78,80	-0,41		0,00	0,00	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Edifício I-4	**PMG-81**	**A**	**12/06/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,00	-	0,00	78,90	-0,32		0,00	0,00	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Edifício I-4	**PMG-81**	**B**	**12/06/2025**	0,00%	0,00%	0,50	20,70	-	0,00	78,80	-0,55		0,00	0,00	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Edifício I-4	**PMG-144**	**B**	**12/06/2025**	0,00%	0,00%	0,10	21,10	-	0,00	78,80	-0,40		0,00	0,00	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Edifício I-4	**PMG-145**	**B**	**12/06/2025**	0,00%	0,00%	0,20	20,70	-	0,00	79,10	-0,40		0,00	0,00	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Edifício I-4	**PMG-146**	**B**	**12/06/2025**	0,00%	0,00%	0,30	20,90	-	0,00	78,80	-0,35		0,00	0,00	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Edifício I-4	**PMG-147**	**B**	**12/06/2025**	0,00%	0,00%	0,80	20,10	-	0,00	79,00	-0,41		0,00	0,00	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Edifício I-4	**PMG-148**	**B**	**13/06/2025**	-	-	-	-	-	-	-	-		0,00	0,00	Não medido com o GEM 5000.
Edifício I-4	**PMG-149**	**B**	**13/06/2025**	-	-	-	-	-	-	-	-		0,00	0,00	Não medido com o GEM 5000.
Edifício I-4	**PMG-150**	**B**	**13/06/2025**	-	-	-	-	-	-	-	-		0,00	0,00	Não medido com o GEM 5000.
Edifício I-4	**PMG-151**	**B**	**13/06/2025**	-	-	-	-	-	-	-	-		0,00	0,00	Não medido com o GEM 5000.
Conjunto Laboratorial	**PMG-46**	**A**	**12/06/2025**	0,00%	0,00%	0,30	20,50	-	0,00	79,20	-0,30		0,00	0,00	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Conjunto Laboratorial	**PMG-46**	**B**	**12/06/2025**	0,00%	0,00%	2,90	17,80	-	0,00	79,40	-0,26		0,00	0,00	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Conjunto Laboratorial	**PMG-47**	**A**	**12/06/2025**	0,00%	0,00%	0,20	20,50	-	0,00	79,20	-0,26		0,00	0,00	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Conjunto Laboratorial	**PMG-47**	**B**	**12/06/2025**	0,00%	0,00%	0,10	20,70	-	0,00	79,20	-0,37		0,00	0,00	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Conjunto Laboratorial	**PMG-48**	**A**	**12/06/2025**	0,00%	0,00%	0,40	20,50	-	0,00	79,10	-0,32		0,00	0,00	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Conjunto Laboratorial	**PMG-48**	**B**	**12/06/2025**	0,00%	0,00%	0,70	20,20	-	0,00	79,10	-0,36		0,00	0,00	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Conjunto Laboratorial	**PMG-49**	**A**	**12/06/2025**	0,00%	0,00%	0,20	20,70	-	0,00	79,00	-0,31		0,00	0,00	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Conjunto Laboratorial	**PMG-49**	**B**	**12/06/2025**	0,00%	0,00%	2,80	18,20	-	0,00	79,00	-0,33		0,00	0,00	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Conjunto Laboratorial	**PMG-50**	**A**	**12/06/2025**	0,00%	0,00%	0,30	20,80	-	0,00	79,00	-0,36		0,00	0,00	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Conjunto Laboratorial	**PMG-50**	**B**	**12/06/2025**	0,00%	0,00%	1,10	20,00	-	0,00	78,90	-0,36		0,00	0,00	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Conjunto Laboratorial	**PMG-51**	**A**	**12/06/2025**	0,00%	0,00%	0,20	20,80	-	0,00	79,00	-0,09		0,00	0,00	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Conjunto Laboratorial	**PMG-51**	**B**	**12/06/2025**	0,00%	0,00%	0,10	20,80	-	0,00	79,10	-0,11		0,00	0,00	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Conjunto Laboratorial	**PMG-52**	**A**	**12/06/2025**	0,00%	0,00%	0,10	20,90	-	0,00	79,00	-0,09		0,00	0,00	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Conjunto Laboratorial	**PMG-52**	**B**	**12/06/2025**	0,00%	0,00%	0,30	20,70	-	0,00	79,00	-0,08		0,00	0,00	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Conjunto Laboratorial	**PMG-53**	**A**	**12/06/2025**	0,00%	0,00%	0,40	20,60	-	0,00	79,00	0,07		0,00	0,00	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Conjunto Laboratorial	**PMG-53**	**B**	**12/06/2025**	0,00%	0,00%	0,50	20,00	-	0,00	79,50	0,08		0,00	0,00	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Conjunto Laboratorial	**PMG-54**	**A**	**12/06/2025**	0,00%	0,00%	0,30	20,50	-	0,00	79,20	0,10		0,00	0,00	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Conjunto Laboratorial	**PMG-54**	**B**	**12/06/2025**	0,40%	0,40%	2,30	17,20	-	0,00	80,10	0,05		0,00	**13,00**	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Conjunto Laboratorial	**PMG-55**	**A**	**12/06/2025**	0,00%	0,00%	0,20	20,80	-	0,00	79,00	0,18		0,00	0,00	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Conjunto Laboratorial	**PMG-55**	**B**	**12/06/2025**	0,00%	0,00%	2,40	18,30	-	0,00	79,30	0,07		0,00	0,00	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Conjunto Laboratorial	**PMG-56**	**A**	**12/06/2025**	0,00%	0,00%	0,20	20,40	-	0,00	79,40	-0,26		0,00	0,00	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Conjunto Laboratorial	**PMG-56**	**B**	**12/06/2025**	0,00%	0,00%	0,90	20,10	-	0,00	79,00	-0,26		0,00	0,00	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	C02 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H_2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
Conjunto Laboratorial	**PMG-57**	**A**	**12/06/2025**	0,00%	0,00%	0,10	20,70	-	0,00	79,10	-0,18		0,00	0,00	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Conjunto Laboratorial	**PMG-57**	**B**	**12/06/2025**	0,00%	0,00%	1,80	18,90	-	0,00	79,20	-0,20		0,00	0,00	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Conjunto Laboratorial	**PMG-58**	**A**	**12/06/2025**	0,00%	0,00%	0,10	20,60	-	0,00	79,20	-0,19		0,00	0,00	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Conjunto Laboratorial	**PMG-58**	**B**	**12/06/2025**	0,00%	0,00%	2,10	18,70	-	0,00	79,20	-0,20		0,00	0,00	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Conjunto Laboratorial	**PMG-59**	**A**	**12/06/2025**	0,00%	0,00%	0,10	20,60	-	0,00	79,20	-0,20		0,00	0,00	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Conjunto Laboratorial	**PMG-59**	**B**	**12/06/2025**	0,00%	0,00%	1,70	19,20	-	0,00	79,10	-0,22		0,00	0,00	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Conjunto Laboratorial	**PMG-60**	**A**	**12/06/2025**	0,00%	0,00%	0,20	20,50	-	0,00	79,20	-0,24		0,00	0,00	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Conjunto Laboratorial	**PMG-60**	**B**	**12/06/2025**	0,00%	0,00%	2,80	17,80	-	0,00	79,30	-0,25		0,00	0,00	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Conjunto Laboratorial	**PMG-61**	**A**	**12/06/2025**	0,00%	0,00%	0,30	20,40	-	0,00	79,30	-0,25		0,00	0,00	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Conjunto Laboratorial	**PMG-61**	**B**	**12/06/2025**	0,00%	0,00%	6,50	13,40	-	0,00	80,20	-0,20		0,00	0,00	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Conjunto Laboratorial	**PMG-137**	**B**	**12/06/2025**	0,00%	0,00%	0,10	20,90	-	0,00	79,00	-0,34		0,00	0,00	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Conjunto Laboratorial	**PMG-138**	**B**	**12/06/2025**	0,00%	0,00%	2,80	18,60	-	0,00	78,60	-0,34		0,00	0,00	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Conjunto Laboratorial	**PMG-139**	**A**	**12/06/2025**	0,00%	0,00%	0,10	20,70	-	0,00	79,10	0,01		0,00	0,00	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Conjunto Laboratorial	**PMG-139**	**B**	**12/06/2025**	0,00%	0,00%	0,40	20,30	-	0,00	79,30	0,02		0,00	0,00	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Conjunto Laboratorial	**PMG-140**	**A**	**12/06/2025**	0,00%	0,00%	0,10	20,70	-	0,00	79,10	-0,04		0,00	0,00	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Conjunto Laboratorial	**PMG-140**	**B**	**12/06/2025**	0,00%	0,00%	0,20	20,70	-	0,00	79,10	-0,05		0,00	0,00	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Conjunto Laboratorial	**PMG-141**	**B**	**12/06/2025**	0,00%	0,00%	0,10	20,70	-	0,00	79,10	-0,11		0,00	0,00	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Conjunto Laboratorial	**PMG-62**	**A**	**12/06/2025**	0,00%	0,00%	0,10	20,80	-	0,00	79,10	-0,13		0,00	0,00	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Conjunto Laboratorial	**PMG-62**	**B**	**12/06/2025**	0,30%	3,40%	0,10	20,60	-	0,00	79,00	-0,14		0,00	**53,00**	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-01**	**A**	**11/06/2025**	0,00%	0,00%	0,10	20,70	-	0,00	79,10	-0,26		0,00	0,00	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-01**	**B**	**11/06/2025**	0,00%	0,00%	0,10	20,80	-	0,00	79,10	-0,32		0,00	0,00	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-02**	**A**	**11/06/2025**	0,00%	0,00%	0,10	22,00	1,00	0,00	77,90	0,04		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-02**	**B**	**11/06/2025**	0,00%	0,00%	0,10	22,00	1,00	0,00	77,90	-0,04		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-03**	**A**	**11/06/2025**	0,00%	0,00%	0,10	20,70	-	0,00	79,10	-0,32		0,00	0,00	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-03**	**B**	**11/06/2025**	0,00%	0,00%	2,20	17,60	-	0,00	80,20	-0,07		0,00	0,00	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-04**	**A**	**18/06/2025**	0,00%	0,00%	1,7	19,1	-	0	79,3	-0,64		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-04**	**B**	**18/06/2025**	0,00%	0,00%	1,9	18,5	-	0	79,6	-0,69		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-05**	**A**	**11/06/2025**	0,00%	0,00%	0,10	20,70	-	0,00	79,10	-0,32		0,00	0,00	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-05**	**B**	**11/06/2025**	0,20%	0,20%	0,10	20,50	-	0,00	79,20	-0,34		0,00	**11,00**	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-06**	**A**	**11/06/2025**	0,00%	0,00%	0,10	20,80	-	0,00	79,10	-0,39		0,00	0,00	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-06**	**B**	**11/06/2025**	0,00%	0,00%	0,10	20,90	-	0,00	79,00	-0,46		0,00	0,00	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-07**	**A**	**11/06/2025**	0,00%	0,00%	0,10	20,80	-	0,00	79,10	-0,35		0,00	0,00	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-07**	**B**	**11/06/2025**	0,00%	0,00%	0,10	20,80	-	0,00	79,10	-0,43		0,00	0,00	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-08**	**A**	**11/06/2025**	0,00%	0,00%	0,20	21,80	1,00	0,00	78,00	0,11		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-08**	**B**	**11/06/2025**	0,00%	0,00%	0,10	22,00	2,00	0,00	77,90	0,02		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-09**	**A**	**18/06/2025**	0,00%	0,00%	1,1	19	-	0	79,9	-0,48		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-09**	**B**	**18/06/2025**	0,00%	0,00%	5,6	15,3	-	0	80,1	-0,51		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-10**	**A**	**18/06/2025**	0,00%	0,00%	0,4	19,6	-	0	80	-0,43		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-10**	**B**	**18/06/2025**	0,00%	0,00%	0,3	19,6	-	0	80,1	-0,41		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-84**	**A**	**11/06/2025**	0,00%	0,00%	0,20	21,80	2,00	0,00	78,00	-0,01		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-84**	**B**	**11/06/2025**	0,00%	0,00%	0,90	21,20	2,00	0,00	77,90	-0,04		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-85**	**A**	**11/06/2025**	0,00%	0,00%	0,90	20,90	1,00	0,00	78,10	-0,04		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-85**	**B**	**11/06/2025**	0,00%	0,00%	2,90	18,90	1,00	0,00	78,30	-0,08		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-86**	**A**	**11/06/2025**	0,00%	0,00%	0,40	21,50	1,00	0,00	78,10	-0,03		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-86**	**B**	**11/06/2025**	0,00%	0,00%	1,20	20,50	1,00	0,00	78,30	-0,09		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-87**	**A**	**11/06/2025**	0,00%	0,00%	2,00	18,20	1,00	0,00	79,80	-0,02		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-87**	**B**	**11/06/2025**	0,00%	0,00%	2,60	17,60	2,00	0,00	79,70	-0,04		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-152**	**A**	**13/06/2025**	-	-	-	-	-	-	-	-		0,00	0,00	Não medido com o GEM 5000.
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-152**	**B**	**13/06/2025**	-	-	-	-	-	-	-	-		0,00	0,00	Não medido com o GEM 5000.
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-153**	**B**	**11/06/2025**	0,00%	0,00%	0,10	20,80	-	0,00	79,10	-0,27		0,00	0,00	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-154**	**B**	**11/06/2025**	0,00%	0,00%	0,10	22,00	1,00	0,00	77,90	0,03		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-155**	**B**	**11/06/2025**	0,00%	0,00%	0,60	20,10	-	0,00	79,30	-0,32		0,00	0,00	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-156**	**B**	**11/06/2025**	0,00%	0,00%	0,10	20,70	-	0,00	79,10	-0,33		0,00	0,00	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	C02 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H_2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-157**	**B**	**11/06/2025**	0,00%	0,00%	0,10	20,90	-	0,00	79,00	-0,33		0,00	0,00	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Enfermaria	**PMG-70**	**A**	**18/06/2025**	0,00%	0,00%	0,1	21,3	-	0	78,6	-0,62		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Enfermaria	**PMG-70**	**B**	**18/06/2025**	0,00%	0,00%	1,3	18,9	-	0	79,8	-0,46		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Enfermaria	**PMG-71**	**A**	**18/06/2025**	0,00%	0,00%	0,3	21	-	1	78,7	-0,57		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Enfermaria	**PMG-71**	**B**	**18/06/2025**	0,60%	0,60%	2,3	13,4	-	1	82,7	-0,58		0	7	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Enfermaria	**PMG-72**	**A**	**18/06/2025**	0,00%	0,00%	0,1	19,6	-	0	80,3	-0,68		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Enfermaria	**PMG-72**	**B**	**18/06/2025**	0,00%	0,00%	1,9	17,5	-	0	80,6	-0,65		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Enfermaria	**PMG-73**	**A**	**18/06/2025**	0,00%	0,00%	0,6	20	-	0	79,4	-0,7		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Enfermaria	**PMG-73**	**B**	**18/06/2025**	0,00%	0,00%	1,9	17,8	-	1	80,3	-0,51		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Enfermaria	**PMG-74**	**A**	**18/06/2025**	0,00%	0,00%	0,5	20	-	1	79,4	-0,69		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Enfermaria	**PMG-74**	**B**	**18/06/2025**	1,70%	1,70%	1	13,7	-	0	83,6	-0,62		0	52	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Enfermaria	**PMG-75**	**A**	**18/06/2025**	0,00%	0,00%	0,1	20,3	-	2	79,6	-0,68		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Enfermaria	**PMG-75**	**B**	**18/06/2025**	0,00%	0,00%	5,5	13,8	-	1	80,7	-0,65		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Enfermaria	**PMG-76**	**A**	**18/06/2025**	0,00%	0,00%	0,5	18,7	-	0	80,7	-0,7		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Enfermaria	**PMG-76**	**B**	**18/06/2025**	0,00%	0,00%	3	16,6	-	0	80,4	-0,82		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Enfermaria	**PMG-165**	**A**	**18/06/2025**	0,00%	0,00%	0,5	19,7	-	1	79,8	-0,65		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Enfermaria	**PMG-165**	**B**	**18/06/2025**	4,10%	4,10%	0,3	11,3	-	2	81,3	-0,72		0	66	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
CAT	**PMG-82**	**A**	**18/06/2025**	0,00%	0,00%	2,3	17,7	-	1	80	-0,6		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
CAT	**PMG-82**	**B**	**18/06/2025**	0,00%	0,00%	1,9	18,2	-	0	79,9	-0,57		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
CAT	**PMG-83**	**A**	**18/06/2025**	0,00%	0,00%	1,4	19,1	-	0	79,5	-0,68		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
CAT	**PMG-83**	**B**	**18/06/2025**	0,00%	0,00%	2,2	18,6	-	1	79,3	-0,59		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
CAT	**PMG-94**	**A**	**18/06/2025**	0,00%	0,00%	4,6	16,5	-	0	78,8	-0,63		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
CAT	**PMG-94**	**B**	**18/06/2025**	0,00%	0,00%	0,9	19,6	-	0	79,4	-0,72		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
CAT	**PMG-95**	**A**	**18/06/2025**	0,00%	0,00%	0,1	20,8	-	0	79,1	-0,69		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
CAT	**PMG-95**	**B**	**18/06/2025**	0,00%	0,00%	4,4	16,9	-	0	78,7	-0,58		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
CAT	**PMG-96**	**A**	**18/06/2025**	0,00%	0,00%	0,1	21,5	-	1	78,4	-0,56		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
CAT	**PMG-96**	**B**	**18/06/2025**	0,00%	0,00%	4,8	12,8	-	0	82,4	-0,55		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
CAT	**PMG-97**	**A**	**18/06/2025**	0,00%	0,00%	0,2	21,3	-	0	78,5	-0,66		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
CAT	**PMG-97**	**B**	**18/06/2025**	0,00%	0,00%	6,9	12,3	-	0	80,8	-0,59		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
CAT	**PMG-98**	**A**	**18/06/2025**	0,00%	0,00%	0,1	21,5	-	1	78,4	-0,62		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
CAT	**PMG-98**	**B**	**18/06/2025**	0,00%	0,00%	0,2	21,5	-	1	78,3	-0,5		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
CAT	**PMG-160**	**A**	**18/06/2025**	0,00%	0,00%	0,1	20,1	-	0	79,3	-0,6		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
CAT	**PMG-160**	**B**	**18/06/2025**	0,00%	0,00%	3,4	17,1	-	0	79,5	-0,72		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
CAT	**PMG-161**	**A**	**18/06/2025**	0,00%	0,00%	1,9	18,4	-	1	79,7	-0,61		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
CAT	**PMG-161**	**B**	**18/06/2025**	0,00%	0,00%	5,1	16,4	-	1	78,5	-0,64		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Incubadora	**PMG-88**	**A**	**20/06/2025**	0,00%	0,00%	0,2	20,8	-	0	79	-0,64		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Incubadora	**PMG-88**	**B**	**20/06/2025**	0,00%	0,00%	1	19,9	-	0	79,1	-0,48		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Incubadora	**PMG-89**	**A**	**20/06/2025**	0,00%	0,00%	2	19	-	0	78,9	-0,6		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Incubadora	**PMG-89**	**B**	**20/06/2025**	0,00%	0,00%	0,1	21,3	-	0	78,6	-0,47		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Incubadora	**PMG-90**	**A**	**20/06/2025**	0,00%	0,00%	0,1	21,1	-	0	78,8	-0,49		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Incubadora	**PMG-90**	**B**	**20/06/2025**	0,00%	0,00%	1,4	19,7	-	0	78,9	-0,53		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Incubadora	**PMG-91**	**A**	**20/06/2025**	0,00%	0,00%	0,1	20,4	-	0	79,5	-0,56		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Incubadora	**PMG-91**	**B**	**20/06/2025**	0,00%	0,00%	1,3	19,8	-	0	78,9	-0,61		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Incubadora	**PMG-92**	**A**	**20/06/2025**	0,00%	0,00%	0	21,3	-	0	78,7	-0,58		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Incubadora	**PMG-92**	**B**	**20/06/2025**	0,00%	0,00%	0	21,4	-	0	78,6	-0,58		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Incubadora	**PMG-93**	**A**	**20/06/2025**	0,00%	0,00%	0,3	20,8	-	0	78,9	-0,53		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Incubadora	**PMG-93**	**B**	**20/06/2025**	0,00%	0,00%	0,7	20,4	-	0	78,9	-0,65		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Ginásio Poliesportivo	**PMG-102**		**10/06/2025**	0,00%	0,00%	0	22	1	1	77,9	0,04		0	0	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-103**		**10/06/2025**	0,00%	0,00%	0	22	2	1	78	0,03		0	0	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-104**		**10/06/2025**	0,00%	0,00%	0,1	22	1	0	77,9	-0,09		0	0	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-105**		**10/06/2025**	0,00%	0,00%	1,3	20,8	2	0	78	0,03		0	0	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-106**		**10/06/2025**	0,00%	0,00%	0,2	21,7	1	0	78,1	0,03		0	0	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-107**		**10/06/2025**	0,00%	0,00%	1,9	18,8	1	0	79,2	0		0	0	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	C02 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H_2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
Ginásio Poliesportivo	**PMG-108**		**10/06/2025**	0,00%	0,00%	0,1	22,1	2	1	77,9	0,04		0	0	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-109**	**A**	**10/06/2025**	0,00%	0,00%	0,1	22,1	1	0	77,8	-0,03		0	0	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-109**	**B**	**10/06/2025**	0,00%	0,00%	0,5	21,4	2	0	78,1	-0,03		0	0	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-110**	**A**	**10/06/2025**	0,00%	0,00%	0,1	22	2	1	77,9	0,08		0	0	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-110**	**B**	**10/06/2025**	0,00%	0,00%	0	22	1	1	77,9	0,03		0	0	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-111**	**A**	**10/06/2025**	0,00%	0,00%	0,1	22	1	1	77,9	0,05		0	0	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-111**	**B**	**10/06/2025**	0,00%	0,00%	0,2	21,7	2	1	78,1	0,02		0	0	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-112**		**10/06/2025**	0,00%	0,00%	0,1	22,1	2	0	77,8	0,02		0	0	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-162**	**A**	**10/06/2025**	0,00%	0,00%	0,1	22,1	1	0	77,9	0		0	0	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-162**	**B**	**10/06/2025**	0,00%	0,00%	5	14,8	1	1	80,1	-0,03		0	0	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-166**	**A**	**10/06/2025**	0,00%	0,00%	0	22	1	0	77,9	0		0	0	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-166**	**B**	**10/06/2025**	0,00%	0,00%	0,4	21,1	1	0	78,5	-0,38		0	0	
Portaria P3	**PMG-119**	**A**	**10/06/2025**	0,00%	0,00%	0,1	22	1	1	77,9	0,08		0	0	
Portaria P3	**PMG-119**	**B**	**10/06/2025**	0,00%	0,00%	0,1	22	1	1	77,9	0,03		0	0	
Portaria P3	**PMG-119**	**C**	**10/06/2025**	0,00%	0,00%	0,1	22,1	2	1	77,9	0,08		0	0	
Portaria P3	**PMG-120**	**A**	**10/06/2025**	0,00%	0,00%	0	22,1	2	1	77,8	0,02		0	0	
Portaria P3	**PMG-120**	**B**	**10/06/2025**	0,00%	0,00%	0,1	22	3	1	77,9	0,07		0	0	
Portaria P3	**PMG-120**	**C**	**10/06/2025**	0,00%	0,00%	0	22,1	2	0	77,8	0,05		0	0	
Portaria P3	**PMG-163**	**B**	**10/06/2025**	0,00%	0,00%	0,1	22,1	2	1	77,9	0,03		0	0	
Portaria P3	**PMG-164**	**B**	**10/06/2025**	0,00%	0,00%	0,1	22,1	2	1	77,8	0,04		0	0	
Portaria P3	**PMG-164**	**C**	**10/06/2025**	0,00%	0,00%	0	22,1	2	1	77,9	0,01		0	0	
Transportes	**PMG-121**	**A**	**18/06/2025**	0,00%	0,00%	0,2	20,6	-	0	79,2	-0,51		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Transportes	**PMG-121**	**B**	**18/06/2025**	0,00%	0,00%	2,6	17,2	-	0	80,2	-0,58		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Transportes	**PMG-122**	**A**	**18/06/2025**	0,00%	0,00%	0,4	20,2	-	0	79,3	-0,64		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Transportes	**PMG-122**	**B**	**18/06/2025**	0,00%	0,00%	4,7	16,2	-	0	79	-0,72		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Transportes	**PMG-123**	**A**	**18/06/2025**	0,00%	0,00%	0,4	20,1	-	0	79,5	-0,64		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Transportes	**PMG-123**	**B**	**18/06/2025**	0,00%	0,00%	0,1	20,8	-	0	79,1	-0,6		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Transportes	**PMG-124**	**A**	**18/06/2025**	0,00%	0,00%	0,2	20,6	-	0	79,2	-0,56		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Transportes	**PMG-124**	**B**	**18/06/2025**	0,00%	0,00%	2,5	17,2	-	0	80,3	-0,54		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Transportes	**PMG-158**	**B**	**18/06/2025**	0,00%	0,00%	0,1	20,6	-	0	79,3	-0,58		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Transportes	**PMG-159**	**B**	**18/06/2025**	0,00%	0,00%	0,1	20,8	-	0	79,1	-0,53		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Posto Guarda Universitário	**PMG-125**	**A**	**20/06/2025**	0,00%	0,00%	0,2	20,4	-	0	79,4	-0,63		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Posto Guarda Universitário	**PMG-125**	**B**	**20/06/2025**	0,00%	0,00%	0,1	20,7	-	0	79,2	-0,71		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Posto Guarda Universitário	**PMG-126**	**A**	**20/06/2025**	0,00%	0,00%	0,1	20,8	-	0	79,1	-0,86		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Posto Guarda Universitário	**PMG-126**	**B**	**20/06/2025**	0,00%	0,00%	0,9	20	-	0	79	-0,7		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Posto Guarda Universitário	**PMG-127**	**A**	**20/06/2025**	0,00%	0,00%	0,2	20,7	-	0	79,1	-0,83		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Posto Guarda Universitário	**PMG-127**	**B**	**20/06/2025**	0,00%	0,00%	3	17,9	-	0	79,1	-0,7		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Posto Guarda Universitário	**PMG-128**	**A**	**20/06/2025**	0,00%	0,00%	0,2	20,7	-	0	79,1	-0,83		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Posto Guarda Universitário	**PMG-128**	**B**	**20/06/2025**	0,00%	0,00%	1,1	20	-	0	78,9	-0,61		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Posto Guarda Universitário	**PMG-129**	**A**	**20/06/2025**	0,00%	0,00%	0,1	20,9	-	0	79	-0,64		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Posto Guarda Universitário	**PMG-129**	**B**	**20/06/2025**	0,00%	0,00%	0,9	20,3	-	0	78,9	-0,6		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Posto Guarda Universitário	**PMG-130**	**A**	**20/06/2025**	0,00%	0,00%	0,1	20,9	-	0	79	-0,54		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Posto Guarda Universitário	**PMG-130**	**B**	**20/06/2025**	0,00%	0,00%	1,9	19	-	0	79,1	-0,59		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Posto Guarda Universitário	**PMG-131**	**A**	**20/06/2025**	0,00%	0,00%	0,1	21	-	0	79	-0,64		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Posto Guarda Universitário	**PMG-131**	**B**	**20/06/2025**	0,00%	0,00%	1,1	20,2	-	0	78,8	-0,72		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Edifício I 1	**PMG-16**	**A**	**17/06/2025**	0,00%	0,00%	1,9	18,9	-	0	79,2	-0,49		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Edifício I 1	**PMG-16**	**B**	**17/06/2025**	0,00%	0,00%	2,4	18,3	-	0	79,3	-0,51		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Edifício I 1	**PMG-17**	**A**	**17/06/2025**	0,00%	0,00%	0,5	20,4	-	0	79,1	-0,51		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Edifício I 1	**PMG-17**	**B**	**17/06/2025**	0,00%	0,00%	1,4	19,5	-	0	79,1	-0,59		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Edifício I 1	**PMG-18**	**A**	**17/06/2025**	0,00%	0,00%	0,3	20,5	-	0	79,2	0,22		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Edifício I 1	**PMG-18**	**B**	**17/06/2025**	0,00%	0,00%	1,5	19,3	-	0	79,1	0,16		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Edifício I 1	**PMG-20**	**A**	**17/06/2025**	0,00%	0,00%	0,2	19,9	-	0	79,8	-0,14		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Edifício I 1	**PMG-20**	**B**	**17/06/2025**	0,00%	0,00%	0,3	19,9	-	0	79,7	-0,16		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	C02 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H_2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
Edificio I 1	**PMG-22**	**A**	**17/06/2025**	0,00%	0,00%	0,3	20,1	-	0	79,6	-0,1		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Edificio I 1	**PMG-22**	**B**	**17/06/2025**	0,00%	0,00%	3,7	16,4	-	0	79,8	-0,16		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Edificio I 1	**PMG-23**	**A**	**17/06/2025**	0,00%	0,00%	0,5	19,9	-	0	79,7	-0,14		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Edificio I 1	**PMG-23**	**B**	**17/06/2025**	0,00%	0,00%	1,5	18,7	-	0	79,7	-0,1		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Edificio I 1	**PMG-113**	**A**	**17/06/2025**	0,00%	0,00%	0,1	20,4	-	0	79,1	0,16		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Edificio I 1	**PMG-113**	**B**	**17/06/2025**	0,00%	0,00%	1,2	19,2	-	0	79,5	-0,08		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Edificio I 1	**PMG-114**	**A**	**17/06/2025**	0,00%	0,00%	0,2	20,2	-	0	79,5	-0,06		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Edificio I 1	**PMG-114**	**B**	**17/06/2025**	0,00%	0,00%	0,2	20,2	-	0	79,6	0,02		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Edificio I 1	**PMG-115**	**A**	**17/06/2025**	0,00%	0,00%	0,2	20,3	-	0	79,5	0,17		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Edificio I 1	**PMG-115**	**B**	**17/06/2025**	0,00%	0,00%	0,2	20,4	-	0	79,5	0,03		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Edificio I 1	**PMG-11**	**A**	**17/06/2025**	0,00%	0,00%	1	19,7	-	0	79,3	-0,57		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Edificio I 1	**PMG-11**	**B**	**17/06/2025**	0,20%	0,20%	0,4	20,4	-	0	79	-0,72		0	**67**	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Edificio I 1	**PMG-12**	**A**	**17/06/2025**	0,00%	0,00%	2,8	17,8	-	0	79,4	0,03		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Edificio I 1	**PMG-12**	**B**	**17/06/2025**	0,00%	0,00%	3,3	17	-	0	79,7	0,09		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Edificio I 1	**PMG-13**	**A**	**17/06/2025**	0,00%	0,00%	1	19,9	-	0	79,1	-0,57		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Edificio I 1	**PMG-13**	**B**	**17/06/2025**	0,00%	0,00%	1,4	19,4	-	0	79,2	-0,6		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Edificio I 1	**PMG-14**	**A**	**17/06/2025**	0,00%	0,00%	2,1	18,5	-	0	79,4	-0,54		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Edificio I 1	**PMG-14**	**B**	**17/06/2025**	0,00%	0,00%	3,5	17,1	-	0	79,4	-0,58		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Edificio I 1	**PMG-15**	**A**	**17/06/2025**	0,00%	0,00%	0,3	20,7	-	0	79,1	-0,53		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Edificio I 1	**PMG-15**	**B**	**17/06/2025**	0,00%	0,00%	0,1	20,8	-	0	79,1	-0,6		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Edificio I 1	**PMG-19**	**A**	**17/06/2025**	0,00%	0,00%	0,4	20,6	-	0	79	-0,58		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Edificio I 1	**PMG-19**	**B**	**17/06/2025**	0,00%	0,00%	0,7	20,2	-	0	79,1	-0,56		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Edificio I 1	**PMG-21**	**A**	**17/06/2025**	0,00%	0,00%	0,9	19,9	-	0	79,3	-0,54		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Edificio I 1	**PMG-21**	**B**	**17/06/2025**	0,00%	0,00%	1,3	19,5	-	0	79,3	-0,6		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Edificio I 1	**PMG-24**	**A**	**17/06/2025**	0,00%	0,00%	0,4	20,3	-	0	79,2	-0,01		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Edificio I 1	**PMG-24**	**B**	**17/06/2025**	0,00%	0,00%	0,6	20,1	-	0	79,3	-0,21		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Edificio I 1	**PMG-135**	**A**	**17/06/2025**	0,00%	0,00%	0,2	20,2	-	0	79,6	0		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Edificio I 1	**PMG -135**	**B**	**17/06/2025**	0,00%	0,00%	0,1	20,3	-	0	79,6	-0,1		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Edificio I 1	**PMG-136**	**B**	**17/06/2025**	0,00%	0,00%	0,2	20,3	-	0	79,5	0,03		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
I-5 Auditórios	**PMG-25**	**A**	**18/06/2025**	0,00%	0,00%	0,2	21	-	0	78,8	-0,68		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
I-5 Auditórios	**PMG-25**	**B**	**18/06/2025**	0,00%	0,00%	1,3	20	-	1	78,7	-0,66		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
I-5 Auditórios	**PMG-26**	**A**	**18/06/2025**	0,00%	0,00%	0,6	20,7	-	0	78,7	-0,72		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
I-5 Auditórios	**PMG-26**	**B**	**18/06/2025**	0,00%	0,00%	0,3	21,1	-	0	78,6	-0,63		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
I-5 Auditórios	**PMG-27**	**A**	**18/06/2025**	0,00%	0,00%	1	20,7	-	1	78,4	-0,66		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
I-5 Auditórios	**PMG-27**	**B**	**18/06/2025**	0,00%	0,00%	1,8	20	-	1	78,2	-0,73		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
I-5 Auditórios	**PMG-28**	**A**	**18/06/2025**	0,00%	0,00%	0,2	21,3	-	0	78,5	-0,65		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
I-5 Auditórios	**PMG-28**	**B**	**18/06/2025**	0,00%	0,00%	3,9	16,5	-	0	79,6	-0,69		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
I-5 Auditórios	**PMG-29**	**A**	**18/06/2025**	0,00%	0,00%	0,2	21,6	-	0	78,3	-0,56		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
I-5 Auditórios	**PMG-29**	**B**	**18/06/2025**	0,00%	0,00%	0,3	21,3	-	0	78,4	-0,64		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
I-5 Auditórios	**PMG-44**	**A**	**18/06/2025**	0,00%	0,00%	0,4	20,5	-	0	79,1	-0,6		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
I-5 Auditórios	**PMG-44**	**B**	**18/06/2025**	0,00%	0,00%	0,9	19,8	-	0	79,3	-0,71		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
I-5 Auditórios	**PMG-45**	**A**	**18/06/2025**	0,00%	0,00%	0,1	21,5	-	1	78,4	-0,64		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
I-5 Auditórios	**PMG-45**	**B**	**18/06/2025**	0,00%	0,00%	0,2	21,5	-	0	78,3	-0,59		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
I-5 Auditórios	**PMG-134**	**B**	**18/06/2025**	0,00%	0,00%	0,1	21,3	-	1	78,6	-0,66		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
I-3 Biblioteca	**PMG-30**	**A**	**18/06/2025**	0,00%	0,00%	0,1	21,4	-	2	78,5	-0,16		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
I-3 Biblioteca	**PMG-30**	**B**	**18/06/2025**	0,00%	0,00%	0,1	21,5	-	2	78,4	-0,21		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
I-3 Biblioteca	**PMG-31**	**A**	**18/06/2025**	0,00%	0,00%	0,2	21,4	-	2	78,5	-0,16		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
I-3 Biblioteca	**PMG-31**	**B**	**18/06/2025**	0,00%	0,00%	0,1	21,5	-	2	78,4	-0,15		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
I-3 Biblioteca	**PMG-32**	**A**	**18/06/2025**	0,00%	0,00%	0,1	21,2	-	2	78,7	-0,16		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
I-3 Biblioteca	**PMG-32**	**B**	**18/06/2025**	0,00%	0,00%	0,6	20,7	-	2	78,7	-0,2		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
I-3 Biblioteca	**PMG-33**	**A**	**18/06/2025**	0,00%	0,00%	0,1	21,2	-	2	78,6	-0,15		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
I-3 Biblioteca	**PMG-33**	**B**	**18/06/2025**	0,00%	0,00%	2,9	18,3	-	3	78,9	-0,27		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
I-3 Biblioteca	**PMG-34**	**A**	**18/06/2025**	0,00%	0,00%	0,2	21,2	-	2	78,6	-0,1		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	C02 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H_2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
I-3 Biblioteca	PMG-34	B	18/06/2025	0,00%	0,00%	0,9	20,6	-	2	78,5	-0,12		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
I-3 Biblioteca	PMG-35	A	18/06/2025	0,00%	0,00%	0,1	21,4	-	2	78,6	-0,09		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
I-3 Biblioteca	PMG-35	B	18/06/2025	0,00%	0,00%	0,5	20,8	-	2	78,6	-0,09		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
I-3 Biblioteca	PMG-36	A	18/06/2025	0,00%	0,00%	0,1	21,3	-	2	78,6	-0,15		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
I-3 Biblioteca	PMG-36	B	18/06/2025	0,00%	0,00%	2,2	18,9	-	2	78,9	-0,41		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
I-3 Biblioteca	PMG-37	A	18/06/2025	0,00%	0,00%	0,1	21,3	-	2	78,6	-0,09		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
I-3 Biblioteca	PMG-37	B	18/06/2025	0,00%	0,00%	0,8	20,6	-	2	78,6	-0,13		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
I-3 Biblioteca	PMG-38	A	18/06/2025	0,00%	0,00%	0,1	21,1	-	2	78,7	-0,02		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
I-3 Biblioteca	PMG-38	B	18/06/2025	0,00%	0,00%	0,3	20,9	-	2	78,8	-0,11		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
I-3 Biblioteca	PMG-39	A	18/06/2025	0,00%	0,00%	0,2	21	-	2	78,8	-0,89		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
I-3 Biblioteca	PMG-39	B	18/06/2025	0,00%	0,00%	6,7	13,9	-	2	79,4	-0,93		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
I-3 Biblioteca	PMG-40	A	18/06/2025	0,00%	0,00%	0,1	21,2	-	2	78,7	-0,09		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
I-3 Biblioteca	PMG-40	B	18/06/2025	0,00%	0,00%	0,2	21,1	-	2	78,7	-0,03		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
I-3 Biblioteca	PMG-41	A	18/06/2025	0,00%	0,00%	0,1	21,5	-	2	78,5	-0,16		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
I-3 Biblioteca	PMG-41	B	18/06/2025	0,00%	0,00%	0	21,6	-	2	78,4	-0,4		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
I-3 Biblioteca	PMG-42	A	18/06/2025	0,00%	0,00%	0,7	20,8	-	2	78,5	-0,12		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
I-3 Biblioteca	PMG-42	B	18/06/2025	0,00%	0,00%	0,4	21,1	-	2	78,4	-0,14		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
I-3 Biblioteca	PMG-43	A	18/06/2025	0,00%	0,00%	0,1	21,5	-	2	78,5	-0,14		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
I-3 Biblioteca	PMG-43	B	18/06/2025	0,00%	0,00%	0,5	21	-	2	78,5	-0,16		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
I-3 Biblioteca	PMG-132	A	18/06/2025	0,00%	0,00%	0,2	21,2	-	2	78,6	-0,14		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
I-3 Biblioteca	PMG-132	B	18/06/2025	0,00%	0,00%	0,1	21,4	-	2	78,4	-0,27		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
I-3 Biblioteca	PMG-133	A	18/06/2025	0,00%	0,00%	0,3	20,7	-	2	79	-0,87		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
I-3 Biblioteca	PMG-133	B	18/06/2025	0,00%	0,00%	0,4	20,7	-	2	78,9	-0,96		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Edifício I-4	PMG-63	A	18/06/2025	0,00%	0,00%	0,1	21,2	-	1	78,8	-0,74		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Edifício I-4	PMG-63	B	18/06/2025	0,00%	0,00%	0,2	21,1	-	0	78,7	-0,81		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Edifício I-4	PMG-64	A	18/06/2025	0,00%	0,00%	0,1	21	-	0	78,9	-0,69		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Edifício I-4	PMG-64	B	18/06/2025	0,00%	0,00%	0,3	20,7	-	0	79	-0,66		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Edifício I-4	PMG-65	A	18/06/2025	0,00%	0,00%	0,1	21,1	-	1	78,8	-0,72		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Edifício I-4	PMG-65	B	18/06/2025	0,00%	0,00%	0,1	21	-	0	78,9	-0,74		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Edifício I-4	PMG-66	A	18/06/2025	0,00%	0,00%	0,2	20,9	-	1	78,9	-0,73		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Edifício I-4	PMG-66	B	18/06/2025	0,00%	0,00%	0,3	20,8	-	0	78,9	-0,75		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Edifício I-4	PMG-67	A	18/06/2025	0,00%	0,00%	0,1	21,2	-	0	78,8	-0,73		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Edifício I-4	PMG-67	B	18/06/2025	0,00%	0,00%	0,4	20,9	-	1	78,7	-0,78		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Edifício I-4	PMG-68	A	18/06/2025	0,00%	0,00%	0,1	21,1	-	1	78,8	-0,8		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Edifício I-4	PMG-68	B	18/06/2025	0,00%	0,00%	0,4	20,8	-	1	78,8	-0,71		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Edifício I-4	PMG-69	A	18/06/2025	0,00%	0,00%	0,1	21,2	-	1	78,7	-0,71		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Edifício I-4	PMG-69	B	18/06/2025	0,00%	0,00%	0,1	21,2	-	1	78,7	-0,73		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Edifício I-4	PMG-77	A	18/06/2025	0,00%	0,00%	0,1	20,9	-	0	79	-0,51		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Edifício I-4	PMG-77	B	18/06/2025	0,00%	0,00%	0,6	20,2	-	0	79,1	-0,58		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Edifício I-4	PMG-78	A	18/06/2025	0,00%	0,00%	0,1	20,8	-	0	79,1	-0,59		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Edifício I-4	PMG-78	B	18/06/2025	0,00%	0,00%	0,1	20,8	-	0	79,1	-0,64		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Edifício I-4	PMG-79	A	18/06/2025	0,00%	0,00%	0,1	21,1	-	1	78,8	-0,72		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Edifício I-4	PMG-79	B	18/06/2025	0,00%	0,00%	1,1	19,8	-	0	79,1	-0,72		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Edifício I-4	PMG-80	A	18/06/2025	0,00%	0,00%	0,1	21,2	-	1	78,8	-0,7		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Edifício I-4	PMG-80	B	18/06/2025	0,00%	0,00%	0,1	21	-	1	78,8	-0,81		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Edifício I-4	PMG-81	A	18/06/2025	0,00%	0,00%	0,1	20,8	-	0	79,1	-0,64		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Edifício I-4	PMG-81	B	18/06/2025	0,00%	0,00%	0,3	20,6	-	0	79,2	-0,6		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Edifício I-4	PMG-144	B	18/06/2025	0,00%	0,00%	0,1	20,9	-	0	79	-0,8		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Edifício I-4	PMG-145	B	18/06/2025	0,00%	0,00%	0,1	20,7	-	0	79,2	-0,6		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Edifício I-4	PMG-146	B	18/06/2025	0,00%	0,00%	0,4	20,5	-	0	79,2	-0,52		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Edifício I-4	PMG-147	B	18/06/2025	0,00%	0,00%	0,5	20,5	-	1	79	-0,83		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Edifício I-4	PMG-148	B	18/06/2025	0,00%	0,00%	1,3	19,8	-	0	79	-0,66		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Edifício I-4	PMG-149	B	18/06/2025	0,00%	0,00%	1,5	19,9	-	0	78,6	-0,66		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	C02 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H_2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
Edifício I-4	**PMG-150**	**B**	**18/06/2025**	0,00%	0,00%	0,5	20,3	-	1	79,2	-0,63		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Edifício I-4	**PMG-151**	**B**	**18/06/2025**	0,00%	0,00%	0,4	20,8	-	1	78,8	-0,69		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Conjunto Laboratorial	**PMG-46**	**A**	**18/06/2025**	0,00%	0,00%	0,4	20,4	-	0	79,1	-0,48		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Conjunto Laboratorial	**PMG-46**	**B**	**18/06/2025**	0,00%	0,00%	3,3	17,2	-	0	79,5	-0,6		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Conjunto Laboratorial	**PMG-47**	**A**	**18/06/2025**	0,00%	0,00%	0,3	20,5	-	0	79,2	-0,47		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Conjunto Laboratorial	**PMG-47**	**B**	**18/06/2025**	0,00%	0,00%	0,1	20,8	-	0	79,1	-0,54		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Conjunto Laboratorial	**PMG-48**	**A**	**18/06/2025**	0,00%	0,00%	0,3	20,6	-	0	79,1	-0,46		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Conjunto Laboratorial	**PMG-48**	**B**	**18/06/2025**	0,00%	0,00%	0,7	20,2	-	0	79,1	-0,56		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Conjunto Laboratorial	**PMG-49**	**A**	**18/06/2025**	0,00%	0,00%	0,3	20,6	-	0	79	-0,49		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Conjunto Laboratorial	**PMG-49**	**B**	**18/06/2025**	0,00%	0,00%	4,1	17	-	0	78,9	-0,49		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Conjunto Laboratorial	**PMG-50**	**A**	**18/06/2025**	0,00%	0,00%	0,1	20,6	-	0	79,3	-0,53		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Conjunto Laboratorial	**PMG-50**	**B**	**18/06/2025**	0,00%	0,00%	2,3	19	-	0	78,7	-0,56		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Conjunto Laboratorial	**PMG-51**	**A**	**18/06/2025**	0,00%	0,00%	0,2	20,5	-	0	79,3	-0,3		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Conjunto Laboratorial	**PMG-51**	**B**	**18/06/2025**	0,00%	0,00%	0,1	20,6	-	0	79,3	-0,31		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Conjunto Laboratorial	**PMG-52**	**A**	**18/06/2025**	0,00%	0,00%	0,1	20,6	-	0	79,3	-0,3		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Conjunto Laboratorial	**PMG-52**	**B**	**18/06/2025**	0,00%	0,00%	0,2	20,5	-	0	79,3	-0,32		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Conjunto Laboratorial	**PMG-53**	**A**	**18/06/2025**	0,00%	0,00%	0,3	20,3	-	0	79,3	-0,22		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Conjunto Laboratorial	**PMG-53**	**B**	**18/06/2025**	0,00%	0,00%	0,8	19,1	-	0	80,1	-0,26		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Conjunto Laboratorial	**PMG-54**	**A**	**18/06/2025**	0,00%	0,00%	0,2	20,3	-	0	79,5	-0,14		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Conjunto Laboratorial	**PMG-54**	**B**	**18/06/2025**	0,00%	0,00%	4,6	13,5	-	0	81,9	-0,14		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Conjunto Laboratorial	**PMG-55**	**A**	**18/06/2025**	0,00%	0,00%	0,2	20,5	-	0	79,4	-0,03		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Conjunto Laboratorial	**PMG-55**	**B**	**18/06/2025**	0,00%	0,00%	3,7	16,6	-	0	79,7	-0,09		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Conjunto Laboratorial	**PMG-56**	**A**	**18/06/2025**	0,00%	0,00%	0,2	20,3	-	0	79,5	-0,45		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Conjunto Laboratorial	**PMG-56**	**B**	**18/06/2025**	0,00%	0,00%	1,2	19,8	-	0	79	-0,49		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Conjunto Laboratorial	**PMG-57**	**A**	**18/06/2025**	0,00%	0,00%	0,2	20,5	-	0	79,3	-0,33		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Conjunto Laboratorial	**PMG-57**	**B**	**18/06/2025**	0,00%	0,00%	1,7	18,8	-	0	79,4	-0,41		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Conjunto Laboratorial	**PMG-58**	**A**	**18/06/2025**	0,00%	0,00%	0,1	20,5	-	0	79,4	-0,37		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Conjunto Laboratorial	**PMG-58**	**B**	**18/06/2025**	0,00%	0,00%	0,9	19,8	-	0	79,4	-0,47		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Conjunto Laboratorial	**PMG-59**	**A**	**18/06/2025**	0,00%	0,00%	0,1	20,5	-	0	79,3	-0,36		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Conjunto Laboratorial	**PMG-59**	**B**	**18/06/2025**	0,00%	0,00%	2,4	18,3	-	0	79,3	-0,53		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Conjunto Laboratorial	**PMG-60**	**A**	**18/06/2025**	0,00%	0,00%	0,1	20,5	-	0	79,4	-0,39		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Conjunto Laboratorial	**PMG-60**	**B**	**18/06/2025**	0,00%	0,00%	2,1	18,4	-	0	79,4	-0,38		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Conjunto Laboratorial	**PMG-61**	**A**	**18/06/2025**	0,00%	0,00%	0,3	20,3	-	0	79,4	-0,37		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Conjunto Laboratorial	**PMG-61**	**B**	**18/06/2025**	0,00%	0,00%	6,5	13,1	-	0	80,4	-0,55		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Conjunto Laboratorial	**PMG-137**	**B**	**18/06/2025**	0,00%	0,00%	0,1	20,9	-	0	79	-0,66		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Conjunto Laboratorial	**PMG-138**	**B**	**18/06/2025**	0,00%	0,00%	2,8	18,4	-	0	78,8	-0,47		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Conjunto Laboratorial	**PMG-139**	**A**	**18/06/2025**	0,00%	0,00%	0,1	20,3	-	0	79,6	-0,18		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Conjunto Laboratorial	**PMG-139**	**B**	**18/06/2025**	0,00%	0,00%	0,1	20,5	-	0	79,4	-0,27		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Conjunto Laboratorial	**PMG-140**	**A**	**18/06/2025**	0,00%	0,00%	0,1	20,4	-	0	79,4	-0,21		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Conjunto Laboratorial	**PMG-140**	**B**	**18/06/2025**	0,20%	0,20%	0,2	20,3	-	0	79,3	-0,32		0	**5**	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Conjunto Laboratorial	**PMG-141**	**B**	**18/06/2025**	0,00%	0,00%	0,2	20,4	-	0	79,3	-0,34		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Conjunto Laboratorial	**PMG-62**	**A**	**18/06/2025**	0,00%	0,00%	0,1	20,6	-	0	79,3	-0,32		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Conjunto Laboratorial	**PMG-62**	**B**	**18/06/2025**	0,10%	0,10%	0,1	20,5	-	0	79,3	-0,43		0	**7**	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-01**	**A**	**17/06/2025**	0,00%	0,00%	0,1	20,4	-	0	79,4	-0,37		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-01**	**B**	**17/06/2025**	0,00%	0,00%	0,1	20,5	-	0	79,4	-0,43		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-02**	**A**	**17/06/2025**	0,00%	0,00%	0,2	20,3	-	0	79,5	-0,55		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-02**	**B**	**17/06/2025**	0,00%	0,00%	0,1	20,5	-	0	79,4	-0,61		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-03**	**A**	**17/06/2025**	0,00%	0,00%	0,1	20,5	-	0	79,3	-0,74		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-03**	**B**	**17/06/2025**	0,00%	0,00%	1,8	18,1	-	0	80,1	-0,47		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-04**	**A**	**17/06/2025**	0,00%	0,00%	0,4	20,3	-	0	79,3	-0,59		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-04**	**B**	**17/06/2025**	0,00%	0,00%	0,3	20,4	-	0	79,3	-0,62		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-05**	**A**	**17/06/2025**	0,00%	0,00%	0,1	20,6	-	0	79,3	-0,48		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-05**	**B**	**17/06/2025**	0,00%	0,00%	0,1	20,6	-	0	79,3	-0,52		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	C02 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H_2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-06**	**A**	**17/06/2025**	0,00%	0,00%	0,1	20,6	-	0	79,2	-0,5		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-06**	**B**	**17/06/2025**	0,00%	0,00%	0,1	20,7	-	0	79,2	-0,49		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-07**	**A**	**17/06/2025**	0,00%	0,00%	0,1	20,7	-	0	79,2	-0,46		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-07**	**B**	**17/06/2025**	0,00%	0,00%	0,1	20,7	-	0	79,2	-0,62		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-08**	**A**	**17/06/2025**	0,00%	0,00%	0,3	20,2	-	0	79,5	-0,36		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-08**	**B**	**17/06/2025**	0,00%	0,00%	4,7	14,6	-	0	80,7	-0,27		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-09**	**A**	**17/06/2025**	0,00%	0,00%	0,1	20,3	-	0	79,5	-0,39		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-09**	**B**	**17/06/2025**	0,00%	0,00%	7,4	12,1	-	0	80,6	-0,32		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-10**	**A**	**17/06/2025**	0,00%	0,00%	0,6	19,6	-	0	79,8	-0,37		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-10**	**B**	**17/06/2025**	0,00%	0,00%	1,7	18,1	-	0	80,1	-0,48		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-84**	**A**	**17/06/2025**	0,00%	0,00%	0,3	20,3	-	0	79,4	-0,35		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-84**	**B**	**17/06/2025**	0,00%	0,00%	3,2	18	-	0	78,7	-0,34		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-85**	**A**	**17/06/2025**	0,00%	0,00%	0,9	19,5	-	0	79,6	-0,3		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-85**	**B**	**17/06/2025**	0,00%	0,00%	1,6	19	-	0	79,4	-0,49		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-86**	**A**	**17/06/2025**	0,00%	0,00%	0,4	20,1	-	0	79,5	-0,28		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-86**	**B**	**17/06/2025**	0,00%	0,00%	0,7	19,5	-	0	79,7	-0,32		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-87**	**A**	**17/06/2025**	0,00%	0,00%	2,5	16,2	-	0	81,3	-0,26		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-87**	**B**	**17/06/2025**	0,00%	0,00%	1,1	18,9	-	0	79,9	-0,25		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-152**	**A**	**17/06/2025**	0,00%	0,00%	0,4	19,9	-	0	79,7	-0,39		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-152**	**B**	**17/06/2025**	0,00%	0,00%	5,8	13,9	-	0	80,3	-0,38		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-153**	**B**	**17/06/2025**	0,00%	0,00%	0,1	20,6	-	0	79,3	-0,38		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-154**	**B**	**17/06/2025**	0,00%	0,00%	0,1	20,5	-	1	79,3	-0,54		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-155**	**B**	**17/06/2025**	0,00%	0,00%	1,9	18,3	-	0	79,8	-0,41		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-156**	**B**	**17/06/2025**	0,00%	0,00%	0,1	20,6	-	0	79,3	-0,5		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-157**	**B**	**17/06/2025**	0,00%	0,00%	0,1	20,7	-	0	79,2	-0,6		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Enfermaria	**PMG-70**	**A**	**17/06/2025**	0,00%	0,00%	0,2	20,7	-	1	79	-0,75		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Enfermaria	**PMG-70**	**B**	**17/06/2025**	0,00%	0,00%	2	17,1	-	1	80,9	-0,86		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Enfermaria	**PMG-71**	**A**	**17/06/2025**	0,00%	0,00%	0,3	20,5	-	0	79,2	-0,55		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Enfermaria	**PMG-71**	**B**	**17/06/2025**	0,30%	0,30%	1,9	1,3	-	1	96,5	-0,74		0	5	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Enfermaria	**PMG-72**	**A**	**17/06/2025**	0,00%	0,00%	0,5	19,4	-	1	80,1	-0,62		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Enfermaria	**PMG-72**	**B**	**17/06/2025**	0,00%	0,00%	2,5	15,3	-	1	82,2	-0,62		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Enfermaria	**PMG-73**	**A**	**17/06/2025**	0,00%	0,00%	0,3	20,4	-	1	79,3	-0,68		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Enfermaria	**PMG-73**	**B**	**17/06/2025**	0,00%	0,00%	1	19,3	-	0	79,7	-0,65		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Enfermaria	**PMG-74**	**A**	**17/06/2025**	0,00%	0,00%	0,5	19,6	-	0	79,9	-0,7		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Enfermaria	**PMG-74**	**B**	**17/06/2025**	2,80%	2,80%	1	9,3	-	0	87	-0,83		0	78	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Enfermaria	**PMG-75**	**A**	**17/06/2025**	0,00%	0,00%	0,6	19,4	-	1	79,9	-0,66		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Enfermaria	**PMG-75**	**B**	**17/06/2025**	0,00%	0,00%	5,2	9,4	-	1	85,5	-0,83		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Enfermaria	**PMG-76**	**A**	**17/06/2025**	0,00%	0,00%	0,7	18,8	-	1	80,5	-0,72		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Enfermaria	**PMG-76**	**B**	**17/06/2025**	0,00%	0,00%	3,2	11,4	-	1	85,4	-0,72		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Enfermaria	**PMG-165**	**A**	**17/06/2025**	0,00%	0,00%	0,5	19,7	-	1	79,8	-0,61		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Enfermaria	**PMG-165**	**B**	**17/06/2025**	4,50%	4,50%	0,6	13,9	-	3	81	-0,64		0	68	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
CAT	**PMG-82**	**A**	**17/06/2025**	0,00%	0,00%	5,7	14,1	-	0	80,1	-0,6		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
CAT	**PMG-82**	**B**	**17/06/2025**	0,00%	0,00%	1,4	19,4	-	0	79,2	-0,55		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
CAT	**PMG-83**	**A**	**17/06/2025**	0,00%	0,00%	2	18,8	-	0	79,2	-0,55		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
CAT	**PMG-83**	**B**	**17/06/2025**	0,00%	0,00%	2,6	18,3	-	0	79,2	-0,65		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
CAT	**PMG-94**	**A**	**17/06/2025**	0,00%	0,00%	3,8	16,2	-	1	79,9	-0,61		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
CAT	**PMG-94**	**B**	**17/06/2025**	0,00%	0,00%	0,1	21	-	1	78,9	-0,58		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
CAT	**PMG-95**	**A**	**17/06/2025**	0,00%	0,00%	0,1	21,1	-	0	78,8	-0,63		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
CAT	**PMG-95**	**B**	**17/06/2025**	0,00%	0,00%	4,2	18	-	0	77,9	-0,73		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
CAT	**PMG-96**	**A**	**17/06/2025**	0,00%	0,00%	0,2	20,8	-	1	78,9	-0,61		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
CAT	**PMG-96**	**B**	**17/06/2025**	0,00%	0,00%	6,3	10,4	-	0	83,3	-0,6		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
CAT	**PMG-97**	**A**	**17/06/2025**	0,00%	0,00%	0,2	21	-	1	78,9	-0,57		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
CAT	**PMG-97**	**B**	**17/06/2025**	0,00%	0,00%	5,8	13,4	-	1	80,7	-0,65		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	C02 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H_2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
CAT	PMG-98	A	17/06/2025	0,00%	0,00%	0,1	21	-	0	78,9	-0,59		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
CAT	PMG-98	B	17/06/2025	0,00%	0,00%	0,7	20,3	-	0	78,9	-0,62		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
CAT	PMG-160	A	17/06/2025	0,00%	0,00%	0,2	20,7	-	0	79,1	-0,59		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
CAT	PMG-160	B	17/06/2025	0,00%	0,00%	2,4	18,2	-	0	79,4	-0,56		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
CAT	PMG-161	A	17/06/2025	0,00%	0,00%	1,6	19,2	-	1	79,2	-0,57		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
CAT	PMG-161	B	17/06/2025	0,00%	0,00%	5	16,2	-	1	78,8	-0,68		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Incubadora	PMG-88	A	17/06/2025	0,00%	0,00%	0,5	20,5	-	1	79	-0,6		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Incubadora	PMG-88	B	17/06/2025	0,00%	0,00%	0,5	20,7	-	0	78,8	-0,65		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Incubadora	PMG-89	A	17/06/2025	0,00%	0,00%	0,2	20,9	-	0	78,9	-0,62		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Incubadora	PMG-89	B	17/06/2025	0,00%	0,00%	0,9	20,2	-	1	78,9	-0,71		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Incubadora	PMG-90	A	17/06/2025	0,00%	0,00%	0,1	21,2	-	1	78,7	-0,6		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Incubadora	PMG-90	B	17/06/2025	0,00%	0,00%	0,6	20,5	-	0	78,9	-0,66		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Incubadora	PMG-91	A	17/06/2025	0,00%	0,00%	0,1	21,2	-	0	78,8	-0,59		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Incubadora	PMG-91	B	17/06/2025	0,00%	0,00%	1,7	19,3	-	0	79,1	-0,64		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Incubadora	PMG-92	A	17/06/2025	0,00%	0,00%	0,1	21,1	-	0	78,8	-0,59		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Incubadora	PMG-92	B	17/06/2025	0,00%	0,00%	0,9	20,1	-	1	78,9	-0,66		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Incubadora	PMG-93	A	17/06/2025	0,00%	0,00%	0,3	20,9	-	1	78,8	-0,66		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Incubadora	PMG-93	B	17/06/2025	0,00%	0,00%	1,1	20	-	0	78,9	-0,71		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Ginásio Poliesportivo	PMG-102		18/06/2025	0,00%	0,00%	0	21,2	-	2	78,8	-0,81		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Ginásio Poliesportivo	PMG-103		18/06/2025	0,00%	0,00%	0,1	20,9	-	2	79	-0,81		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Ginásio Poliesportivo	PMG-104		18/06/2025	0,00%	0,00%	0,1	21	-	2	78,9	-0,8		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Ginásio Poliesportivo	PMG-105		18/06/2025	0,00%	0,00%	1,1	19,9	-	2	79	-0,78		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Ginásio Poliesportivo	PMG-106		18/06/2025	0,00%	0,00%	0,2	20,8	-	2	79	-0,76		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Ginásio Poliesportivo	PMG-107		18/06/2025	0,20%	0,20%	2,3	17	-	1	80,5	-0,76		0	5	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Ginásio Poliesportivo	PMG-108		18/06/2025	0,00%	0,00%	0,2	20,9	-	2	78,9	-0,73		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Ginásio Poliesportivo	PMG-109	A	18/06/2025	0,00%	0,00%	0,2	20,9	-	2	78,9	-0,63		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Ginásio Poliesportivo	PMG-109	B	18/06/2025	0,00%	0,00%	0,7	20,1	-	2	79,1	-0,71		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Ginásio Poliesportivo	PMG-110	A	18/06/2025	0,00%	0,00%	0,2	21	-	2	78,8	-0,86		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Ginásio Poliesportivo	PMG-110	B	18/06/2025	0,00%	0,00%	0,1	21,1	-	2	78,8	-0,7		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Ginásio Poliesportivo	PMG-111	A	18/06/2025	0,00%	0,00%	0,1	21,1	-	2	78,8	-0,83		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Ginásio Poliesportivo	PMG-111	B	18/06/2025	0,00%	0,00%	0,1	21	-	2	78,9	-0,78		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Ginásio Poliesportivo	PMG-112		18/06/2025	0,00%	0,00%	0,2	20,9	-	2	78,9	-0,6		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Ginásio Poliesportivo	PMG-162	A	18/06/2025	0,00%	0,00%	0,2	20,9	-	2	78,9	-0,71		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Ginásio Poliesportivo	PMG-162	B	18/06/2025	0,00%	0,00%	3,5	15,9	-	2	80,5	-0,75		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Ginásio Poliesportivo	PMG-166	A	18/06/2025	0,00%	0,00%	0,1	21,1	-	2	78,8	-0,81		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Ginásio Poliesportivo	PMG-166	B	18/06/2025	0,00%	0,00%	1	18,9	-	2	80,1	-0,72		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Portaria P3	PMG-119	A	17/06/2025	0,00%	0,00%	0,1	20,6	-	1	79,3	-0,76		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Portaria P3	PMG-119	B	17/06/2025	0,00%	0,00%	0,2	20,5	-	1	79,3	-0,95		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Portaria P3	PMG-119	C	17/06/2025	0,00%	0,00%	0,1	20,8	-	1	79,1	-0,93		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Portaria P3	PMG-120	A	17/06/2025	0,00%	0,00%	0,1	20,8	-	1	79,2	-0,81		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Portaria P3	PMG-120	B	17/06/2025	0,00%	0,00%	0,1	20,8	-	1	79,1	-0,89		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Portaria P3	PMG-120	C	17/06/2025	0,00%	0,00%	0,1	20,9	-	1	79,1	-0,89		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Portaria P3	PMG-163	B	17/06/2025	0,00%	0,00%	0,1	20,9	-	1	79,1	-0,98		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Portaria P3	PMG-164	B	17/06/2025	0,00%	0,00%	0,1	20,7	-	1	79,2	-0,75		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Portaria P3	PMG-164	C	17/06/2025	0,00%	0,00%	0,1	20,8	-	1	79,2	-0,73		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Transportes	PMG-121	A	17/06/2025	0,00%	0,00%	0,2	20,8	-	0	79	-0,39		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Transportes	PMG-121	B	17/06/2025	0,00%	0,00%	2,3	16,4	-	0	81,3	-0,62		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Transportes	PMG-122	A	17/06/2025	0,00%	0,00%	0,3	20,7	-	0	79	-0,41		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Transportes	PMG-122	B	17/06/2025	0,00%	0,00%	4,9	13,5	-	0	81,6	-0,89		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Transportes	PMG-123	A	17/06/2025	0,00%	0,00%	0,6	20,2	-	0	79,2	-0,56		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Transportes	PMG-123	B	17/06/2025	0,00%	0,00%	0,8	19,7	-	0	79,5	-0,64		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Transportes	PMG-124	A	17/06/2025	0,00%	0,00%	0,4	20,6	-	0	79	-0,6		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Transportes	PMG-124	B	17/06/2025	0,00%	0,00%	2,3	18,5	-	0	79,2	-0,71		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.

EngeSolve
SOLUÇÕES AMBIENTAIS INTEGRADAS

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	C02 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H_2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
Transportes	**PMG-158**	**B**	**17/06/2025**	0,00%	0,00%	0,9	19,7	-	0	79,4	-0,75		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Transportes	**PMG-159**	**B**	**17/06/2025**	0,00%	0,00%	2,1	17,6	-	0	80,3	-0,55		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Posto Guarda Universitário	**PMG-125**	**A**	**18/06/2025**	0,00%	0,00%	0,1	21	-	0	79	-0,63		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Posto Guarda Universitário	**PMG-125**	**B**	**18/06/2025**	0,00%	0,00%	0,1	21	-	0	79	-0,68		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Posto Guarda Universitário	**PMG-126**	**A**	**18/06/2025**	0,00%	0,00%	0,1	20,9	-	0	79	-0,59		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Posto Guarda Universitário	**PMG-126**	**B**	**18/06/2025**	0,00%	0,00%	1,5	19,7	-	1	78,8	-0,7		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Posto Guarda Universitário	**PMG-127**	**A**	**18/06/2025**	0,00%	0,00%	0,1	20,9	-	0	79	-0,6		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Posto Guarda Universitário	**PMG-127**	**B**	**18/06/2025**	0,00%	0,00%	2,4	19	-	0	78,6	-0,68		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Posto Guarda Universitário	**PMG-128**	**A**	**18/06/2025**	0,00%	0,00%	0,1	21	-	0	79	-0,66		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Posto Guarda Universitário	**PMG-128**	**B**	**18/06/2025**	0,00%	0,00%	3,8	17,7	-	0	78,5	-0,72		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Posto Guarda Universitário	**PMG-129**	**A**	**18/06/2025**	0,00%	0,00%	0,1	20,9	-	0	79	-0,63		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Posto Guarda Universitário	**PMG-129**	**B**	**18/06/2025**	0,00%	0,00%	1,1	20,2	-	2	78,8	-0,85		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Posto Guarda Universitário	**PMG-130**	**A**	**18/06/2025**	0,00%	0,00%	0,1	20,9	-	0	79	-0,66		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Posto Guarda Universitário	**PMG-130**	**B**	**18/06/2025**	0,00%	0,00%	0,1	20,9	-	0	79	-0,73		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Posto Guarda Universitário	**PMG-131**	**A**	**18/06/2025**	0,00%	0,00%	0,2	20,7	-	1	79	-0,65		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Posto Guarda Universitário	**PMG-131**	**B**	**18/06/2025**	0,00%	0,00%	0,8	20,3	-	1	78,9	-0,69		0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Edifício I 1	**PMG-16**	**A**	**23/06/2025**	0,00%	0,00%	1,7	18,7	-	0	79,1	-0,45	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Edifício I 1	**PMG-16**	**B**	**23/06/2025**	0,00%	0,00%	2,3	18,5	-	0	79,2	-0,49	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Edifício I 1	**PMG-17**	**A**	**23/06/2025**	0,00%	0,00%	0,4	20,2	-	0	78,9	-0,52	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Edifício I 1	**PMG-17**	**B**	**23/06/2025**	0,00%	0,00%	1,2	19,7	-	0	79	-0,55	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Edifício I 1	**PMG-18**	**A**	**23/06/2025**	0,00%	0,00%	0,4	20,6	-	0	79,1	0,15	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Edifício I 1	**PMG-18**	**B**	**23/06/2025**	0,00%	0,00%	1,4	19,4	-	0	78,9	0,1	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Edifício I 1	**PMG-20**	**A**	**23/06/2025**	0,00%	0,00%	0,3	20,1	-	0	79,6	-0,09	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Edifício I 1	**PMG-20**	**B**	**23/06/2025**	0,00%	0,00%	0,4	19,9	-	0	79,5	-0,12	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Edifício I 1	**PMG-22**	**A**	**23/06/2025**	0,00%	0,00%	0,3	20	-	0	79,3	-0,1	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Edifício I 1	**PMG-22**	**B**	**23/06/2025**	0,00%	0,00%	3,5	16,5	-	0	79,6	-0,18	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Edifício I 1	**PMG-23**	**A**	**23/06/2025**	0,00%	0,00%	0,3	20,1	-	0	79,2	-0,14	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Edifício I 1	**PMG-23**	**B**	**23/06/2025**	0,00%	0,00%	1,2	18,8	-	0	79,5	-0,1	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Edifício I 1	**PMG-113**	**A**	**23/06/2025**	0,00%	0,00%	0,2	20,3	-	0	79,2	0,15	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Edifício I 1	**PMG-113**	**B**	**23/06/2025**	0,00%	0,00%	1,1	19,2	-	0	79,3	0,09	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Edifício I 1	**PMG-114**	**A**	**23/06/2025**	0,00%	0,00%	0,1	20,1	-	0	79,5	0,04	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Edifício I 1	**PMG-114**	**B**	**23/06/2025**	0,00%	0,00%	0,2	20,2	-	0	79,4	0,03	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Edifício I 1	**PMG-115**	**A**	**23/06/2025**	0,00%	0,00%	0,3	20,2	-	0	79,5	0,19	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Edifício I 1	**PMG-115**	**B**	**23/06/2025**	0,00%	0,00%	0,2	20,3	-	0	79,5	0,05	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Edifício I 1	**PMG-11**	**A**	**23/06/2025**	0,00%	0,00%	0,9	19,8	-	0	79,1	-0,61	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Edifício I 1	**PMG-11**	**B**	**23/06/2025**	0,10%	0,10%	0,6	20,2	-	0	79	-0,66	-	0	58	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Edifício I 1	**PMG-12**	**A**	**23/06/2025**	0,00%	0,00%	2,7	18,1	-	0	79,2	0,03	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Edifício I 1	**PMG-12**	**B**	**23/06/2025**	0,00%	0,00%	3,2	17,5	-	0	79,6	0,08	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Edifício I 1	**PMG-13**	**A**	**23/06/2025**	0,00%	0,00%	0,8	19,9	-	0	79,2	-0,62	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Edifício I 1	**PMG-13**	**B**	**23/06/2025**	0,00%	0,00%	1,3	19,3	-	0	79,2	-0,63	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Edifício I 1	**PMG-14**	**A**	**23/06/2025**	0,00%	0,00%	2	19,1	-	0	79,3	-0,58	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Edifício I 1	**PMG-14**	**B**	**23/06/2025**	0,00%	0,00%	3,4	17,3	-	0	79,2	-0,57	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Edifício I 1	**PMG-15**	**A**	**23/06/2025**	0,00%	0,00%	0,2	20,5	-	0	78,8	-0,52	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Edifício I 1	**PMG-15**	**B**	**23/06/2025**	0,00%	0,00%	0,1	20,7	-	0	79	-0,62	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Edifício I 1	**PMG-19**	**A**	**23/06/2025**	0,00%	0,00%	0,3	20,5	-	0	78,9	-0,55	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Edifício I 1	**PMG-19**	**B**	**23/06/2025**	0,00%	0,00%	0,6	20,3	-	0	79,1	-0,52	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Edifício I 1	**PMG-21**	**A**	**23/06/2025**	0,00%	0,00%	1	19,8	-	0	79,2	-0,54	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Edifício I 1	**PMG-21**	**B**	**23/06/2025**	0,00%	0,00%	1,2	19,7	-	0	79,3	-0,58	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Edifício I 1	**PMG-24**	**A**	**23/06/2025**	0,00%	0,00%	0,6	20,1	-	0	79,1	-0,03	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Edifício I 1	**PMG-24**	**B**	**23/06/2025**	0,00%	0,00%	0,6	19,9	-	0	79,3	-0,18	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Edifício I 1	**PMG-135**	**A**	**23/06/2025**	0,00%	0,00%	0,3	20,1	-	0	79,4	-0,01	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Edifício I 1	**PMG -135**	**B**	**23/06/2025**	0,00%	0,00%	0,1	20,2	-	0	79,7	-0,13	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Edifício I 1	**PMG-136**	**B**	**23/06/2025**	0,00%	0,00%	0,2	20,3	-	0	79,6	-0,08	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	C02 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H_2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
I-5 Auditórios	PMG-25	A	23/06/2025	0,00%	0,00%	0,6	20,2	-	0	79,2	-0,55	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
I-5 Auditórios	PMG-25	B	23/06/2025	0,00%	0,00%	0,2	20,7	-	1	79,2	-0,58	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
I-5 Auditórios	PMG-26	A	23/06/2025	0,00%	0,00%	1,2	19,3	-	0	79,5	-0,54	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
I-5 Auditórios	PMG-26	B	23/06/2025	0,00%	0,00%	1,4	19,4	-	0	79,3	-0,55	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
I-5 Auditórios	PMG-27	A	23/06/2025	0,00%	0,00%	0,3	20,6	-	1	79,1	-0,6	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
I-5 Auditórios	PMG-27	B	23/06/2025	0,00%	0,00%	3,4	17	-	1	79,5	-0,52	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
I-5 Auditórios	PMG-28	A	23/06/2025	0,00%	0,00%	1	18,8	-	0	80,1	-0,63	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
I-5 Auditórios	PMG-28	B	23/06/2025	0,00%	0,00%	1,9	17,2	-	0	80,9	-0,61	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
I-5 Auditórios	PMG-29	A	23/06/2025	0,00%	0,00%	0,3	20,5	-	0	79,2	-0,62	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
I-5 Auditórios	PMG-29	B	23/06/2025	0,00%	0,00%	0,9	19,9	-	0	79,2	-0,63	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
I-5 Auditórios	PMG-44	A	23/06/2025	0,00%	0,00%	1	19,3	-	0	79,6	-0,51	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
I-5 Auditórios	PMG-44	B	23/06/2025	0,00%	0,00%	1	19,4	-	0	79,7	-0,62	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
I-5 Auditórios	PMG-45	A	23/06/2025	0,00%	0,00%	0	20,6	-	1	79,1	-0,74	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
I-5 Auditórios	PMG-45	B	23/06/2025	0,00%	0,00%	0	20,1	-	0	79,3	-0,75	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
I-5 Auditórios	PMG-134	B	23/06/2025	0,00%	0,00%	0	20,9	-	1	79	-0,79	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
I-3 Biblioteca	PMG-30	A	24/06/2025	0,00%	0,00%	0,1	212	-	1	78,3	-0,16	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
I-3 Biblioteca	PMG-30	B	24/06/2025	0,00%	0,00%	0,3	213	-	2	78,4	-0,21	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
I-3 Biblioteca	PMG-31	A	24/06/2025	0,00%	0,00%	0,4	21,4	-	2	78,4	-0,16	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
I-3 Biblioteca	PMG-31	B	24/06/2025	0,00%	0,00%	0,1	21,3	-	1	78,4	-0,15	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
I-3 Biblioteca	PMG-32	A	24/06/2025	0,00%	0,00%	0,1	21,1	-	0	78,6	-0,16	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
I-3 Biblioteca	PMG-32	B	24/06/2025	0,00%	0,00%	0,4	20,2	-	1	78,7	-0,2	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
I-3 Biblioteca	PMG-33	A	24/06/2025	0,00%	0,00%	0,1	20,9	-	0	78,5	-0,15	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
I-3 Biblioteca	PMG-33	B	24/06/2025	0,00%	0,00%	2,8	18,4	-	2	78,8	-0,27	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
I-3 Biblioteca	PMG-34	A	24/06/2025	0,00%	0,00%	0,1	21,4	-	1	78,7	-0,1	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
I-3 Biblioteca	PMG-34	B	24/06/2025	0,00%	0,00%	0,7	20,5	-	2	78,6	-0,12	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
I-3 Biblioteca	PMG-35	A	24/06/2025	0,00%	0,00%	0,1	21,1	-	1	78,5	-0,09	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
I-3 Biblioteca	PMG-35	B	24/06/2025	0,00%	0,00%	0,4	21,2	-	1	78,4	-0,09	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
I-3 Biblioteca	PMG-36	A	24/06/2025	0,00%	0,00%	0,1	21,5	-	2	78,5	-0,15	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
I-3 Biblioteca	PMG-36	B	24/06/2025	0,00%	0,00%	1,9	19,1	-	1	78,8	-0,41	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
I-3 Biblioteca	PMG-37	A	24/06/2025	0,00%	0,00%	0,1	21,2	-	2	78,8	-0,09	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
I-3 Biblioteca	PMG-37	B	24/06/2025	0,00%	0,00%	0,7	20,4	-	2	78,6	-0,13	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
I-3 Biblioteca	PMG-38	A	24/06/2025	0,00%	0,00%	0,2	21,1	-	1	78,5	-0,02	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
I-3 Biblioteca	PMG-38	B	24/06/2025	0,00%	0,00%	0,1	20,9	-	2	78,6	-0,11	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
I-3 Biblioteca	PMG-39	A	24/06/2025	0,00%	0,00%	0,2	21,1	-	2	78,8	-0,89	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
I-3 Biblioteca	PMG-39	B	24/06/2025	0,00%	0,00%	5,9	14,1	-	1	79,1	-0,93	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
I-3 Biblioteca	PMG-40	A	24/06/2025	0,00%	0,00%	0,2	21	-	2	78,9	-0,09	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
I-3 Biblioteca	PMG-40	B	24/06/2025	0,00%	0,00%	0,2	21,1	-	2	78,6	-0,03	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
I-3 Biblioteca	PMG-41	A	24/06/2025	0,00%	0,00%	0,1	21,4	-	2	78,5	-0,16	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
I-3 Biblioteca	PMG-41	B	24/06/2025	0,00%	0,00%	0,1	21,5	-	2	78,4	-0,4	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
I-3 Biblioteca	PMG-42	A	24/06/2025	0,00%	0,00%	0,6	20,9	-	2	78,4	-0,12	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
I-3 Biblioteca	PMG-42	B	24/06/2025	0,00%	0,00%	0,3	21,2	-	2	78,4	-0,14	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
I-3 Biblioteca	PMG-43	A	24/06/2025	0,00%	0,00%	0,1	21,3	-	1	78,5	-0,14	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
I-3 Biblioteca	PMG-43	B	24/06/2025	0,00%	0,00%	0,6	21,2	-	2	78,4	-0,16	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
I-3 Biblioteca	PMG-132	A	24/06/2025	0,00%	0,00%	0,1	21,3	-	2	78,6	-0,14	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
I-3 Biblioteca	PMG-132	B	24/06/2025	0,00%	0,00%	0,1	21,2	-	2	78,5	-0,27	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
I-3 Biblioteca	PMG-133	A	24/06/2025	0,00%	0,00%	0,2	20,6	-	1	78,9	-0,87	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
I-3 Biblioteca	PMG-133	B	24/06/2025	0,00%	0,00%	0,5	20,5	-	2	78,8	-0,96	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Edifício I-4	PMG-63	A	24/06/2025	0,00%	0,00%	0,2	21	-	0	78,9	-0,74	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Edifício I-4	PMG-63	B	24/06/2025	0,00%	0,00%	0,1	20,8	-	1	78,9	-0,81	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Edifício I-4	PMG-64	A	24/06/2025	0,00%	0,00%	0,1	21,1	-	0	78,9	-0,69	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Edifício I-4	PMG-64	B	24/06/2025	0,00%	0,00%	0,4	21,1	-	0	79,2	-0,66	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Edifício I-4	PMG-65	A	24/06/2025	0,00%	0,00%	0,2	20,9	-	1	79	-0,72	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Edifício I-4	PMG-65	B	24/06/2025	0,00%	0,00%	0,1	21	-	0	79,2	-0,74	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	C02 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H_2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
Edifício I-4	**PMG-66**	**A**	**24/06/2025**	0,00%	0,00%	0,1	20,8	-	1	79,1	-0,73	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Edifício I-4	**PMG-66**	**B**	**24/06/2025**	0,00%	0,00%	0,2	20,9	-	0	78,9	-0,75	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Edifício I-4	**PMG-67**	**A**	**24/06/2025**	0,00%	0,00%	0,1	21,4	-	1	79	-0,73	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Edifício I-4	**PMG-67**	**B**	**24/06/2025**	0,00%	0,00%	0,5	21,2	-	0	78,9	-0,78	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Edifício I-4	**PMG-68**	**A**	**24/06/2025**	0,00%	0,00%	0,3	21,2	-	1	78,8	-0,8	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Edifício I-4	**PMG-68**	**B**	**24/06/2025**	0,00%	0,00%	0,2	21,2	-	0	78,8	-0,71	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Edifício I-4	**PMG-69**	**A**	**24/06/2025**	0,00%	0,00%	0,1	21,3	-	1	78,8	-0,71	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Edifício I-4	**PMG-69**	**B**	**24/06/2025**	0,00%	0,00%	0,1	21,1	-	1	78,7	-0,73	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Edifício I-4	**PMG-77**	**A**	**24/06/2025**	0,00%	0,00%	0,1	20,9	-	0	78,9	-0,51	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Edifício I-4	**PMG-77**	**B**	**24/06/2025**	0,00%	0,00%	0,4	21,5	-	0	79,1	-0,58	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Edifício I-4	**PMG-78**	**A**	**24/06/2025**	0,00%	0,00%	0,2	21,3	-	1	79,1	-0,59	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Edifício I-4	**PMG-78**	**B**	**24/06/2025**	0,00%	0,00%	0,1	21,1	-	0	79,2	-0,64	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Edifício I-4	**PMG-79**	**A**	**24/06/2025**	0,00%	0,00%	0,1	21,4	-	0	79	-0,72	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Edifício I-4	**PMG-79**	**B**	**24/06/2025**	0,00%	0,00%	0,9	20,2	-	0	79,3	-0,72	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Edifício I-4	**PMG-80**	**A**	**24/06/2025**	0,00%	0,00%	0,1	20	-	1	79,1	-0,7	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Edifício I-4	**PMG-80**	**B**	**24/06/2025**	0,00%	0,00%	0,2	20,1	-	0	78,8	-0,81	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Edifício I-4	**PMG-81**	**A**	**24/06/2025**	0,00%	0,00%	0,1	20,8	-	0	79,1	-0,64	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Edifício I-4	**PMG-81**	**B**	**24/06/2025**	0,00%	0,00%	0,4	20,5	-	0	79,3	-0,6	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Edifício I-4	**PMG-144**	**B**	**24/06/2025**	0,00%	0,00%	0,2	20,9	-	0	79,2	-0,8	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Edifício I-4	**PMG-145**	**B**	**24/06/2025**	0,00%	0,00%	0,1	20,8	-	0	79,3	-0,6	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Edifício I-4	**PMG-146**	**B**	**24/06/2025**	0,00%	0,00%	0,3	20,6	-	0	79,1	-0,52	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Edifício I-4	**PMG-147**	**B**	**24/06/2025**	0,00%	0,00%	0,4	20,4	-	1	78,9	-0,83	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Edifício I-4	**PMG-148**	**B**	**24/06/2025**	0,00%	0,00%	1,1	20,1	-	0	79	-0,66	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Edifício I-4	**PMG-149**	**B**	**24/06/2025**	0,00%	0,00%	1,3	20,3	-	0	78,8	-0,66	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Edifício I-4	**PMG-150**	**B**	**24/06/2025**	0,00%	0,00%	0,6	20,4	-	1	79,3	-0,63	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Edifício I-4	**PMG-151**	**B**	**24/06/2025**	0,00%	0,00%	0,4	20,6	-	0	79	-0,66	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Conjunto Laboratorial	**PMG-46**	**A**	**25/06/2025**	0,00%	0,00%	2	20,2	-	0	79,2	-0,55	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Conjunto Laboratorial	**PMG-46**	**B**	**25/06/2025**	0,00%	0,00%	1,8	17,4	-	0	79,4	-0,6	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Conjunto Laboratorial	**PMG-47**	**A**	**25/06/2025**	0,00%	0,00%	0,2	20,3	-	0	79,4	-0,52	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Conjunto Laboratorial	**PMG-47**	**B**	**25/06/2025**	0,00%	0,00%	0,1	20,7	-	0	79,5	-0,54	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Conjunto Laboratorial	**PMG-48**	**A**	**25/06/2025**	0,00%	0,00%	0,2	20,1	-	0	79,4	-0,45	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Conjunto Laboratorial	**PMG-48**	**B**	**25/06/2025**	0,00%	0,00%	0,5	19,9	-	0	79	-0,54	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Conjunto Laboratorial	**PMG-49**	**A**	**25/06/2025**	0,00%	0,00%	0,3	20,5	-	0	79	-0,51	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Conjunto Laboratorial	**PMG-49**	**B**	**25/06/2025**	0,00%	0,00%	4,7	17,3	-	0	79,1	-0,49	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Conjunto Laboratorial	**PMG-50**	**A**	**25/06/2025**	0,00%	0,00%	0,1	20,4	-	0	79,5	-0,5	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Conjunto Laboratorial	**PMG-50**	**B**	**25/06/2025**	0,00%	0,00%	2,1	19	-	0	78,9	-0,61	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Conjunto Laboratorial	**PMG-51**	**A**	**25/06/2025**	0,00%	0,00%	0,2	20,2	-	0	79,5	-0,46	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Conjunto Laboratorial	**PMG-51**	**B**	**25/06/2025**	0,00%	0,00%	0,1	20,3	-	0	79,6	-0,4	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Conjunto Laboratorial	**PMG-52**	**A**	**25/06/2025**	0,00%	0,00%	0,1	20,8	-	0	79,5	-0,35	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Conjunto Laboratorial	**PMG-52**	**B**	**25/06/2025**	0,00%	0,00%	0,1	20,4	-	0	79,3	-0,32	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Conjunto Laboratorial	**PMG-53**	**A**	**25/06/2025**	0,00%	0,00%	0,2	20,1	-	0	79,4	-0,26	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Conjunto Laboratorial	**PMG-53**	**B**	**25/06/2025**	0,00%	0,00%	0,5	19,3	-	0	80	-0,28	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Conjunto Laboratorial	**PMG-54**	**A**	**25/06/2025**	0,00%	0,00%	0,2	20,1	-	0	79,6	-0,19	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Conjunto Laboratorial	**PMG-54**	**B**	**25/06/2025**	0,00%	0,00%	4,7	14,5	-	0	81,6	-0,18	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Conjunto Laboratorial	**PMG-55**	**A**	**25/06/2025**	0,00%	0,00%	0,2	18,9	-	0	79,1	-0,1	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Conjunto Laboratorial	**PMG-55**	**B**	**25/06/2025**	0,00%	0,00%	3,2	17,5	-	0	79,6	-0,09	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Conjunto Laboratorial	**PMG-56**	**A**	**25/06/2025**	0,00%	0,00%	0,2	19,8	-	0	79,8	-0,51	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Conjunto Laboratorial	**PMG-56**	**B**	**25/06/2025**	0,00%	0,00%	1	19,8	-	0	78,8	-0,51	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Conjunto Laboratorial	**PMG-57**	**A**	**25/06/2025**	0,00%	0,00%	0,1	20,1	-	0	79,1	-0,42	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Conjunto Laboratorial	**PMG-57**	**B**	**25/06/2025**	0,00%	0,00%	1,4	19,2	-	0	79,3	-0,42	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Conjunto Laboratorial	**PMG-58**	**A**	**25/06/2025**	0,00%	0,00%	0,1	20,1	-	0	79,4	-0,39	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Conjunto Laboratorial	**PMG-58**	**B**	**25/06/2025**	0,00%	0,00%	1	20,4	-	0	79,5	-0,42	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Conjunto Laboratorial	**PMG-59**	**A**	**25/06/2025**	0,00%	0,00%	0,1	20,5	-	0	79,5	-0,48	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	C02 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H_2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
Conjunto Laboratorial	**PMG-59**	**B**	**25/06/2025**	0,00%	0,00%	2,2	19,5	-	0	79,3	-0,49	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Conjunto Laboratorial	**PMG-60**	**A**	**25/06/2025**	0,00%	0,00%	0,1	19,9	-	0	79,6	-0,42	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Conjunto Laboratorial	**PMG-60**	**B**	**25/06/2025**	0,00%	0,00%	2,3	19,1	-	0	79,4	-0,42	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Conjunto Laboratorial	**PMG-61**	**A**	**25/06/2025**	0,00%	0,00%	0,1	20,2	-	0	79,4	-0,39	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Conjunto Laboratorial	**PMG-61**	**B**	**25/06/2025**	0,00%	0,00%	6,8	13,1	-	0	80,1	-0,62	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Conjunto Laboratorial	**PMG-137**	**B**	**25/06/2025**	0,00%	0,00%	0,1	20,5	-	0	80,2	-0,68	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Conjunto Laboratorial	**PMG-138**	**B**	**25/06/2025**	0,00%	0,00%	2,5	18,6	-	0	79,1	-0,47	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Conjunto Laboratorial	**PMG-139**	**A**	**25/06/2025**	0,00%	0,00%	0,1	20,1	-	0	79,4	-0,19	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Conjunto Laboratorial	**PMG-139**	**B**	**25/06/2025**	0,00%	0,00%	0,1	20,6	-	0	79,3	-0,1	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Conjunto Laboratorial	**PMG-140**	**A**	**25/06/2025**	0,00%	0,00%	0,1	20,5	-	0	79,4	-0,18	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Conjunto Laboratorial	**PMG-140**	**B**	**25/06/2025**	0,00%	0,20%	0,1	20,1	-	0	79,4	-0,24	-	0	**0**	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Conjunto Laboratorial	**PMG-141**	**B**	**25/06/2025**	0,00%	0,00%	0,2	20,6	-	0	79,5	-0,32	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Conjunto Laboratorial	**PMG-62**	**A**	**25/06/2025**	0,00%	0,00%	0,1	20,4	-	0	80,2	-0,35	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Conjunto Laboratorial	**PMG-62**	**B**	**25/06/2025**	0,00%	0,10%	0,1	20,3	-	0	79,5	-0,42	-	0	**0**	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-01**	**A**	**26/06/2025**	0,00%	0,00%	0,1	20,2	-	0	79,1	-0,35	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-01**	**B**	**26/06/2025**	0,00%	0,00%	0	20,4	-	0	79,4	-0,4	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-02**	**A**	**26/06/2025**	0,00%	0,00%	0,1	20,4	-	0	79,6	-0,52	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-02**	**B**	**26/06/2025**	0,00%	0,00%	0,1	20,6	-	0	79,2	-0,58	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-03**	**A**	**26/06/2025**	0,00%	0,00%	0	20,5	-	0	79,1	-0,72	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-03**	**B**	**26/06/2025**	0,00%	0,00%	1,2	18,5	-	0	80,2	-0,47	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-04**	**A**	**26/06/2025**	0,00%	0,00%	0,2	20,2	-	0	79,4	-0,56	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-04**	**B**	**26/06/2025**	0,00%	0,00%	0,1	20,1	-	0	79,3	-0,59	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-05**	**A**	**26/06/2025**	0,00%	0,00%	0,1	20,4	-	0	79,5	-0,51	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-05**	**B**	**26/06/2025**	0,00%	0,00%	0,1	20,6	-	0	79,3	-0,55	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-06**	**A**	**26/06/2025**	0,00%	0,00%	0,1	20,7	-	0	79,1	-0,52	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-06**	**B**	**26/06/2025**	0,00%	0,00%	0	20,7	-	0	79,2	-0,49	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-07**	**A**	**26/06/2025**	0,00%	0,00%	0,1	20,7	-	0	79,1	-0,49	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-07**	**B**	**26/06/2025**	0,00%	0,00%	0	20,6	-	0	79,4	-0,58	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-08**	**A**	**26/06/2025**	0,00%	0,00%	0,1	20,4	-	0	79,6	-0,42	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-08**	**B**	**26/06/2025**	0,00%	0,00%	3,9	15,1	-	0	80,2	-0,32	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-09**	**A**	**26/06/2025**	0,00%	0,00%	0,1	20,1	-	0	79,2	-0,44	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-09**	**B**	**26/06/2025**	0,00%	0,00%	6,5	12,9	-	0	80,3	-0,32	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-10**	**A**	**26/06/2025**	0,00%	0,00%	0,4	20,1	-	0	79,4	-0,35	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-10**	**B**	**26/06/2025**	0,00%	0,00%	1,5	18,9	-	0	79,9	-0,42	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-84**	**A**	**26/06/2025**	0,00%	0,00%	0,2	20,1	-	0	79,7	-0,35	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-84**	**B**	**26/06/2025**	0,00%	0,00%	2,9	18,5	-	0	79,5	-0,36	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-85**	**A**	**26/06/2025**	0,00%	0,00%	0,5	19,6	-	0	79,6	-0,35	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-85**	**B**	**26/06/2025**	0,00%	0,00%	1,4	19,2	-	0	79,2	-0,52	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-86**	**A**	**26/06/2025**	0,00%	0,00%	0,5	20	-	0	79,3	-0,32	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-86**	**B**	**26/06/2025**	0,00%	0,00%	0,8	19,9	-	0	79,5	-0,34	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-87**	**A**	**26/06/2025**	0,00%	0,00%	2,2	16,8	-	0	80,8	-0,29	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-87**	**B**	**26/06/2025**	0,00%	0,00%	0,9	19,2	-	0	79,6	-0,27	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-152**	**A**	**26/06/2025**	0,00%	0,00%	0,3	19,7	-	0	79,4	-0,36	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-152**	**B**	**26/06/2025**	0,00%	0,00%	4,9	14,2	-	0	79,8	-0,32	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-153**	**B**	**26/06/2025**	0,00%	0,00%	0,1	20,4	-	0	79,1	-0,34	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-154**	**B**	**26/06/2025**	0,00%	0,00%	0	20,5	-	0	79	-0,51	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-155**	**B**	**26/06/2025**	0,00%	0,00%	1,7	18,5	-	0	79,6	-0,39	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-156**	**B**	**26/06/2025**	0,00%	0,00%	0,1	20,4	-	0	79,1	-0,48	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-157**	**B**	**26/06/2025**	0,00%	0,00%	0,1	20,6	-	0	79,3	-0,57	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Enfermaria	**PMG-70**	**A**	**23/06/2025**	0,00%	0,00%	0,5	18,2	-	0	80,8	-0,95	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Enfermaria	**PMG-70**	**B**	**23/06/2025**	0,00%	0,00%	2,2	17,1	-	0	80,6	-0,96	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Enfermaria	**PMG-71**	**A**	**23/06/2025**	0,00%	0,00%	0,6	20,2	-	0	79,1	-0,92	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Enfermaria	**PMG-71**	**B**	**23/06/2025**	0,04%	0,04%	2,3	0,3	-	0	97	-0,96	-	0	**0**	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	C02 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H_2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
Enfermaria	PMG-72	A	23/06/2025	0,00%	0,00%	0,7	18,2	-	0	80,9	-0,93	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Enfermaria	PMG-72	B	23/06/2025	0,00%	0,00%	3,3	15	-	0	81,6	-0,83	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Enfermaria	PMG-73	A	23/06/2025	0,00%	0,00%	0,5	20,2	-	0	79,2	-0,89	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Enfermaria	PMG-73	B	23/06/2025	0,00%	0,00%	1,2	19,5	-	0	79,3	-0,85	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Enfermaria	PMG-74	A	23/06/2025	0,00%	0,00%	0,8	18,9	-	0	80,2	-0,96	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Enfermaria	PMG-74	B	23/06/2025	4,70%	4,70%	1,8	1,5	-	0	92	-0,83	-	0	0,5	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Enfermaria	PMG-75	A	23/06/2025	0,00%	0,00%	0,9	19,2	-	0	79,7	-0,8	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Enfermaria	PMG-75	B	23/06/2025	0,00%	0,00%	7,3	5,7	-	0	85,7	-0,79	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Enfermaria	PMG-76	A	23/06/2025	0,00%	0,00%	1	18,3	-	0	80,6	-0,75	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Enfermaria	PMG-76	B	23/06/2025	0,00%	0,00%	6,4	3,2	-	0	90,3	-0,78	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Enfermaria	PMG-165	A	23/06/2025	0,00%	0,00%	0,6	18,7	-	0	80,6	-1,01	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Enfermaria	PMG-165	B	23/06/2025	14,50%	14,50%	1,9	1,5	-	3	82,1	-0,24	-	0	0,85	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
CAT	PMG-82	A	23/06/2025	0,00%	0,00%	5,5	14,5	-	0	80,2	-0,65	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
CAT	PMG-82	B	23/06/2025	0,00%	0,00%	1,3	19,6	-	0	79,3	-0,48	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
CAT	PMG-83	A	23/06/2025	0,00%	0,00%	1,9	18,6	-	0	79,1	-0,52	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
CAT	PMG-83	B	23/06/2025	0,00%	0,00%	2,7	18,5	-	0	79,2	-0,59	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
CAT	PMG-94	A	23/06/2025	0,00%	0,00%	3,7	16,4	-	0	79,6	-0,63	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
CAT	PMG-94	B	23/06/2025	0,00%	0,00%	0,2	20,8	-	1	78,5	-0,58	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
CAT	PMG-95	A	23/06/2025	0,00%	0,00%	0,1	20,9	-	1	80	-0,6	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
CAT	PMG-95	B	23/06/2025	0,00%	0,00%	4,3	18,1	-	0	78,2	-0,71	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
CAT	PMG-96	A	23/06/2025	0,00%	0,00%	0,1	20,7	-	1	78,9	-0,64	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
CAT	PMG-96	B	23/06/2025	0,00%	0,00%	6,1	10,3	-	0	83,5	-0,54	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
CAT	PMG-97	A	23/06/2025	0,00%	0,00%	0,3	20,9	-	0	78,9	-0,57	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
CAT	PMG-97	B	23/06/2025	0,00%	0,00%	5,6	13,3	-	1	80,5	-0,68	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
CAT	PMG-98	A	23/06/2025	0,00%	0,00%	0,2	21,1	-	0	78,4	-0,62	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
CAT	PMG-98	B	23/06/2025	0,00%	0,00%	0,8	20,1	-	0	78,6	-0,65	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
CAT	PMG-160	A	23/06/2025	0,00%	0,00%	0,1	20,4	-	1	79,2	-0,58	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
CAT	PMG-160	B	23/06/2025	0,00%	0,00%	2,3	18,4	-	0	79,2	-0,59	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
CAT	PMG-161	A	23/06/2025	0,00%	0,00%	1,5	19,1	-	1	79,3	-0,57	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
CAT	PMG-161	B	23/06/2025	0,00%	0,00%	5,1	15,9	-	0	78,6	-0,64	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Incubadora	PMG-88	A	23/06/2025	0,00%	0,00%	0,6	20,3	-	1	79,1	-0,6	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Incubadora	PMG-88	B	23/06/2025	0,00%	0,00%	0,5	20,6	-	0	78,8	-0,65	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Incubadora	PMG-89	A	23/06/2025	0,00%	0,00%	0,2	20,9	-	0	78,9	-0,62	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Incubadora	PMG-89	B	23/06/2025	0,00%	0,00%	0,9	20,2	-	1	78,9	-0,71	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Incubadora	PMG-90	A	23/06/2025	0,00%	0,00%	0,1	21,2	-	1	78,7	-0,6	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Incubadora	PMG-90	B	23/06/2025	0,00%	0,00%	0,6	20,5	-	0	78,9	-0,66	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Incubadora	PMG-91	A	23/06/2025	0,00%	0,00%	0,1	21,2	-	0	78,8	-0,59	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Incubadora	PMG-91	B	23/06/2025	0,00%	0,00%	1,7	19,3	-	0	79,1	-0,64	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Incubadora	PMG-92	A	23/06/2025	0,00%	0,00%	0,1	21,1	-	0	78,8	-0,59	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Incubadora	PMG-92	B	23/06/2025	0,00%	0,00%	0,9	20,1	-	1	78,9	-0,66	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Incubadora	PMG-93	A	23/06/2025	0,00%	0,00%	0,3	20,9	-	1	78,8	-0,66	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Incubadora	PMG-93	B	23/06/2025	0,00%	0,00%	1,1	20	-	0	78,9	-0,71	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Posto Guarda Universitário	PMG-125	A	24/06/2025	0,00%	0,00%	0	20,9	-	0	79,1	-0,62	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Posto Guarda Universitário	PMG-125	B	24/06/2025	0,00%	0,00%	0	21,1	-	0	79,1	-0,65	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Posto Guarda Universitário	PMG-126	A	24/06/2025	0,00%	0,00%	0	20,8	-	0	79	-0,62	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Posto Guarda Universitário	PMG-126	B	24/06/2025	0,00%	0,00%	1,2	20	-	0	78,8	-0,68	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Posto Guarda Universitário	PMG-127	A	24/06/2025	0,00%	0,00%	0,1	21,1	-	0	79,1	-0,58	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Posto Guarda Universitário	PMG-127	B	24/06/2025	0,00%	0,00%	1,9	19,2	-	0	79	-0,65	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Posto Guarda Universitário	PMG-128	A	24/06/2025	0,00%	0,00%	0,1	21,2	-	0	78,9	-0,66	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Posto Guarda Universitário	PMG-128	B	24/06/2025	0,00%	0,00%	2,1	17,9	-	0	78,8	-0,7	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Posto Guarda Universitário	PMG-129	A	24/06/2025	0,00%	0,00%	0,1	20,9	-	0	78,8	-0,65	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Posto Guarda Universitário	PMG-129	B	24/06/2025	0,00%	0,00%	0,9	20,1	-	0	78,8	-0,81	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Posto Guarda Universitário	PMG-130	A	24/06/2025	0,00%	0,00%	0,1	21,1	-	0	79,2	-0,69	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	C02 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H_2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
Posto Guarda Universitário	**PMG-130**	**B**	**24/06/2025**	0,00%	0,00%	0	21	-	0	79,1	-0,75	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Posto Guarda Universitário	**PMG-131**	**A**	**24/06/2025**	0,00%	0,00%	0,1	20,5	-	0	79	-0,71	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Posto Guarda Universitário	**PMG-131**	**B**	**24/06/2025**	0,00%	0,00%	0,5	20,1	-	0	79,2	-0,65	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
I-3 Biblioteca	**PMG-30**	**A**	**30/06/2025**	0,00%	0,00%	0,3	20	-	0	79,7	-0,52	-	0	0	Sem sensor CO no equipamento
I-3 Biblioteca	**PMG-30**	**B**	**30/06/2025**	0,00%	0,00%	2	18,6	-	0	79,4	0,42	-	0	0	Sem sensor CO no equipamento
I-3 Biblioteca	**PMG-31**	**A**	**30/06/2025**	0,00%	0,00%	0,4	19,8	-	0	79,7	0,65	-	0	0	Sem sensor CO no equipamento
I-3 Biblioteca	**PMG-31**	**B**	**30/06/2025**	0,00%	0,00%	3,1	13,8	-	0	83,1	0,49	-	0	0	Sem sensor CO no equipamento
I-3 Biblioteca	**PMG-32**	**A**	**30/06/2025**	0,00%	0,00%	0,3	20,6	-	0	79,1	0,46	-	0	0	Sem sensor CO no equipamento
I-3 Biblioteca	**PMG-32**	**B**	**30/06/2025**	0,00%	0,00%	1,5	19,2	-	0	79,2	0,35	-	0	0	Sem sensor CO no equipamento
I-3 Biblioteca	**PMG-33**	**A**	**30/06/2025**	0,00%	0,00%	0,2	20,8	-	0	79	0,42	-	0	0	Sem sensor CO no equipamento
I-3 Biblioteca	**PMG-33**	**B**	**30/06/2025**	0,00%	0,00%	6,5	14,3	-	0	79,1	0,32	-	0	0	Sem sensor CO no equipamento
I-3 Biblioteca	**PMG-34**	**A**	**30/06/2025**	0,00%	0,00%	0,4	20,6	-	0	79	0,43	-	0	0	Sem sensor CO no equipamento
I-3 Biblioteca	**PMG-34**	**B**	**30/06/2025**	0,00%	0,00%	2,1	19,2	-	0	78,7	0,36	-	0	0	Sem sensor CO no equipamento
I-3 Biblioteca	**PMG-35**	**A**	**30/06/2025**	0,00%	0,00%	0,2	20,6	-	0	79,2	0,38	-	0	0	Sem sensor CO no equipamento
I-3 Biblioteca	**PMG-35**	**B**	**30/06/2025**	0,00%	0,00%	2,6	18	-	0	79,3	0,37	-	0	0	Sem sensor CO no equipamento
I-3 Biblioteca	**PMG-36**	**A**	**30/06/2025**	0,00%	0,00%	0,2	20,6	-	0	79,2	0,41	-	0	0	Sem sensor CO no equipamento
I-3 Biblioteca	**PMG-36**	**B**	**30/06/2025**	0,00%	0,00%	7,5	12,8	-	0	79,6	0,36	-	0	0	Sem sensor CO no equipamento
I-3 Biblioteca	**PMG-37**	**A**	**30/06/2025**	0,00%	0,00%	0,1	20,6	-	0	79,3	0,44	-	0	0	Sem sensor CO no equipamento
I-3 Biblioteca	**PMG-37**	**B**	**30/06/2025**	0,00%	0,00%	2,1	18,9	-	0	78,9	0,45	-	0	0	Sem sensor CO no equipamento
I-3 Biblioteca	**PMG-38**	**A**	**30/06/2025**	0,00%	0,00%	0,4	20,3	-	0	79,2	0,39	-	0	0	Sem sensor CO no equipamento
I-3 Biblioteca	**PMG-38**	**B**	**30/06/2025**	0,00%	0,00%	1	19,3	-	0	79,2	0,4	-	0	0	Sem sensor CO no equipamento
I-3 Biblioteca	**PMG-39**	**A**	**30/06/2025**	0,00%	0,00%	0,4	20,3	-	0	79,3	0,49	-	0	0	Sem sensor CO no equipamento
I-3 Biblioteca	**PMG-39**	**B**	**30/06/2025**	0,00%	0,00%	0,2	15,5	-	0	79,2	0,43	-	0	0	Sem sensor CO no equipamento
I-3 Biblioteca	**PMG-40**	**A**	**30/06/2025**	0,00%	0,00%	0,1	20,7	-	0	79,1	0,6	-	0	0	Sem sensor CO no equipamento
I-3 Biblioteca	**PMG-40**	**B**	**30/06/2025**	0,00%	0,00%	0,8	20,2	-	0	79	0,58	-	0	0	Sem sensor CO no equipamento
I-3 Biblioteca	**PMG-41**	**A**	**30/06/2025**	0,00%	0,00%	0,2	20,2	-	0	79,5	0,53	-	0	0	Sem sensor CO no equipamento
I-3 Biblioteca	**PMG-41**	**B**	**30/06/2025**	0,00%	0,00%	0,4	20,2	-	0	79,4	0,65	-	0	0	Sem sensor CO no equipamento
I-3 Biblioteca	**PMG-42**	**A**	**30/06/2025**	0,00%	0,00%	1,3	19,9	-	0	78,9	0,35	-	0	0	Sem sensor CO no equipamento
I-3 Biblioteca	**PMG-42**	**B**	**30/06/2025**	0,00%	0,00%	10,4	12,1	-	0	77,5	0,2	-	0	0	Sem sensor CO no equipamento
I-3 Biblioteca	**PMG-43**	**A**	**30/06/2025**	0,00%	0,00%	0,1	20,8	-	0	79,1	0,39	-	0	0	Sem sensor CO no equipamento
I-3 Biblioteca	**PMG-43**	**B**	**30/06/2025**	0,00%	0,00%	1,5	19,5	-	0	79	0,36	-	0	0	Sem sensor CO no equipamento
I-3 Biblioteca	**PMG-132**	**A**	**30/06/2025**	0,00%	0,00%	0,3	20,3	-	0	79,4	-0,66	-	0	0	Sem sensor CO no equipamento
I-3 Biblioteca	**PMG-132**	**B**	**30/06/2025**	0,00%	0,00%	0,5	14,2	-	0	81,8	0,16	-	0	0	Sem sensor CO no equipamento
I-3 Biblioteca	**PMG-133**	**A**	**30/06/2025**	0,00%	0,00%	0,3	20,4	-	0	79,3	0,41	-	0	0	Sem sensor CO no equipamento
I-3 Biblioteca	**PMG-133**	**B**	**30/06/2025**	0,00%	0,00%	0,7	20	-	0	79,3	0,33	-	0	0	Sem sensor CO no equipamento
Conjunto Laboratorial	**PMG-46**	**A**	**25/06/2025**	0,00%	0,00%	2	20,2	-	0	79,2	-0,55	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Conjunto Laboratorial	**PMG-46**	**B**	**25/06/2025**	0,00%	0,00%	1,8	17,4	-	0	79,4	-0,6	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Conjunto Laboratorial	**PMG-47**	**A**	**25/06/2025**	0,00%	0,00%	0,2	20,3	-	0	79,4	-0,52	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Conjunto Laboratorial	**PMG-47**	**B**	**25/06/2025**	0,00%	0,00%	0,1	20,7	-	0	79,5	-0,54	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Conjunto Laboratorial	**PMG-48**	**A**	**25/06/2025**	0,00%	0,00%	0,2	20,1	-	0	79,4	-0,45	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Conjunto Laboratorial	**PMG-48**	**B**	**25/06/2025**	0,00%	0,00%	0,5	19,9	-	0	79	-0,54	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Conjunto Laboratorial	**PMG-49**	**A**	**25/06/2025**	0,00%	0,00%	0,3	20,5	-	0	79	-0,51	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Conjunto Laboratorial	**PMG-49**	**B**	**25/06/2025**	0,00%	0,00%	4,7	17,3	-	0	79,1	-0,49	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Conjunto Laboratorial	**PMG-50**	**A**	**25/06/2025**	0,00%	0,00%	0,1	20,4	-	0	79,5	-0,5	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Conjunto Laboratorial	**PMG-50**	**B**	**25/06/2025**	0,00%	0,00%	2,1	19	-	0	78,9	-0,61	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Conjunto Laboratorial	**PMG-51**	**A**	**25/06/2025**	0,00%	0,00%	0,2	20,2	-	0	79,5	-0,46	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Conjunto Laboratorial	**PMG-51**	**B**	**25/06/2025**	0,00%	0,00%	0,1	20,3	-	0	79,6	-0,4	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Conjunto Laboratorial	**PMG-52**	**A**	**25/06/2025**	0,00%	0,00%	0,1	20,8	-	0	79,5	-0,35	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Conjunto Laboratorial	**PMG-52**	**B**	**25/06/2025**	0,00%	0,00%	0,1	20,4	-	0	79,3	-0,32	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Conjunto Laboratorial	**PMG-53**	**A**	**25/06/2025**	0,00%	0,00%	0,2	20,1	-	0	79,4	-0,26	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Conjunto Laboratorial	**PMG-53**	**B**	**25/06/2025**	0,00%	0,00%	0,5	19,3	-	0	80	-0,28	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Conjunto Laboratorial	**PMG-54**	**A**	**25/06/2025**	0,00%	0,00%	0,2	20,1	-	0	79,6	-0,19	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Conjunto Laboratorial	**PMG-54**	**B**	**25/06/2025**	0,00%	0,00%	4,7	14,5	-	0	81,6	-0,18	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	C02 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H_2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
Conjunto Laboratorial	**PMG-55**	**A**	**25/06/2025**	0,00%	0,00%	0,2	18,9	-	0	79,1	-0,1	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Conjunto Laboratorial	**PMG-55**	**B**	**25/06/2025**	0,00%	0,00%	3,2	17,5	-	0	79,6	-0,09	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Conjunto Laboratorial	**PMG-56**	**A**	**25/06/2025**	0,00%	0,00%	0,2	19,8	-	0	79,8	-0,51	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Conjunto Laboratorial	**PMG-56**	**B**	**25/06/2025**	0,00%	0,00%	1	19,8	-	0	78,8	-0,51	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Conjunto Laboratorial	**PMG-57**	**A**	**25/06/2025**	0,00%	0,00%	0,1	20,1	-	0	79,1	-0,42	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Conjunto Laboratorial	**PMG-57**	**B**	**25/06/2025**	0,00%	0,00%	1,4	19,2	-	0	79,3	-0,42	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Conjunto Laboratorial	**PMG-58**	**A**	**25/06/2025**	0,00%	0,00%	0,1	20,1	-	0	79,4	-0,39	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Conjunto Laboratorial	**PMG-58**	**B**	**25/06/2025**	0,00%	0,00%	1	20,4	-	0	79,5	-0,42	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Conjunto Laboratorial	**PMG-59**	**A**	**25/06/2025**	0,00%	0,00%	0,1	20,5	-	0	79,5	-0,48	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Conjunto Laboratorial	**PMG-59**	**B**	**25/06/2025**	0,00%	0,00%	2,2	19,5	-	0	79,3	-0,49	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Conjunto Laboratorial	**PMG-60**	**A**	**25/06/2025**	0,00%	0,00%	0,1	19,9	-	0	79,6	-0,42	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Conjunto Laboratorial	**PMG-60**	**B**	**25/06/2025**	0,00%	0,00%	2,3	19,1	-	0	79,4	-0,42	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Conjunto Laboratorial	**PMG-61**	**A**	**25/06/2025**	0,00%	0,00%	0,1	20,2	-	0	79,4	-0,39	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Conjunto Laboratorial	**PMG-61**	**B**	**25/06/2025**	0,00%	0,00%	6,8	13,1	-	0	80,1	-0,62	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Conjunto Laboratorial	**PMG-137**	**B**	**25/06/2025**	0,00%	0,00%	0,1	20,5	-	0	80,2	-0,68	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Conjunto Laboratorial	**PMG-138**	**B**	**25/06/2025**	0,00%	0,00%	2,5	18,6	-	0	79,1	-0,47	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Conjunto Laboratorial	**PMG-139**	**A**	**25/06/2025**	0,00%	0,00%	0,1	20,1	-	0	79,4	-0,19	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Conjunto Laboratorial	**PMG-139**	**B**	**25/06/2025**	0,00%	0,00%	0,1	20,6	-	0	79,3	-0,1	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Conjunto Laboratorial	**PMG-140**	**A**	**25/06/2025**	0,00%	0,00%	0,1	20,5	-	0	79,4	-0,18	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Conjunto Laboratorial	**PMG-140**	**B**	**25/06/2025**	0,20%	0,20%	0,1	20,1	-	0	79,4	-0,24	-	0	**0**	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Conjunto Laboratorial	**PMG-141**	**B**	**25/06/2025**	0,00%	0,00%	0,2	20,6	-	0	79,5	-0,32	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Conjunto Laboratorial	**PMG-62**	**A**	**25/06/2025**	0,00%	0,00%	0,1	20,4	-	0	80,2	-0,35	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Conjunto Laboratorial	**PMG-62**	**B**	**25/06/2025**	0,00%	0,10%	0,1	20,3	-	0	79,5	-0,42	-	0	**0**	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-01**	**A**	**26/06/2025**	0,00%	0,00%	0,1	20,2	-	0	79,1	-0,35	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-01**	**B**	**26/06/2025**	0,00%	0,00%	0	20,4	-	0	79,4	-0,4	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-02**	**A**	**26/06/2025**	0,00%	0,00%	0,1	20,4	-	0	79,6	-0,52	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-02**	**B**	**26/06/2025**	0,00%	0,00%	0,1	20,6	-	0	79,2	-0,58	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-03**	**A**	**26/06/2025**	0,00%	0,00%	0	20,5	-	0	79,1	-0,72	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-03**	**B**	**26/06/2025**	0,00%	0,00%	1,2	18,5	-	0	80,2	-0,47	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-04**	**A**	**26/06/2025**	0,00%	0,00%	0,2	20,2	-	0	79,4	-0,56	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-04**	**B**	**26/06/2025**	0,00%	0,00%	0,1	20,1	-	0	79,3	-0,59	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-05**	**A**	**26/06/2025**	0,00%	0,00%	0,1	20,4	-	0	79,5	-0,51	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-05**	**B**	**26/06/2025**	0,00%	0,00%	0,1	20,6	-	0	79,3	-0,55	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-06**	**A**	**26/06/2025**	0,00%	0,00%	0,1	20,7	-	0	79,1	-0,52	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-06**	**B**	**26/06/2025**	0,00%	0,00%	0	20,7	-	0	79,2	-0,49	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-07**	**A**	**26/06/2025**	0,00%	0,00%	0,1	20,7	-	0	79,1	-0,49	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-07**	**B**	**26/06/2025**	0,00%	0,00%	0	20,6	-	0	79,4	-0,58	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-08**	**A**	**26/06/2025**	0,00%	0,00%	0,1	20,4	-	0	79,6	-0,42	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-08**	**B**	**26/06/2025**	0,00%	0,00%	3,9	15,1	-	0	80,2	-0,32	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-09**	**A**	**26/06/2025**	0,00%	0,00%	0,1	20,1	-	0	79,2	-0,44	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-09**	**B**	**26/06/2025**	0,00%	0,00%	6,5	12,9	-	0	80,3	-0,32	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-10**	**A**	**26/06/2025**	0,00%	0,00%	0,4	20,1	-	0	79,4	-0,35	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-10**	**B**	**26/06/2025**	0,00%	0,00%	1,5	18,9	-	0	79,9	-0,42	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-84**	**A**	**26/06/2025**	0,00%	0,00%	0,2	20,1	-	0	79,7	-0,35	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-84**	**B**	**26/06/2025**	0,00%	0,00%	2,9	18,5	-	0	79,5	-0,36	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-85**	**A**	**26/06/2025**	0,00%	0,00%	0,5	19,6	-	0	79,6	-0,35	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-85**	**B**	**26/06/2025**	0,00%	0,00%	1,4	19,2	-	0	79,2	-0,52	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-86**	**A**	**26/06/2025**	0,00%	0,00%	0,5	20	-	0	79,3	-0,32	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-86**	**B**	**26/06/2025**	0,00%	0,00%	0,8	19,9	-	0	79,5	-0,34	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-87**	**A**	**26/06/2025**	0,00%	0,00%	2,2	16,8	-	0	80,8	-0,29	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-87**	**B**	**26/06/2025**	0,00%	0,00%	0,9	19,2	-	0	79,6	-0,27	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-152**	**A**	**26/06/2025**	0,00%	0,00%	0,3	19,7	-	0	79,4	-0,36	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-152**	**B**	**26/06/2025**	0,00%	0,00%	4,9	14,2	-	0	79,8	-0,32	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol,)	Pico CH4 (%Vol,)	C02 (%Vol,)	O2 (%Vol,)	CO (ppm)	H_2S (ppm)	BAL (%Vol,)	Pressão (mbar)	OBS ,	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-153**	**B**	**26/06/2025**	0,00%	0,00%	0,1	20,4	-	0	79,1	-0,34	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-154**	**B**	**26/06/2025**	0,00%	0,00%	0	20,5	-	0	79	-0,51	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-155**	**B**	**26/06/2025**	0,00%	0,00%	1,7	18,5	-	0	79,6	-0,39	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-156**	**B**	**26/06/2025**	0,00%	0,00%	0,1	20,4	-	0	79,1	-0,48	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-157**	**B**	**26/06/2025**	0,00%	0,00%	0,1	20,6	-	0	79,3	-0,57	-	0	0	CO não medido, Aparelho alugado com defeito no sensor de CO.

ANEXO 4

TABELAS DE MEDIÇÕES QUINZENAIS NA INFRAESTRUTURA

PONTOS DE INFRAESTRUTURA

Edifício	Tipo	Ponto	Semana	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	Observação
I-5 Auditórios	Espaço c/ pouca circulação de ar	1	07/04/2025	0	0	
I-5 Auditórios	Espaço c/ pouca circulação de ar	2	07/04/2025	0	0	
I-3 Biblioteca	Espaço c/ pouca circulação de ar	3	07/04/2025	0	0	
Enfermaria	Espaço c/ pouca circulação de ar	4	10/04/2025	0	0	
Enfermaria	Espaço c/ pouca circulação de ar	5	10/04/2025	0	0	
Caixa d'água	Espaço c/ pouca circulação de ar	6	10/04/2025	0	0	
Edifício I-4	Espaço c/ pouca circulação de ar	7	09/04/2025	0	0	
Edifício I-4	Espaço c/ pouca circulação de ar	8	09/04/2025	0	0	
Casa de Máquinas	Espaço c/ pouca circulação de ar	9	10/04/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	1	08/04/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	2	08/04/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	3	08/04/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	4	08/04/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	5	08/04/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	6	08/04/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	7	08/04/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	8	08/04/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	9	08/04/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	12	08/04/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	13	08/04/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	14	08/04/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	15	08/04/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	16	08/04/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	17	08/04/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	18	08/04/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	19	08/04/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	20	08/04/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	21	08/04/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	22	08/04/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	23	08/04/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	24	08/04/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	25	08/04/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	26	08/04/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	27	08/04/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	28	08/04/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	30	08/04/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	31	08/04/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	32	08/04/2025	0	0	
I-5 Auditórios	Caixa de passagem	72	07/04/2025	0	0	
I-5 Auditórios	Caixa de passagem	73	07/04/2025	0	0	
I-5 Auditórios	Caixa de passagem	74	07/04/2025	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	159	07/04/2025	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	160	07/04/2025	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	162	07/04/2025	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	164	07/04/2025	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	165	07/04/2025	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	171	07/04/2025	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	174	07/04/2025	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	176	07/04/2025	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	177	07/04/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Caixa de passagem	57	07/04/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Caixa de passagem	58	07/04/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Caixa de passagem	59	07/04/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Caixa de passagem	60	07/04/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Caixa de passagem	67	07/04/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	139	07/04/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	140	07/04/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	141	07/04/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	142	07/04/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	143	07/04/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	144	07/04/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	145	07/04/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	146	07/04/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	147	07/04/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	148	07/04/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	149	07/04/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	150	07/04/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	151	07/04/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	95	09/04/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	97	09/04/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	99	09/04/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	106	09/04/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	96	09/04/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	104	09/04/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	307	09/04/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	122	09/04/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	111	09/04/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	117	09/04/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	100	09/04/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	101	09/04/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	105	09/04/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	91	09/04/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	102	09/04/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	88	09/04/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	108	09/04/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	107	09/04/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	94	09/04/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	92	09/04/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	90	09/04/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	89	09/04/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	87	09/04/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	123	09/04/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	121	09/04/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	120	09/04/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	119	09/04/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	114	09/04/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	113	09/04/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	112	09/04/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	109	09/04/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	110	09/04/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	13	09/04/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	15	09/04/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	16	09/04/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	18	09/04/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	21	09/04/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	24	09/04/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	28	09/04/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	33	09/04/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	37	09/04/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	38	09/04/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	39	09/04/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	40	09/04/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	32	09/04/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	34	09/04/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	36	09/04/2025	0	0	

Edifício	Tipo	Ponto	Semana	PID	%LEL	Observação
Conjunto Laboratorial	Ralo	37	09/04/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	38	09/04/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	40	09/04/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	41	09/04/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	42	09/04/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	43	09/04/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	44	09/04/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	45	09/04/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	46	09/04/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	47	09/04/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	48	09/04/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	49	09/04/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	50	09/04/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	53	09/04/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	54	09/04/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	55	09/04/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	56	09/04/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	57	09/04/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	58	09/04/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	60	09/04/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	61	09/04/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	62	09/04/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	63	09/04/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	64	09/04/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	65	09/04/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	66	09/04/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	67	09/04/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	69	09/04/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	70	09/04/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	71	09/04/2025	0	0	
Conjunto Didádico	Ralo	74	08/04/2025	0	0	
Conjunto Didádico	Ralo	75	08/04/2025	0	0	
Conjunto Didádico	Ralo	76	08/04/2025	0	0	
Conjunto Didádico	Ralo	77	08/04/2025	0	0	
Conjunto Didádico	Ralo	78	08/04/2025	0	0	
Conjunto Didádico	Ralo	79	08/04/2025	0	0	
Conjunto Didádico	Ralo	80	08/04/2025	0	0	
Conjunto Didádico	Ralo	81	08/04/2025	0	0	
Conjunto Didádico	Ralo	82	08/04/2025	0	0	
Conjunto Didádico	Ralo	83	08/04/2025	0	0	
Conjunto Didádico	Ralo	84	08/04/2025	0	0	
Conjunto Didádico	Ralo	85	08/04/2025	0	0	
Conjunto Didádico	Ralo	86	08/04/2025	0	0	
Enfermaria	Caixa de passagem	53	10/04/2025	0	0	
Enfermaria	Caixa de passagem	55	10/04/2025	0	0	
Enfermaria	Ralo	124	10/04/2025	0	0	
Enfermaria	Ralo	125	10/04/2025	0	0	
Enfermaria	Ralo	126	10/04/2025	0	0	
Enfermaria	Ralo	127	10/04/2025	0	0	
CAT 1	Ralo	136	10/04/2025	0	0	
CAT 1	Ralo	137	10/04/2025	0	0	
CAT 1	Ralo	138	10/04/2025	0	0	
CAT 2	Ralo	132	10/04/2025	0	0	
CAT 2	Ralo	133	10/04/2025	0	0	
CAT 2	Ralo	134	10/04/2025	0	0	
CAT 2	Ralo	135	10/04/2025	0	0	
Portaria 3	Ralo	186	07/04/2025	0	0	
Portaria 3	Ralo	187	07/04/2025	0	0	
Base Guarda Universitária	Ralo	188	10/04/2025	0	0	
Base Guarda Universitária	Ralo	189	10/04/2025	0	0	
Base Guarda Universitária	Ralo	190	10/04/2025	0	0	
Base Guarda Universitária	Ralo	191	10/04/2025	0	0	
Base Guarda Universitária	Ralo	192	10/04/2025	0	0	
Base Guarda Universitária	Ralo	193	10/04/2025	0	0	
Base Guarda Universitária	Ralo	194	10/04/2025	0	0	
I-5 Auditórios	Espaço c/ pouca circulação de ar	1	22/04/2025	0	0	
I-5 Auditórios	Espaço c/ pouca circulação de ar	2	22/04/2025	0	0	
I-3 Biblioteca	Espaço c/ pouca circulação de ar	3	22/04/2025	0	0	
Enfermaria	Espaço c/ pouca circulação de ar	4	25/04/2025	0	0	
Enfermaria	Espaço c/ pouca circulação de ar	5	25/04/2025	0	0	
Caixa d'água	Espaço c/ pouca circulação de ar	6	25/04/2025	0	0	
Edifício I-4	Espaço c/ pouca circulação de ar	7	24/04/2025	0	0	
Edifício I-4	Espaço c/ pouca circulação de ar	8	24/04/2025	0	0	
Casa de Máquinas	Espaço c/ pouca circulação de ar	9	25/04/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	1	23/04/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	2	23/04/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	3	23/04/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	4	23/04/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	5	23/04/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	6	23/04/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	7	23/04/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	8	23/04/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	9	23/04/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	12	23/04/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	13	23/04/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	14	23/04/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	15	23/04/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	16	23/04/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	17	23/04/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	18	23/04/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	19	23/04/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	20	23/04/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	21	23/04/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	22	23/04/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	23	23/04/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	24	23/04/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	25	23/04/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	26	23/04/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	27	23/04/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	28	23/04/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	30	23/04/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	31	23/04/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	32	23/04/2025	0	0	
I-5 Auditórios	Caixa de passagem	72	22/04/2025	0	0	
I-5 Auditórios	Caixa de passagem	73	22/04/2025	0	0	
I-5 Auditórios	Caixa de passagem	74	22/04/2025	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	159	22/04/2025	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	160	22/04/2025	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	162	22/04/2025	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	164	22/04/2025	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	165	22/04/2025	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	171	22/04/2025	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	174	22/04/2025	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	176	22/04/2025	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	177	22/04/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Caixa de passagem	57	22/04/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Caixa de passagem	58	22/04/2025	0	0	

Edifício	Tipo	Ponto	Semana	PID	%LEL	Observação
I-3 ADM/Biblioteca	Caixa de passagem	59	22/04/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Caixa de passagem	60	22/04/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Caixa de passagem	67	22/04/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	139	22/04/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	140	22/04/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	141	22/04/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	142	22/04/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	143	22/04/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	144	22/04/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	145	22/04/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	146	22/04/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	147	22/04/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	148	22/04/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	149	22/04/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	150	22/04/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	151	22/04/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	95	24/04/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	97	24/04/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	99	24/04/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	106	24/04/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	96	24/04/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	104	24/04/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	307	24/04/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	122	24/04/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	111	24/04/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	117	24/04/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	100	24/04/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	101	24/04/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	105	24/04/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	91	24/04/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	102	24/04/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	88	24/04/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	108	24/04/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	107	24/04/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	94	24/04/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	92	24/04/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	90	24/04/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	89	24/04/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	87	24/04/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	123	24/04/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	121	24/04/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	120	24/04/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	119	24/04/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	114	24/04/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	113	24/04/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	112	24/04/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	109	24/04/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	110	24/04/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	13	24/04/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	15	24/04/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	16	24/04/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	18	24/04/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	21	24/04/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	24	24/04/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	28	24/04/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	33	24/04/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	37	24/04/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	38	24/04/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	39	24/04/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	40	24/04/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	32	24/04/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	34	24/04/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	36	24/04/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	37	24/04/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	38	24/04/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	40	24/04/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	41	24/04/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	42	24/04/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	43	24/04/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	44	24/04/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	45	24/04/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	46	24/04/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	47	24/04/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	48	24/04/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	49	24/04/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	50	24/04/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	53	24/04/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	54	24/04/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	55	24/04/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	56	24/04/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	57	24/04/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	58	24/04/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	60	24/04/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	61	24/04/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	62	24/04/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	63	24/04/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	64	24/04/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	65	24/04/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	66	24/04/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	67	24/04/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	69	24/04/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	70	24/04/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	71	24/04/2025	0	0	
Conjunto Didádico	Ralo	74	23/04/2025	0	0	
Conjunto Didádico	Ralo	75	23/04/2025	0	0	
Conjunto Didádico	Ralo	76	23/04/2025	0	0	
Conjunto Didádico	Ralo	77	23/04/2025	0	0	
Conjunto Didádico	Ralo	78	23/04/2025	0	0	
Conjunto Didádico	Ralo	79	23/04/2025	0	0	
Conjunto Didádico	Ralo	80	23/04/2025	0	0	
Conjunto Didádico	Ralo	81	23/04/2025	0	0	
Conjunto Didádico	Ralo	82	23/04/2025	0	0	
Conjunto Didádico	Ralo	83	23/04/2025	0	0	
Conjunto Didádico	Ralo	84	23/04/2025	0	0	
Conjunto Didádico	Ralo	85	23/04/2025	0	0	
Conjunto Didádico	Ralo	86	23/04/2025	0	0	
Enfermaria	Caixa de passagem	53	25/04/2025	0	0	
Enfermaria	Caixa de passagem	55	25/04/2025	0	0	
Enfermaria	Ralo	124	25/04/2025	0	0	
Enfermaria	Ralo	125	25/04/2025	0	0	
Enfermaria	Ralo	126	25/04/2025	0	0	
Enfermaria	Ralo	127	25/04/2025	0	0	
CAT 1	Ralo	136	23/04/2025	0	0	
CAT 1	Ralo	137	23/04/2025	0	0	
CAT 1	Ralo	138	23/04/2025	0	0	
CAT 2	Ralo	132	25/04/2025	0	0	
CAT 2	Ralo	133	25/04/2025	0	0	

Edifício	Tipo	Ponto	Semana	PID	%LEL	Observação
CAT 2	Ralo	134	25/04/2025	0	0	
CAT 2	Ralo	135	25/04/2025	0	0	
Portaria 3	Ralo	186	22/04/2025	0	0	
Portaria 3	Ralo	187	22/04/2025	0	0	
Base Guarda Universitária	Ralo	188	25/04/2025	0	0	
Base Guarda Universitária	Ralo	189	25/04/2025	0	0	
Base Guarda Universitária	Ralo	190	25/04/2025	0	0	
Base Guarda Universitária	Ralo	191	25/04/2025	0	0	
Base Guarda Universitária	Ralo	192	25/04/2025	0	0	
Base Guarda Universitária	Ralo	193	25/04/2025	0	0	
Base Guarda Universitária	Ralo	194	25/04/2025	0	0	
I-5 Auditórios	Espaço c/ pouca circulação de ar	1	05/05/2025	0	0	
I-5 Auditórios	Espaço c/ pouca circulação de ar	2	05/05/2025	0	0	
I-3 Biblioteca	Espaço c/ pouca circulação de ar	3	05/05/2025	0	0	
Enfermaria	Espaço c/ pouca circulação de ar	4	08/05/2025	0	0	
Enfermaria	Espaço c/ pouca circulação de ar	5	08/05/2025	0	0	
Caixa d'água	Espaço c/ pouca circulação de ar	6	09/05/2025	0	0	
Edifício I-4	Espaço c/ pouca circulação de ar	7	07/05/2025	0	0	
Edifício I-4	Espaço c/ pouca circulação de ar	8	07/05/2025	0	0	
Casa de Máquinas	Espaço c/ pouca circulação de ar	9	09/05/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	1	09/05/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	2	09/05/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	3	09/05/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	4	09/05/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	5	09/05/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	6	09/05/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	7	09/05/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	8	09/05/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	9	09/05/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	12	09/05/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	13	09/05/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	14	09/05/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	15	09/05/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	16	09/05/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	17	09/05/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	18	09/05/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	19	09/05/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	20	09/05/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	21	09/05/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	22	09/05/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	23	09/05/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	24	09/05/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	25	09/05/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	26	09/05/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	27	09/05/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	28	09/05/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	30	09/05/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	31	09/05/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	32	09/05/2025	0	0	
I-5 Auditórios	Caixa de passagem	72	05/05/2025	0	0	
I-5 Auditórios	Caixa de passagem	73	05/05/2025	0	0	
I-5 Auditórios	Caixa de passagem	74	05/05/2025	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	159	05/05/2025	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	160	05/05/2025	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	162	05/05/2025	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	164	05/05/2025	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	165	05/05/2025	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	171	05/05/2025	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	174	05/05/2025	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	176	05/05/2025	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	177	05/05/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Caixa de passagem	57	05/05/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Caixa de passagem	58	05/05/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Caixa de passagem	59	05/05/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Caixa de passagem	60	05/05/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Caixa de passagem	67	05/05/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	139	05/05/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	140	05/05/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	141	05/05/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	142	05/05/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	143	05/05/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	144	05/05/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	145	05/05/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	146	05/05/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	147	05/05/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	148	05/05/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	149	05/05/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	150	05/05/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	151	05/05/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	95	07/05/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	97	07/05/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	99	07/05/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	106	07/05/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	96	07/05/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	104	07/05/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	307	07/05/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	122	07/05/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	111	07/05/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	117	07/05/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	100	07/05/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	101	07/05/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	105	07/05/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	91	07/05/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	102	07/05/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	88	07/05/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	108	07/05/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	107	07/05/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	94	07/05/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	92	07/05/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	90	07/05/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	89	07/05/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	87	07/05/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	123	07/05/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	121	07/05/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	120	07/05/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	119	07/05/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	114	07/05/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	113	07/05/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	112	07/05/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	109	07/05/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	110	07/05/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	13	07/05/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	15	07/05/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	16	07/05/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	18	07/05/2025	0	0	

Edifício	Tipo	Ponto	Semana	PID	%LEL	Observação
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	21	07/05/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	24	07/05/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	28	07/05/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	33	07/05/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	37	07/05/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	38	07/05/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	39	07/05/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	40	07/05/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	32	07/05/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	34	07/05/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	36	07/05/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	37	07/05/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	38	07/05/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	40	07/05/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	41	07/05/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	42	07/05/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	43	07/05/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	44	07/05/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	45	07/05/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	46	07/05/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	47	07/05/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	48	07/05/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	49	07/05/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	50	07/05/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	53	07/05/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	54	07/05/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	55	07/05/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	56	07/05/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	57	07/05/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	58	07/05/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	60	07/05/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	61	07/05/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	62	07/05/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	63	07/05/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	64	07/05/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	65	07/05/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	66	07/05/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	67	07/05/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	69	07/05/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	70	07/05/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	71	07/05/2025	0	0	
Conjunto Didádico	Ralo	74	06/05/2025	0	0	
Conjunto Didádico	Ralo	75	06/05/2025	0	0	
Conjunto Didádico	Ralo	76	06/05/2025	0	0	
Conjunto Didádico	Ralo	77	06/05/2025	0	0	
Conjunto Didádico	Ralo	78	06/05/2025	0	0	
Conjunto Didádico	Ralo	79	06/05/2025	0	0	
Conjunto Didádico	Ralo	80	06/05/2025	0	0	
Conjunto Didádico	Ralo	81	06/05/2025	0	0	
Conjunto Didádico	Ralo	82	06/05/2025	0	0	
Conjunto Didádico	Ralo	83	06/05/2025	0	0	
Conjunto Didádico	Ralo	84	06/05/2025	0	0	
Conjunto Didádico	Ralo	85	06/05/2025	0	0	
Conjunto Didádico	Ralo	86	06/05/2025	0	0	
Enfermaria	Caixa de passagem	53	08/05/2025	0	0	
Enfermaria	Caixa de passagem	55	08/05/2025	0	0	
Enfermaria	Ralo	124	08/05/2025	0	0	
Enfermaria	Ralo	125	08/05/2025	0	0	
Enfermaria	Ralo	126	08/05/2025	0	0	
Enfermaria	Ralo	127	08/05/2025	0	0	
CAT 1	Ralo	136	08/05/2025	0	0	
CAT 1	Ralo	137	08/05/2025	0	0	
CAT 1	Ralo	138	08/05/2025	0	0	
CAT 2	Ralo	132	08/05/2025	0	0	
CAT 2	Ralo	133	08/05/2025	0	0	
CAT 2	Ralo	134	08/05/2025	0	0	
CAT 2	Ralo	135	08/05/2025	0	0	
Portaria 3	Ralo	186	05/05/2025	0	0	
Portaria 3	Ralo	187	05/05/2025	0	0	
Base Guarda Universitária	Ralo	188	08/05/2025	0	0	
Base Guarda Universitária	Ralo	189	08/05/2025	0	0	
Base Guarda Universitária	Ralo	190	08/05/2025	0	0	
Base Guarda Universitária	Ralo	191	08/05/2025	0	0	
Base Guarda Universitária	Ralo	192	08/05/2025	0	0	
Base Guarda Universitária	Ralo	193	08/05/2025	0	0	
Base Guarda Universitária	Ralo	194	08/05/2025	0	0	
I-5 Auditórios	Espaço c/ pouca circulação de ar	1	19/05/2025	0	0	
I-5 Auditórios	Espaço c/ pouca circulação de ar	2	19/05/2025	0	0	
I-3 Biblioteca	Espaço c/ pouca circulação de ar	3	19/05/2025	0	0	
Enfermaria	Espaço c/ pouca circulação de ar	4	22/05/2025	0	0	
Enfermaria	Espaço c/ pouca circulação de ar	5	22/05/2025	0	0	
Caixa d'água	Espaço c/ pouca circulação de ar	6	23/05/2025	0	0	
Edifício I-4	Espaço c/ pouca circulação de ar	7	21/05/2025	0	0	
Edifício I-4	Espaço c/ pouca circulação de ar	8	21/05/2025	0	0	
Casa de Máquinas	Espaço c/ pouca circulação de ar	9	23/05/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	1	20/05/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	2	20/05/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	3	20/05/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	4	20/05/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	5	20/05/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	6	20/05/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	7	20/05/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	8	20/05/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	9	20/05/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	12	20/05/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	13	20/05/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	14	20/05/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	15	20/05/2025	0	0	

Edifício	Tipo	Ponto	Semana	PID	%LEL	Observação
Edifício I-1	**Ralo**	**16**	**20/05/2025**	0	0	
Edifício I-1	**Ralo**	**17**	**20/05/2025**	0	0	
Edifício I-1	**Ralo**	**18**	**20/05/2025**	0	0	
Edifício I-1	**Ralo**	**19**	**20/05/2025**	0	0	
Edifício I-1	**Ralo**	**20**	**20/05/2025**	0	0	
Edifício I-1	**Ralo**	**21**	**20/05/2025**	0	0	
Edifício I-1	**Ralo**	**22**	**20/05/2025**	0	0	
Edifício I-1	**Ralo**	**23**	**20/05/2025**	0	0	
Edifício I-1	**Ralo**	**24**	**20/05/2025**	0	0	
Edifício I-1	**Ralo**	**25**	**20/05/2025**	0	0	
Edifício I-1	**Ralo**	**26**	**20/05/2025**	0	0	
Edifício I-1	**Ralo**	**27**	**20/05/2025**	0	0	
Edifício I-1	**Ralo**	**28**	**20/05/2025**	0	0	
Edifício I-1	**Ralo**	**30**	**20/05/2025**	0	0	
Edifício I-1	**Ralo**	**31**	**20/05/2025**	0	0	
Edifício I-1	**Ralo**	**32**	**20/05/2025**	0	0	
I-5 Auditórios	**Caixa de passagem**	**72**	**19/05/2025**	0	0	
I-5 Auditórios	**Caixa de passagem**	**73**	**19/05/2025**	0	0	
I-5 Auditórios	**Caixa de passagem**	**74**	**19/05/2025**	0	0	
I-5 Auditórios	**Ralo**	**159**	**19/05/2025**	0	0	
I-5 Auditórios	**Ralo**	**160**	**19/05/2025**	0	0	
I-5 Auditórios	**Ralo**	**162**	**19/05/2025**	0	0	
I-5 Auditórios	**Ralo**	**164**	**19/05/2025**	0	0	
I-5 Auditórios	**Ralo**	**165**	**19/05/2025**	0	0	
I-5 Auditórios	**Ralo**	**171**	**19/05/2025**	0	0	
I-5 Auditórios	**Ralo**	**174**	**19/05/2025**	0	0	
I-5 Auditórios	**Ralo**	**176**	**19/05/2025**	0	0	
I-5 Auditórios	**Ralo**	**177**	**19/05/2025**	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	**Caixa de passagem**	**57**	**19/05/2025**	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	**Caixa de passagem**	**58**	**19/05/2025**	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	**Caixa de passagem**	**59**	**19/05/2025**	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	**Caixa de passagem**	**60**	**19/05/2025**	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	**Caixa de passagem**	**67**	**19/05/2025**	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	**Ralo**	**139**	**19/05/2025**	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	**Ralo**	**140**	**19/05/2025**	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	**Ralo**	**141**	**19/05/2025**	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	**Ralo**	**142**	**19/05/2025**	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	**Ralo**	**143**	**19/05/2025**	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	**Ralo**	**144**	**19/05/2025**	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	**Ralo**	**145**	**19/05/2025**	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	**Ralo**	**146**	**19/05/2025**	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	**Ralo**	**147**	**19/05/2025**	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	**Ralo**	**148**	**19/05/2025**	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	**Ralo**	**149**	**19/05/2025**	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	**Ralo**	**150**	**19/05/2025**	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	**Ralo**	**151**	**19/05/2025**	0	0	
Central de Serviços I-4	**Ralo**	**95**	**21/05/2025**	0	0	
Central de Serviços I-4	**Ralo**	**97**	**21/05/2025**	0	0	
Central de Serviços I-4	**Ralo**	**99**	**21/05/2025**	0	0	
Central de Serviços I-4	**Ralo**	**106**	**21/05/2025**	0	0	
Central de Serviços I-4	**Ralo**	**96**	**21/05/2025**	0	0	
Central de Serviços I-4	**Ralo**	**104**	**21/05/2025**	0	0	
Central de Serviços I-4	**Ralo**	**307**	**21/05/2025**	0	0	
Central de Serviços I-4	**Ralo**	**122**	**21/05/2025**	0	0	
Central de Serviços I-4	**Ralo**	**111**	**21/05/2025**	0	0	
Central de Serviços I-4	**Ralo**	**117**	**21/05/2025**	0	0	
Central de Serviços I-4	**Ralo**	**100**	**21/05/2025**	0	0	
Central de Serviços I-4	**Ralo**	**101**	**21/05/2025**	0	0	
Central de Serviços I-4	**Ralo**	**105**	**21/05/2025**	0	0	
Central de Serviços I-4	**Ralo**	**91**	**21/05/2025**	0	0	
Central de Serviços I-4	**Ralo**	**102**	**21/05/2025**	0	0	
Central de Serviços I-4	**Ralo**	**88**	**21/05/2025**	0	0	
Central de Serviços I-4	**Ralo**	**108**	**21/05/2025**	0	0	
Central de Serviços I-4	**Ralo**	**107**	**21/05/2025**	0	0	
Central de Serviços I-4	**Ralo**	**94**	**21/05/2025**	0	0	
Central de Serviços I-4	**Ralo**	**92**	**21/05/2025**	0	0	
Central de Serviços I-4	**Ralo**	**90**	**21/05/2025**	0	0	
Central de Serviços I-4	**Ralo**	**89**	**21/05/2025**	0	0	
Central de Serviços I-4	**Ralo**	**87**	**21/05/2025**	0	0	
Central de Serviços I-4	**Ralo**	**123**	**21/05/2025**	0	0	
Central de Serviços I-4	**Ralo**	**121**	**21/05/2025**	0	0	
Central de Serviços I-4	**Ralo**	**120**	**21/05/2025**	0	0	
Central de Serviços I-4	**Ralo**	**119**	**21/05/2025**	0	0	
Central de Serviços I-4	**Ralo**	**114**	**21/05/2025**	0	0	
Central de Serviços I-4	**Ralo**	**113**	**21/05/2025**	0	0	
Central de Serviços I-4	**Ralo**	**112**	**21/05/2025**	0	0	
Central de Serviços I-4	**Ralo**	**109**	**21/05/2025**	0	0	
Central de Serviços I-4	**Ralo**	**110**	**21/05/2025**	0	0	
Conjunto Laboratorial	**Caixa de passagem**	**13**	**21/05/2025**	0	0	
Conjunto Laboratorial	**Caixa de passagem**	**15**	**21/05/2025**	0	0	
Conjunto Laboratorial	**Caixa de passagem**	**16**	**21/05/2025**	0	0	
Conjunto Laboratorial	**Caixa de passagem**	**18**	**21/05/2025**	0	0	
Conjunto Laboratorial	**Caixa de passagem**	**21**	**21/05/2025**	0	0	
Conjunto Laboratorial	**Caixa de passagem**	**24**	**21/05/2025**	0	0	
Conjunto Laboratorial	**Caixa de passagem**	**28**	**21/05/2025**	0	0	
Conjunto Laboratorial	**Caixa de passagem**	**33**	**21/05/2025**	0	0	
Conjunto Laboratorial	**Caixa de passagem**	**37**	**21/05/2025**	0	0	
Conjunto Laboratorial	**Caixa de passagem**	**38**	**21/05/2025**	0	0	
Conjunto Laboratorial	**Caixa de passagem**	**39**	**21/05/2025**	0	0	
Conjunto Laboratorial	**Caixa de passagem**	**40**	**21/05/2025**	0	0	
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**32**	**21/05/2025**	0	0	
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**34**	**21/05/2025**	0	0	
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**36**	**21/05/2025**	0	0	
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**37**	**21/05/2025**	0	0	
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**38**	**21/05/2025**	0	0	
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**40**	**21/05/2025**	0	0	
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**41**	**21/05/2025**	0	0	
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**42**	**21/05/2025**	0	0	

Edifício	Tipo	Ponto	Semana	PID	%LEL	Observação
Conjunto Laboratorial	Ralo	43	21/05/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	44	21/05/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	45	21/05/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	46	21/05/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	47	21/05/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	48	21/05/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	49	21/05/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	50	21/05/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	53	21/05/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	54	21/05/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	55	21/05/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	56	21/05/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	57	21/05/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	58	21/05/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	60	21/05/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	61	21/05/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	62	21/05/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	63	21/05/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	64	21/05/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	65	21/05/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	66	21/05/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	67	21/05/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	69	21/05/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	70	21/05/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	71	21/05/2025	0	0	
Conjunto Didádico	Ralo	74	20/05/2025	0	0	
Conjunto Didádico	Ralo	75	20/05/2025	0	0	
Conjunto Didádico	Ralo	76	20/05/2025	0	0	
Conjunto Didádico	Ralo	77	20/05/2025	0	0	
Conjunto Didádico	Ralo	78	20/05/2025	0	0	
Conjunto Didádico	Ralo	79	20/05/2025	0	0	
Conjunto Didádico	Ralo	80	20/05/2025	0	0	
Conjunto Didádico	Ralo	81	20/05/2025	0	0	
Conjunto Didádico	Ralo	82	20/05/2025	0	0	
Conjunto Didádico	Ralo	83	20/05/2025	0	0	
Conjunto Didádico	Ralo	84	20/05/2025	0	0	
Conjunto Didádico	Ralo	85	20/05/2025	0	0	
Conjunto Didádico	Ralo	86	20/05/2025	0	0	
Enfermaria	Caixa de passagem	53	22/05/2025	0	0	
Enfermaria	Caixa de passagem	55	22/05/2025	0	0	
Enfermaria	Ralo	124	22/05/2025	0	0	
Enfermaria	Ralo	125	22/05/2025	0	0	
Enfermaria	Ralo	126	22/05/2025	0	0	
Enfermaria	Ralo	127	22/05/2025	0	0	
CAT 1	Ralo	136	22/05/2025	0	0	
CAT 1	Ralo	137	22/05/2025	0	0	
CAT 1	Ralo	138	22/05/2025	0	0	
CAT 2	Ralo	132	23/05/2025	0	0	
CAT 2	Ralo	133	23/05/2025	0	0	
CAT 2	Ralo	134	23/05/2025	0	0	
CAT 2	Ralo	135	23/05/2025	0	0	
Portaria 3	Ralo	186	19/05/2025	0	0	
Portaria 3	Ralo	187	19/05/2025	0	0	
Base Guarda Universitária	Ralo	188	22/05/2025	0	0	
Base Guarda Universitária	Ralo	189	22/05/2025	0	0	
Base Guarda Universitária	Ralo	190	22/05/2025	0	0	
Base Guarda Universitária	Ralo	191	22/05/2025	0	0	
Base Guarda Universitária	Ralo	192	22/05/2025	0	0	
Base Guarda Universitária	Ralo	193	22/05/2025	0	0	
Base Guarda Universitária	Ralo	194	22/05/2025	0	0	
I-5 Auditórios	Espaço c/ pouca circulação de ar	1	02/06/2025	0	0	
I-5 Auditórios	Espaço c/ pouca circulação de ar	2	02/06/2025	0	0	
I-3 Biblioteca	Espaço c/ pouca circulação de ar	3	02/06/2025	0	0	
Enfermaria	Espaço c/ pouca circulação de ar	4	05/06/2025	0	0	
Enfermaria	Espaço c/ pouca circulação de ar	5	05/06/2025	0	0	
Caixa d'água	Espaço c/ pouca circulação de ar	6	06/06/2025	0	0	
Edifício I-4	Espaço c/ pouca circulação de ar	7	04/06/2025	0	0	
Edifício I-4	Espaço c/ pouca circulação de ar	8	04/06/2025	0	0	
Casa de Máquinas	Espaço c/ pouca circulação de ar	9	06/06/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	1	03/06/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	2	03/06/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	3	03/06/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	4	03/06/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	5	03/06/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	6	03/06/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	7	03/06/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	8	03/06/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	9	03/06/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	12	03/06/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	13	03/06/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	14	03/06/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	15	03/06/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	16	03/06/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	17	03/06/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	18	03/06/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	19	03/06/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	20	03/06/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	21	03/06/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	22	03/06/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	23	03/06/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	24	03/06/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	25	03/06/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	26	03/06/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	27	03/06/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	28	03/06/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	30	03/06/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	31	03/06/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	32	03/06/2025	0	0	

Edifício	Tipo	Ponto	Semana	PID	%LEL	Observação
I-5 Auditórios	Caixa de passagem	72	02/06/2025	0	0	
I-5 Auditórios	Caixa de passagem	73	02/06/2025	0	0	
I-5 Auditórios	Caixa de passagem	74	02/06/2025	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	159	02/06/2025	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	160	02/06/2025	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	162	02/06/2025	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	164	02/06/2025	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	165	02/06/2025	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	171	02/06/2025	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	174	02/06/2025	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	176	02/06/2025	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	177	02/06/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Caixa de passagem	57	02/06/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Caixa de passagem	58	02/06/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Caixa de passagem	59	02/06/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Caixa de passagem	60	02/06/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Caixa de passagem	67	02/06/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	139	02/06/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	140	02/06/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	141	02/06/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	142	02/06/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	143	02/06/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	144	02/06/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	145	02/06/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	146	02/06/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	147	02/06/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	148	02/06/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	149	02/06/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	150	02/06/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	151	02/06/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	95	04/06/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	97	04/06/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	99	04/06/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	106	04/06/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	96	04/06/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	104	04/06/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	307	04/06/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	122	04/06/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	111	04/06/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	117	04/06/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	100	04/06/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	101	04/06/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	105	04/06/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	91	04/06/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	102	04/06/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	88	04/06/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	108	04/06/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	107	04/06/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	94	04/06/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	92	04/06/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	90	04/06/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	89	04/06/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	87	04/06/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	123	04/06/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	121	04/06/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	120	04/06/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	119	04/06/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	114	04/06/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	113	04/06/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	112	04/06/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	109	04/06/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	110	04/06/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	13	04/06/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	15	04/06/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	16	04/06/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	18	04/06/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	21	04/06/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	24	04/06/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	28	04/06/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	33	04/06/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	37	04/06/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	38	04/06/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	39	04/06/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	40	04/06/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	32	04/06/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	34	04/06/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	36	04/06/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	37	04/06/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	38	04/06/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	40	04/06/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	41	04/06/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	42	04/06/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	43	04/06/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	44	04/06/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	45	04/06/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	46	04/06/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	47	04/06/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	48	04/06/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	49	04/06/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	50	04/06/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	53	04/06/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	54	04/06/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	55	04/06/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	56	04/06/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	57	04/06/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	58	04/06/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	60	04/06/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	61	04/06/2025	0	0	

Edifício	Tipo	Ponto	Semana	PID	%LEL	Observação
Conjunto Laboratorial	Ralo	62	04/06/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	63	04/06/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	64	04/06/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	65	04/06/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	66	04/06/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	67	04/06/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	69	04/06/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	70	04/06/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	71	04/06/2025	0	0	
Conjunto Didádico	Ralo	74	03/06/2025	0	0	
Conjunto Didádico	Ralo	75	03/06/2025	0	0	
Conjunto Didádico	Ralo	76	03/06/2025	0	0	
Conjunto Didádico	Ralo	77	03/06/2025	0	0	
Conjunto Didádico	Ralo	78	03/06/2025	0	0	
Conjunto Didádico	Ralo	79	03/06/2025	0	0	
Conjunto Didádico	Ralo	80	03/06/2025	0	0	
Conjunto Didádico	Ralo	81	03/06/2025	0	0	
Conjunto Didádico	Ralo	82	03/06/2025	0	0	
Conjunto Didádico	Ralo	83	03/06/2025	0	0	
Conjunto Didádico	Ralo	84	03/06/2025	0	0	
Conjunto Didádico	Ralo	85	03/06/2025	0	0	
Conjunto Didádico	Ralo	86	03/06/2025	0	0	
Enfermaria	Caixa de passagem	53	05/06/2025	0	0	
Enfermaria	Caixa de passagem	55	05/06/2025	0	0	
Enfermaria	Ralo	124	05/06/2025	0	0	
Enfermaria	Ralo	125	05/06/2025	0	0	
Enfermaria	Ralo	126	05/06/2025	0	0	
Enfermaria	Ralo	127	05/06/2025	0	0	
CAT 1	Ralo	136	05/06/2025	0	0	
CAT 1	Ralo	137	05/06/2025	0	0	
CAT 1	Ralo	138	05/06/2025	0	0	
CAT 2	Ralo	132	06/06/2025	0	0	
CAT 2	Ralo	133	06/06/2025	0	0	
CAT 2	Ralo	134	06/06/2025	0	0	
CAT 2	Ralo	135	06/06/2025	0	0	
Portaria 3	Ralo	186	02/06/2025	0	0	
Portaria 3	Ralo	187	02/06/2025	0	0	
Base Guarda Universitária	Ralo	188	05/06/2025	0	0	
Base Guarda Universitária	Ralo	189	05/06/2025	0	0	
Base Guarda Universitária	Ralo	190	05/06/2025	0	0	
Base Guarda Universitária	Ralo	191	05/06/2025	0	0	
Base Guarda Universitária	Ralo	192	05/06/2025	0	0	
Base Guarda Universitária	Ralo	193	05/06/2025	0	0	
Base Guarda Universitária	Ralo	194	05/06/2025	0	0	
I-5 Auditórios	Espaço c/ pouca circulação de ar	1	18/06/2025	0	0	
I-5 Auditórios	Espaço c/ pouca circulação de ar	2	18/06/2025	0	0	
I-3 Biblioteca	Espaço c/ pouca circulação de ar	3	16/06/2025	0	0	
Enfermaria	Espaço c/ pouca circulação de ar	4	17/06/2025	0	0	
Enfermaria	Espaço c/ pouca circulação de ar	5	17/06/2025	0	0	
Caixa d'água	Espaço c/ pouca circulação de ar	6	16/06/2025	0	0	
Edifício I-4	Espaço c/ pouca circulação de ar	7	16/06/2025	0	0	
Edifício I-4	Espaço c/ pouca circulação de ar	8	16/06/2025	0	0	
Casa de Máquinas	Espaço c/ pouca circulação de ar	9	16/06/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	1	16/06/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	2	16/06/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	3	16/06/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	4	16/06/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	5	16/06/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	6	16/06/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	7	16/06/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	8	16/06/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	9	16/06/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	12	16/06/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	13	16/06/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	14	16/06/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	15	16/06/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	16	16/06/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	17	16/06/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	18	16/06/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	19	16/06/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	20	16/06/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	21	16/06/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	22	16/06/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	23	16/06/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	24	16/06/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	25	16/06/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	26	16/06/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	27	16/06/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	28	16/06/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	30	16/06/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	31	16/06/2025	0	0	
Edifício I-1	Ralo	32	16/06/2025	0	0	
I-5 Auditórios	Caixa de passagem	72	16/06/2025	0	0	
I-5 Auditórios	Caixa de passagem	73	16/06/2025	0	0	
I-5 Auditórios	Caixa de passagem	74	16/06/2025	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	159	16/06/2025	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	160	16/06/2025	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	162	16/06/2025	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	164	16/06/2025	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	165	16/06/2025	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	171	16/06/2025	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	174	16/06/2025	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	176	16/06/2025	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	177	16/06/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Caixa de passagem	57	16/06/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Caixa de passagem	58	16/06/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Caixa de passagem	59	16/06/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Caixa de passagem	60	16/06/2025	0	0	

Edifício	Tipo	Ponto	Semana	PID	%LEL	Observação
I-3 ADM/Biblioteca	Caixa de passagem	67	16/06/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	139	16/06/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	140	16/06/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	141	16/06/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	142	16/06/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	143	16/06/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	144	16/06/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	145	16/06/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	146	16/06/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	147	16/06/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	148	16/06/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	149	16/06/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	150	16/06/2025	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	151	16/06/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	95	16/06/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	97	16/06/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	99	16/06/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	106	16/06/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	96	16/06/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	104	16/06/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	307	16/06/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	122	16/06/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	111	16/06/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	117	16/06/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	100	16/06/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	101	16/06/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	105	16/06/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	91	16/06/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	102	16/06/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	88	16/06/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	108	16/06/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	107	16/06/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	94	16/06/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	92	16/06/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	90	16/06/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	89	16/06/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	87	16/06/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	123	16/06/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	121	16/06/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	120	16/06/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	119	16/06/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	114	16/06/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	113	16/06/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	112	16/06/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	109	16/06/2025	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	110	16/06/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	13	18/06/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	15	18/06/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	16	18/06/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	18	18/06/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	21	18/06/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	24	18/06/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	28	18/06/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	33	18/06/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	37	18/06/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	38	18/06/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	39	18/06/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	40	18/06/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	32	18/06/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	34	18/06/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	36	18/06/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	37	18/06/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	38	18/06/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	40	18/06/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	41	18/06/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	42	18/06/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	43	18/06/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	44	18/06/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	45	18/06/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	46	18/06/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	47	18/06/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	48	18/06/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	49	18/06/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	50	18/06/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	53	18/06/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	54	18/06/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	55	18/06/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	56	18/06/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	57	18/06/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	58	18/06/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	60	18/06/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	61	18/06/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	62	18/06/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	63	18/06/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	64	18/06/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	65	18/06/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	66	18/06/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	67	18/06/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	69	18/06/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	70	18/06/2025	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	71	18/06/2025	0	0	
Conjunto Didádico	Ralo	74	16/06/2025	0	0	
Conjunto Didádico	Ralo	75	16/06/2025	0	0	
Conjunto Didádico	Ralo	76	16/06/2025	0	0	
Conjunto Didádico	Ralo	77	16/06/2025	0	0	
Conjunto Didádico	Ralo	78	16/06/2025	0	0	
Conjunto Didádico	Ralo	79	16/06/2025	0	0	
Conjunto Didádico	Ralo	80	16/06/2025	0	0	


Edifício	Tipo	Ponto	Semana	PID	%LEL	Observação
Conjunto Didádico	**Ralo**	**81**	**16/06/2025**	0	0	
Conjunto Didádico	**Ralo**	**82**	**16/06/2025**	0	0	
Conjunto Didádico	**Ralo**	**83**	**16/06/2025**	0	0	
Conjunto Didádico	**Ralo**	**84**	**16/06/2025**	0	0	
Conjunto Didádico	**Ralo**	**85**	**16/06/2025**	0	0	
Conjunto Didádico	**Ralo**	**86**	**16/06/2025**	0	0	
Enfermaria	**Caixa de passagem**	**53**	**17/06/2025**	0	0	
Enfermaria	**Caixa de passagem**	**55**	**17/06/2025**	0	0	
Enfermaria	**Ralo**	**124**	**17/06/2025**	0	0	
Enfermaria	**Ralo**	**125**	**17/06/2025**	0	0	
Enfermaria	**Ralo**	**126**	**17/06/2025**	0	0	
Enfermaria	**Ralo**	**127**	**17/06/2025**	0	0	
CAT 1	**Ralo**	**136**	**16/06/2025**	0	0	
CAT 1	**Ralo**	**137**	**16/06/2025**	0	0	
CAT 1	**Ralo**	**138**	**16/06/2025**	0	0	
CAT 2	**Ralo**	**132**	**16/06/2025**	0	0	
CAT 2	**Ralo**	**133**	**16/06/2025**	0	0	
CAT 2	**Ralo**	**134**	**16/06/2025**	0	0	
CAT 2	**Ralo**	**135**	**16/06/2025**	0	0	
Portaria 3	**Ralo**	**186**	**16/06/2025**	0	0	
Portaria 3	**Ralo**	**187**	**16/06/2025**	0	0	
Base Guarda Universitária	**Ralo**	**188**	**16/06/2025**	0	0	
Base Guarda Universitária	**Ralo**	**189**	**16/06/2025**	0	0	
Base Guarda Universitária	**Ralo**	**190**	**16/06/2025**	0	0	
Base Guarda Universitária	**Ralo**	**191**	**16/06/2025**	0	0	
Base Guarda Universitária	**Ralo**	**192**	**16/06/2025**	0	0	
Base Guarda Universitária	**Ralo**	**193**	**16/06/2025**	0	0	
Base Guarda Universitária	**Ralo**	**194**	**16/06/2025**	0	0	
I-5 Auditórios	**Espaço c/ pouca circulação de ar**	**1**	**30/06/2025**	0	0	
I-5 Auditórios	**Espaço c/ pouca circulação de ar**	**2**	**30/06/2025**	0	0	
I-3 Biblioteca	**Espaço c/ pouca circulação de ar**	**3**	**30/06/2025**	0	0	


ANEXO 5

EVOLUÇÃO DAS CONCENTRAÇÕES DE METANO X PRESSÃO (ABRIL/2014 A MARÇO/2025)

Portaria P3		
Quantidade total de Poços:	2 Trios	
Período de Medição:	**08 de Abril de 2014 a 30 de junho de 2025**	
Pares com concentração igual ou maior que 1%Vol:	2 Trios	PMG-119
		PMG-120


Observações: As concentrações de Metano apresentaram-se abaixo do Limite inferior de explosividade e somente nas porções profundas, não alcançando os poços subslab, com exceção de um pico de metano no PMG-119C em agosto/21 que atingiu 20%Vol, e de uma concentração de Metano registrada no PMG-120A, em setembro/22, porém abaixo da faixa de inflamabilidade.

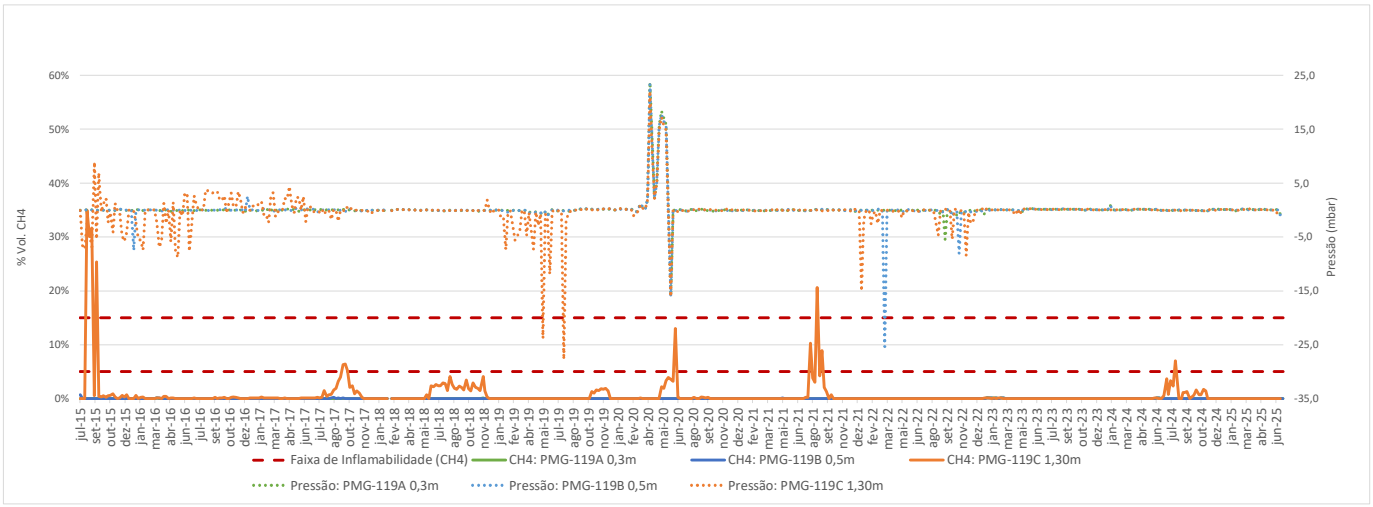


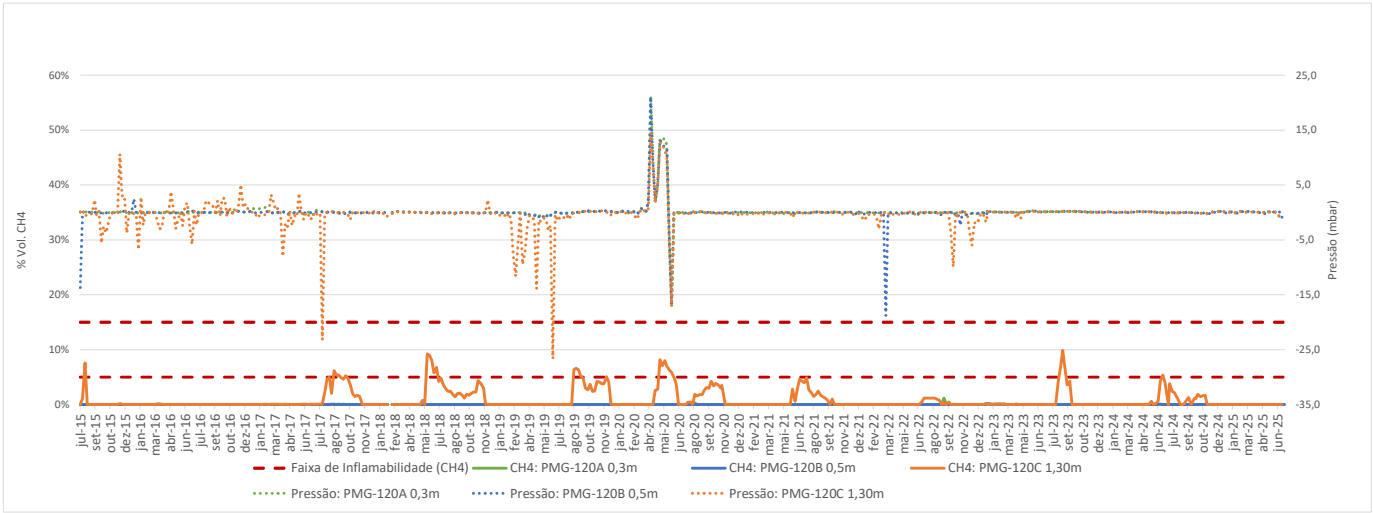

Transportes		
Quantidade total de Poços:	4 Pares	
Período de Medição:	**15 de julho de 2015 a 30 de junho de 2025**	
Pares com concentração igual ou maior que 1%Vol:	2 Pares	PMG-122
		PMG-123


Observações: As concentrações de Metano apresentaram-se abaixo do Limite inferior de explosividade e somente nas porções profundas, não alcançando os poços subslab (poços imediatamente abaixo das edificações).

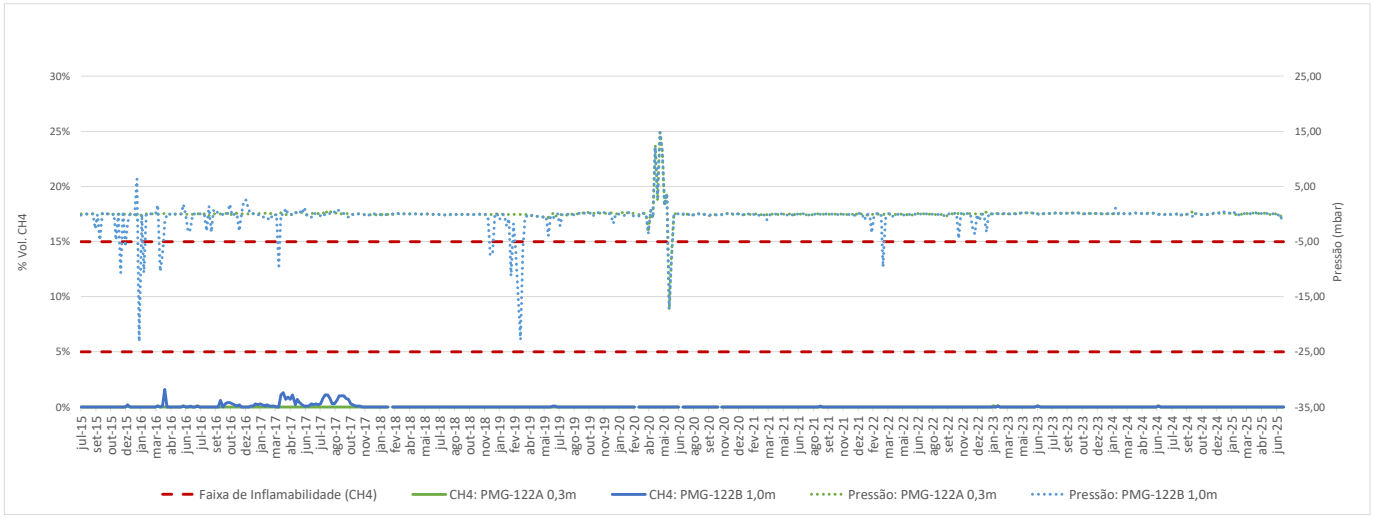


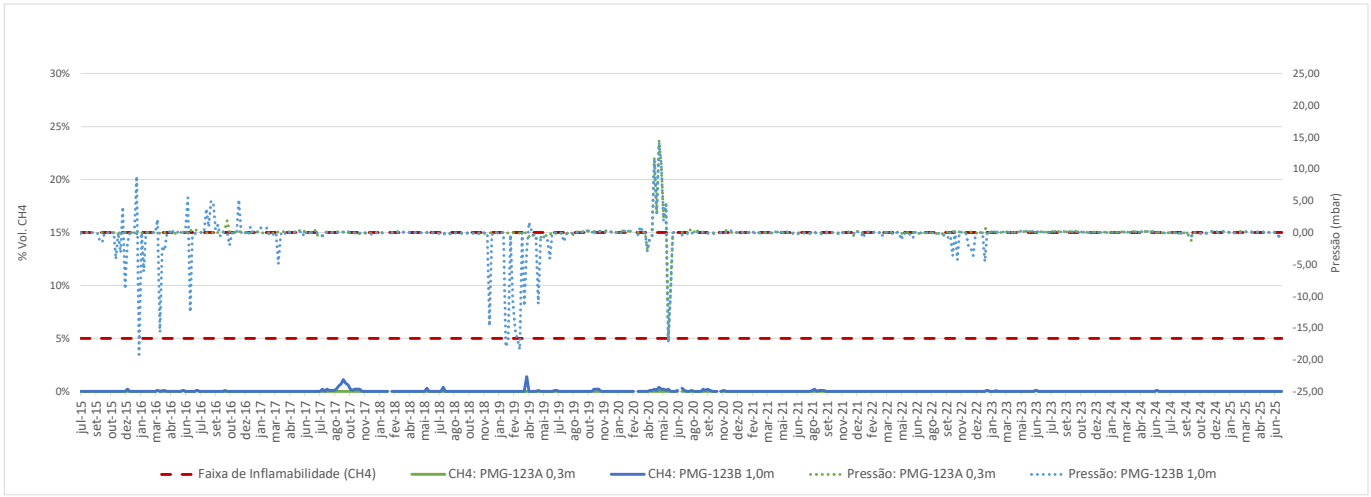

Ginásio		
Quantidade total de Poços:	3 Pares + 8 Poços	
Período de Medição:	**08 de Abril de 2014 a 30 de junho de 2025**	
Pares com concentração igual ou maior que 1%Vol:	1 Poço e 1 Par	PMG-105
		PMG-110

Observações: As concentrações de Metano apresentaram-se abaixo do Limite inferior de explosividade e somente nas porções profundas, não alcançando os poços subslab (poços imediatamente abaixo das edificações).

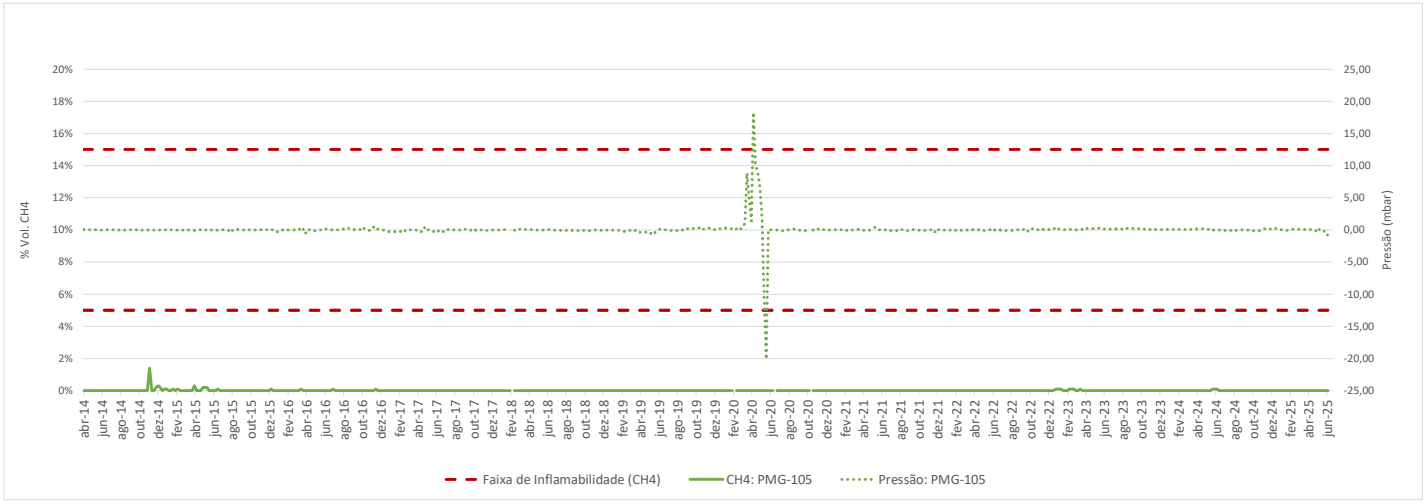


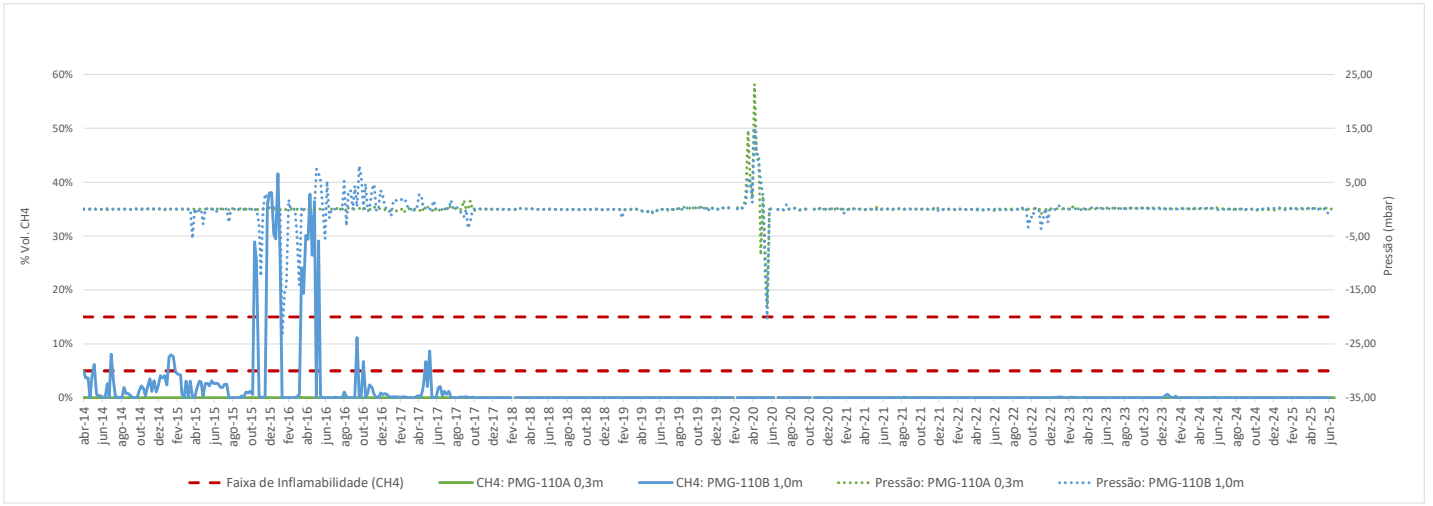

CAT 1				
Quantidade total de Poços:	07 Pares			
Período de Medição:	**08 de Abril de 2014 a 30 de junho de 2025**			
Pares com concentração igual ou maior que 1%Vol:	06 Pares	PMG-82	PMG-94	PMG-96
		PMG-83	PMG-95	PMG-97


Observações: As concentrações de Metano apresentaram-se abaixo do Limite inferior de explosividade e somente nas porções profundas, não alcançando os poços subslab (poços imediatamente abaixo das edificações).




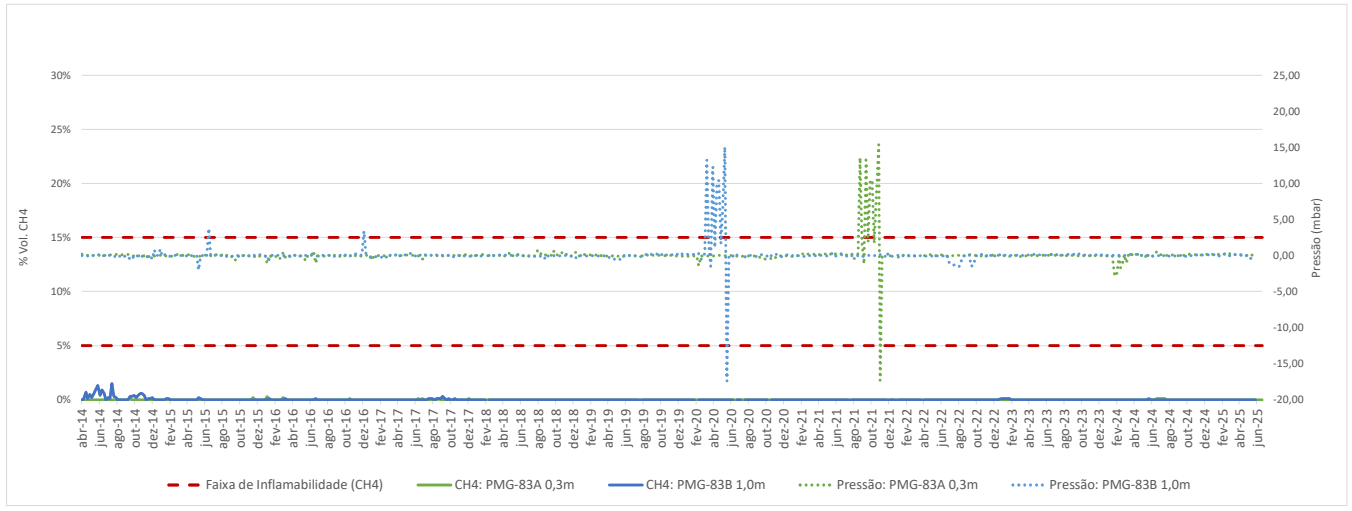

CAT 1				
Quantidade total de Poços:	07 Pares			
Período de Medição:	**08 de Abril de 2014 a 30 de junho de 2025**			
Pares com concentração igual ou maior que 1%Vol:	06 Pares	PMG-82	PMG-94	PMG-96
		PMG-83	PMG-95	PMG-97


Observações: As concentrações de Metano apresentaram-se abaixo do Limite inferior de explosividade e somente nas porções profundas, não alcançando os poços subslab (poços imediatamente abaixo das edificações).

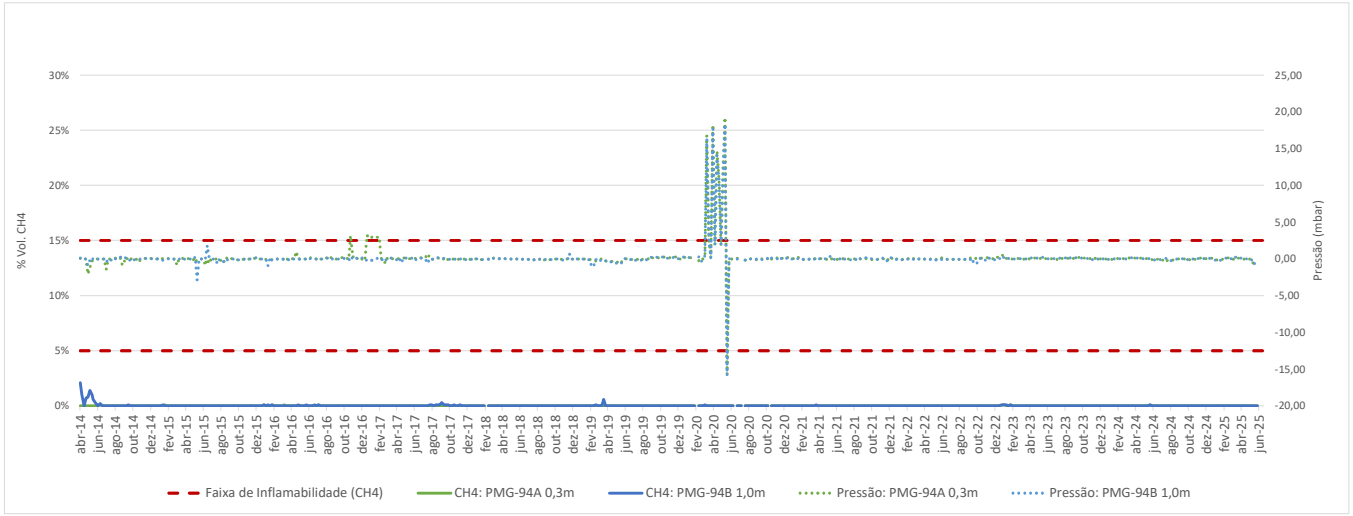

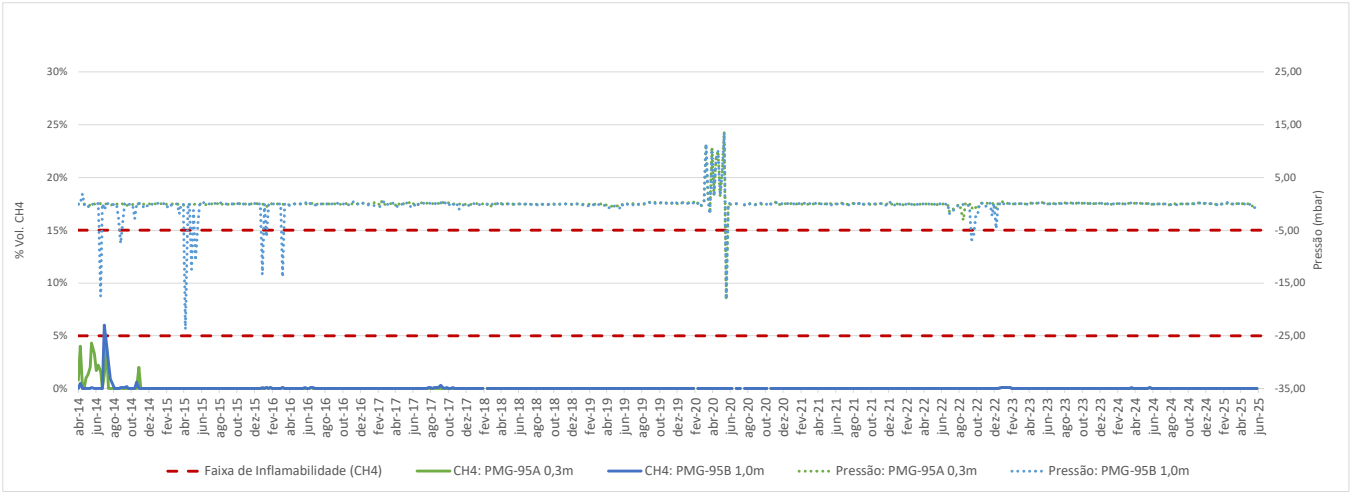

CAT 1				
Quantidade total de Poços:	07 Pares			
Período de Medição:	**08 de Abril de 2014 a 30 de junho de 2025**			
Pares com concentração igual ou maior que 1%Vol:	06 Pares	PMG-82	PMG-94	PMG-96
		PMG-83	PMG-95	PMG-97


Observações: As concentrações de Metano apresentaram-se abaixo do Limite inferior de explosividade e somente nas porções profundas, não alcançando os poços subslab (poços imediatamente abaixo das edificações).

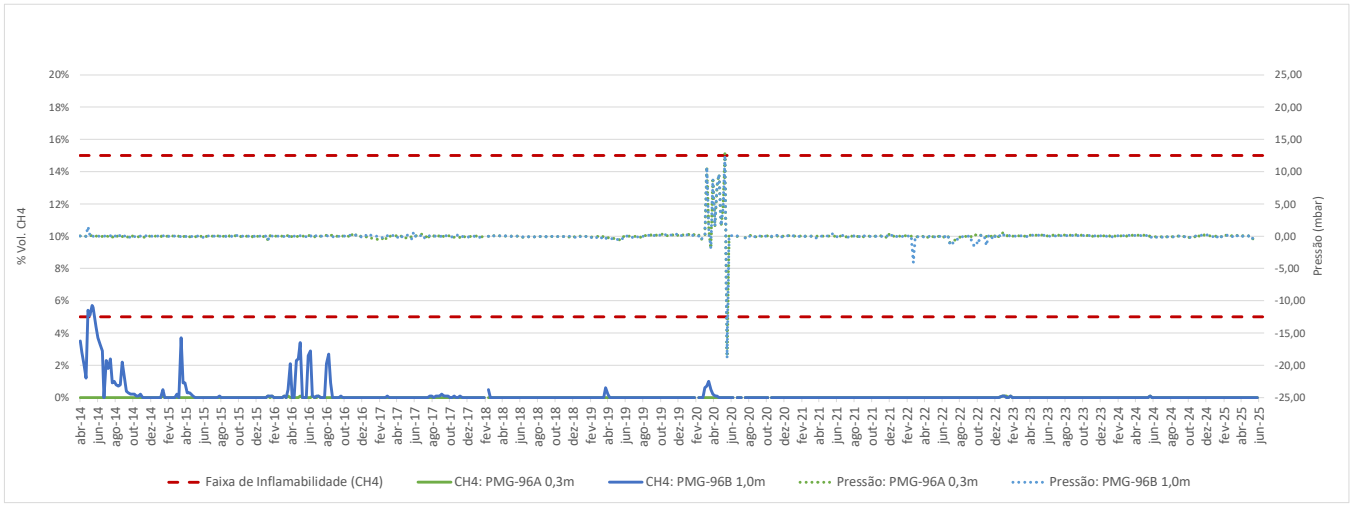




Enfermaria				
Quantidade total de Poços:	07 Pares			
Período de Medição:	**08 de Abril de 2014 a 30 de junho de 2025**			
Pares com concentração igual ou maior que 1%Vol:	05 Pares	PMG-71	PMG-74	PMG-76
		PMG-72	PMG-75	


Observações: As concentrações de Metano apresentaram-se abaixo do Limite inferior de explosividade, com exceção de um pico de Metano no PMG-71B em outubro de 2017, e somente nas porções profundas, não alcançando os poços subslab (poços imediatamente abaixo das edificações).

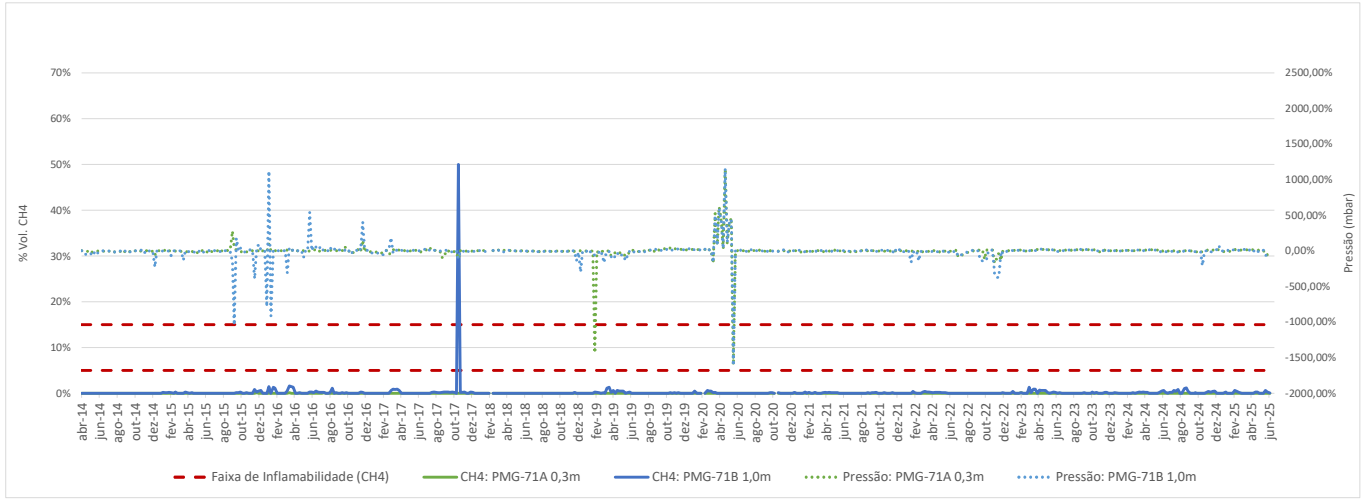


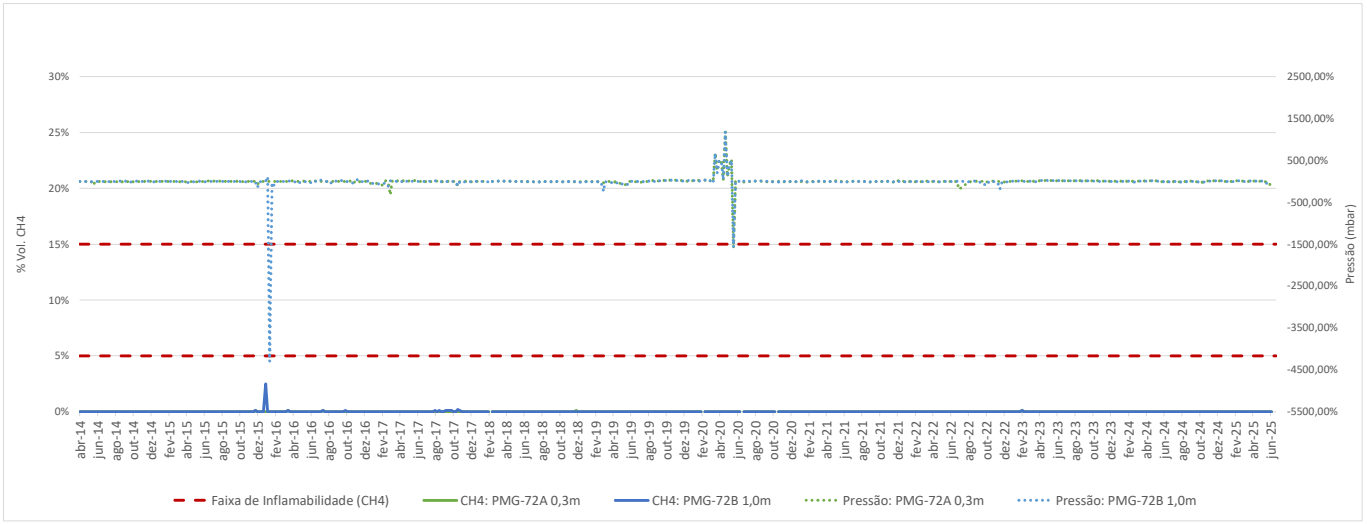

Enfermaria				
Quantidade total de Poços:	07 Pares			
Período de Medição:	**08 de Abril de 2014 a 30 de junho de 2025**			
Pares com concentração igual ou maior que 1%Vol:	05 Pares	PMG-71	PMG-74	PMG-76
		PMG-72	PMG-75	


Observações: As concentrações de Metano apresentaram-se, abaixo do Limite inferior de explosividade, com alguns picos esporádicos na faixa de exposividade no PMG-74B, e somente nas porções profundas, não alcançando os poços subslab (poços imediatamente abaixo das edificações).

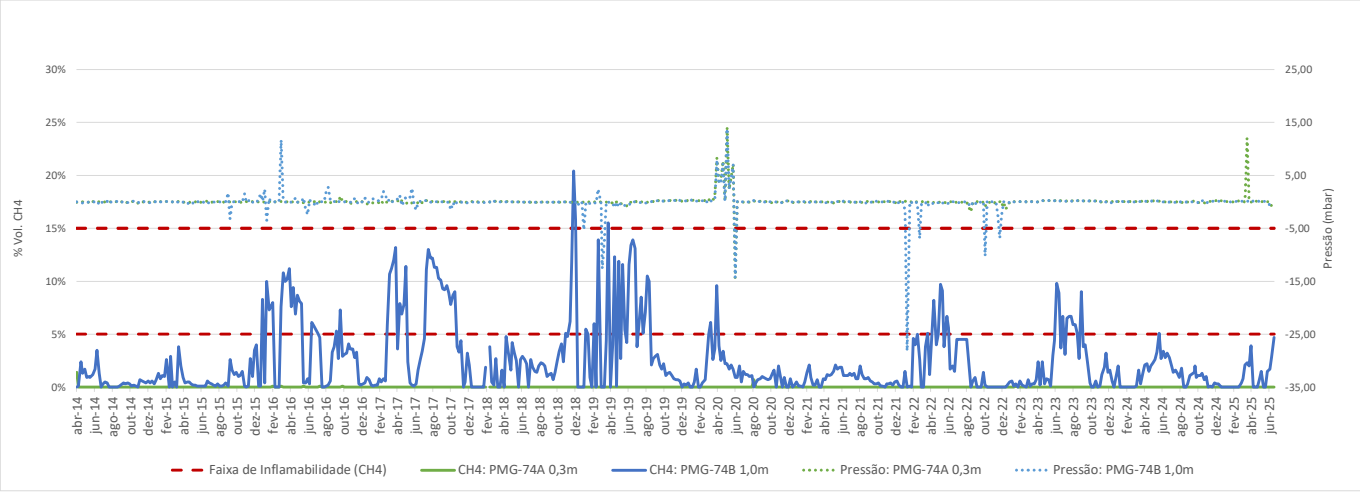

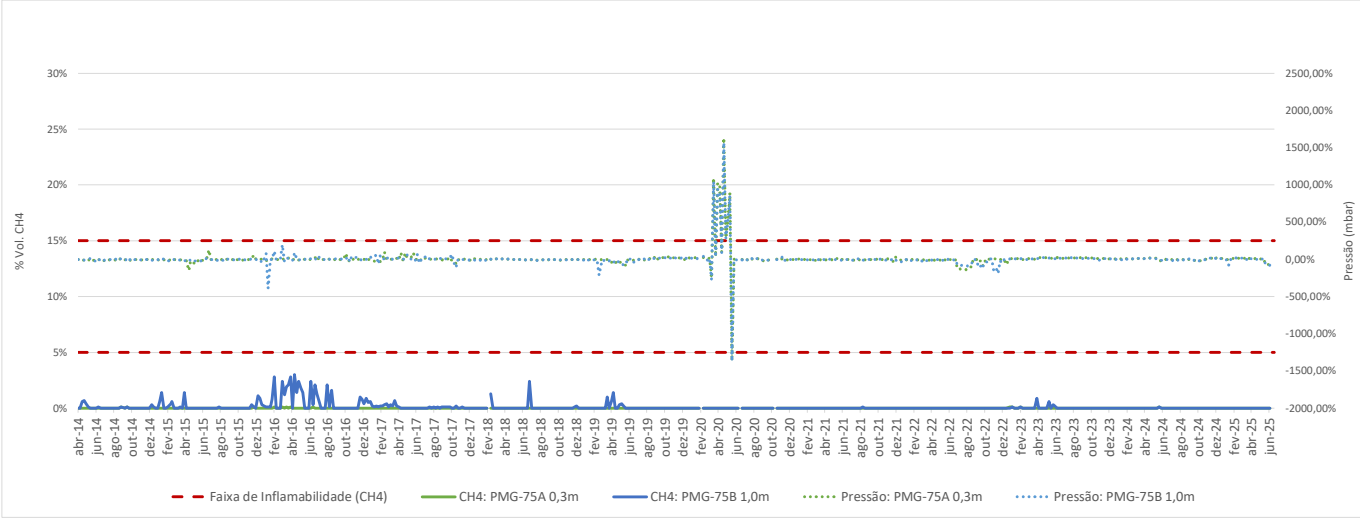


Enfermaria				
Quantidade total de Poços:	07 Pares			
Período de Medição:	**08 de Abril de 2014 a 30 de junho de 2025**			
Pares com concentração igual ou maior que 1%Vol:	05 Pares	PMG-71	PMG-74	PMG-76
		PMG-72	PMG-75	


Observações: As concentrações de Metano apresentaram-se abaixo do Limite inferior de explosividade e somente nas porções profundas, não alcançando os poços subslab (poços imediatamente abaixo das edificações).

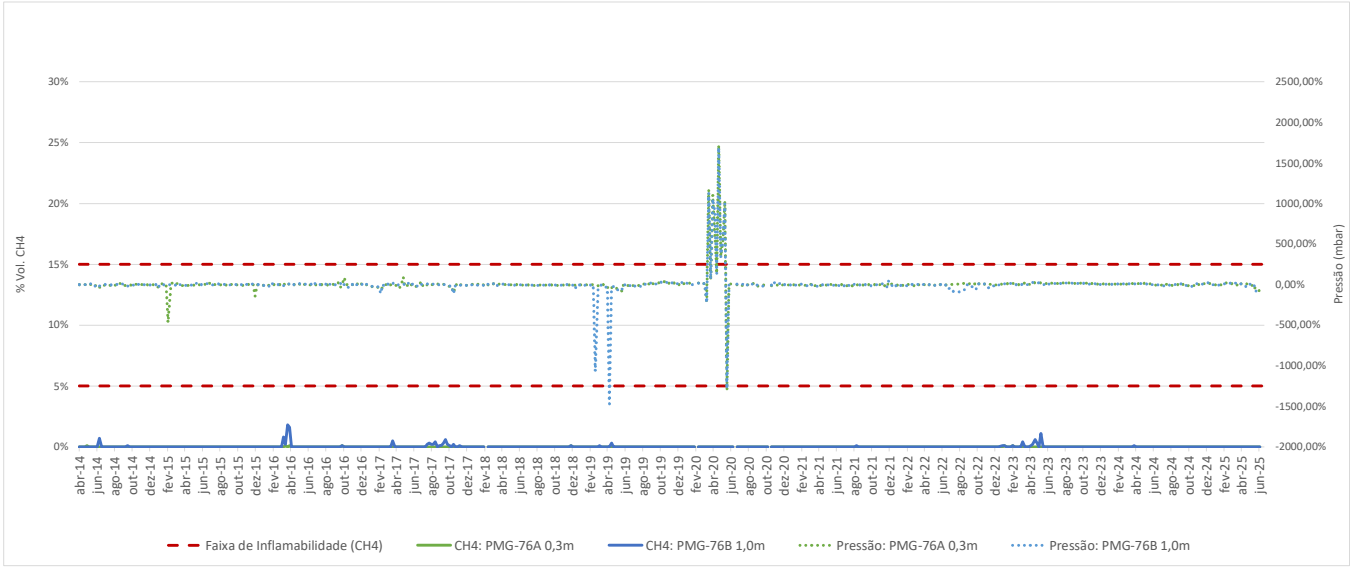

Bloco Inicial (Conj. Didático)							
Quantidade total de Poços:	14 Pares						
Período de Medição:	**08 de Abril de 2014 a 30 de junho de 2025**						
Pares com concentração igual ou maior que 1%Vol:	11 Pares	PMG-01	PMG-03	PMG-05	PMG-07	PMG-09	PMG-85
		PMG-02	PMG-04	PMG-06	PMG-08	PMG-84	

Observações: As concentrações de Metano apresentaram-se acima do Limite inferior de explosividade somente nas porções profundas, não alcançando os poços subslab (poços imediatamente abaixo das edificações).

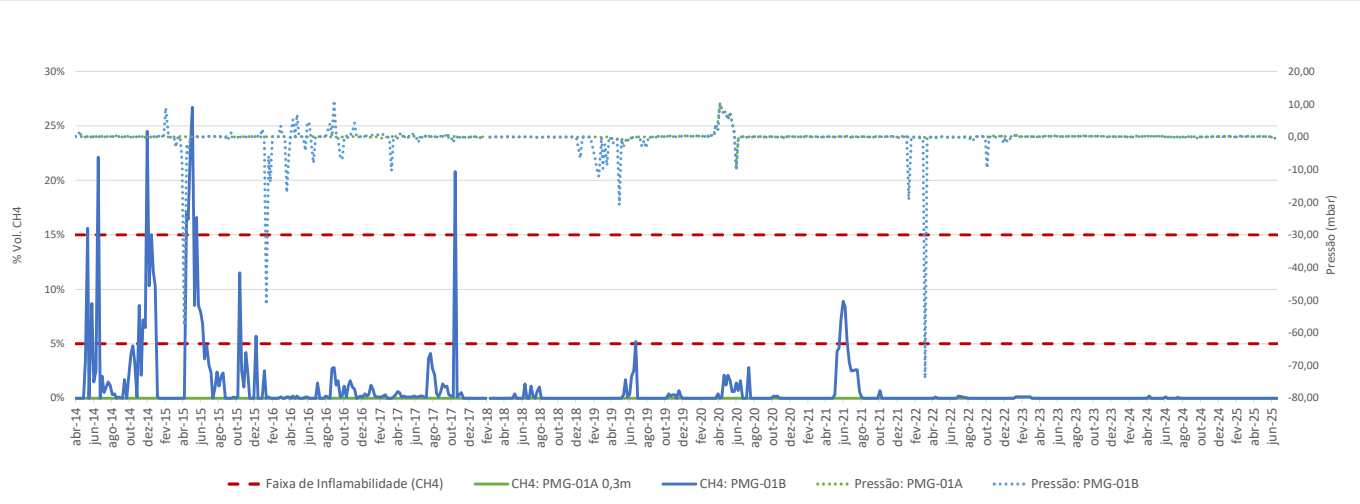

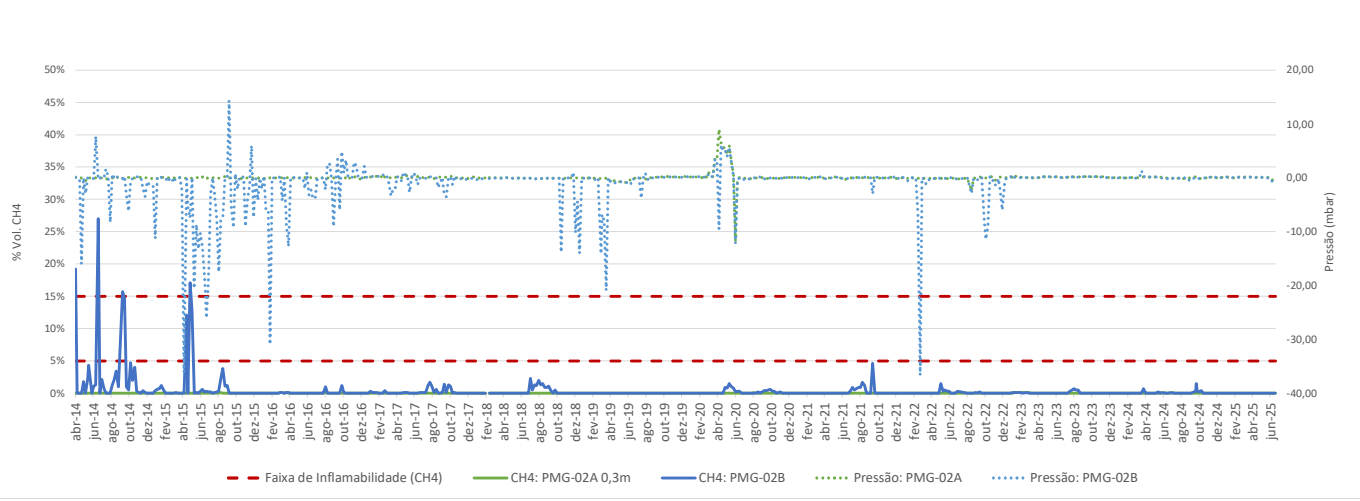

Bloco Inicial (Conj. Didático)							
Quantidade total de Poços:	14 Pares						
Período de Medição:	**08 de Abril de 2014 a 30 de junho de 2025**						
Pares com concentração igual ou maior que 1%Vol:	11 Pares	PMG-01	PMG-03	PMG-05	PMG-07	PMG-09	PMG-85
		PMG-02	PMG-04	PMG-06	PMG-08	PMG-84	


Observações: As concentrações de Metano apresentaram-se acima do Limite inferior de explosividade somente nas porções profundas, não alcançando os poços subslab (poços imediatamente abaixo das edificações).






Bloco Inicial (Conj. Didático)							
Quantidade total de Poços:	14 Pares						
Período de Medição:	**08 de Abril de 2014 a 30 de junho de 2025**						
Pares com concentração igual ou maior que 1%Vol:	11 Pares	PMG-01	PMG-03	PMG-05	PMG-07	PMG-09	PMG-85
		PMG-02	PMG-04	PMG-06	PMG-08	PMG-84	


Observações: As concentrações de Metano apresentaram-se acima do Limite inferior de explosividade somente nas porções profundas, não alcançando os poços subslab (poços imediatamente abaixo das edificações). A porção profunda esteve dentro do limite de inflamabilidade em novembro de 2023.

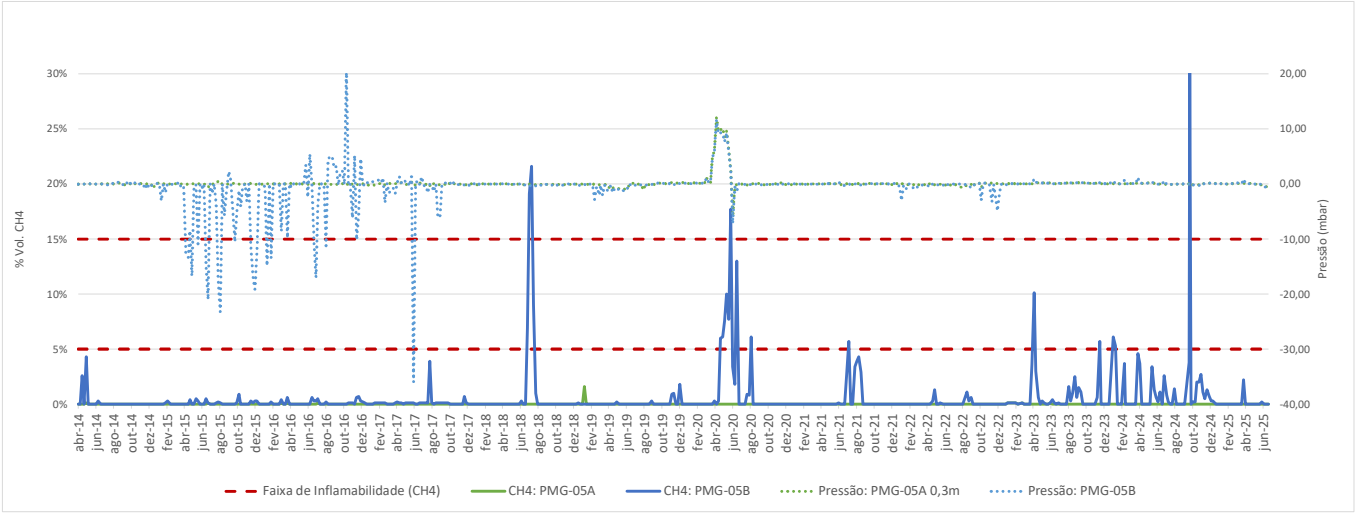


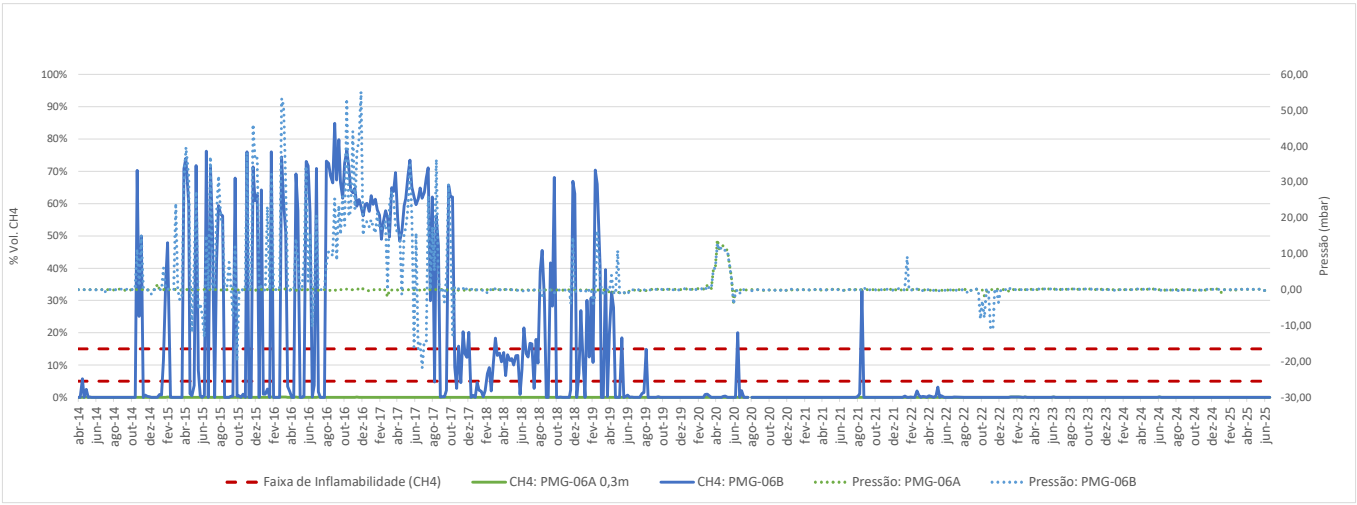

Bloco Inicial (Conj. Didático)							
Quantidade total de Poços:	14 Pares						
Período de Medição:	**08 de Abril de 2014 a 30 de junho de 2025**						
Pares com concentração igual ou maior que 1%Vol:	11 Pares	PMG-01	PMG-03	PMG-05	PMG-07	PMG-09	PMG-85
		PMG-02	PMG-04	PMG-06	PMG-08	PMG-84	


Observações: As concentrações de Metano apresentaram-se acima do Limite inferior de explosividade somente nas porções profundas, não alcançando os poços subslab (poços imediatamente abaixo das edificações).

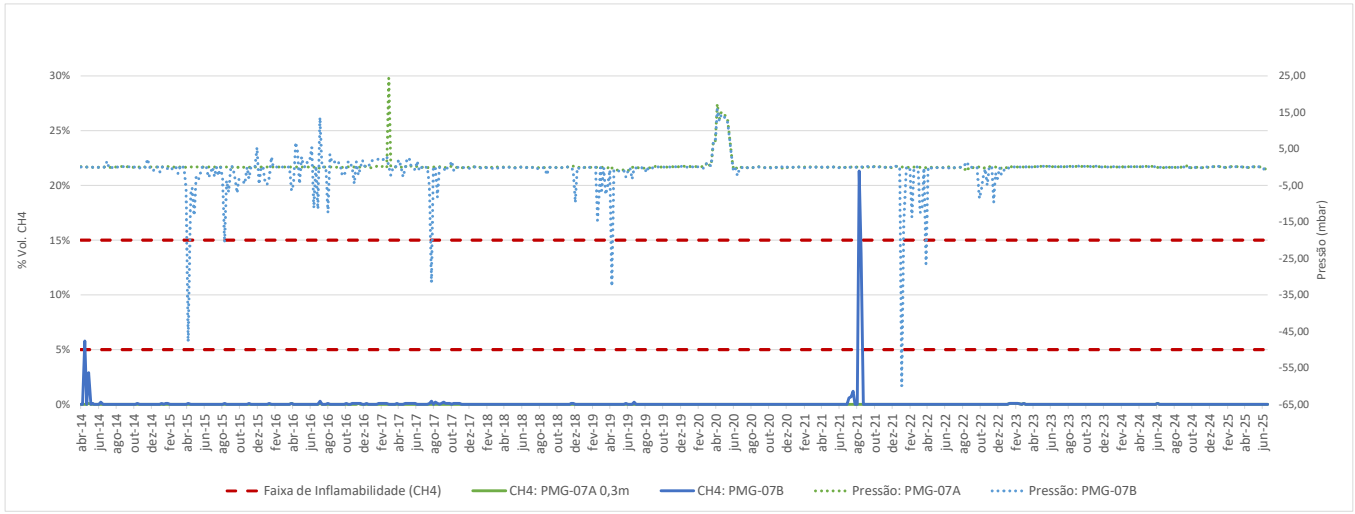

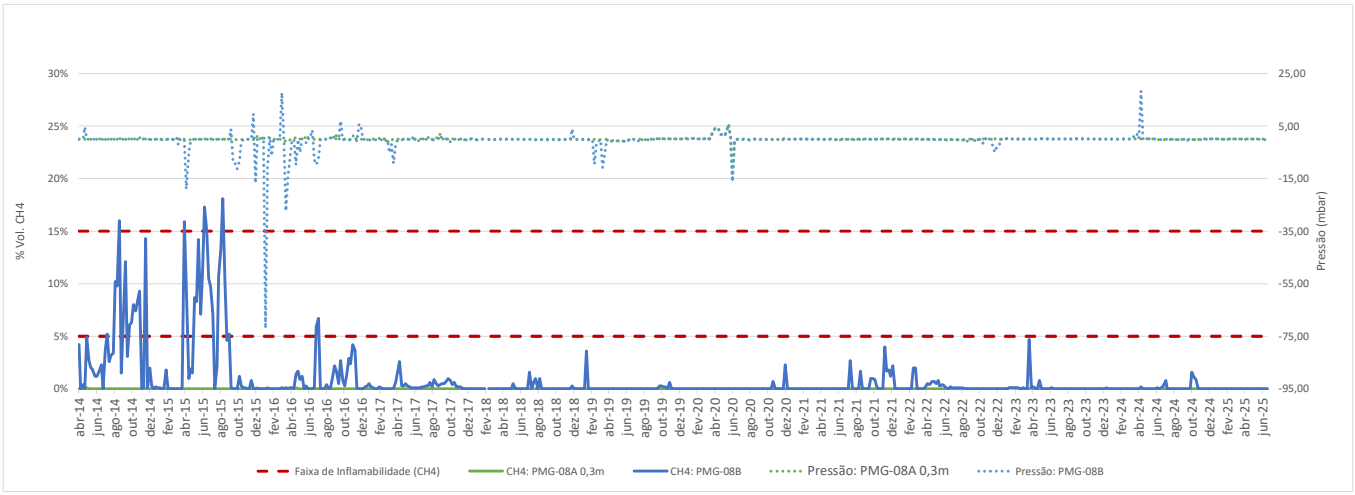

Bloco Inicial (Conj. Didático)								
Quantidade total de Poços:	14 Pares							
Período de Medição:	**08 de Abril de 2014 a 30 de junho de 2025**							
Pares com concentração igual ou maior que 1%Vol:	11 Pares	PMG-01	PMG-03	PMG-05	PMG-07	PMG-09	PMG-85	
		PMG-02	PMG-04	PMG-06	PMG-08	PMG-84		

Observações: As concentrações de Metano apresentaram-se acima do Limite inferior de explosividade somente nas porções profundas, não alcançando os poços subslab (poços imediatamente abaixo das edificações).

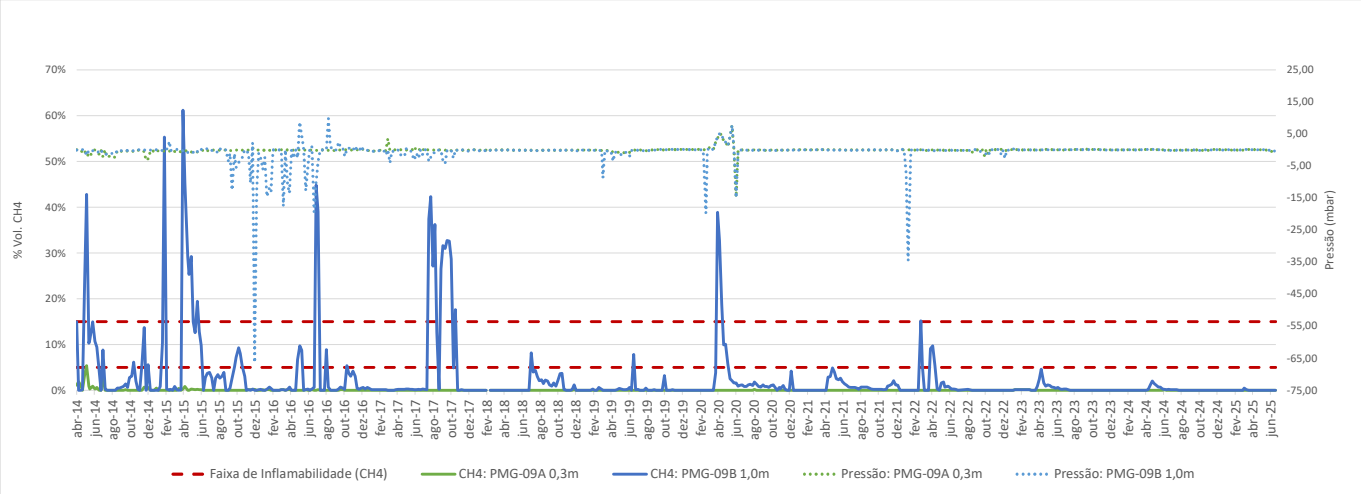




Bloco Inicial (Conj. Didático)								
Quantidade total de Poços:	14 Pares							
Período de Medição:	**08 de Abril de 2014 a 30 de junho de 2025**							
Pares com concentração igual ou maior que 1%Vol:	11 Pares	PMG-01	PMG-03	PMG-05	PMG-07	PMG-09	PMG-85	
		PMG-02	PMG-04	PMG-06	PMG-08	PMG-84		

Observações: As concentrações de Metano apresentaram-se acima do Limite inferior de explosividade somente nas porções profundas, não alcançando os poços subslab (poços imediatamente abaixo das edificações).



Conjunto Laboratorial									
Quantidade total de Poços:	17 Pares								
Período de Medição:	**08 de Abril de 2014 a 30 de junho de 2025**								
Pares com concentração igual ou maior que 1%Vol:	15 Pares	PMG-46	PMG-48	PMG-50	PMG-53	PMG-55	PMG-58	PMG-60	PMG-62
		PMG-47	PMG-49	PMG-51	PMG-54	PMG-57	PMG-59	PMG-61	


Observações: As concentrações de Metano apresentaram-se acima do Limite inferior de explosividade somente nas porções profundas, não alcançando os poços subslab (poços imediatamente abaixo das edificações).

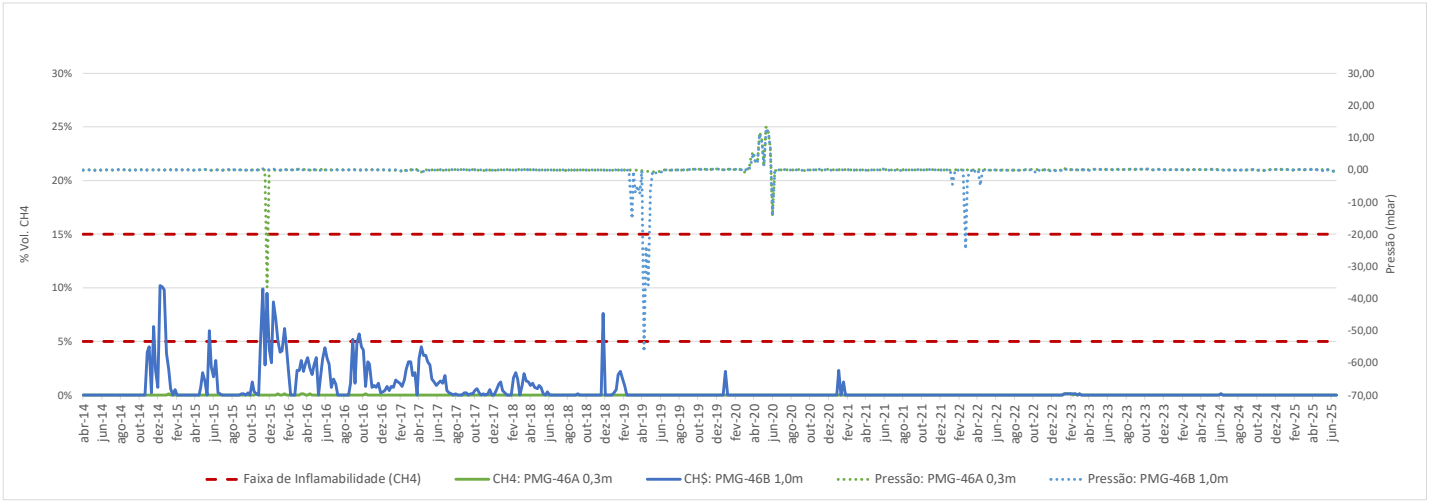




Conjunto Laboratorial									
Quantidade total de Poços:	17 Pares								
Período de Medição:	**08 de Abril de 2014 a 30 de junho de 2025**								
Pares com concentração igual ou maior que 1%Vol:	15 Pares	PMG-46	PMG-48	PMG-50	PMG-53	PMG-55	PMG-58	PMG-60	PMG-62
		PMG-47	PMG-49	PMG-51	PMG-54	PMG-57	PMG-59	PMG-61	


Observações: As concentrações de Metano apresentaram-se acima do Limite inferior de explosividade somente nas porções profundas, não alcançando os poços subslab (poços imediatamente abaixo das edificações).

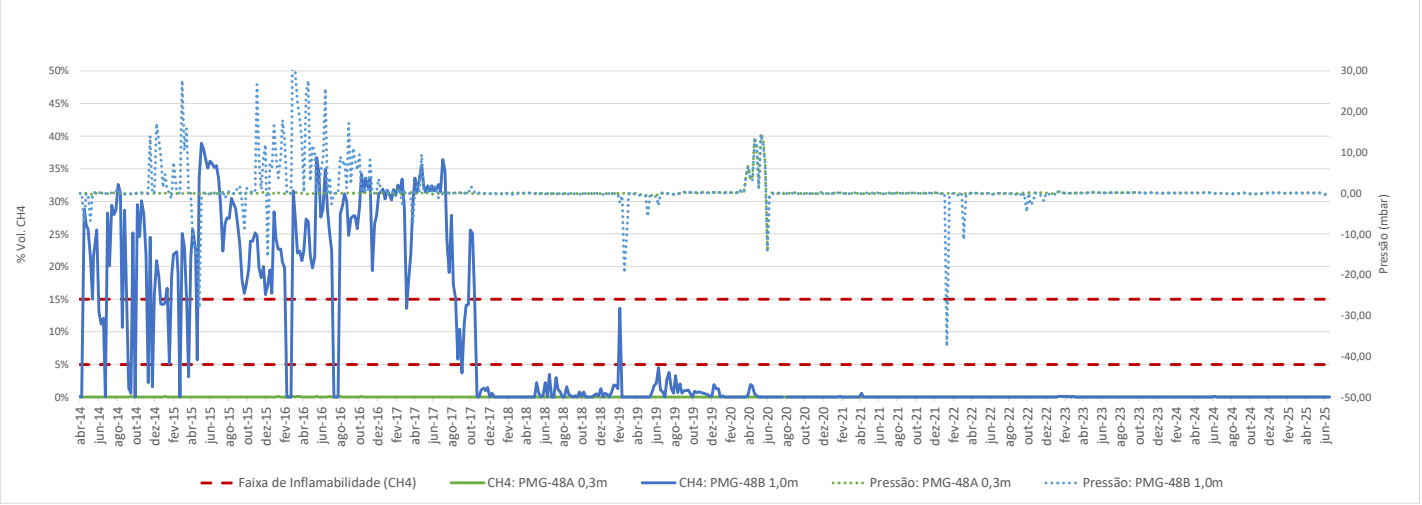


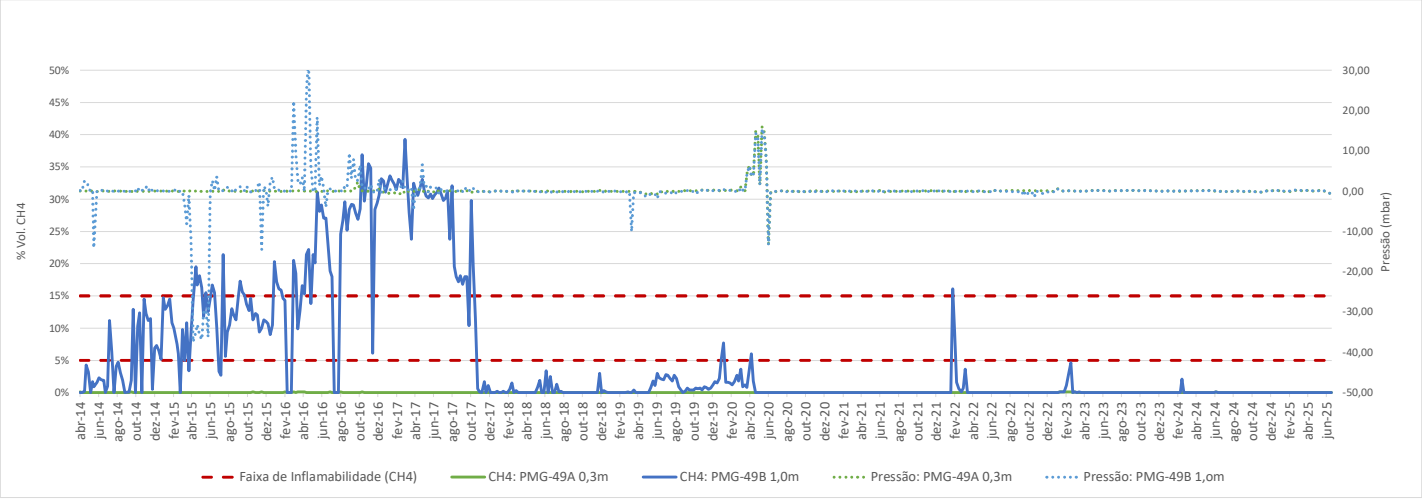

Conjunto Laboratorial									
Quantidade total de Poços:	17 Pares								
Período de Medição:	**08 de Abril de 2014 a 30 de junho de 2025**								
Pares com concentração igual ou maior que 1%Vol:	15 Pares	PMG-46	PMG-48	PMG-50	PMG-53	PMG-55	PMG-58	PMG-60	PMG-62
		PMG-47	PMG-49	PMG-51	PMG-54	PMG-57	PMG-59	PMG-61	


Observações: As concentrações de Metano apresentaram-se acima do Limite inferior de explosividade somente nas porções profundas, não alcançando os poços subslab (poços imediatamente abaixo das edificações).

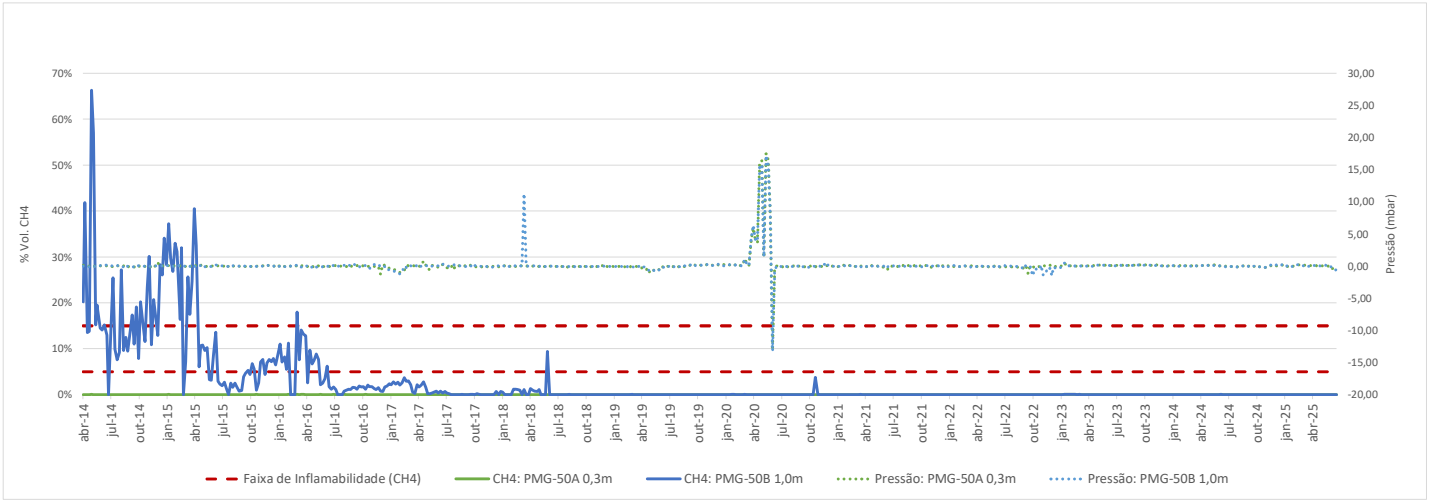


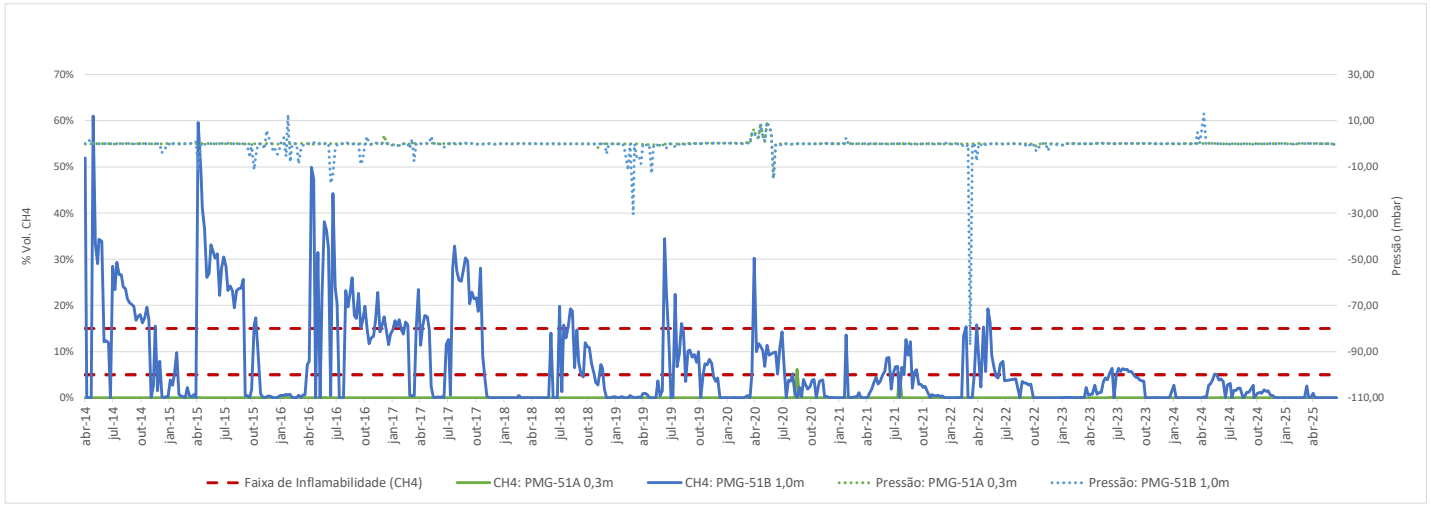

Conjunto Laboratorial									
Quantidade total de Poços:	17 Pares								
Período de Medição:	**08 de Abril de 2014 a 30 de junho de 2025**								
Pares com concentração igual ou maior que 1%Vol:	15 Pares	PMG-46	PMG-48	PMG-50	PMG-53	PMG-55	PMG-58	PMG-60	PMG-62
		PMG-47	PMG-49	PMG-51	PMG-54	PMG-57	PMG-59	PMG-61	


Observações: As concentrações de Metano apresentaram-se acima do Limite inferior de explosividade somente nas porções profundas, não alcançando os poços subslab (poços imediatamente abaixo das edificações).

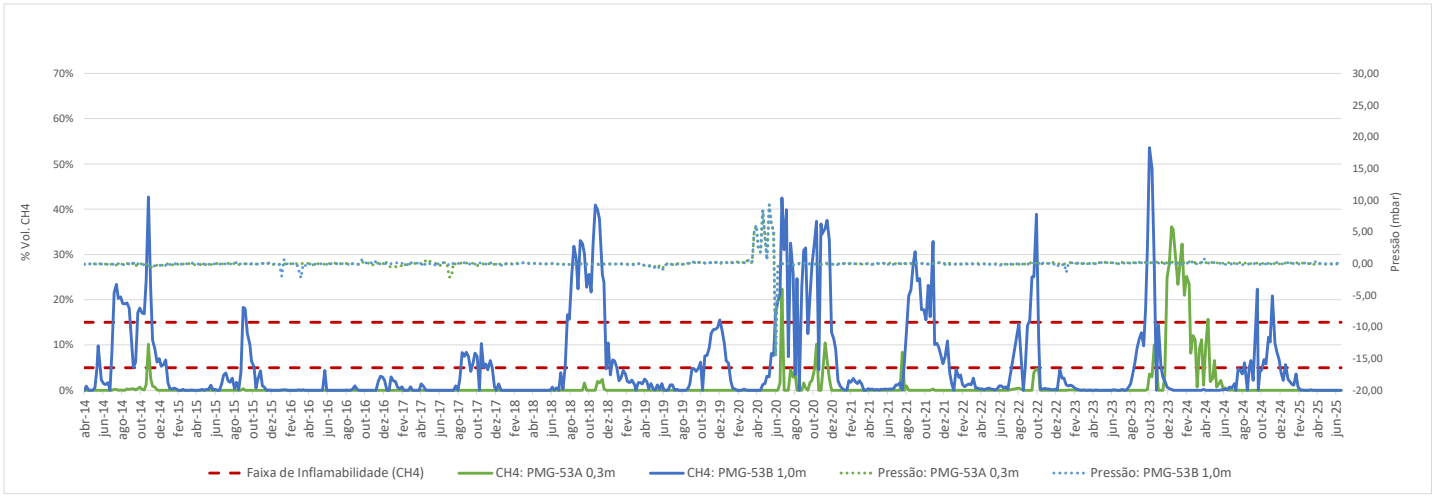


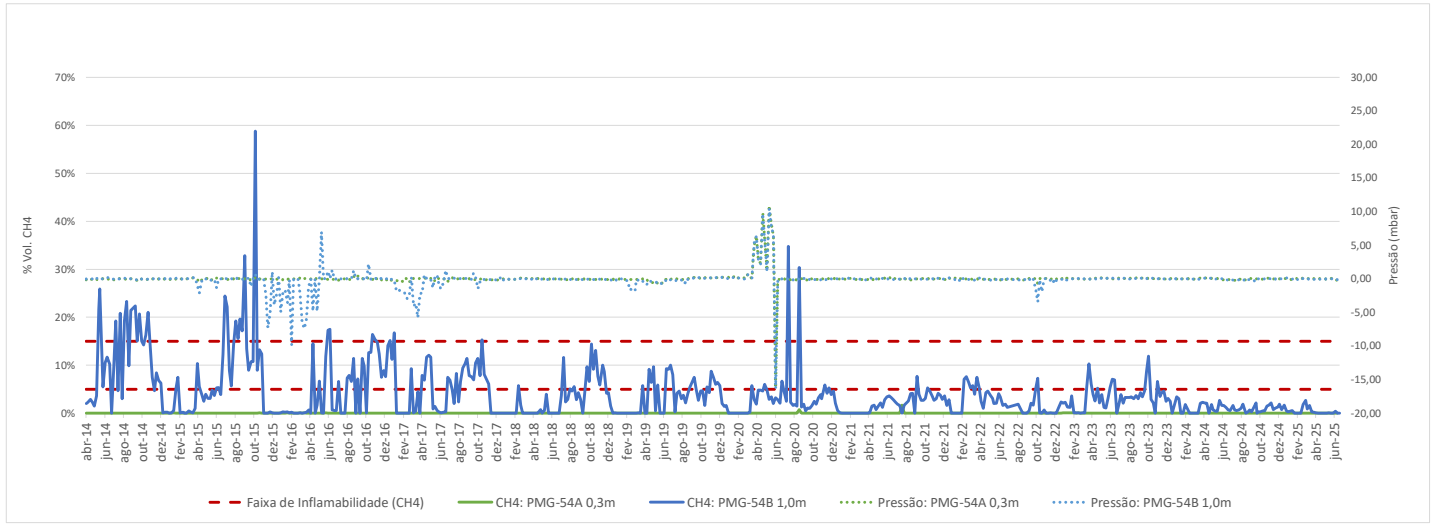

Conjunto Laboratorial									
Quantidade total de Poços:	17 Pares								
Período de Medição:	**08 de Abril de 2014 a 30 de junho de 2025**								
Pares com concentração igual ou maior que 1%Vol:	15 Pares	PMG-46	PMG-48	PMG-50	PMG-53	PMG-55	PMG-58	PMG-60	PMG-62
		PMG-47	PMG-49	PMG-51	PMG-54	PMG-57	PMG-59	PMG-61	


Observações: As concentrações de Metano apresentaram-se acima do Limite inferior de explosividade somente nas porções profundas, não alcançando os poços subslab (poços imediatamente abaixo das edificações).

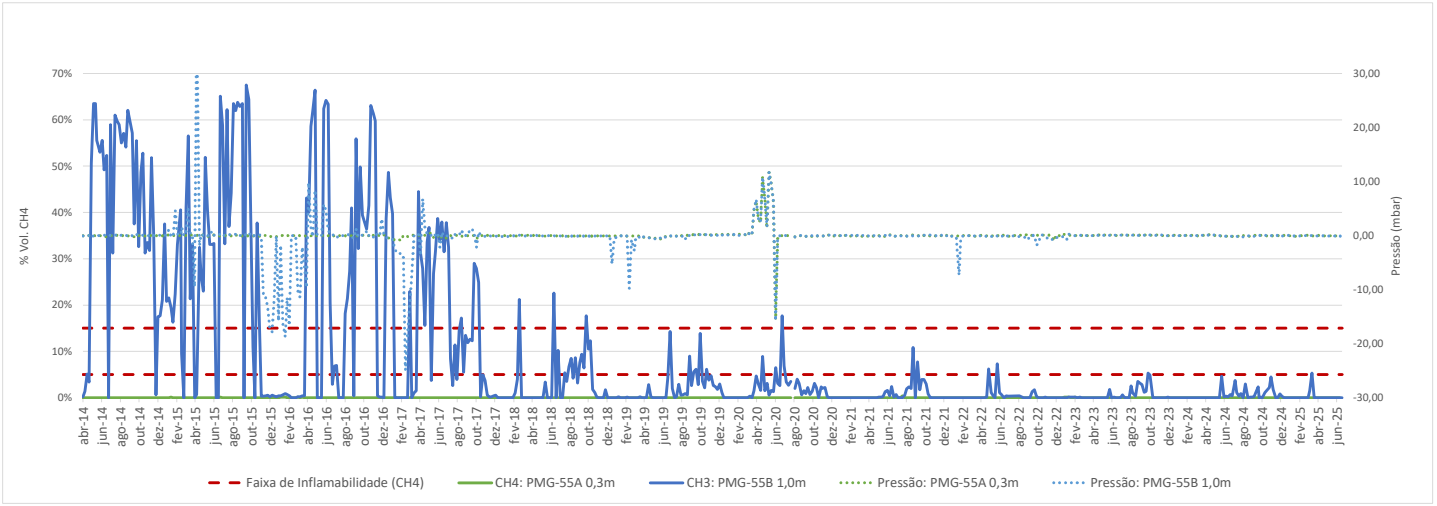


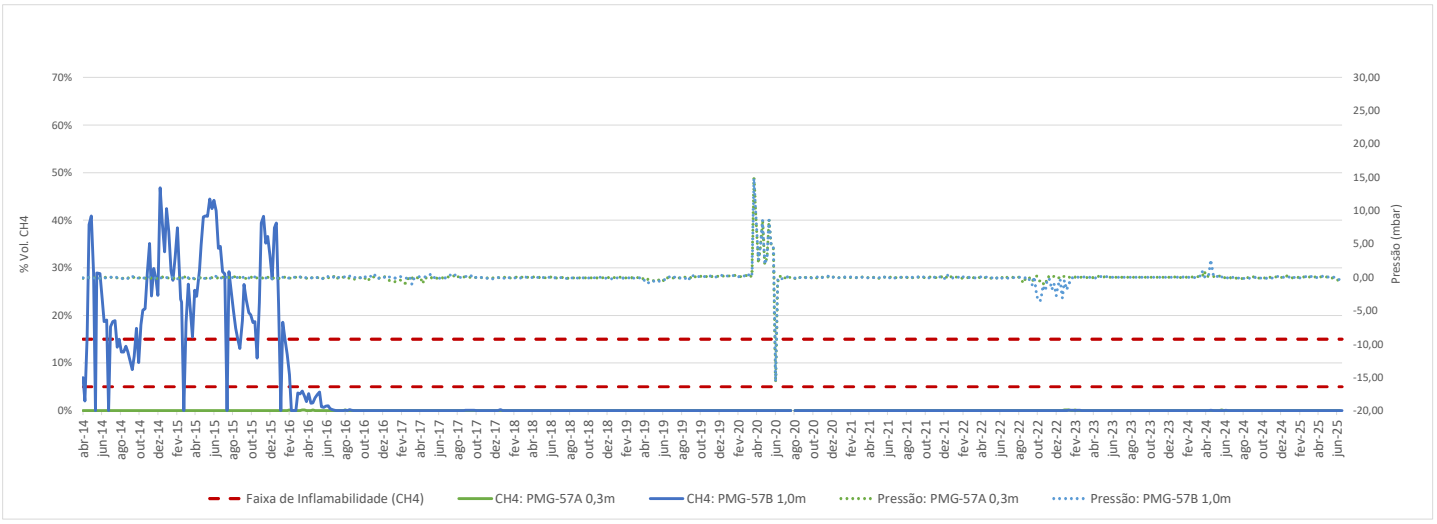

Conjunto Laboratorial									
Quantidade total de Poços:	17 Pares								
Período de Medição:	**08 de Abril de 2014 a 30 de junho de 2025**								
Pares com concentração igual ou maior que 1%Vol:	15 Pares	PMG-46	PMG-48	PMG-50	PMG-53	PMG-55	PMG-58	PMG-60	PMG-62
		PMG-47	PMG-49	PMG-51	PMG-54	PMG-57	PMG-59	PMG-61	


Observações: As concentrações de Metano apresentaram-se acima do Limite inferior de explosividade somente nas porções profundas, não alcançando os poços subslab (poços imediatamente abaixo das edificações).

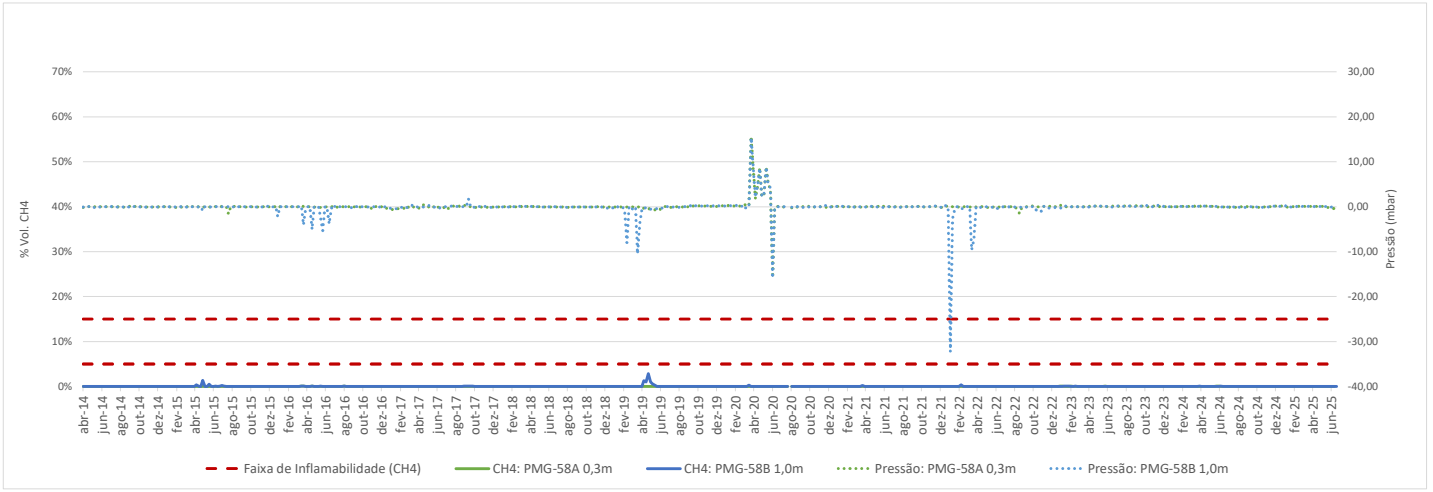


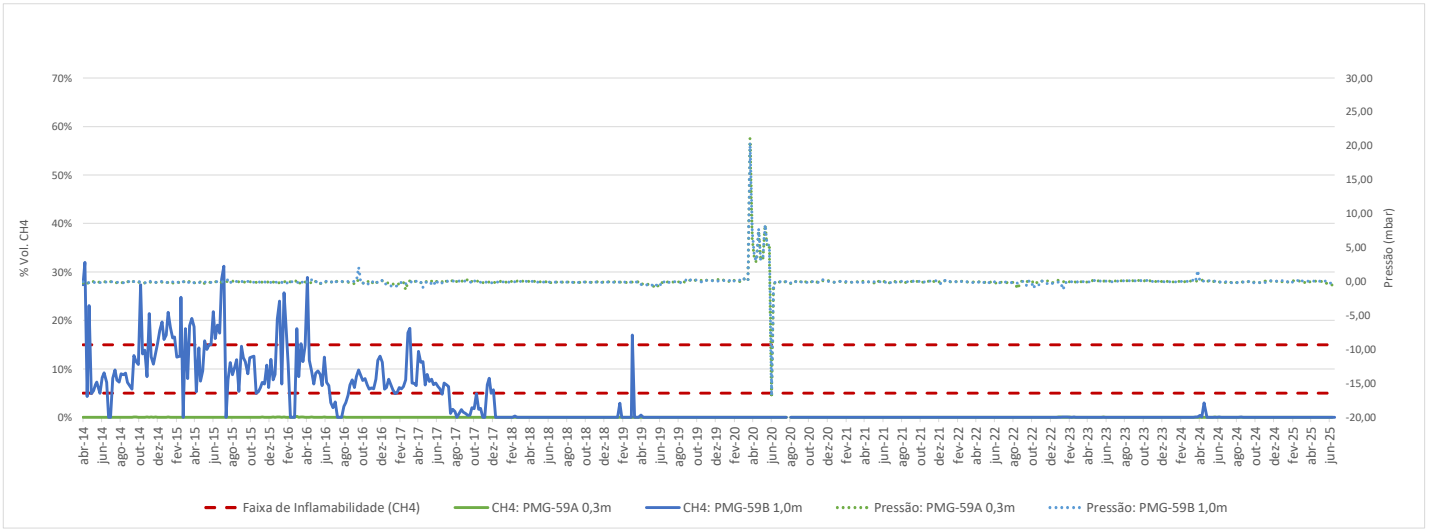

Conjunto Laboratorial									
Quantidade total de Poços:	17 Pares								
Período de Medição:	**08 de Abril de 2014 a 30 de junho de 2025**								
Pares com concentração igual ou maior que 1%Vol:	15 Pares	PMG-46	PMG-48	PMG-50	PMG-53	PMG-55	PMG-58	PMG-60	PMG-62
		PMG-47	PMG-49	PMG-51	PMG-54	PMG-57	PMG-59	PMG-61	


Observações: As concentrações de Metano apresentaram-se acima do Limite inferior de explosividade somente nas porções profundas, não alcançando os poços subslab (poços imediatamente abaixo das edificações).

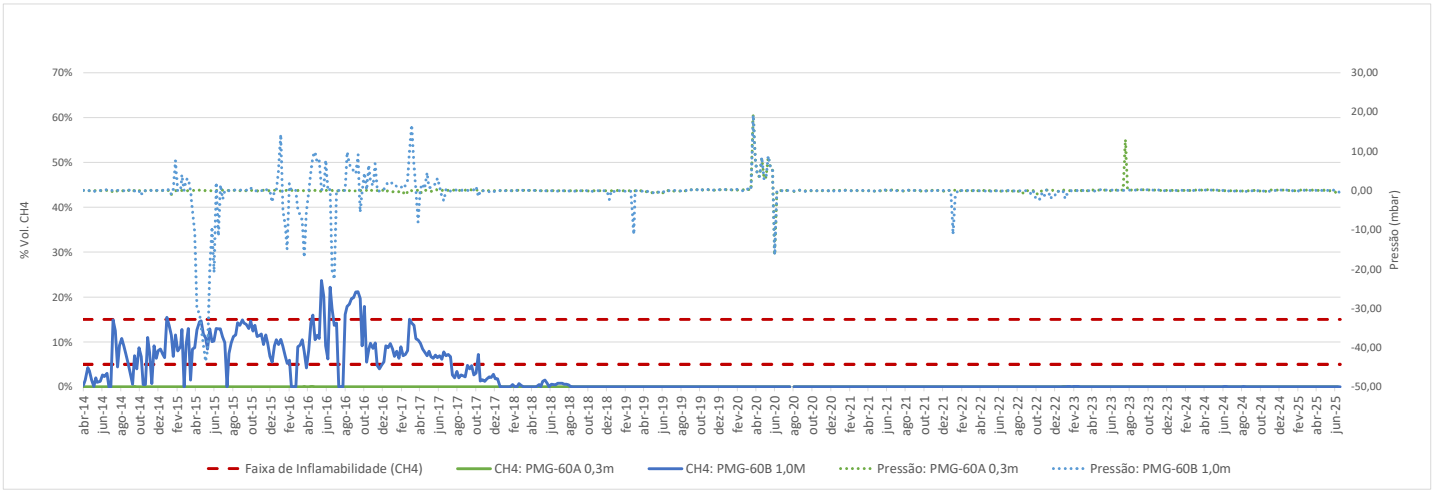

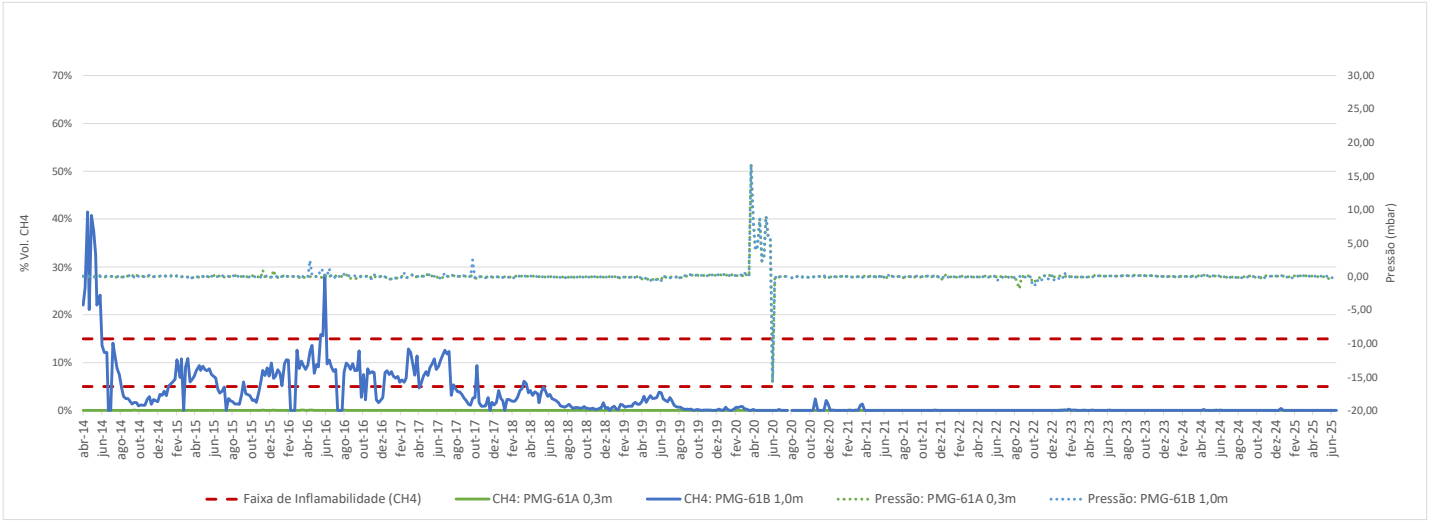


Conjunto Laboratorial									
Quantidade total de Poços:	17 Pares								
Período de Medição:	**08 de Abril de 2014 a 30 de junhoo de 2025**								
Pares com concentração igual ou maior que 1%Vol:	15 Pares	PMG-46	PMG-48	PMG-50	PMG-53	PMG-55	PMG-58	PMG-60	PMG-62
		PMG-47	PMG-49	PMG-51	PMG-54	PMG-57	PMG-59	PMG-61	


Observações: As concentrações de Metano apresentaram-se acima do Limite inferior de explosividade somente nas porções profundas, não alcançando os poços subslab (poços imediatamente abaixo das edificações).

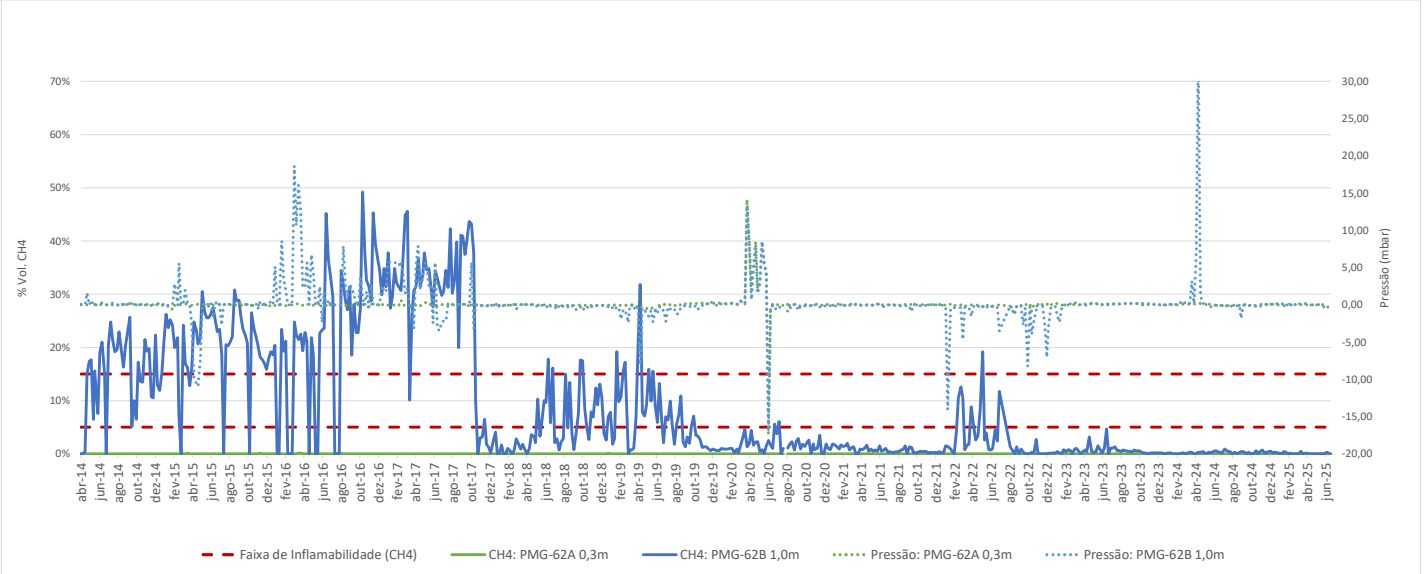

Edifício I-4					
Quantidade total de Poços:	12 Pares				
Período de Medição:	**08 de Abril de 2014 a 30 de junho de 2025**				
Pares com concentração igual ou maior que 1%Vol:	5 Pares	PMG-64	PMG-67	PMG-77	
		PMG-66	PMG-69		


Observações: As concentrações de Metano apresentaram-se acima do Limite inferior de explosividade somente nas porções profundas, não alcançando os poços subslab (poços imediatamente abaixo das edificações).

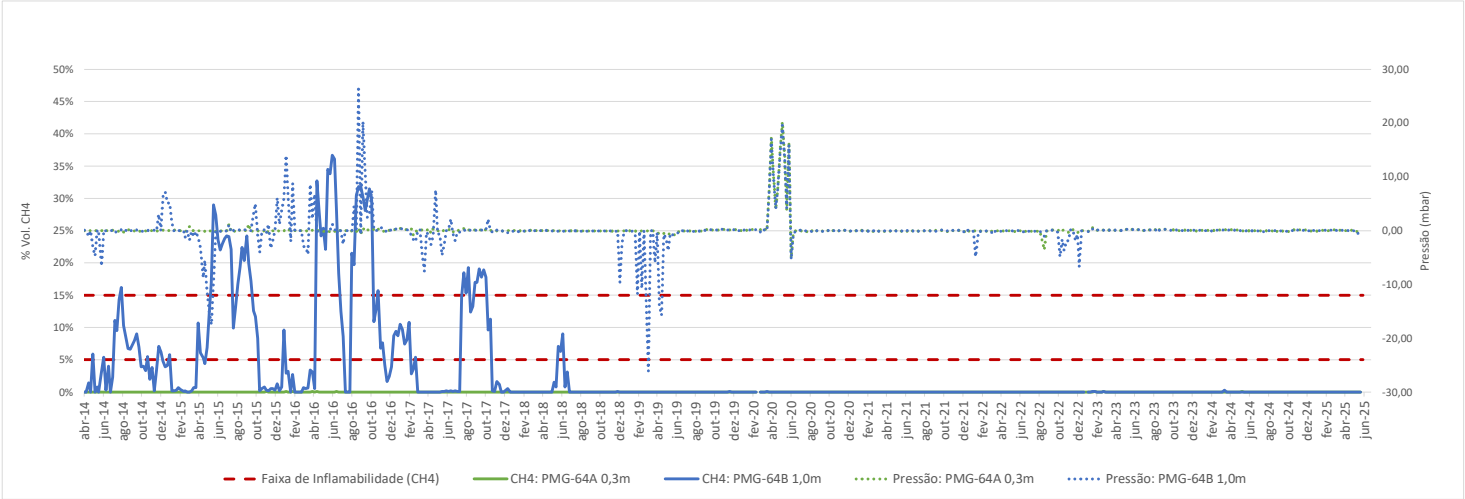


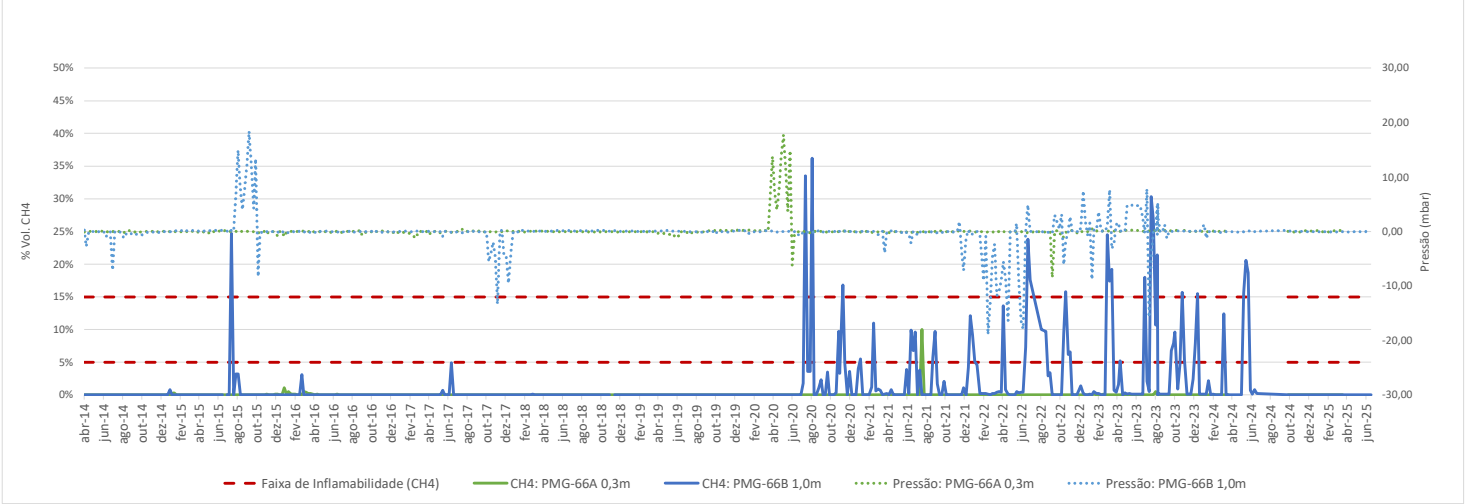

Edifício I-4				
Quantidade total de Poços:	12 Pares			
Período de Medição:	**08 de Abril de 2014 a 30 de junho de 2025**			
Pares com concentração igual ou maior que 1%Vol:	5 Pares	PMG-64	PMG-67	PMG-77
		PMG-66	PMG-69	


Observações: As concentrações de Metano apresentaram-se abaixo do Limite inferior de explosividade, com exceção de um pico de Metano no PMG-67B em março/2020 dentro da faixa de inflamabilidade, e somente nas porções profundas, não alcançando os poços subslab (poços imediatamente abaixo das edificações).

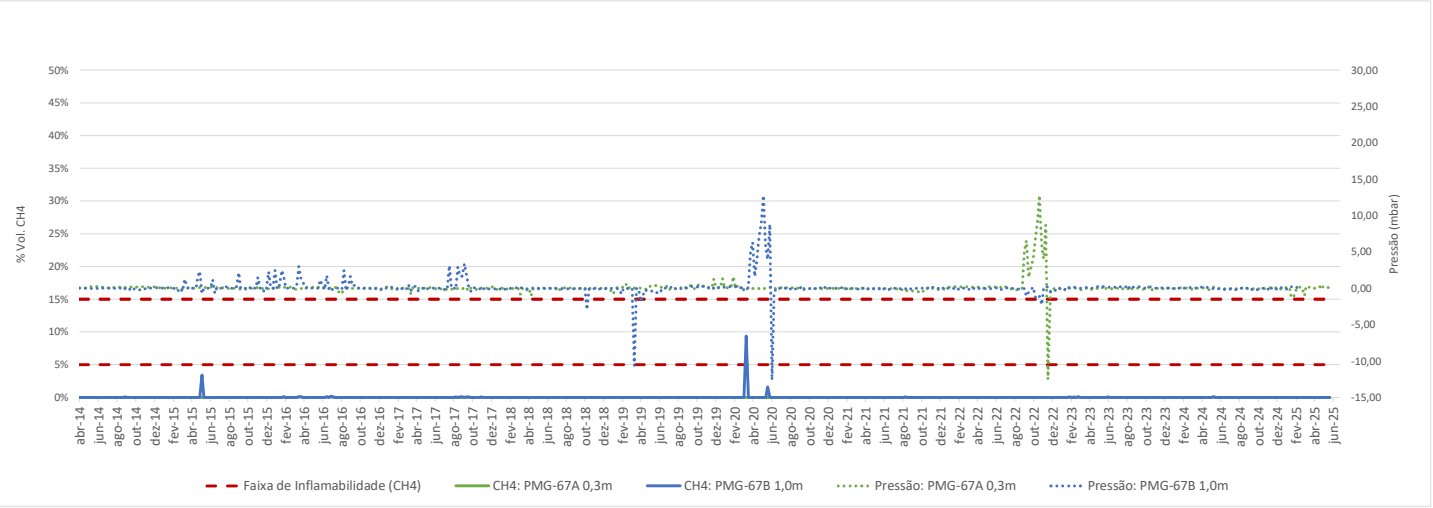

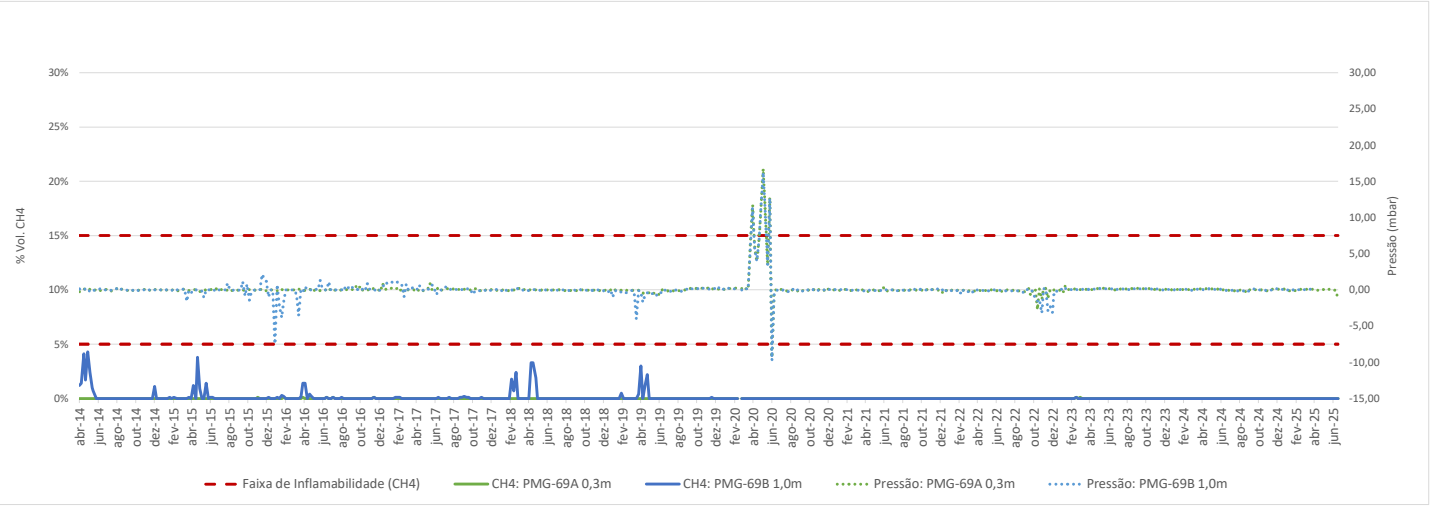


Edifício I-4				
Quantidade total de Poços:	12 Pares			
Período de Medição:	**08 de Abril de 2014 a 30 de junho de 2025**			
Pares com concentração igual ou maior que 1%Vol:	5 Pares	PMG-64	PMG-67	PMG-77
		PMG-66	PMG-69	


Observações: As concentrações de Metano apresentaram-se abaixo do Limite inferior de explosividade somente nas porções profundas, não alcançando os poços subslab (poços imediatamente abaixo das edificações).

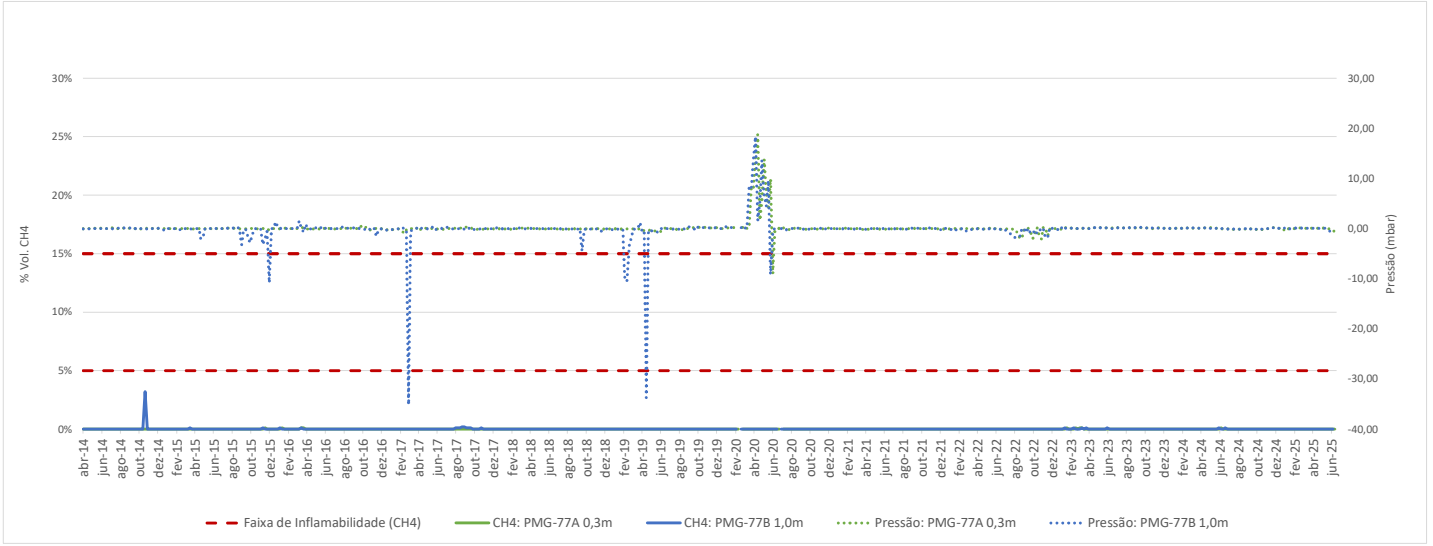

Edifício I-3 - Biblioteca		
Quantidade total de Poços:	14 Pares	
Período de Medição:	**08 de Abril de 2014 a 30 de junho de 2025**	
Pares com concentração igual ou maior que 1%Vol:	2 Pares	PMG-31
		PMG-39


Observações: As concentrações de Metano apresentaram-se acima do Limite inferior de explosividade somente nas porções profundas, não alcançando os poços subslab (poços imediatamente abaixo das edificações).

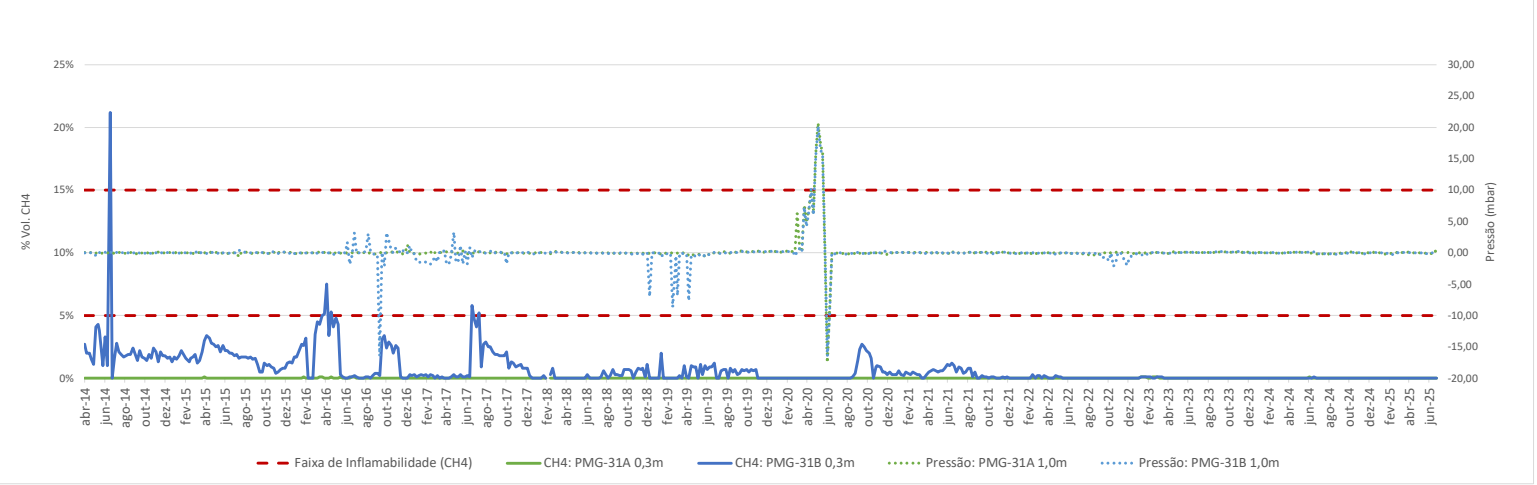


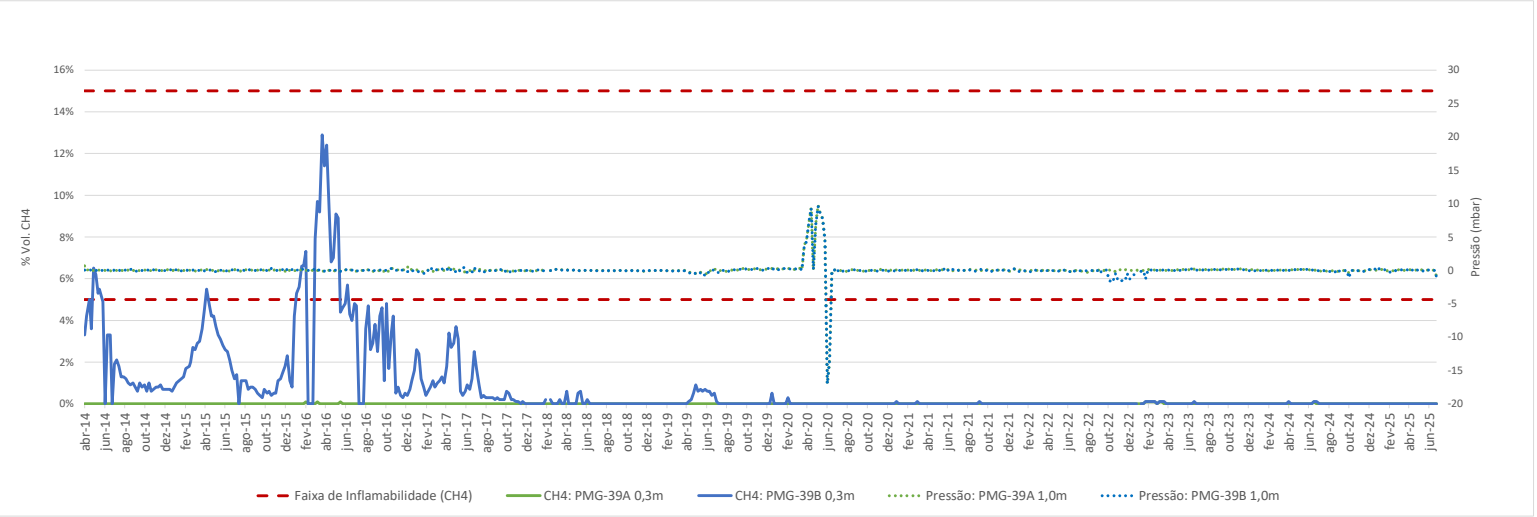

Edifício I-1		
Quantidade total de Poços:	17 Pares	
Período de Medição:	**08 de Abril de 2014 a 30 de junho de 2025**	
Pares com concentração igual ou maior que 1%Vol:	2 Pares	PMG-114 Parte 1
		PMG-11 Parte 2

Observações: As concentrações de Metano apresentaram-se acima do Limite inferior de explosividade somente nas porções profundas, não alcançando os poços subslab (poços imediatamente abaixo das edificações).

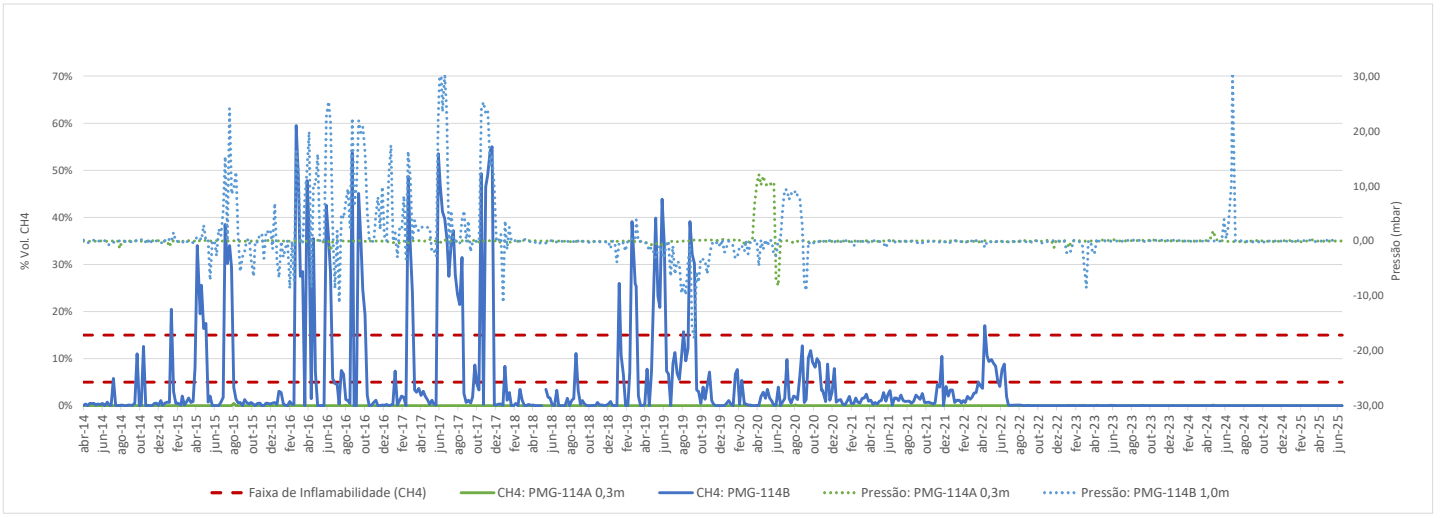

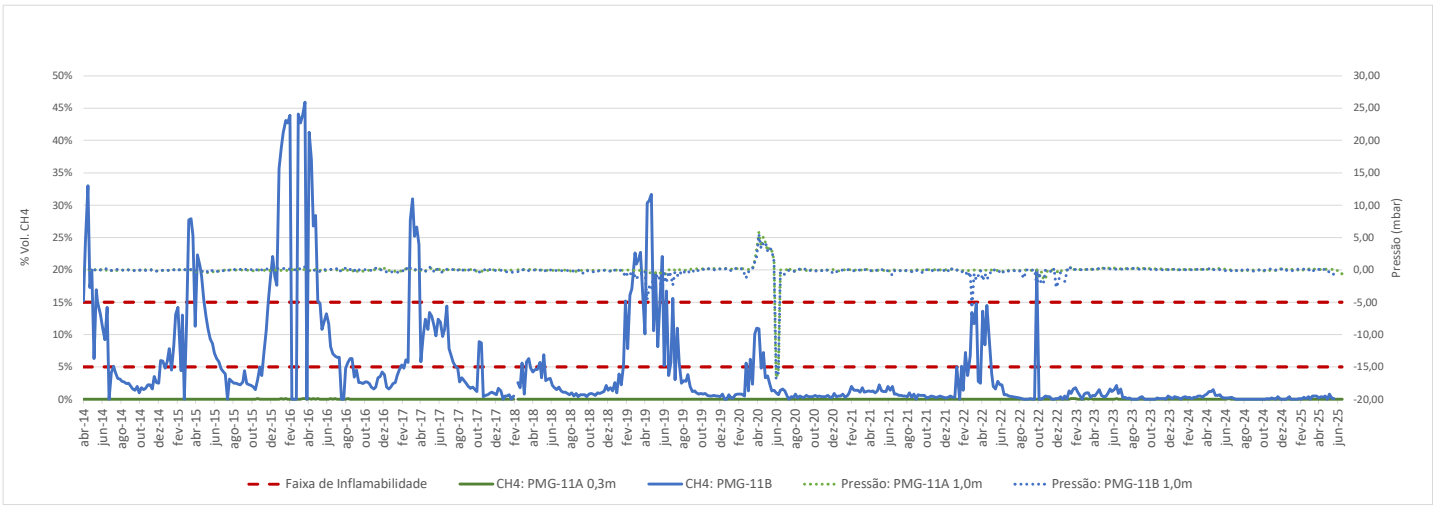

ANEXO 6

TABELAS DE MEDIÇÕES SEMANAIS NOS EXAUSTORES

Identificação do Exaustor	Semana	Operação	Vácuo da celula		PID	%LEL	Pressão	Observação
			(mmHg)	(mBar)	(ppm)	(5%Vol.)	(mBar)	
Exaustor I1	**04/04/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,22	
Exaustor I1 (2)	**04/04/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,20	
Exaustor I5 Auditório	**04/04/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,70	
Exaustor Biblioteca	**04/04/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,08	
Exaustor Portaria 3	**04/04/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,29	
Exaustor Ginasio	**04/04/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,85	
Exaustor Enfermaria	**04/04/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,61	
Exaustor CAT1	**04/04/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,51	
Exaustor CAT2	**04/04/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,64	
Exaustor Transportes	**04/04/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,49	
Exaustor MI (B1)	**04/04/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,88	
Exaustor MI (B2)	**04/04/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,58	
Exaustor MI (B3)	**04/04/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,95	
Exaustor Auditório 1	**04/04/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,91	
Exaustor Auditório 2	**04/04/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,57	
Exaustor Cantina	**04/04/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,66	
Exaustor Corredor	**04/04/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,86	
Exaustor Conj. Lab (A1)	**04/04/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-5,68	
Exaustor Conj. Lab (A2)	**04/04/2025**	**sim**	-4,00	-2,66	0,00	0,00	-5,98	
Exaustor Conj. Lab (A3)	**04/04/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,32	
Exaustor I4	**04/04/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,73	
Exaustor Guarda	**04/04/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,84	
Exaustor Reserva 1	**Estão localizados no Edifício I1**							
Exaustor Reserva 2								
Exaustor I1	**10/04/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,56	
Exaustor I1 (2)	**10/04/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,76	
Exaustor I5 Auditório	**10/04/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,94	
Exaustor Biblioteca	**10/04/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,14	
Exaustor Portaria 3	**10/04/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,57	
Exaustor Ginasio	**10/04/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,24	
Exaustor Enfermaria	**10/04/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-5,58	
Exaustor CAT1	**10/04/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,40	
Exaustor CAT2	**10/04/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,55	
Exaustor Transportes	**10/04/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,53	
Exaustor MI (B1)	**10/04/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,44	
Exaustor MI (B2)	**10/04/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,58	
Exaustor MI (B3)	**10/04/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,24	
Exaustor Auditório 1	**10/04/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,57	
Exaustor Auditório 2	**10/04/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,07	
Exaustor Cantina	**10/04/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,61	
Exaustor Corredor	**10/04/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,96	
Exaustor Conj. Lab (A1)	**10/04/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,92	
Exaustor Conj. Lab (A2)	**10/04/2025**	**sim**	-4,00	-2,66	0,00	0,00	-5,50	
Exaustor Conj. Lab (A3)	**10/04/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,37	
Exaustor I4	**10/04/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,98	
Exaustor Guarda	**10/04/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,17	
Exaustor Reserva 1	**Estão localizados no Edifício I1**							
Exaustor Reserva 2								
Exaustor I1	**17/04/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,23	
Exaustor I1 (2)	**17/04/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,35	
Exaustor I5 Auditório	**17/04/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,89	
Exaustor Biblioteca	**17/04/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,01	
Exaustor Portaria 3	**17/04/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,41	
Exaustor Ginasio	**17/04/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,08	
Exaustor Enfermaria	**17/04/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-5,37	
Exaustor CAT1	**17/04/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,39	
Exaustor CAT2	**17/04/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,43	
Exaustor Transportes	**17/04/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,59	
Exaustor MI (B1)	**17/04/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,32	
Exaustor MI (B2)	**17/04/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,25	
Exaustor MI (B3)	**17/04/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,07	
Exaustor Auditório 1	**17/04/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,46	
Exaustor Auditório 2	**17/04/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,94	
Exaustor Cantina	**17/04/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,51	
Exaustor Corredor	**17/04/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,78	
Exaustor Conj. Lab (A1)	**17/04/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,88	
Exaustor Conj. Lab (A2)	**17/04/2025**	**sim**	-4,00	-2,66	0,00	0,00	-5,53	
Exaustor Conj. Lab (A3)	**17/04/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,31	
Exaustor I4	**17/04/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,79	
Exaustor Guarda	**17/04/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,12	
Exaustor Reserva 1	**Estão localizados no Edifício I1**							
Exaustor Reserva 2								
Exaustor I1	**25/04/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,82	
Exaustor I1 (2)	**25/04/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,58	
Exaustor I5 Auditório	**25/04/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,54	
Exaustor Biblioteca	**25/04/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,09	
Exaustor Portaria 3	**25/04/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,99	
Exaustor Ginasio	**25/04/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,23	
Exaustor Enfermaria	**25/04/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,26	
Exaustor CAT1	**25/04/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,54	
Exaustor CAT2	**25/04/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,64	
Exaustor Transportes	**25/04/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,84	
Exaustor MI (B1)	**25/04/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,56	
Exaustor MI (B2)	**25/04/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,19	
Exaustor MI (B3)	**25/04/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,56	
Exaustor Auditório 1	**25/04/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,45	
Exaustor Auditório 2	**25/04/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,87	
Exaustor Cantina	**25/04/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,47	
Exaustor Corredor	**25/04/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,09	
Exaustor Conj. Lab (A1)	**25/04/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,94	
Exaustor Conj. Lab (A2)	**25/04/2025**	**sim**	-4,00	-2,66	0,00	0,00	-5,83	
Exaustor Conj. Lab (A3)	**25/04/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,83	
Exaustor I4	**25/04/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,31	
Exaustor Guarda	**25/04/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,45	
Exaustor Reserva 1	**Estão localizados no Edifício I1**							
Exaustor Reserva 2								

Identificação do Exaustor	Semana	Operação	Vácuo da celula		PID	%LEL	Pressão	Observação
			(mmHg)	(mBar)	(ppm)	(5%Vol.)	(mBar)	
Exaustor I1	**30/04/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,64	
Exaustor I1 (2)	**30/04/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,37	
Exaustor I5 Auditório	**30/04/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,61	
Exaustor Biblioteca	**30/04/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,98	
Exaustor Portaria 3	**30/04/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,72	
Exaustor Ginasio	**30/04/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,31	
Exaustor Enfermaria	**30/04/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,20	
Exaustor CAT1	**30/04/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,56	
Exaustor CAT2	**30/04/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,59	
Exaustor Transportes	**30/04/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,65	
Exaustor MI (B1)	**30/04/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,62	
Exaustor MI (B2)	**30/04/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,04	
Exaustor MI (B3)	**30/04/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,38	
Exaustor Auditório 1	**30/04/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,27	
Exaustor Auditório 2	**30/04/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,78	
Exaustor Cantina	**30/04/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,53	
Exaustor Corredor	**30/04/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,11	
Exaustor Conj. Lab (A1)	**30/04/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-5,12	
Exaustor Conj. Lab (A2)	**30/04/2025**	**sim**	-4,00	-2,66	0,00	0,00	-5,77	
Exaustor Conj. Lab (A3)	**30/04/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,96	
Exaustor I4	**30/04/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,27	
Exaustor Guarda	**30/04/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,31	
Exaustor Reserva 1	**Estão localizados no Edificio I1**							
Exaustor Reserva 2								
Exaustor I1	**09/05/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,15	
Exaustor I1 (2)	**09/05/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	-	-	-	Não medido. Porta do exaustor inacessível devido ao ninho de marimbondos.
Exaustor I5 Auditório	**09/05/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,61	
Exaustor Biblioteca	**09/05/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,86	
Exaustor Portaria 3	**09/05/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,37	
Exaustor Ginasio	**09/05/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,01	
Exaustor Enfermaria	**09/05/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-5,11	
Exaustor CAT1	**09/05/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,06	
Exaustor CAT2	**09/05/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,54	
Exaustor Transportes	**09/05/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-5,11	
Exaustor MI (B1)	**09/05/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,70	
Exaustor MI (B2)	**09/05/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,91	
Exaustor MI (B3)	**09/05/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,62	
Exaustor Auditório 1	**09/05/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,36	
Exaustor Auditório 2	**09/05/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,21	
Exaustor Cantina	**09/05/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,55	
Exaustor Corredor	**09/05/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,93	
Exaustor Conj. Lab (A1)	**09/05/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-5,25	
Exaustor Conj. Lab (A2)	**09/05/2025**	**sim**	-4,00	-2,66	0,00	0,00	-5,43	
Exaustor Conj. Lab (A3)	**09/05/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,12	
Exaustor I4	**09/05/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,52	
Exaustor Guarda	**09/05/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,41	
Exaustor Reserva 1	**Estão localizados no Edificio I1**							
Exaustor Reserva 2								
Exaustor I1	**16/05/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,72	
Exaustor I1 (2)	**16/05/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	-	-	-	Não medido. Porta do exaustor inacessível devido ao ninho de marimbondos.
Exaustor I5 Auditório	**16/05/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,58	
Exaustor Biblioteca	**16/05/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,07	
Exaustor Portaria 3	**16/05/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,03	
Exaustor Ginasio	**16/05/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,29	
Exaustor Enfermaria	**16/05/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-5,41	
Exaustor CAT1	**16/05/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,68	
Exaustor CAT2	**16/05/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,19	
Exaustor Transportes	**16/05/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,41	
Exaustor MI (B1)	**16/05/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,09	
Exaustor MI (B2)	**16/05/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,99	
Exaustor MI (B3)	**16/05/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,31	
Exaustor Auditório 1	**16/05/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,88	
Exaustor Auditório 2	**16/05/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,17	
Exaustor Cantina	**16/05/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,71	
Exaustor Corredor	**16/05/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,09	
Exaustor Conj. Lab (A1)	**16/05/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,64	
Exaustor Conj. Lab (A2)	**16/05/2025**	**sim**	-4,00	-2,66	0,00	0,00	-5,53	
Exaustor Conj. Lab (A3)	**16/05/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,17	
Exaustor I4	**16/05/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,03	
Exaustor Guarda	**16/05/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,10	
Exaustor Reserva 1	**Estão localizados no Edificio I1**							
Exaustor Reserva 2								
Exaustor I1	**23/05/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,99	
Exaustor I1 (2)	**23/05/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	-	-	-	Não medido. Porta do exaustor inacessível devido ao ninho de marimbondos.
Exaustor I5 Auditório	**23/05/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,81	
Exaustor Biblioteca	**23/05/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,35	
Exaustor Portaria 3	**23/05/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,23	
Exaustor Ginasio	**23/05/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,72	
Exaustor Enfermaria	**23/05/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,71	
Exaustor CAT1	**23/05/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,30	
Exaustor CAT2	**23/05/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,56	
Exaustor Transportes	**23/05/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-5,15	
Exaustor MI (B1)	**23/05/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,55	
Exaustor MI (B2)	**23/05/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,43	
Exaustor MI (B3)	**23/05/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,56	
Exaustor Auditório 1	**23/05/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,23	
Exaustor Auditório 2	**23/05/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,19	
Exaustor Cantina	**23/05/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,82	
Exaustor Corredor	**23/05/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,06	
Exaustor Conj. Lab (A1)	**23/05/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,89	
Exaustor Conj. Lab (A2)	**23/05/2025**	**sim**	-4,00	-2,66	0,00	0,00	-4,94	
Exaustor Conj. Lab (A3)	**23/05/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,04	
Exaustor I4	**23/05/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,87	
Exaustor Guarda	**23/05/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,13	
Exaustor Reserva 1	**Estão localizados no Edificio I1**							
Exaustor Reserva 2								

Identificação do Exaustor	Semana	Operação	Vácuo da celula		PID	%LEL	Pressão	Observação
			(mmHg)	(mBar)	(ppm)	(5%Vol.)	(mBar)	
Exaustor I1	**30/05/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,18	
Exaustor I1 (2)	**30/05/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	-	-	-	Não medido. Porta do exaustor inacessível devido ao ninho de marimbondos.
Exaustor I5 Auditório	**30/05/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,96	
Exaustor Biblioteca	**30/05/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,82	
Exaustor Portaria 3	**30/05/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,59	
Exaustor Ginasio	**30/05/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,35	
Exaustor Enfermaria	**30/05/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-5,57	
Exaustor CAT1	**30/05/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,66	
Exaustor CAT2	**30/05/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,85	
Exaustor Transportes	**30/05/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,37	
Exaustor MI (B1)	**30/05/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,83	
Exaustor MI (B2)	**30/05/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,64	
Exaustor MI (B3)	**30/05/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,46	
Exaustor Auditório 1	**30/05/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,41	
Exaustor Auditório 2	**30/05/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,26	
Exaustor Cantina	**30/05/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,09	
Exaustor Corredor	**30/05/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,48	
Exaustor Conj. Lab (A1)	**30/05/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-5,35	
Exaustor Conj. Lab (A2)	**30/05/2025**	**sim**	-4,00	-2,66	0,00	0,00	-4,74	
Exaustor Conj. Lab (A3)	**30/05/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,79	
Exaustor I4	**30/05/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,79	
Exaustor Guarda	**30/05/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,11	
Exaustor Reserva 1	**Estão localizados no Edificio I1**							
Exaustor Reserva 2								
Exaustor I1	**06/06/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,22	
Exaustor I1 (2)	**06/06/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	-	-	-	Não medido. Porta do exaustor inacessível devido ao ninho de marimbondos.
Exaustor I5 Auditório	**06/06/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,65	
Exaustor Biblioteca	**06/06/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,38	
Exaustor Portaria 3	**06/06/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,08	
Exaustor Ginasio	**06/06/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,08	
Exaustor Enfermaria	**06/06/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,69	
Exaustor CAT1	**06/06/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,51	
Exaustor CAT2	**06/06/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,50	
Exaustor Transportes	**06/06/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,33	
Exaustor MI (B1)	**06/06/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,82	
Exaustor MI (B2)	**06/06/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,35	
Exaustor MI (B3)	**06/06/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,43	
Exaustor Auditório 1	**06/06/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,72	
Exaustor Auditório 2	**06/06/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,06	
Exaustor Cantina	**06/06/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,10	
Exaustor Corredor	**06/06/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,19	
Exaustor Conj. Lab (A1)	**06/06/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-5,62	
Exaustor Conj. Lab (A2)	**06/06/2025**	**sim**	-4,00	-2,66	0,00	0,00	-4,62	
Exaustor Conj. Lab (A3)	**06/06/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,31	
Exaustor I4	**06/06/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,46	
Exaustor Guarda	**06/06/2025**	**sim**	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,55	
Exaustor Reserva 1	**Estão localizados no Edificio I1**							
Exaustor Reserva 2								
Exaustor I1	**17/06/2025**	**sim**	-2	-2,66	0	0	-2,31	
Exaustor I1 (2)	**17/06/2025**	**sim**	-2	-2,66	-	-	-	Não medido. Porta do exaustor inacessível devido ao ninho de marimbondos.
Exaustor I5 Auditório	**17/06/2025**	**sim**	-2	-2,66	0	0	-1,69	
Exaustor Biblioteca	**17/06/2025**	**sim**	-2	-2,66	0	0	-2,27	
Exaustor Portaria 3	**17/06/2025**	**sim**	-2	-2,66	0	0	-4,15	
Exaustor Ginasio	**17/06/2025**	**sim**	-2	-2,66	0	0	-2,13	
Exaustor Enfermaria	**17/06/2025**	**sim**	-2	-2,66	0	0	-4,52	
Exaustor CAT1	**17/06/2025**	**sim**	-2	-2,66	0	0	-2,54	
Exaustor CAT2	**17/06/2025**	**sim**	-2	-2,66	0	0	-3,38	
Exaustor Transportes	**17/06/2025**	**sim**	-2	-2,66	0	0	-4,51	
Exaustor MI (B1)	**17/06/2025**	**sim**	-2	-2,66	0	0	-3,69	
Exaustor MI (B2)	**17/06/2025**	**sim**	-2	-2,66	0	0	-3,22	
Exaustor MI (B3)	**17/06/2025**	**sim**	-2	-2,66	0	0	-3,36	
Exaustor Auditório 1	**17/06/2025**	**sim**	-2	-2,66	0	0	-2,46	
Exaustor Auditório 2	**17/06/2025**	**sim**	-2	-2,66	0	0	-1,97	
Exaustor Cantina	**17/06/2025**	**sim**	-2	-2,66	0	0	-3,01	
Exaustor Corredor	**17/06/2025**	**sim**	-2	-2,66	0	0	-3,16	
Exaustor Conj. Lab (A1)	**17/06/2025**	**sim**	-2	-2,66	0	0	-5,44	
Exaustor Conj. Lab (A2)	**17/06/2025**	**sim**	-4	-2,66	0	0	-4,82	
Exaustor Conj. Lab (A3)	**17/06/2025**	**sim**	-2	-2,66	0	0	-4,38	
Exaustor I4	**17/06/2025**	**sim**	-2	-2,66	0	0	-2,39	
Exaustor Guarda	**17/06/2025**	**sim**	-2	-2,66	0	0	-2,35	
Exaustor Reserva 1	**Estão localizados no Edificio I1**							
Exaustor Reserva 2								

ANEXO 7

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

_____, cujo CPF _____, em conjunto com Felipe Martins Chufi, cujo CPF 326.774.078-92, declaram, sob as penas da lei e de responsabilização administrativa, civil e penal, que todas as informações prestadas à CETESB – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, no Relatório Técnico "Monitoramento de Intrusão de Gases em Ambientes Fechados – USP Leste – Relatório de Evolução 2º Trimestre/2025", realizado na AI-1 da USP Leste, localizada na Rua Arlindo Béttio, 1.000, Ermelino Matarazzo – São Paulo/SP, de julho de 2025 ,são verdadeiras e contemplam integralmente as exigências estabelecidas pela CETESB e se encontram em consonância com o que determinam o regulamento da Lei nº 13.577/2009, aprovado pelo Decreto nº 59.263/2013, e os Procedimentos para Proteção da Qualidade do Solo e Gerenciamento de Áreas Contaminadas aprovado em Decisão de Diretoria da CETESB, publicada no Diário Oficial do Estado no dia 10/02/2017.

Declaram, ainda estar cientes de que os documentos e laudos que subsidiam as informações prestadas à CETESB poderão ser requisitados a qualquer momento, durante ou após a implementação do procedimento previsto no documento Procedimentos para Proteção da Qualidade do Solo e Gerenciamento de Áreas Contaminadas, para fins de auditoria.

São Paulo, 31 de julho de 2025.

_____

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – CAMPUS LESTE
CNPJ: 63.025.530/0062-26
Nome do Responsável Legal:
RG:
CPF:

_____

ENGESOLVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS INTEGRADAS LTDA
CNPJ 23.559.934/0001-63
Nome do Responsável Técnico: Felipe Martins Chufi
RG: 29.447.243-5
CPF: 326.774.078-92

1 O artigo 69-A da Lei n° 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 (Lei de Crimes Ambientais) estabelece: "Elaborar ou apresentar, no licenciamento, concessão florestal ou qualquer outro procedimento administrativo, estudo, laudo ou relatório ambiental total ou parcialmente falso ou enganoso, inclusive por omissão:

Pena - reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.
§ 1o Se o crime é culposo: Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos.
§ 2o A pena é aumentada de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços), se há dano significativo ao meio ambiente, em decorrência do uso da informação falsa, incompleta ou enganosa".

ANEXO 8

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

ART de Obra ou Serviço
2620241434975

1. Responsável Técnico

FELIPE MARTINS CHUFI
Título Profissional: **Engenheiro Ambiental**
RNP: **2608845975**
Registro: **5063256720-SP**
Empresa Contratada: **ENGESOLVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS INTEGRADAS LTDA**
Registro: **2031192-SP**

2. Dados do Contrato

Contratante: **UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO** CPF/CNPJ: **63.025.530/0114-91**
Endereço: **Rua Arlindo Bettio** N°:
Complemento: **Saída do km 17,5 da Rodovia Ayrton Senna** Bairro: **Vila Guaraciaba**
Cidade: **São Paulo** UF: **SP** CEP: **03828-000**
Contrato: **0000001/2022 - PUSP-CL** Celebrado em: **24/07/2024** Vinculada à Art n°: **28027230221208991**
Valor: R$ **154148,42** Tipo de Contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação Institucional:

3. Dados da Obra Serviço

Endereço: **Rua Arlindo Bettio** N°:
Complemento: **Saída do km 17,5 da Rodovia Ayrton Senna** Bairro: **Vila Guaraciaba**
Cidade: **São Paulo** UF: **SP** CEP: **03828-000**
Data de Início: **04/08/2024**
Previsão de Término: **03/08/2025**
Coordenadas Geográficas:
Finalidade: **Ambiental** Código:

4. Atividade Técnica

		Quantidade	Unidade
Execução 1	**Execução de serviço técnico de controle ambiental**	**passivo ambiental**	**1,00000**	**unidade**

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Avaliação de Passivo Ambiental: Operação, Manutenção e Monitoramento de Poços de Gás (CH4), Pontos na Estrutura e de Sistemas de Ventilação de Gases através do PROCESSO Nº 22.1.18.95.7, Contrato Nº. 02/2022 - 2º Termo de aditivo.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

Nenhuma

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

São Paulo (Local) 08 **de** outubro **de** 2024 (Data)

FELIPE MARTINS CHUFI - CPF: 326.774.078-92

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CPF/CNPJ: 63.025.530/0114-91

9. Informações

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados constantes no rodapé-versão do sistema, certificada pelo *Nosso Número*.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.
